Harmonogram stavby: Vzdělávací a chovné centrum pro supy- 1. a 2. etapa

Zhotovitel : KKS, spol. s r.o.
Příluky 386
76001 Zlín

Číslo	Název	Začátek činnosti	Konec činnosti
ZOOIII	**Vzdělávací a chovné centrum pro supy**	**01.10.2021**	**18.03.2022**
ET_1	**ETAPA 1**	**01.10.2021**	**18.03.2022**
_1	ESIL_1: Zařízení silnoproudé elektrotechniky a MaR	16.01.2022	18.03.2022
_2	ESIL_2: Přeložka Vnitroareálového vedení silnoproudu	01.10.2021	15.10.2021
_3	ESIL_3: Vnitroareálová přípojka silnoproudu	01.10.2021	15.10.2021
_4	ESLA_1: Přeložka telefonního kabelu	01.10.2021	15.10.2021
_5	KAN_SO_01: KANALIZACE	18.10.2021	15.02.2022
_6	PKAN_SO_01: PŘÍPOJKA KANALIZACE	18.10.2021	21.12.2021
_7	PVOD_SO_01: PŘÍPOJKA VODY	18.10.2021	21.12.2021
_8	VOD_SO_01: VODOVOD	18.10.2021	15.02.2022
SO_01: Expozice + voliéra želv a damanů	001: Zemní práce	11.10.2021	18.03.2022
	002: Základy	31.10.2022	19.11.2021
	003: Svislé konstrukce	12.11.2022	03.12.2021
	004: Vodorovné konstrukce	16.11.2022	21.12.2021
	005: Komunikace	01.03.2022	18.03.2022
	006: Úpravy povrchu	01.02.2022	18.03.2022
	009: Ostatní konstrukce a práce	22.11.2021	08.03.2022
	099: Přesun hmot HSV	16.10.2021	18.03.2022
	711: Izolace proti vodě	25.10.2021	30.11.2021
	712: Povlakové krytiny	17.01.2022	13.02.2022
	713: Izolace tepelné	17.01.2022	27.02.2022
	762: Konstrukce tesařské	17.01.2022	27.02.2022
	763: Konstrukce montované	01.02.2022	27.02.2022
	764: Konstrukce klempířské	17.01.2022	27.02.2022
	766: Konstrukce truhlářské	01.02.2022	27.02.2022
	767: Konstrukce zámečnické	17.01.2022	27.02.2022
	782: Obklady z kamene	17.01.2022	13.02.2022
	783: Nátěry	14.02.2022	13.03.2022
	784: Malby	14.02.2022	13.03.2022
	JEZ: Jezírka	24.01.2022	27.02.2022
	MOB: Mobiliář	01.03.2022	18.03.2022
	OST: Ostatní prvky	01.03.2022	18.03.2022
	VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	01.10.2021	18.03.2022
ET_2	**ETAPA 2**	**01.10.2021**	**18.03.2022**
SO_02: Eukalyptová voliéra	001: Zemní práce	01.10.2021	06.03.2022
	002: Základy	18.10.2022	25.11.2021
	009: Ostatní konstrukce a práce	31.01.2022	27.02.2022
	099: Přesun hmot HSV	01.10.2021	18.03.2022
	762: Konstrukce tesařské	17.01.2022	13.02.2022
	767: Konstrukce zámečnické	17.01.2022	13.02.2022
	VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	01.10.2021	18.03.2022

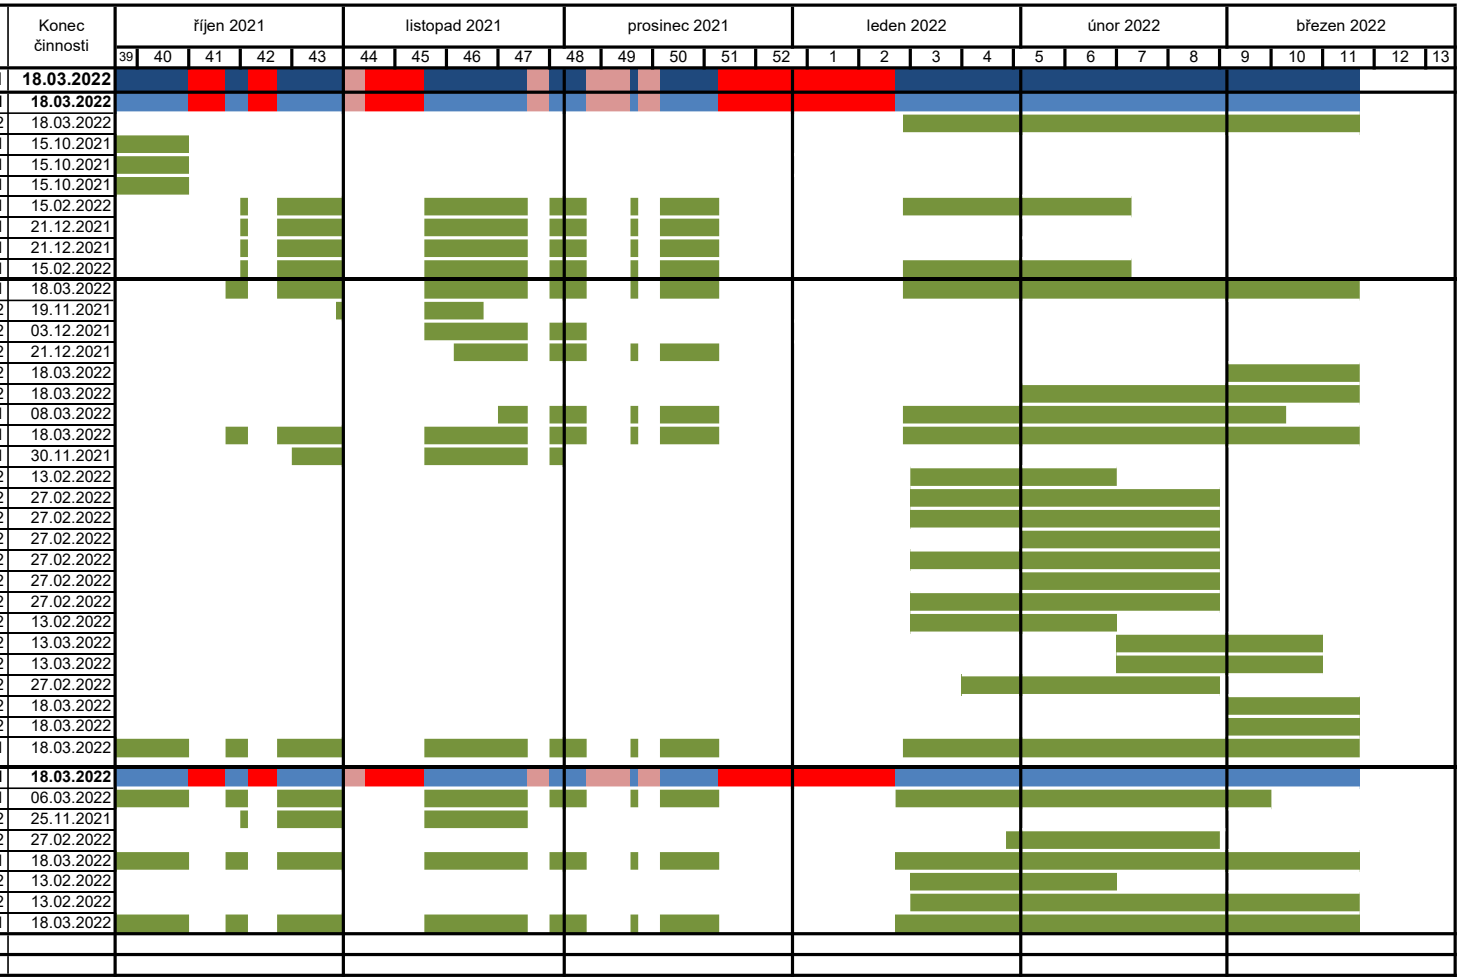

- práce přerušeny investorem
- klimatické vlivy

Ing. Radomír Kocman, jednatel
