Polita Praha 3, Olšanská – stavební úpravy 5. NP
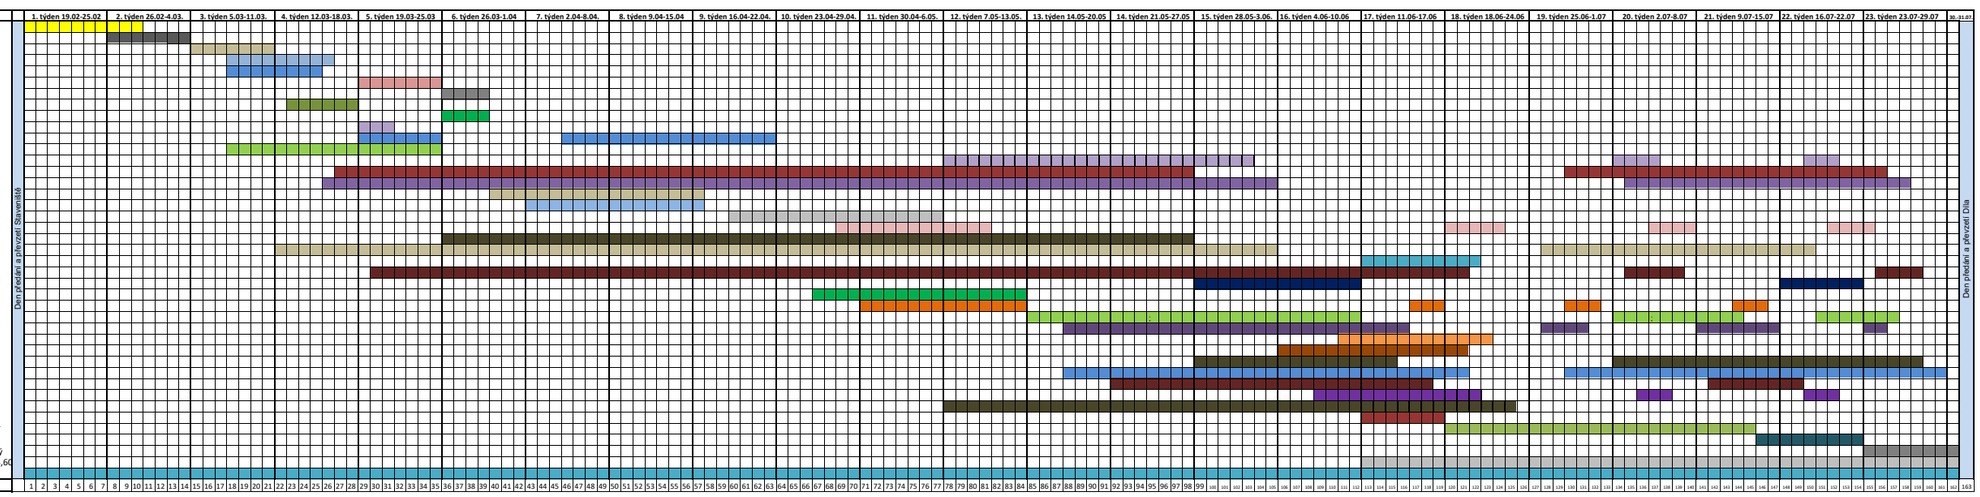
| P.č. | Činnost |
|---|---|
| 1 | bourací práce 518E,518G |
| 2 | ocelova konstrukce pod tempest vč betonaže |
| 3 | sdk konstrukce mistnosti 518E, 518 G |
| 4 | rozvody silnoproudu 518E, 518 G |
| 5 | rozvody slaboproudu 518 E, 518 G |
| 6 | pvc podlahy 518E, 518 G |
| 7 | komplektace silno a slaboproudu 518 E, 518 G |
| 8 | rozvody VZT 518 E, 518 G |
| 9 | komplektace VZT 518 E, 518 G |
| 10 | malby 518 E, 518 G |
| 11 | hrube podlahy |
| 12 | zdivo |
| 13 | D+M zarubní |
| 14 | rozvody silnoproudu |
| 15 | rozvody slaboproudu |
| 16 | rozvody UT |
| 17 | rozvody ZTI |
| 18 | omitky jadrove |
| 19 | omitky stukove |
| 20 | rozvody VZT |
| 21 | sdk konstrukce |
| 22 | akusticke obklady |
| 23 | akusticke podhledy |
| 24 | hlinikove steny vč dveri |
| 25 | obklady a dlažby |
| 26 | samonivelační stěrks |
| 27 | malby |
| 28 | pvc podlahy a koberce |
| 29 | komplektace UT |
| 30 | komplektace ZTI |
| 31 | komplektace silnoproudu |
| 32 | komplektace slaboproudu |
| 33 | komplektace VZT |
| 34 | D+M dveře |
| 35 | D+M zamečnickych konstrukcí |
| 36 | Práce v místnost 610,612: výměna dveří vč zarubni, |
| 37 | Práce v místnosti 626A,626B, 630,607CH: D+M dveří |
| 38 | Práce v místnosti 648,649: výměna kazetových |
| 39 | Práce místnost 636: D+M chladicích jednotek, upravý |
| 40 | Rozvody silno a slaboproudu vč kompletace:601,603,60 |
| 41 | VRN |
| | **Doba realizace 120 + 43 kalendářních dnů** |
