Generel Karlovarské krajské nemocnice – 1. etapa – zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti a autorského dozoru projektanta – část 2 – Výstavba objektů G1, G2, G3

Harmonogram projekční a inženýrské přípravy - aktualizace po přerušení prací, časové úseky plnění dle HMG z SoD
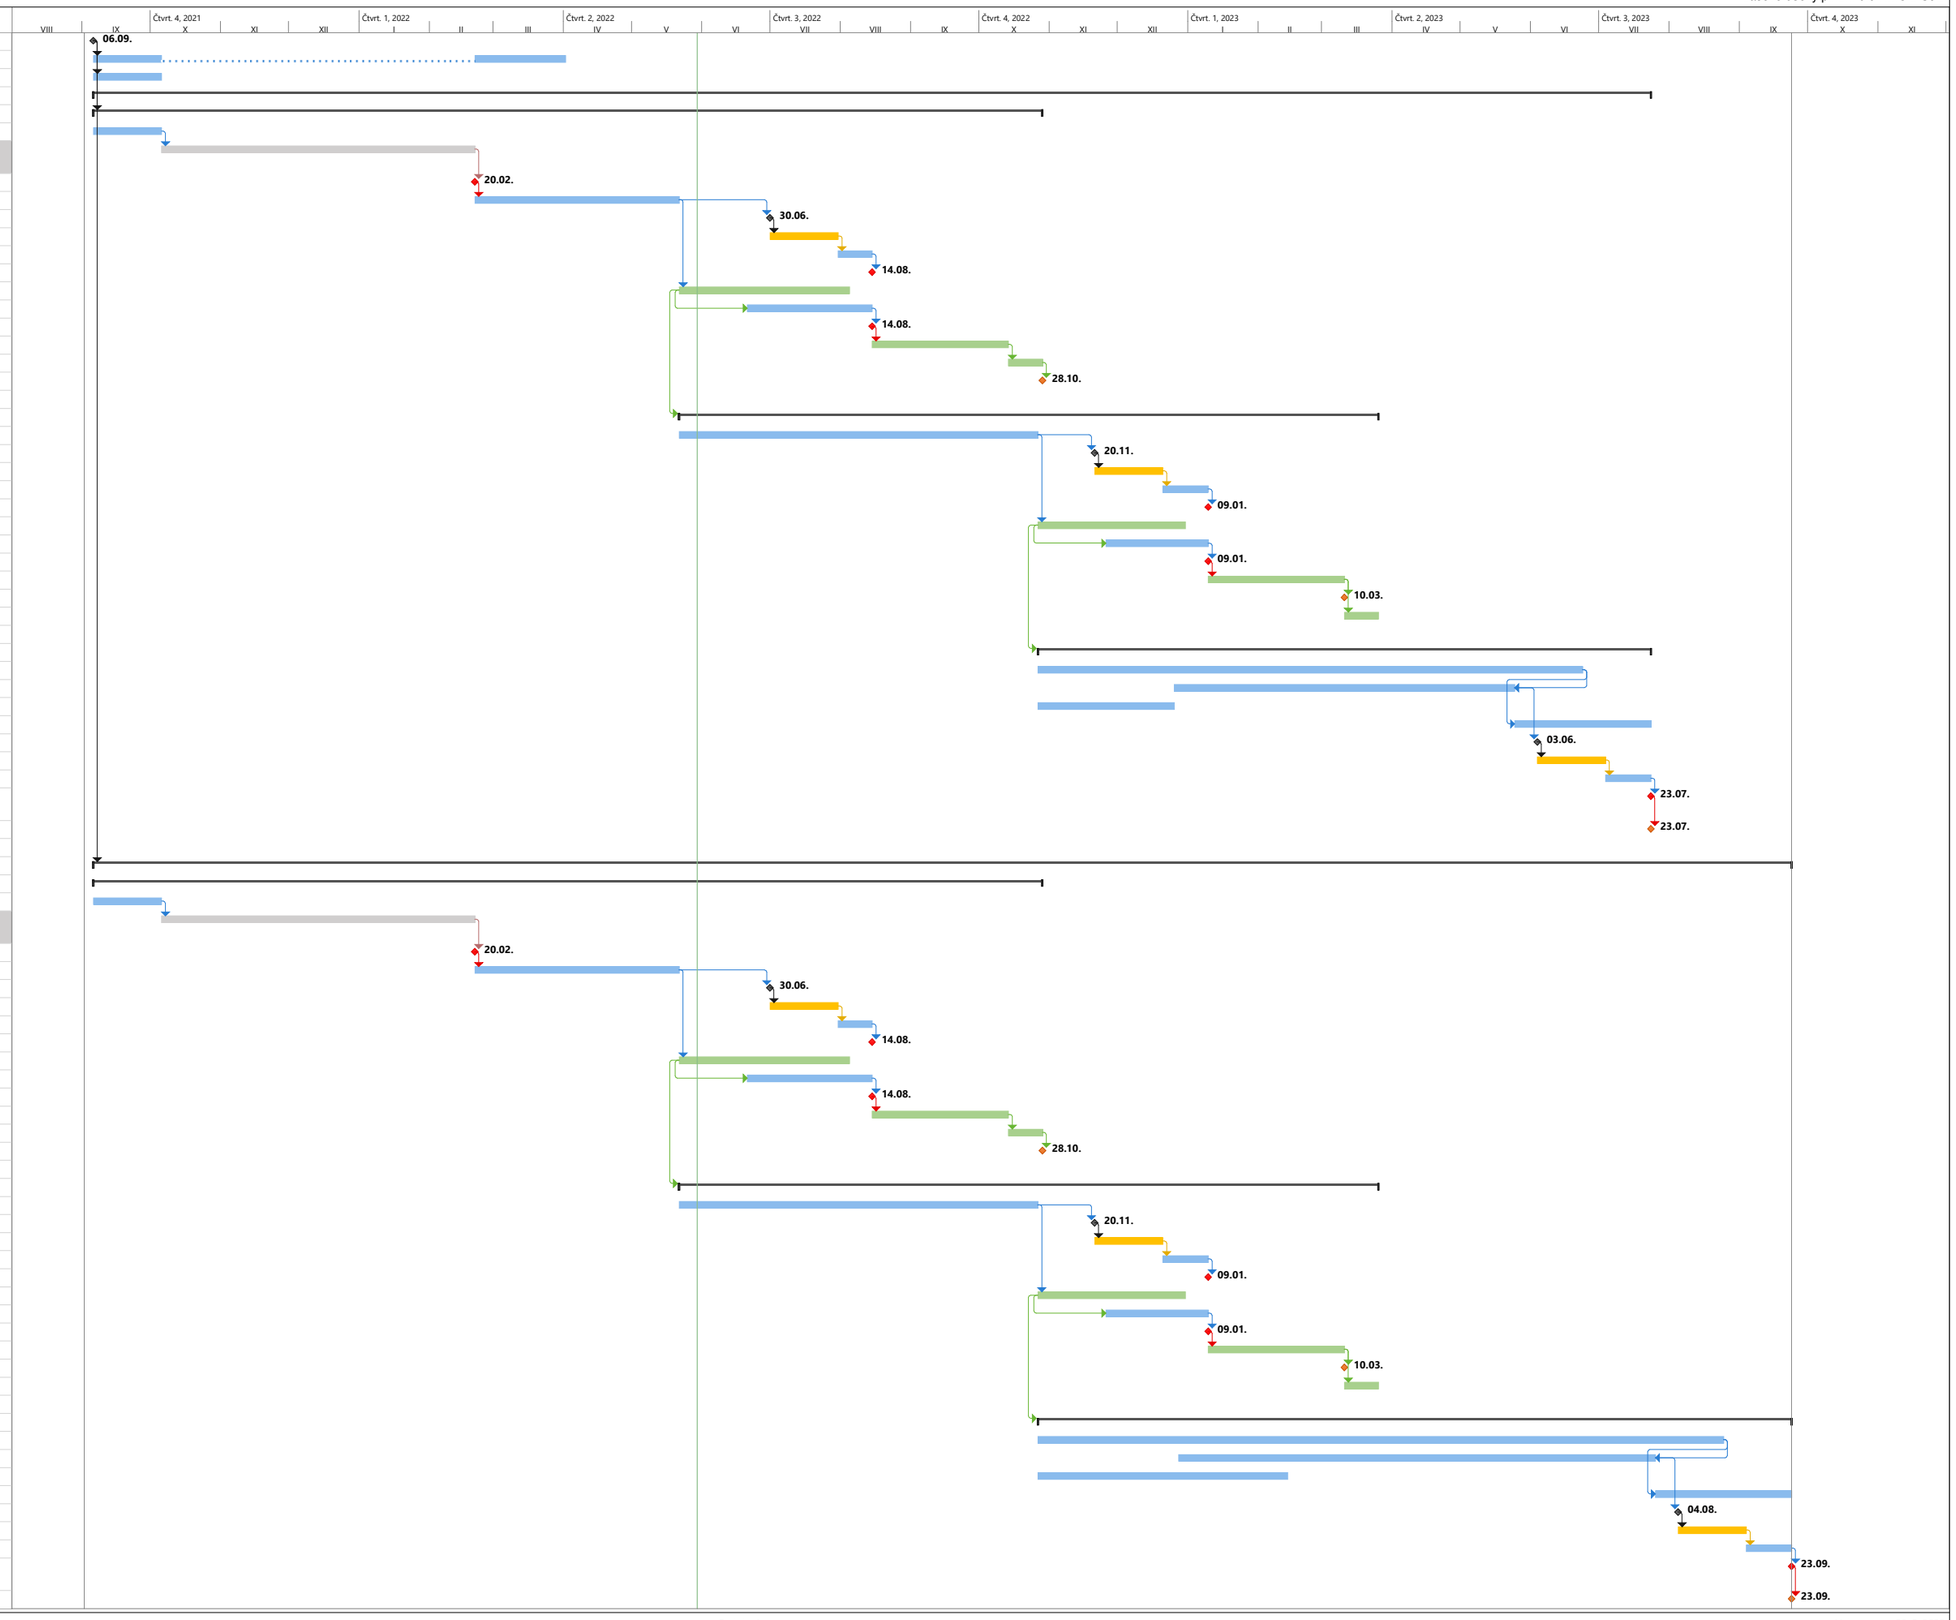
ID	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení
1	Zveřejnění SoD v registru smluv	0 dny	06.09. 21	06.09. 21
2	Průzkumy	70 dny	06.09. 21	01.04. 22
3	Příprava	30 dny	06.09. 21	05.10. 21
4	**Část 1/2 - G1**	**686 dny**	**06.09. 21**	**23.07. 23**
5	**Územní řízení**	**418 dny**	**06.09. 21**	**28.10. 22**
6	Zpracování dokumentace	30 dny	06.09. 21	05.10. 21
7	Přepracování studie (nové dispozice a organizace provozů)	138 dny	06.10. 21	20.02. 22
8	**Odsouhlasení studie**	**0 dny**	**20.02. 22**	**20.02. 22**
9	Dopracování dokumentace	90 dny	21.02. 22	21.05. 22
10	Odevzdání modelu BIM - hrubopis	0 dny	30.06. 22	30.06. 22
11	Připomínky objednatel k modelu BIM	30 dny	01.07. 22	30.07. 22
12	Zapracování připomínek do modelu BIM	15 dny	31.07. 22	14.08. 22
13	**Odevzdání modelu BIM - čistopis**	**0 dny**	**14.08. 22**	**14.08. 22**
14	Projednávání s DOSS	75 dny	22.05. 22	04.08. 22
15	Zapracování připomínek DOSS	55 dny	21.06. 22	14.08. 22
16	**Podání žádosti**	**0 dny**	**14.08. 22**	**14.08. 22**
17	Vydávání rozhodnutí	60 dny	15.08. 22	13.10. 22
18	Nabytí právní moci	15 dny	14.10. 22	28.10. 22
19	Fakrurační milník	0 dny	28.10. 22	28.10. 22
20				
21	**Stavební řízení**	**308 dny**	**22.05. 22**	**25.03. 23**
22	Zpracování dokumentace	158 dny	22.05. 22	26.10. 22
23	Odevzdání modelu BIM - hrubopis	0 dny	20.11. 22	20.11. 22
24	Připomínky objednatel k modelu BIM	30 dny	21.11. 22	20.12. 22
25	Zapracování připomínek do modelu BIM	20 dny	21.12. 22	09.01. 23
26	**Odevzdání modelu BIM - čistopis**	**0 dny**	**09.01. 23**	**09.01. 23**
27	Projednávání s DOSS	65 dny	27.10. 22	30.12. 22
28	Zapracování připomínek DOSS	45 dny	26.11. 22	09.01. 23
29	**Podání žádosti**	**0 dny**	**09.01. 23**	**09.01. 23**
30	Vydávání rozhodnutí	60 dny	10.01. 23	10.03. 23
31	Fakrurační milník	0 dny	10.03. 23	10.03. 23
32	Nabytí právní moci	15 dny	11.03. 23	25.03. 23
33				
34	**Dokumentace pro provedení stavby**	**270 dny**	**27.10. 22**	**23.07. 23**
35	Zpracování dokumentace stavby	240 dny	27.10. 22	23.06. 23
36	Zpracování dokumentace interiérů	150 dny	26.12. 22	24.05. 23
37	Zpracování dokumentace vnějších částí	60 dny	27.10. 22	25.12. 22
38	Zpracování výkazu výměr a rozpočtu	60 dny	25.05. 23	23.07. 23
39	Odevzdání modelu BIM - hrubopis	0 dny	03.06. 23	03.06. 23
40	Připomínky objednatel k modelu BIM	30 dny	04.06. 23	03.07. 23
41	Zapracování připomínek do modelu BIM	20 dny	04.07. 23	23.07. 23
42	**Odevzdání modelu BIM a dokumentace - čistopis**	**0 dny**	**23.07. 23**	**23.07. 23**
43	Fakrurační milník	0 dny	23.07. 23	23.07. 23
44				
45	**Část 2/2 - G2 a G3**	**748 dny**	**06.09. 21**	**23.09. 23**
46	**Územní řízení**	**418 dny**	**06.09. 21**	**28.10. 22**
47	Zpracování dokumentace	30 dny	06.09. 21	05.10. 21
48	Přepracování studie (nové dispozice a organizace provozů)	138 dny	06.10. 21	20.02. 22
49	**Odsouhlasení studie**	**0 dny**	**20.02. 22**	**20.02. 22**
50	Dopracování dokumentace	90 dny	21.02. 22	21.05. 22
51	Odevzdání modelu BIM - hrubopis	0 dny	30.06. 22	30.06. 22
52	Připomínky objednatel k modelu BIM	30 dny	01.07. 22	30.07. 22
53	Zapracování připomínek do modelu BIM	15 dny	31.07. 22	14.08. 22
54	**Odevzdání modelu BIM - čistopis**	**0 dny**	**14.08. 22**	**14.08. 22**
55	Projednávání s DOSS	75 dny	22.05. 22	04.08. 22
56	Zapracování připomínek DOSS	55 dny	21.06. 22	14.08. 22
57	**Podání žádosti**	**0 dny**	**14.08. 22**	**14.08. 22**
58	Vydávání rozhodnutí	60 dny	15.08. 22	13.10. 22
59	Nabytí právní moci	15 dny	14.10. 22	28.10. 22
60	Fakrurační milník	0 dny	28.10. 22	28.10. 22
61				
62	**Stavební řízení**	**308 dny**	**22.05. 22**	**25.03. 23**
63	Zpracování dokumentace	158 dny	22.05. 22	26.10. 22
64	Odevzdání modelu BIM - hrubopis	0 dny	20.11. 22	20.11. 22
65	Připomínky objednatel k modelu BIM	30 dny	21.11. 22	20.12. 22
66	Zapracování připomínek do modelu BIM	20 dny	21.12. 22	09.01. 23
67	**Odevzdání modelu BIM - čistopis**	**0 dny**	**09.01. 23**	**09.01. 23**
68	Projednávání s DOSS	65 dny	27.10. 22	30.12. 22
69	Zapracování připomínek DOSS	45 dny	26.11. 22	09.01. 23
70	**Podání žádosti**	**0 dny**	**09.01. 23**	**09.01. 23**
71	Vydávání rozhodnutí	60 dny	10.01. 23	10.03. 23
72	Fakrurační milník	0 dny	10.03. 23	10.03. 23
73	Nabytí právní moci	15 dny	11.03. 23	25.03. 23
74				
75	**Dokumentace pro provedení stavby**	**332 dny**	**27.10. 22**	**23.09. 23**
76	Zpracování dokumentace stavby	302 dny	27.10. 22	24.08. 23
77	Zpracování dokumentace interiérů	210 dny	28.12. 22	25.07. 23
78	Zpracování dokumentace vnějších částí	110 dny	27.10. 22	13.02. 23
79	Zpracování výkazu výměr a rozpočtu	60 dny	26.07. 23	23.09. 23
80	Odevzdání modelu BIM - hrubopis	0 dny	04.08. 23	04.08. 23
81	Připomínky objednatel k modelu BIM	30 dny	05.08. 23	03.09. 23
82	Zapracování připomínek do modelu BIM	20 dny	04.09. 23	23.09. 23
83	**Odevzdání modelu BIM a dokumentace - čistopis**	**0 dny**	**23.09. 23**	**23.09. 23**
84	Fakrurační milník	0 dny	23.09. 23	23.09. 23
