PŘEDBĚŽNÝ ČASOVÝ HARMONOGRAM

ID	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení
1	**Přístavby, nástavby a stavební úpravy pavilonu CH, Nemocnice ČB - 2.etapa**	**670 dny**	**01.10. 22**	**31.07. 24**
2	Předokl.datum účinnosti smlouvy	1 den	01.10. 22	01.10. 22
3	Předání staveniště	1 den	10.10. 22	10.10. 22
4	Zahájení provádění díla	1 den	11.10. 22	11.10. 22
5	Bourací práce	200 dny	12.10. 22	29.04. 23
6	Stavebně-konstrukční část	650 dny	12.10. 22	22.07. 24
7	Vnitřní kanalizace	200 dny	01.03. 23	16.09. 23
8	Vnitřní vodovod	200 dny	01.03. 23	16.09. 23
9	Venkovní kanalizace	90 dny	12.10. 22	09.01. 23
10	Silnoproud	200 dny	01.05. 23	16.11. 23
11	Chlazení vodní	200 dny	01.04. 23	17.10. 23
12	VRF chlazení	200 dny	01.04. 23	17.10. 23
13	Chlazení TM	200 dny	01.04. 23	17.10. 23
14	Slaboproud	200 dny	01.05. 23	16.11. 23
15	EPS + ERO	200 dny	01.05. 23	16.11. 23
16	Vytápění	200 dny	01.04. 23	17.10. 23
17	Vzduchotechnika	200 dny	01.04. 23	17.10. 23
18	Měření a regulace	200 dny	01.05. 23	16.11. 23
19	Speciální zdravotní nábytek	90 dny	01.05. 24	29.07. 24
20	Lékařské technologie	91 dny	02.04. 24	01.07. 24
21	Výtahy	90 dny	01.11. 23	29.01. 24
22	Zpevněné plochy, komunikace	108 dny	15.04. 24	31.07. 24
23	Vedlejší a ostatní náklady	670 dny	01.10. 22	31.07. 24
24	Dokončení díla	1 den	31.07. 24	31.07. 24

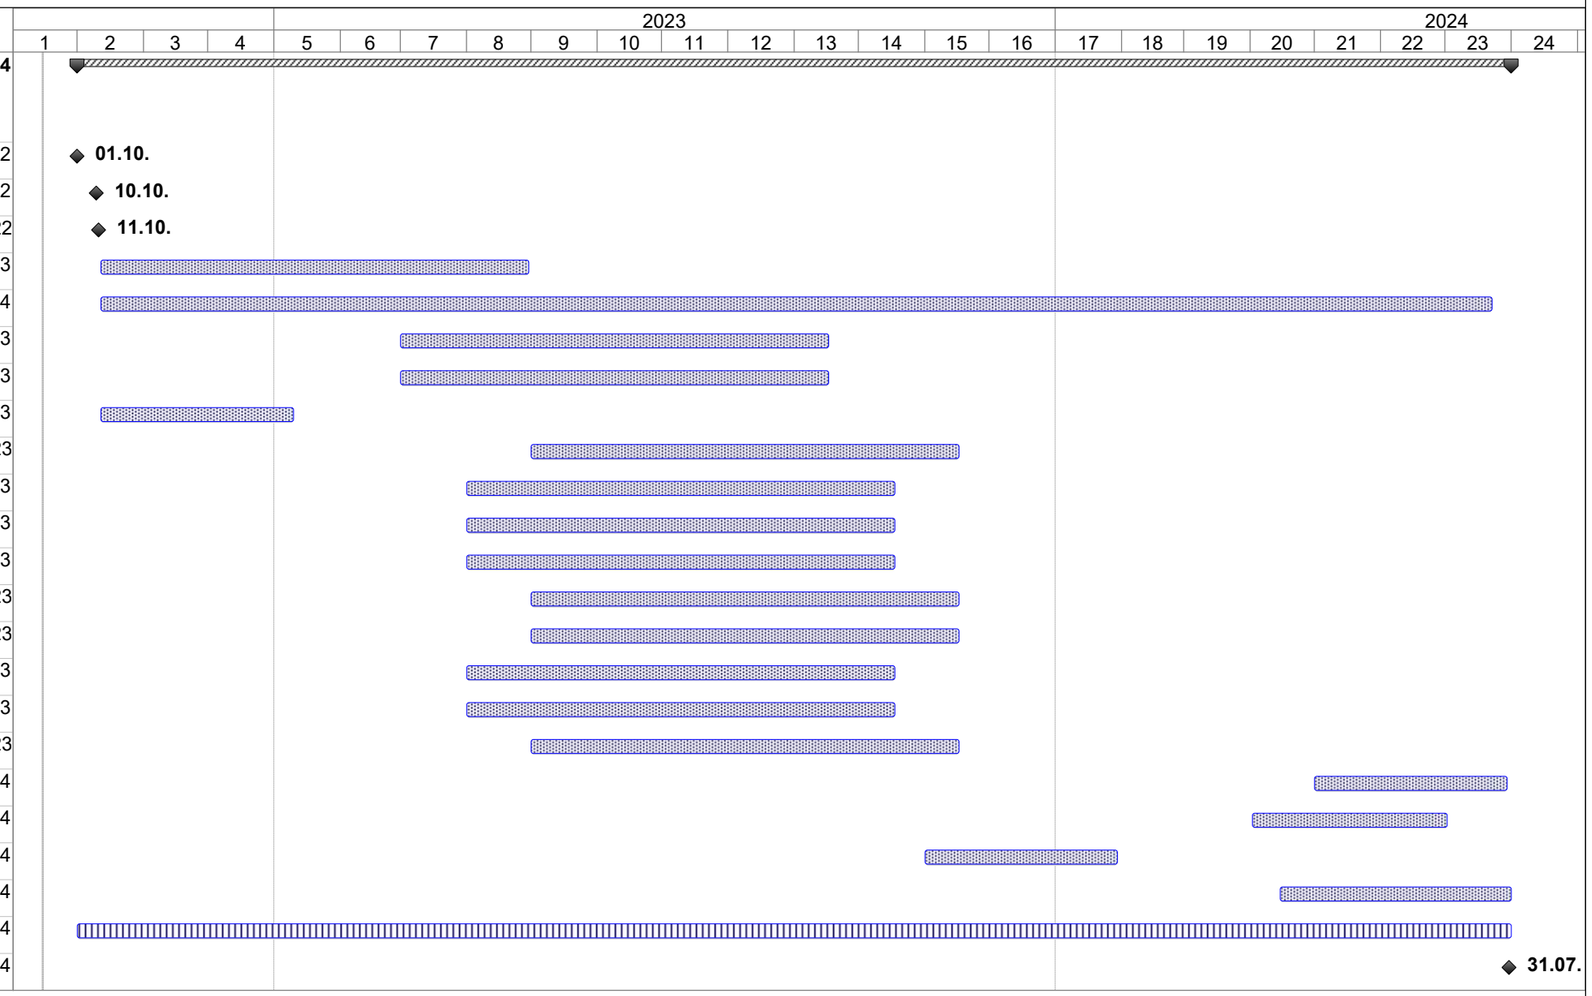

Úkol | Rozdělení | Milník | Souhrnný | Souhrn projektu

ŽS OHLA

Metrostav DIZ s.r.o.
