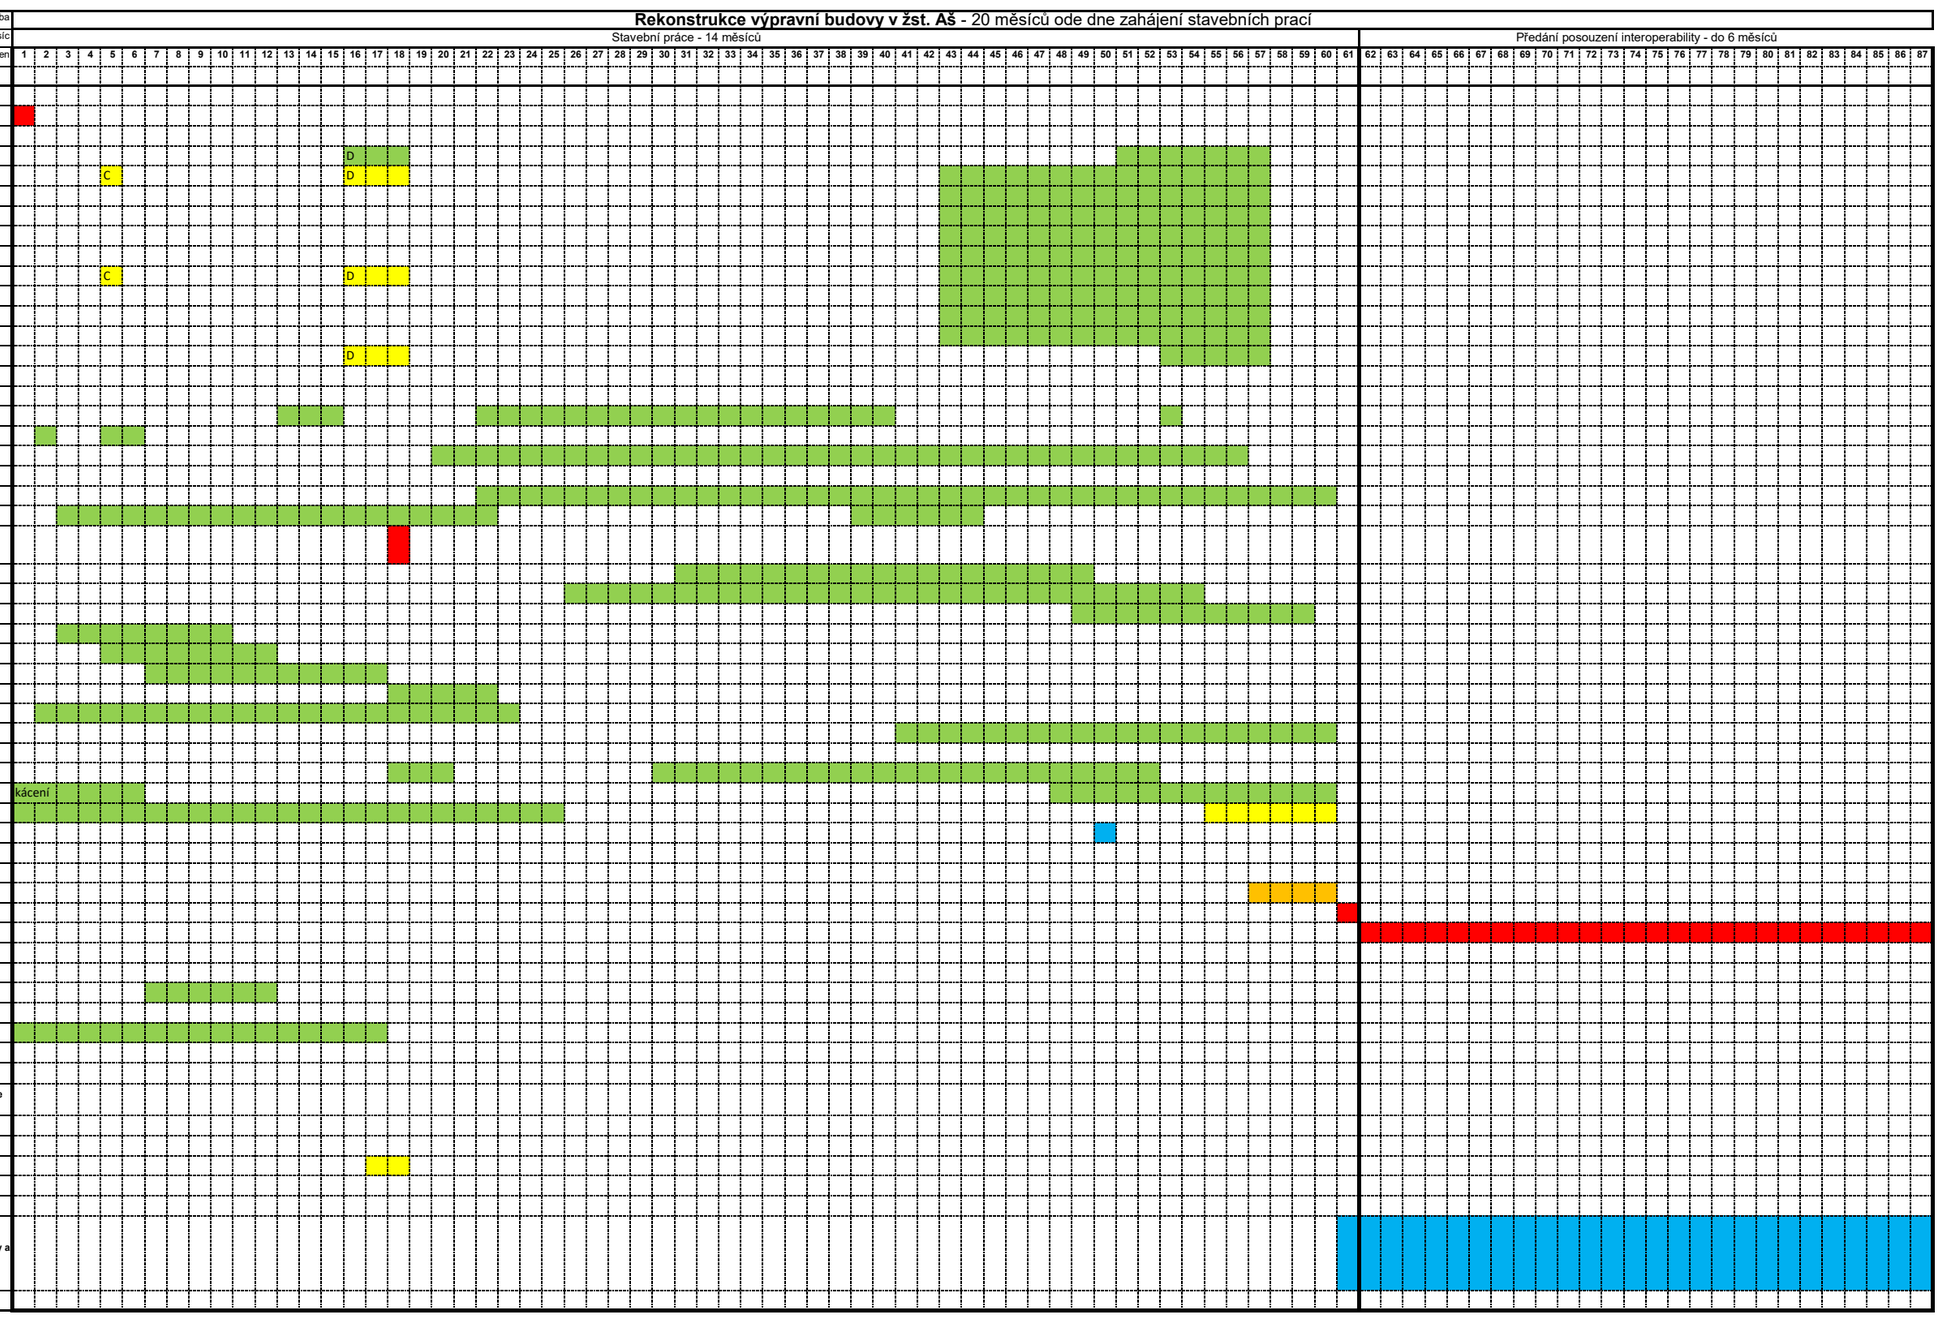Poř. Číslo	Část	Soubor	Popis
1			**Aš - Správa železnic, státní organizace**
2			Převzetí staveniště
3	**D.1**		**Technologická část**
4	D.1.1		Zabezpečovací zařízení
5	D.1.2	00-02-21	Rozhlasové zařízení
6		00-02-22	IP Rozhlas
7		00-02-41	Elektrická požární a zabezpečovací signalizace SŽ
8		00-02-42	Elektrická požární a zabezpečovací signalizace Sec.
9		00-02-61	Informační systém pro cestující
10		00-02-71	Jednotný čas
11		00-02-72	Kamerový systém SŽ
12		00-02-73	Dohledový systém Security
13		00-02-74	Strukturovaná kabeláž
14		00-02-74	Přemístění technologie z VB
15	**D.2**	**D.2**	**Stavební část**
16	D.2.1		Inženýrské objekty
17		00-31-01	Potrubní vedení kanalizace
18		00-33-01	Potrubní vedení plynovod
19		00-50-03	Pozemní komunikace, parkovací stání
20	D.2.2		Pozemní stavební objekty
21	D.2.2.1	00-71-01	Novostavba výpravní budovy
22		00-72-01	Přístavba technologického objektu
23			Zprovoznění nové technologie v přístavbě technologického objektu, nahrazující technologii v bourané výpravní budově
24		00-73-01	Hodinová věž
25	D.2.2.2	00-74-01	Zastřešení nástupiště
26	D.2.2.4	00-77-01	Orientační systém
27	D.2.2.5	00-78-01	Demolice A
28			Demolice B
29			Demolice C
30			Demolice D
31			Demolice E
32	D.2.2.6	D.2.2.6	Drobná architektura a oplocení
33	D.2.4	D.2.4	Ostatní stavební objekty
34		00-86-01	Rozvody NN a osvětlení
35		00-95-01	Ostatní vegetační úprava
36		00-98-01	ZOV
			Dodání mobiliáře a AZD do - zajišťuje objednatel
37			
38			
39			Přejímka stavby
40			Převzetí dokončené stavby
41			Zkušební provoz
42			
43			
44		00-72-01	Nový přívod NN
45			
46			Přeložka vodovodu CHEVAK
47			
48			
49			Plánovaná výluka úpravy kabelizace a přenesení technologie (5 nočních výluk)
50			Plánovaná výluka V-007218/21 Fr. Lázně - Aš
51			Plán. výluka V-005103/21 Přejezd P330 Aš
52			Výluka po dobu přepojování na novou technologii
53			
54			
55			Posouzení interoperability, včetně zajištění všech souvisejících dokladů, , předání souborného zpracování geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby a kompletní technické části dokumentace skutečného provedení stavby, odstranění vad a nedodělků nebránících užívání
56
