# Krycí list ZBV

| Název a evidenční číslo Stavby: | Číslo SO/PS / | Číslo ZBV: |
|---|---|---|
| **II/272 Lysá nad Labem, průtah - stavba** | / číslo Změny SO/PS: | **16** |
| Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): | **921 / 2** | |
| **DIO** | | |

Objednatel: **Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace**
Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5, Smíchov IČO: 00066001

**Město Lysá nad Labem**
Husovo náměstí 23, 289 22 Lysá nad Labem IČO: 00239402

Zhotovitel: **Metrostav Infrastructure a.s.**
Koželužská 2246/5, Libeň, 180 00 Praha 8 IČO: 24204005
člen Skupiny Metrostav (Metrostav a.s. IČO: 00014915)

**Rekapitulace ZBV č. 16 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5 a 6**

| část ZBV č. | Cena navrhovaných Změn záporných | Cena navrhovaných Změn kladných | Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem |
|---|---|---|---|
| 16 .1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| část ZBV č. | Cena navrhovaných Změn záporných | Cena navrhovaných Změn kladných | Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem |
|---|---|---|---|
| 16 .2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| část ZBV č. | Cena navrhovaných Změn záporných | Cena navrhovaných Změn kladných | Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem |
|---|---|---|---|
| 16 .3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| část ZBV č. | Cena navrhovaných Změn záporných | Cena navrhovaných Změn kladných | Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem |
|---|---|---|---|
| 16 .4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| část ZBV č. | Cena navrhovaných Změn záporných | Cena navrhovaných Změn kladných | Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem |
|---|---|---|---|
| 16 .5 | 0,00 | 197 628,36 | 197 628,36 |

| **Suma ZBV č.** | Cena navrhovaných Změn záporných | Cena navrhovaných Změn kladných | Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem |
|---|---|---|---|
| 16 | **0,00** | **197 628,36** | **197 628,36** |

Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.
Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy
a pro Rozpis ocenění změn položek.

Odvolání proti povolení uzavírky nemá, podle 24 odst. 4 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, odkladný účinek.

v. r.
Kateřina Uhrová
vedoucí odboru dopravy
(otisk úředního razítka)

Obdrží :

- SEDOZ DZ, s. r. o.

- Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, územní odbor Nymburk, Boleslavská 1836, Nymburk
- Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, Zborovská 11, 150 21 Praha 5
- Ministerstvo dopravy ČR
- Ředitelství silnic a dálnic ČR
- obec Milovice
- obec Stratov
- obec Sojovice
- obec Lysá nad Labem
- Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, Tyršova 11, 288 02 Nymburk
- Zdravotnická záchranná služba, Smetanova 56, 288 02 Nymburk
- Integrovaná doprava Středočeského kraje
- elektronicky zadáno do Centrálního registru uzavírek

Vypraveno dne: 11.08.2021

Městský úřad Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
Masarykovo náměstí 1/6
250 01 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav

brnlvp21v00gcl

Odbor dopravy

**Váš dopis čj.:**
**Ze dne:**
**Naše čj.:** MÚBNLSB-OD-76766/2021-MASPE
**Naše sp. zn.:** OD-20608/2021-MASPE

SEDOZ DZ s.r.o. IČ 24218537
Primátorská č. p. 296/38
180 00 PRAHA 8

**Vyřizuje:** Petra Mašková
**Tel.:**
**E-mail:**

**Datum:** 21.07.2021

# Veřejná vyhláška

## Opatření obecné povahy

## Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích

Městský úřad Brandýs nad Labem–Stará Boleslav, odbor dopravy, jako příslušný orgán státní správy ve věcech provozu na pozemních komunikacích podle ust. § 124 odst. 6) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu") pro stanovení místní a přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích na základě žádosti společnosti **Metrostav infrastructure a.s.,** IČ: 00014915 se sídlem Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 zastoupen na základě plné moci společností SEDOZ CZ s.r.o., IČ. 24218537 se sídlem Primátorská 296/38, 180 00 Praha 8 - Libeň (dále jen „žadatel") podané dne 20.07.2021, podle ust. § 171 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád") **rozhodl** podle ust. § 77 zákona o silničním provozu

**o stanovení přechodné úpravy silničního provozu**

**na silnicích č. II/610 v k.ú. Stará Boleslav a III/2752 v k.ú. Hlavenec,** z důvodu objízdné trasy k úplné uzavírce pozemní komunikace – oprava povrchu komunikace II/272 v k.ú. Lysá nad Labem, spočívající v umístění dopravního značení a zařízení v rozsahu dle předloženého a odsouhlaseného Policie ČR Krajské ředitelství SK, DI Praha-venkov-východ č. j.: **KRPS-276005-1/ČJ-2020-011506 ze dne 09.11.2020** a její prodloužení č.j. **KRPS-170132-1/ČJ-2021-011506 ze dne 16.07.2021,** které je nedílnou součástí tohoto opatření obecné povahy.

Podmínky pro provedení přechodné úpravy provozu:
- Termín přechodné úpravy provozu: **16. 08. 2021 – 30. 11. 2021**
- Dopravní značení bude umístěno a instalováno dle schváleného DIO Policie ČR Krajské ředitelství SK, DI Praha-venkov-východ č. j.: KRPS-276005-1/ČJ-2020-011506 ze dne 09.11.2020.

- Dopravní značení bude provedeno v souladu se zásadami pro dopravní značení na pozemních komunikacích TP 66, Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích, vydané Centrem dopravního výzkumu v Brně.
- Dopravní značení musí provedením odpovídat vyhlášce č. 294/2015 Sb., a zákonu o silničním provozu.
- **Dopravní značení, které je v rozporu s touto přechodnou úpravou silničního provozu bude zakryto.**
- Dopravní značení musí být upevněno na kovových sloupcích nebo případně na sloupech veřejného osvětlení. Musí být provedeno dle příslušné ČSN EN 12899-1 a musí být z retroreflexního materiálu. Dopravní značení včetně nosičů a spojovacích součástí musí být schváleno Ministerstvem dopravy ČR.
- **Dopravní značení bude rozmístěno odbornou firmou, která má platná oprávnění k výkonu této činnosti a to do zahájení stavebních prací.**
- Osoby, které se budou pohybovat na komunikacích, jsou povinny nosit výstražné oblečení.
- Na místě stavebních prací bude dostatečný počet poučených osob schopných v případě potřeby, řídit silniční provoz.
- Osoba zodpovědná za přechodnou úpravu provozu v místě omezení je pan Ing. Ondřej Vítek, T.: 702 012 844, Metrostav infrastructure a.s.,

## Odůvodnění

Na základě žádosti podané dne 20.07.2021 žadatelem o stanovení přechodné úpravy silničního provozu na silnicích č. II/610 v k.ú. Stará Boleslav a III/2752 v k.ú. Hlavenec, z důvodu objízdné trasy k úplné uzavírce pozemní komunikace – oprava povrchu komunikace II/272 v k.ú. Lysá nad Labem, bylo podle ust. § 171 správního řádu zahájeno řízení, na základě kterého se vydává opatření obecné povahy.

K žádosti o stanovení přechodné úpravy silničního provozu bylo předloženo DIO, které bylo projednáno s Policií ČR Krajské ředitelství SK, DI úo Praha-venkov-východ, jako dotčeným orgánem dle ust. § 77 odst. 2 písm. b) zákona o silničním provozu.

V souladu s ust. § 173 odst. 1 správního řádu a podle ust. § 77 odst. 4) a 5) zákona o silničním provozu se proto stanovuje přechodná úprava silničního provozu, dle předloženého a odsouhlaseného DIO, které je nedílnou součástí tohoto opatření.

## Poučení

Proti stanovení přechodné úpravy provozu formou opatření obecné povahy nelze dle ust. § 173 odst. 2) správního řádu podat opravný prostředek.

Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti pátým dnem po dni vyvěšení této veřejné vyhlášky.

Podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES Vám oznamujeme, že na základě plnění úkolů, které nám ukládají právní předpisy, shromažďujeme a dále

zpracováváme Vaše osobní údaje za účelem výkonu agendy silničního správního úřadu a speciálního stavebního úřadu. Bližší informace naleznete na stránkách http://www.brandysko.cz/.

Petra Mašková v. r.
Referent odboru dopravy

Příloha – situace, originál DIO k nahlédnutí na MěÚ Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, Odbor dopravy, pracoviště Stará Boleslav, Mariánské náměstí 28, kancelář č. 111)

**Toto opatření obecné povahy musí být vyvěšeno na úřední desce MěÚ Brandýs nad Labem–Stará Boleslav, OÚ Hlavenec po dobu 15 dnů.**

Vyvěšeno dne: ..... Sejmuto dne: .....

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

Vývěsní lhůta začíná den následující po dni vyvěšení. Sejmutí vyhlášky je možno následující pracovní den po posledním (patnáctém) dni vývěsní lhůty.

**Písemnost /nebo oznámení/ se zveřejňuje též způsobem umožňujícím dálkový přístup.**

**Právní účinky doručení má výhradně doručení veřejnou vyhláškou prostřednictvím úřední desky MěÚ Brandýs n.L. – St. Boleslav.**

**Obdrží:**

- SEDOZ CZ s.r.o.; IDDS: mrr9x73
- Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje; IDDS: a6ejgmx
- MěÚ Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, OISMM; IDDS: c5hb7xy
- Obec Hlavenec; IDDS: uvuarx5

**Dotčené orgány státní správy:**

- Policie ČR, KŘ SK DI úo Praha-venkov-východ; IDDS: 2dtai5u

**K vyvěšení na úřední desce:**

- MěÚ Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
- OÚ Hlavenec

# Magistrát města Mladá Boleslav

**Odbor dopravy a silničního hospodářství**

**Havlíčkova 1307, 293 01 Mladá Boleslav**

*tel./fax.:* *e-mail:* p


**Metrostav a.s., divize 4**
**IČ 00014915**
**Koželužská 2450/4**
**186 03 Praha 8 - Libeň**

*v zastoupení:*
**SEDOZ DZ s.r.o.**
**IČ 24218537**
**Primátorská 296/38**
**186 03 Praha 8 - Libeň**

NAŠE ZN.: ODSH 253-280/2020-24/202
ODSH 253-280/2021-24/130
VYŘIZUJE: Pelc Jiří
TEL.:
E-MAIL:
DATUM 19.07.2021

## Stanovení přechodné úpravy provozu

(*dopravního značení*).

Odbor dopravy a silničního hospodářství Magistrátu města Mladá Boleslav příslušný dle § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, Vám sděluje, že na podkladě předloženého návrhu na přechodnou úpravu provozu, které bude užito v souvislosti s dopravním opatřením na silnicích č. II/610, II/272, II/331, III/24424, III/2729, III/27212, z důvodu uzavírky silnice č. II/272 v Lysé nad Labem, v termínu od 16. srpna 2021 do 30. listopadu 2021, odsouhlasený v písemném stanovisku Policie ČR Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, Územní odbor Mladá Boleslav - dopravní inspektorát č.j: KRPS-195062/ČJ-2020-010706-KOM, ze dne 13. srpna 2020 a dne 14. července 2021, pod Čj: KRPS 168688/Čj-2021-010706-KOM, tímto:

**s t a n o v u j e**

podle § 77 odst. 1 písm. c) zákona č. 361/2000 Sb., přechodnou úpravu provozu, které bude užito v souvislosti s dopravním opatřením na silnicích č. II/610, II/272, II/331, III/24424, III/2729, III/27212, z důvodu uzavírky silnice č. II/272 v Lysé nad Labem. (oprava povrchu komunikace) v termínu od 16. srpna 2021 do 30. listopadu 2021.

Dopravní značení musí být provedeno podle platných právních předpisů a norem, souladu se situačním plánkem dopravního značení - DIO, odsouhlaseného dne 2. září 2020, pod Čj: : ODSH 253-280/2020-24/2020. Dodržení podmínek Policie ČR Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, Územní odbor Mladá Boleslav - dopravní inspektorát č.j: KRPS-195062/ČJ-2020-010706-KOM se nemění.

Za instalaci a stav přechodné úpravy provozu (dopravního značení) je odpovědny pan Ing. Ondřej Vítek, tel. 702012844.

Magistrát města Mladá Boleslav, odbor dopravy a silničního hospodářství si vyhrazuje právo toto stanovení změnit nebo doplnit, pokud si to vyžádá změna situace v silničním provozu nebo veřejný zájem.

Proti tomuto stanovení nejsou přípustné opravné prostředky ve smyslu obecných předpisů o správním řízení.

Referent odboru dopravy:

**Na vědomí:**
Policie ČR DI Ml. Boleslav
KSÚS oblast Mnichovo Hradiště

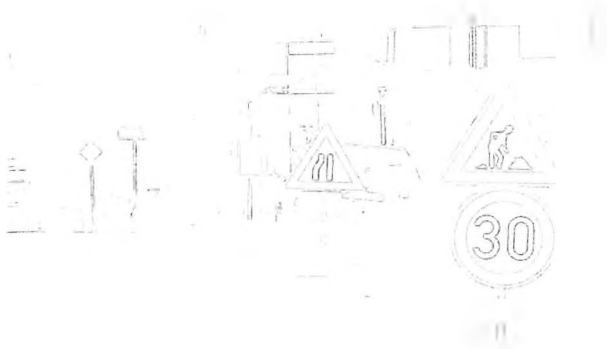


Lysá nad Labem - II/272, oprava povrchu komunikace
**PRODLOUŽENÍ**

# NÁVRH
# dopravně inženýrského opatření (DIO)

SEDOZ
DOPRAVNÍ ZNAČENÍ

**Při umístění dopravního značení musí být dodrženy podmínky dané v TP66 - OZNAČENÍ PRACOVNÍCH MÍST NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH III.VYDÁNÍ, zák.č.361/2000 Sb. v platném znění a zák.č. 13/1997 Sb. v platném znění.**

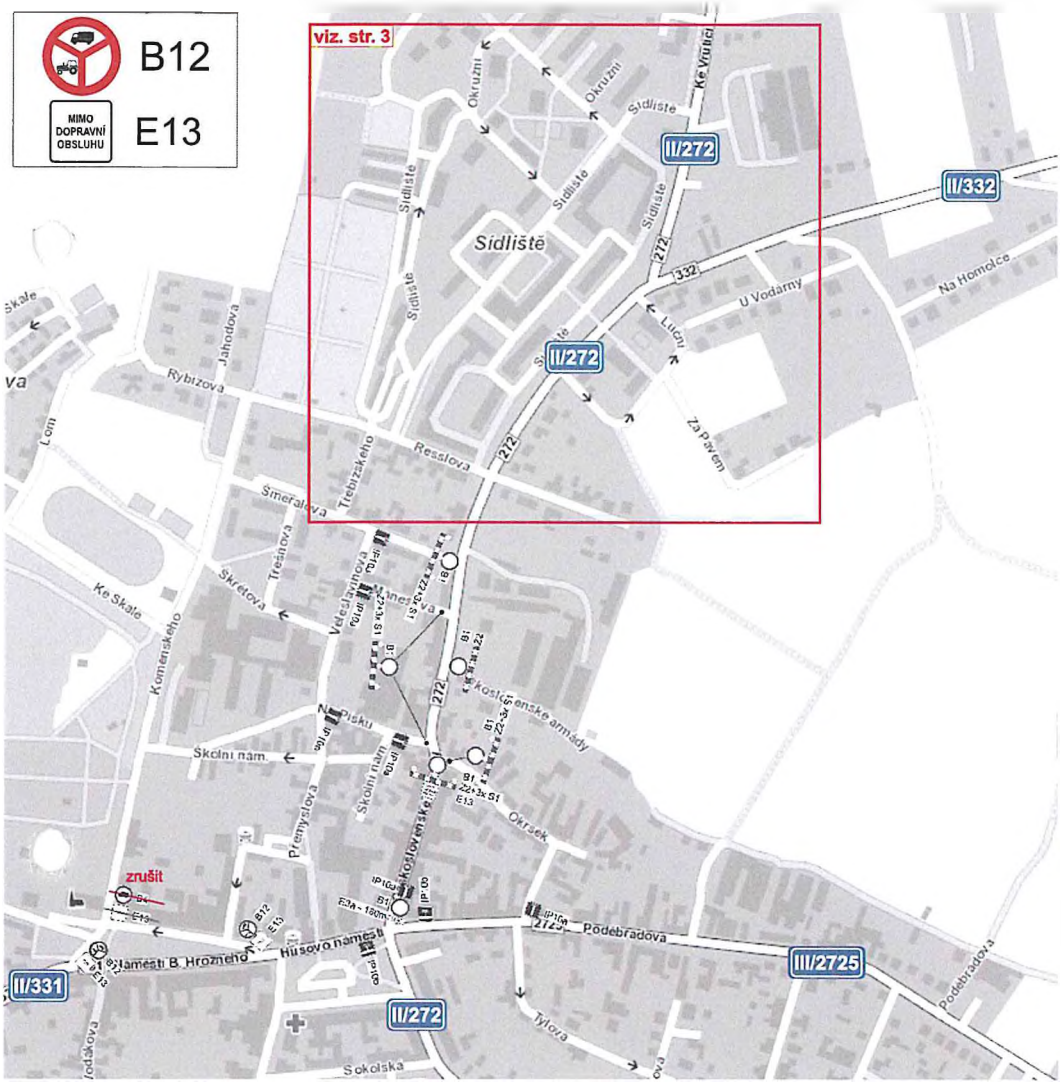


Při umístění dopravního značení musí být dodrženy podmínky dané v TP66 - OZNAČENÍ PRACOVNÍCH MÍST NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH III.VYDÁNÍ, zák.č.361/2000 Sb. v platném znění a zák.č. 13/1997 Sb. v platném znění.

| | |
|---|---|
| METROSTAV INFRASTRUCTURE a.s. | SEDOZ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ |
| Lysá n/L., II/272 - oprava povrchu komunikace PRODLOUŽENÍ | |
| Návrh DIO | |

Při umístění dopravního značení musí být dodrženy podmínky dané v TP66 - OZNAČENÍ PRACOVNÍCH MÍST NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH III.VYDÁNÍ, zák.č.361/2000 Sb. v platném znění a zák.č. 13/1997 Sb. v platném znění.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Zodpovědný inženýr: Tomáš Šrůtek | Vypracoval: Tomáš Vyčítal | Kreslil: Tomáš Vyčítal | SEDOZ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ |
| Objednatel: METROSTAV INFRASTRUCTURE a.s. | | | |
| Akce: Lysá n/L, II/272 - oprava povrchu komunikace PRODLOUŽENÍ | | | Formát: A3<br>Měřítko:<br>Datum: 07/21<br>List: 6/6 |
| Obsah: Návrh DIO | | | Číslo výkresu:<br>Revize: |

Okružní
Okružní
Okružní
Okružní
Okružní
Ke Vrutici
Sídliště
Sídliště
Sídliště

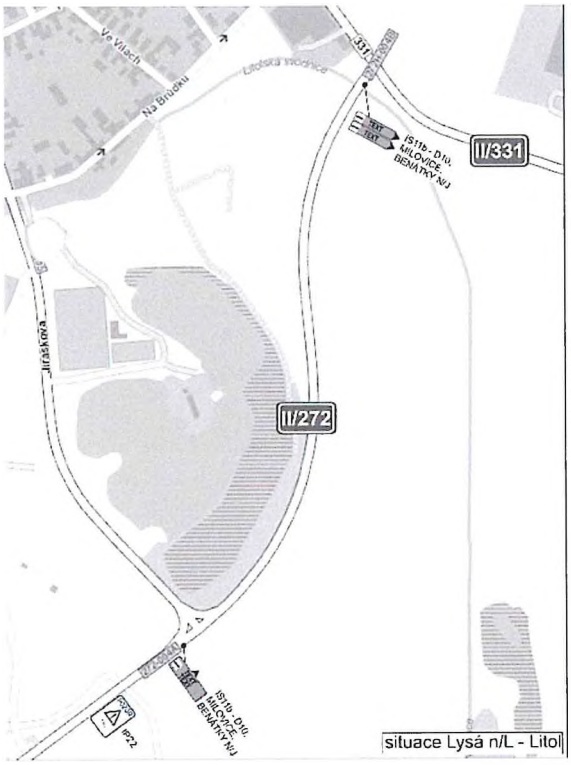


situace Lysá n/L - Litol

situace Ben. Vrutice

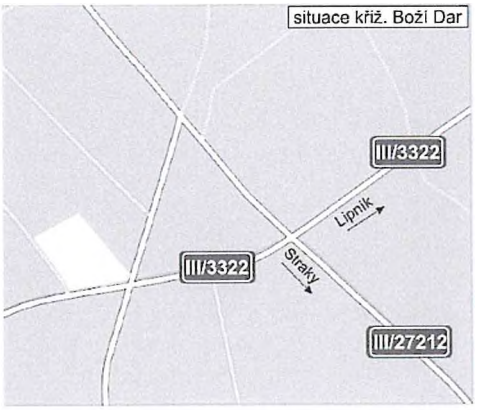


situace kříž. Boží Dar

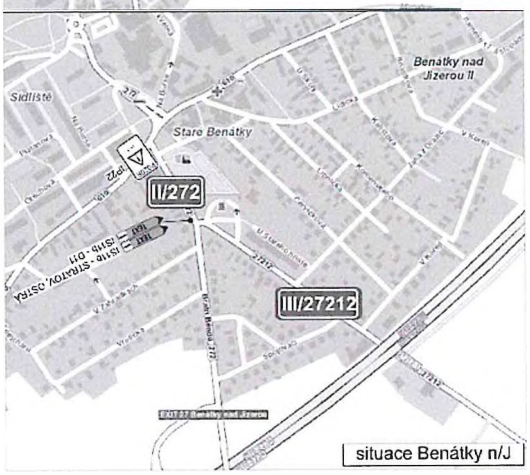


situace Benátky n/J

Při umístění dopravního značení musí být dodrženy podmínky dané v TP66 - OZNAČENÍ PRACOVNÍCH MÍST NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH III.VYDÁNÍ, zák.č.361/2000 Sb. v platném znění a zák.č. 13/1997 Sb. v platném znění.

Stávající dopravní značení, které bude v kolizi s DZ přechodným nutno zakrýt!

IP22 - SIL. II/272
V LYSÉ N/L
UZAVŘENA

SEDOZ
DOPRAVNÍ ZNAČENÍ

METROSTAV INFRASTRUCTURE a.s.

Lysá n/L. II/272 - oprava povrchu komunikace
PRODLOUŽENÍ

Návrh DIO

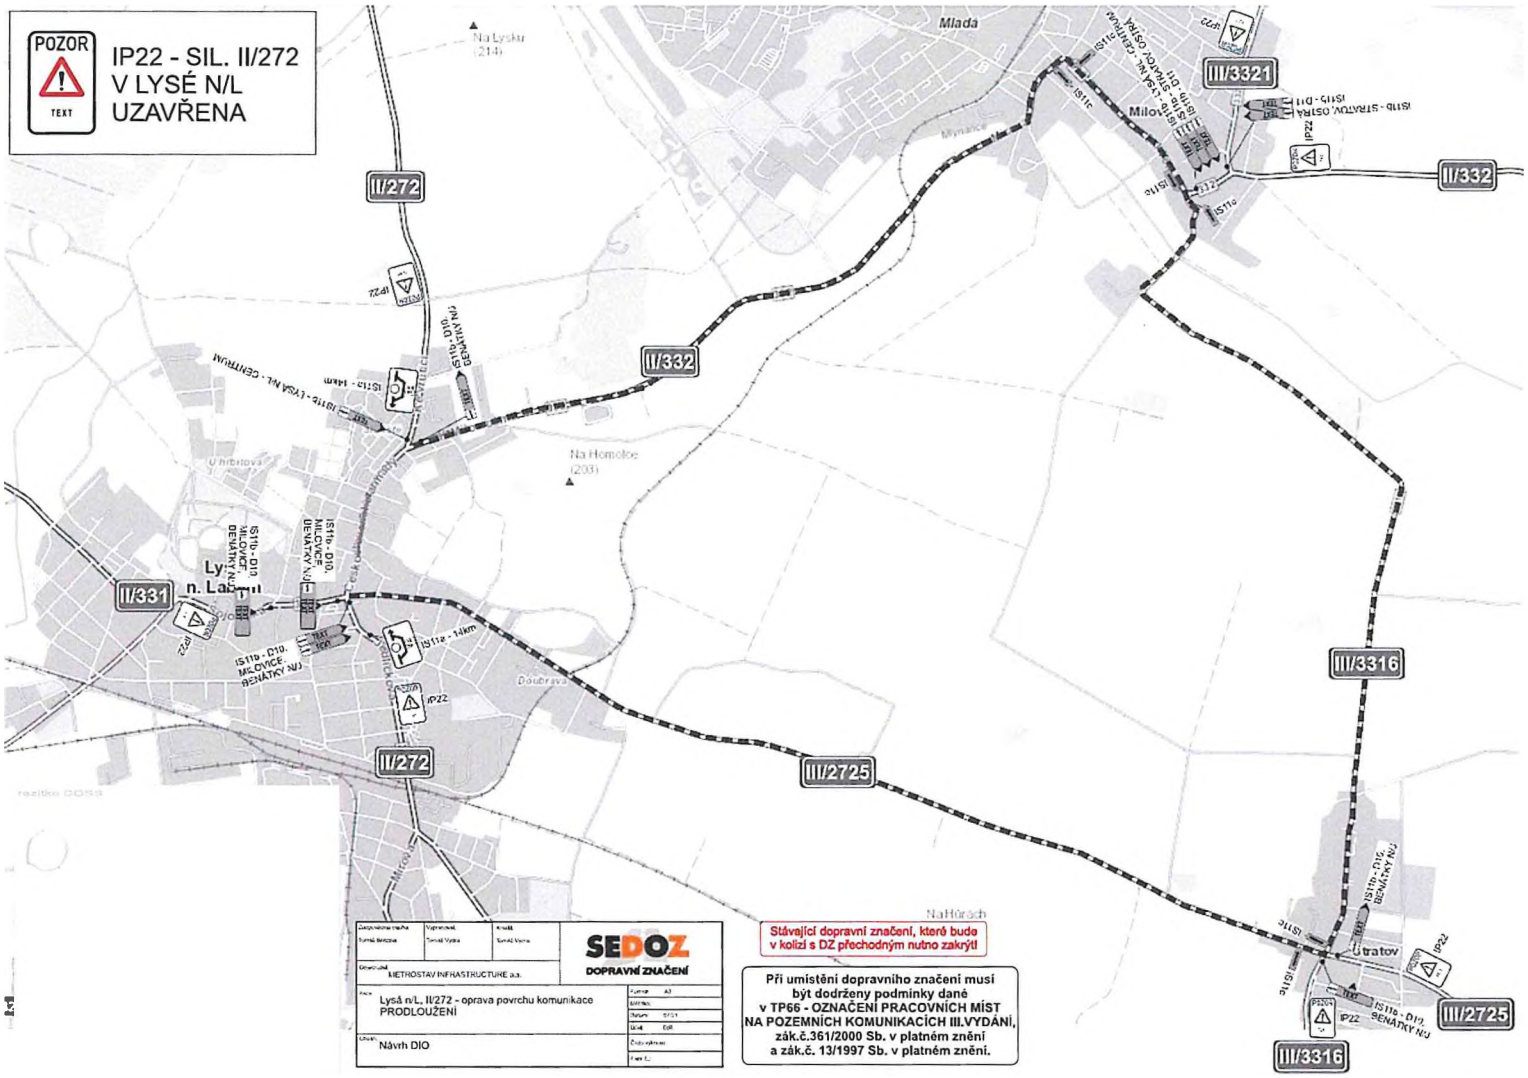
POZOR
TEXT
IP22 - SIL. II/272
V LYSÉ N/L
UZAVŘENA
II/272
II/332
II/331
III/3321
III/3316
III/2725
Mladá
Milovice
Na Lysku
(214)
Na Homolce
(203)
Lysá n. Labem
Úvratov
IP22
IS11a - 1km
IS11b - D10, MILOVICE, BENÁTKY NAD JIZEROU
IS11b - D10, BENÁTKY NAD JIZEROU
IS11b - STRATOV, OSTRÁ
IS11c
IS11e
IS12a - 1km
IS12b - LYSÁ NAD LABEM, CENTRUM
IS12b - LYSÁ NAD LABEM - CENTRUM
IS12b - STRATOV, OSTRÁ
METROSTAV INFRASTRUCTURE a.s.
SEDOZ
DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
Lysá n/L, II/272 - oprava povrchu komunikace
PRODLOUŽENÍ
Návrh DIO
Stávající dopravní značení, které bude v kolizi s DZ přechodným nutno zakrýt!
Při umístění dopravního značení musí být dodrženy podmínky dané v TP66 - OZNAČENÍ PRACOVNÍCH MÍST NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH III.VYDÁNÍ, zák.č.361/2000 Sb. v platném znění a zák.č. 13/1997 Sb. v platném znění.

Při umístění dopravního značení musí
být dodrženy podmínky dané
v TP66 - OZNAČENÍ PRACOVNÍCH MÍST
NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH III.VYDÁNÍ,
zák.č.361/2000 Sb. v platném znění
a zák.č. 13/1997 Sb. v platném znění.

Stávající dopravní značení, které bude
v kolizi s DZ přechodným nutno zakrýt!

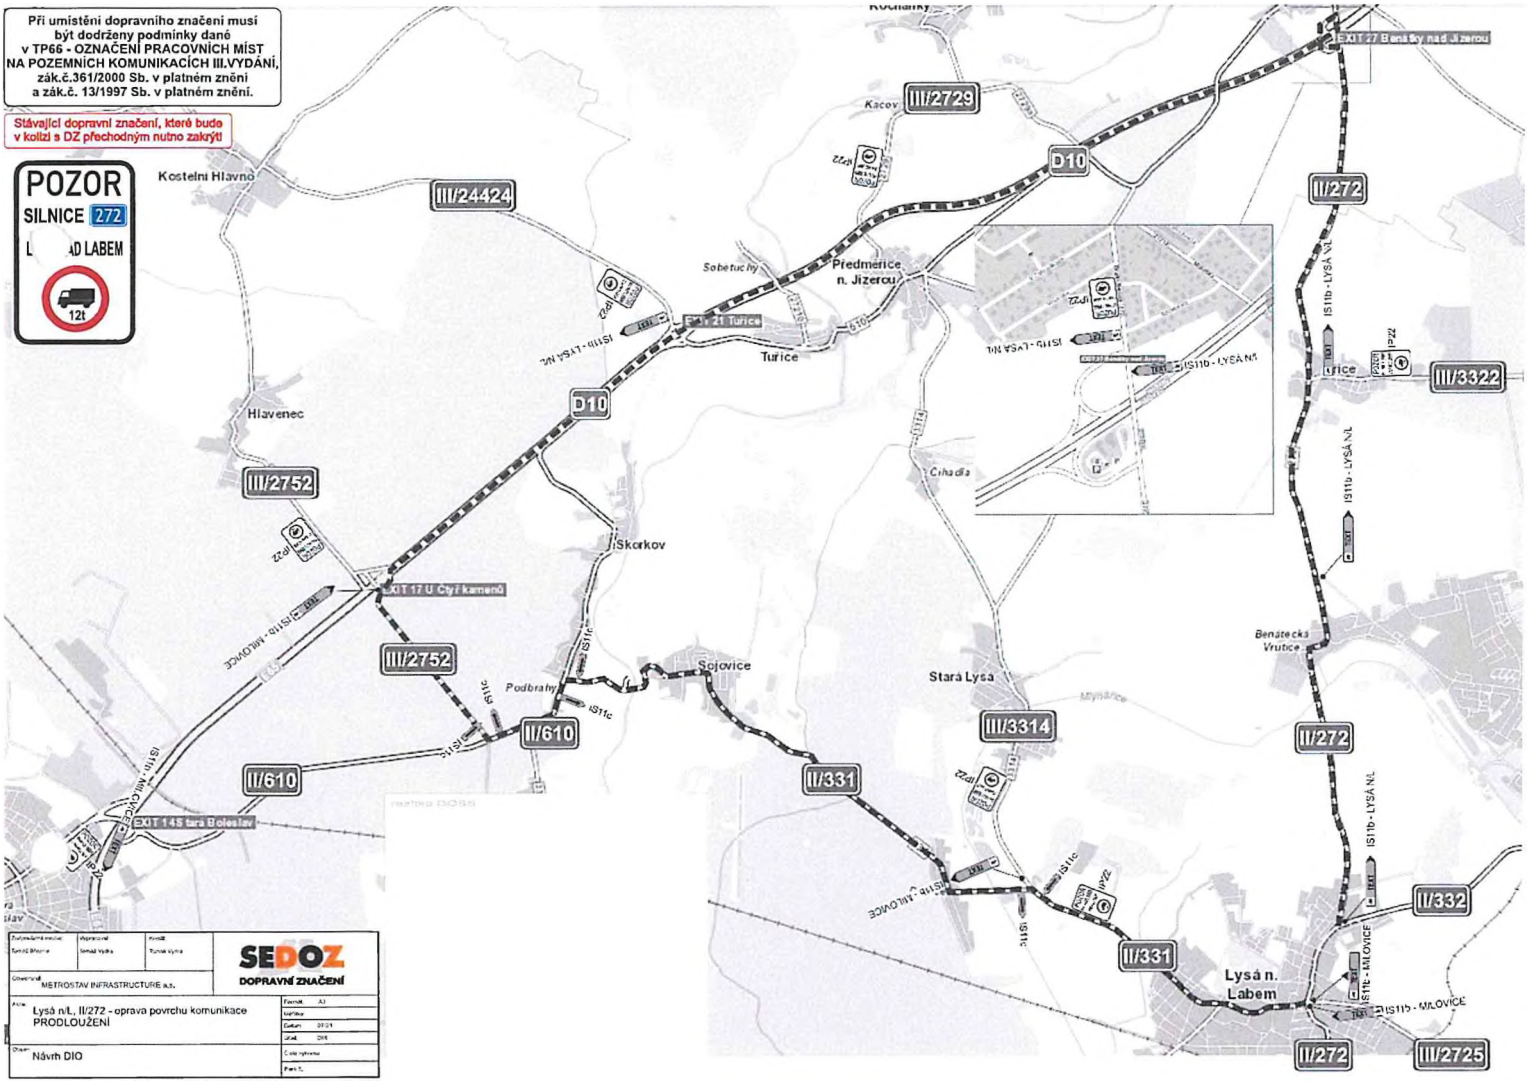


| | | |
|---|---|---|
| Zodpovědná inženýr: Tomáš Šťastný | Vypracoval: Tomáš Vydra | Kreslil: Tomáš Vydra |
| Objednatel: METROSTAV INFRASTRUCTURE a.s. | | SEDOZ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ |
| Akce: Lysá n/L, II/272 - oprava povrchu komunikace PRODLOUŽENÍ | | Formát: A3 |
| Obsah: Návrh DIO | | Měřítko: Datum: 07.21 Úřad: DIR |
| | | Číslo výkresu: Počet l.: |

**Při umístění dopravního značení musí být dodrženy podmínky dané v TP66 - OZNAČENÍ PRACOVNÍCH MÍST NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH III.VYDÁNÍ, zák.č.361/2000 Sb. v platném znění a zák.č. 13/1997 Sb. v platném znění.**

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | SEDOZ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ |
| Zpracovatel: METROSTAV INFRASTRUCTURE a.s. | | | |
| Lysá n/L. II/272 - oprava povrchu komunikace PRODLOUŽENÍ | | | Formát: A3 |
| | | | Měřítko: |
| | | | Datum: 07/21 |
| | | | List: 03 |
| Návrh DIO | | | Číslo projektu: |
| | | | Počet: |

Při umístění dopravního značení musí
být dodrženy podmínky dané
v TP66 - OZNAČENÍ PRACOVNÍCH MÍST
NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH III.VYDÁNÍ,
zák.č.361/2000 Sb. v platném znění
a zák.č. 13/1997 Sb. v platném znění.

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | SEDOZ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ |
| | METROSTAV INFRASTRUCTURE a.s. | | |
| Lysá n/L. II/272 - oprava povrchu komunikace PRODLOUŽENÍ | | | |
| Návrh DIO | | | |

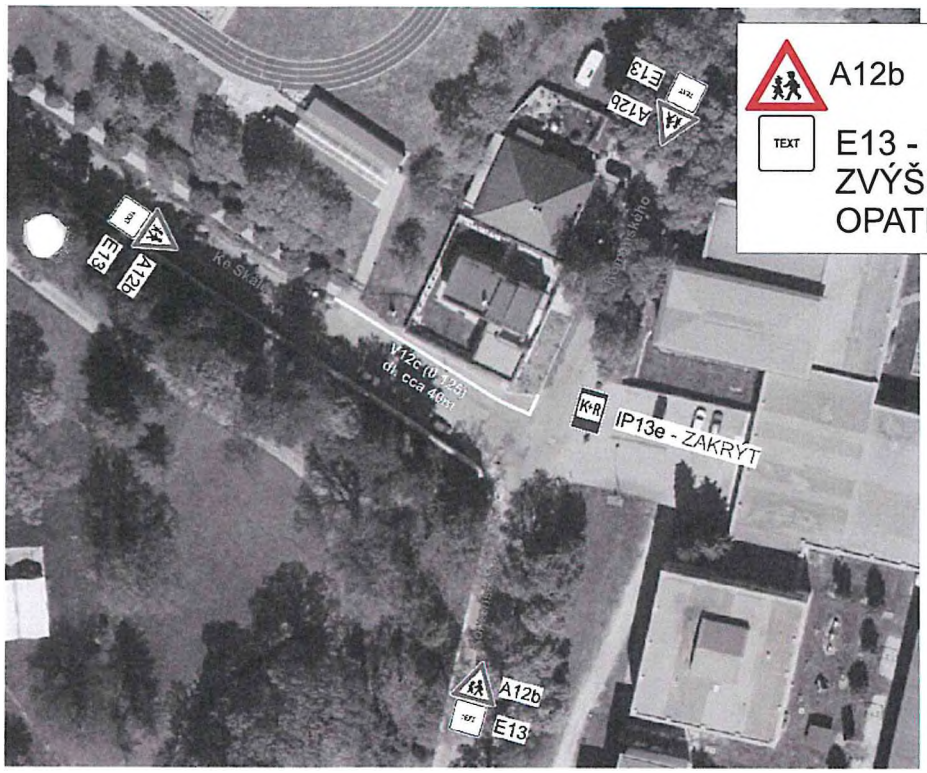


A12b

TEXT

E13 - DBEJTE ZVÝŠENÉ OPATRNOSTI

**Při umístění dopravního značení musí být dodrženy podmínky dané v TP66 - OZNAČENÍ PRACOVNÍCH MÍST NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH III.VYDÁNÍ, zák.č.361/2000 Sb. v platném znění a zák.č. 13/1997 Sb. v platném znění.**

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | SEDOZ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ |
| Objednatel: METROSTAV INFRASTRUCTURE a.s. | | | |
| Lysá n/L. II/272 - oprava povrchu komunikace PRODLOUŽENÍ | | | |
| Návrh DIO | | | |

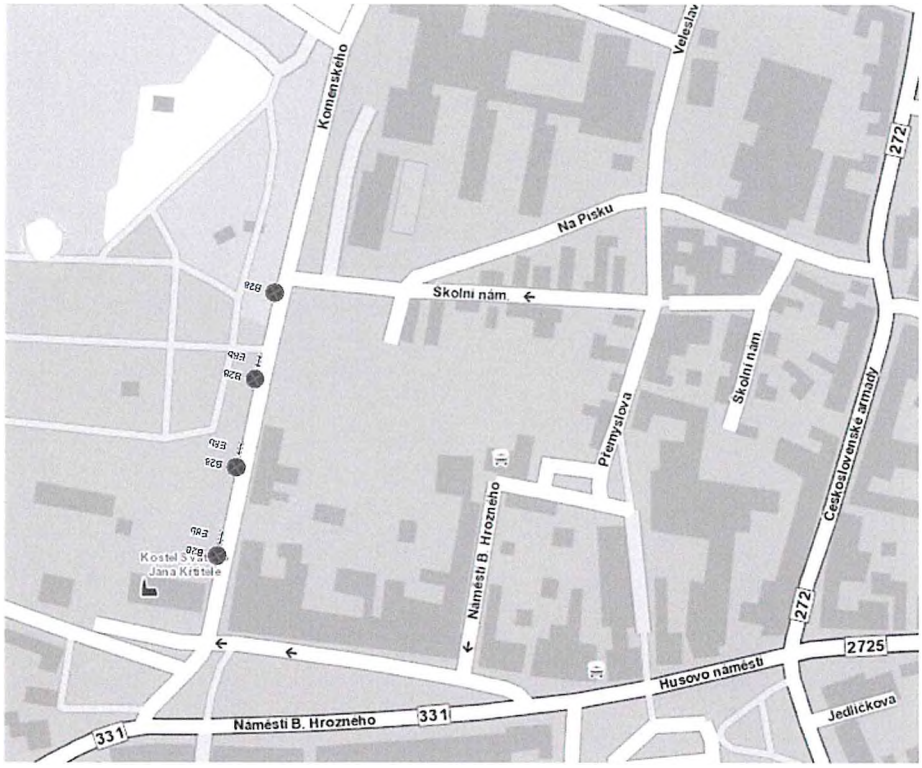


**Při umístění dopravního značení musí být dodrženy podmínky dané v TP66 - OZNAČENÍ PRACOVNÍCH MÍST NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH III.VYDÁNÍ, zák.č.361/2000 Sb. v platném znění a zák.č. 13/1997 Sb. v platném znění.**

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | SEDOZ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ |
| | | | METROSTAV INFRASTRUCTURE a.s. |
| Lysá n/L, II/272 - oprava povrchu komunikace PRODLOUŽENÍ | | | |
| Návrh DIO | | | |

EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR

# Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo uzavřené ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále též **„občanský zákoník“**) mezi:

**Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace**

se sídlem: Zborovská 81/11, Praha 5, Smíchov PSČ: 150 00
IČO: 00066001
DIČ: CZ00066001
zastoupená: Ing. Janem Lichtnegerem, ředitelem
č. smlouvy: S-2057/00066001/2020

**Město Lysá nad Labem**

se sídlem: Husovo náměstí 23, 289 22 Lysá nad Labem
IČO: 00239402
DIČ: 00239402
zastoupené Ing. Karlem Otavou, starostou města
č. smlouvy: 2020-0355/OMI
dále jen **„Objednatel“** na straně jedné

a

**Metrostav Infrastructure a.s.**

se sídlem: Koželužská 2246/5, Libeň, 180 00 Praha 8
IČO: 242 04 005
DIČ: CZ24204005
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 17819
zastoupená Ing. Zdeňkem Ludvíkem, předsedou představenstva a Ing. Markem Steinerem, místopředsedou představenstva
č. smlouvy: D4/45/2020
dále jen **„Zhotovitel“** na straně jedné

(Objednatel a Zhotovitel společně dále jen **„smluvní strany“**)

**Preambule:**

Smluvní strany tímto prohlašují, že dne 29. 7. 2020 uzavřely smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení stavebních prací na veřejné zakázce s názvem: **„II/272 Lysá nad Labem, průtah - stavba“**, a následně též Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo (dále společně jen „**Smlouva o dílo**“). Na základě dohody smluvních stran a ve vazbě na čl. 15. odst. 15.13 Smlouvy o dílo, uzavírají smluvní strany tento dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo (dále jen „**Dodatek č. 2**“).

## I. Předmět Dodatku č. 2

1. S ohledem na vznik objektivně nepředvídaných okolností v průběhu realizace prací na díle, které nemohl zhotovitel před zahájením prací předpokládat (kolize stávajícího STL plynovodu s nově budovanou hlavní stokou kanalizace), upravuje se po dohodě smluvních stran tímto termín dokončení díla v čl. 4 odst. 4.1. Smlouvy o dílo takto:

*„4.1 Zhotovitel je povinen zahájit stavební práce do 10 dnů od převzetí Staveniště a Dílo dokončit a předat Objednateli do* ***8 měsíců a 194 dnů*** *od předání Staveniště Zhotoviteli (tj. do 30. 11. 2021).“*

## II. Závěrečná ustanovení

1. Smlouva bude uveřejněna dle § 219 zákona o ZVZ na profilu Objednatele, včetně všech jejích změn a dodatků.
2. Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv, které provede Objednatel. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Objednatel tento Dodatek č. 2 uveřejní v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
3. Tento Dodatek č. 2 je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy o dílo. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo, která nejsou tímto Dodatkem č. 2 výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti.
4. Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž každá ze smluvních stran obdrží její elektronický originál.
5. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tento Dodatek č. 2 uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah tohoto Dodatku č. 2 za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku č. 2 rozhodující.

6. Podpis tohoto Dodatku č. 2 schválila RM Lysá nad Labem dne 26. 10. 2021 usnesením č. 576.

V Praze dne:
Dodavatel:

**Metrostav Infrastracture a.s.**

.....
Ing. Zdeněk Ludvík
Předseda představenstva

Ing. Marek Steiner
Místopředseda představenstva

V Praze dne:
Objednatel:

**Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p.o.**

.....
Ing. Jan Lichtneger, MPA
Ředitel organizace

V Lysé nad Labem dne:
Objednatel:

Město Lysá nad Labem

.....
Ing. Karel Otava
Starosta města

# Městský úřad Lysá nad Labem

*Odbor dopravy*

Husovo náměstí 23, 289 22 Lysá nad Labem


Č.j.: MULNL-OD/82356/2021/Uh/229

Vyřizuje: Kateřina Uhrová
Telefon:
E-mail:
Datum: 04.10.2021

## VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
## opatření obecné povahy

Městský úřad Lysá nad Labem obce s rozšířenou působností, odbor dopravy, správní orgán oprávněný ke stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích dle ustanovení § 77 odst. 1 písm. c) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen: „zákon o silničním provozu"), na základě ustanovení § 171 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění (dále jen: „správní řád")

**v y d á v á  o p a t ř e n í  o b e c n é  povahy**

spočívající

**ve stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci, silnice č. II/272, II/332 a MK ul. Resslova a Luční v obci Lysá nad Labem, z důvodu zajištění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu.**

Správní orgán, jako příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností po předchozím písemném vyjádření Policie ČR, Krajského ředitelství policie Středočeského kraje, dopravního inspektorátu Nymburk, vydaném pod č. j. KRPS-217300-1/ČJ-2021-010806-OD dne 30.09.2021,

**s t a n o v í**

ve smyslu ustanovení § 77 odst. 1 písm. c) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů v platném znění a vyhlášky č. 294/2015 Sb., přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích – k označení provedení omezení provozu na pozemní komunikaci, silnice č. II/272, II/332 a MK ul. Resslova a Luční v obci Lysá nad Labem.

**Žadatel: Metrostav Infrastructure, a. s., IČ 00014915, se sídlem Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8**

**Zástupce: SEDOZ DZ, s. r. o., IČ 242318537, se sídlem Primátorská 296/38, 180 00 Praha 8**

K označení použijte dopravní značky dle ověřeného a schváleného DIO (dopravně inženýrské opatření), které je součástí a přílohou tohoto opatření obecné povahy.

**Dopravní značení a zařízení proveďte jako:** dopravní zařízení a přenosné svislé dopravní značky

**Velikost dopravního značení:** základní rozměrová řada

**Provedení dopravního značení a zařízení:** retroreflexní

**Důvod:** předběžné užívání stavby

**Platnost úpravy:** od 06.10.2021 do 30.11.2021

**Odpovědná osoba za řádné provedení úpravy:** Ing. Ondřej Vítek, tel.: 702 012 844

**Další podmínky pro provedení přechodné úpravy provozu:**

1) Dopravní značení, případně dopravní zařízení, proveďte dle přiloženého situačního plánku, pokud je tento nedílnou součástí tohoto stanovení, nebo podle odkazu či slovního popisu uvedeného v tomto stanovení.
2) Přechodné dopravní značky musí být umístěny v souladu s TP 66 – Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích. Dopravní značení a zařízení musí odpovídat vyhlášce č. 294/2015 Sb., a ČSN EN 12899-1.
3) Žadatel je povinen zajišťovat průběžnou kontrolu a údržbu dopravního značení a zařízení tak, aby bylo v řádné stavu.
4) Dopravní značení bude zajištěno proti posunutí, otočení nebo pádu vlivem provozu popřípadě povětrnostních podmínek a instalováno bezprostředně před skutečným zahájením prací.
5) Přechodná úprava bude instalována po dobu nezbytně nutnou pro stanovený účel, po skončení akce bude tato bez prodlení odstraněna.
6) Místní úprava provozu na dotčených pozemních komunikacích (trvalé dopravní značení), které je v rozporu s přechodnou úpravou provozu na pozemních komunikacích, bude zneplatněna (překryta či přeškrtnuta) a po ukončení akce uvedena do původního stavu.
7) Městský úřad Lysá nad Labem, odbor dopravy si vyhrazuje právo stanovení přechodné úpravy dopravního značení změnit nebo doplnit, jestliže to bude vyžadovat změna provozu nebo veřejný zájem. Policie ČR má právo kontroly a předložení dalších podmínek, zajišťujících bezpečnost a plynulost silničního provozu.
8) V době, kdy nebudou probíhat práce, bude omezení v maximální možné míře minimalizováno (nesmí však dojít k ohrožení bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích).
9) Bude zajištěn přístup k sousedním nemovitostem.
10) Po dobu předčasného užívání bude plotovými zábranami vymezen prostor staveniště. Na komunikaci bude osazeno přechodné dopravní značení dle návrhu.

Upozornění: Toto opatření obecné povahy nenahrazuje povolení, stanovisko, posouzení, případně jiné opatření dotčeného správního úřadu vyžadované zvláštními předpisy. Tímto stanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vyplývající z případných smluvních vztahů mezi žadatelem a právnickou osobou zajišťující vlastní realizaci dopravního značení.

**Odůvodnění:**

Městský úřad Lysá nad Labem, odbor dopravy, zpracoval podklady k žádosti žadatele a na základě souhlasných vyjádření příslušných dotčených orgánů věc posoudil a rozhodl o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, kdy v podmínkách pro její platnost stanoví zejména dodržení souladu provedení dopravního značení dle přiloženého dopravně inženýrského opatření (DIO).

**Poučení:**

Proti opatření obecné povahy nelze dle ustanovení § 173 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů podat opravný prostředek. Opatření obecné povahy nabývá účinnosti pátým dnem po vyvěšení.

v. r.
Kateřina Uhrová

vedoucí odboru dopravy
*(otisk úředního razítka)*

Tato veřejná vyhláška musí být vyvěšena nejméně po dobu 15-ti dnů na úřední desce MěÚ Lysá nad Labem. Současně se zveřejní též způsobem umožňující dálkový přístup. Vývěsní lhůta začíná den následující po dni vyvěšení, sejmutí vyhlášky je možné následující pracovní den po posledním dni vývěsní lhůty. Poslední den této lhůty je dnem doručení.

Vyvěšeno dne: .....  Sejmuto dne: .....

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

Obdrží:
Veřejnou vyhláškou (ve smyslu § 172 správního řádu) – se žádostí o vyvěšení na úřední desce obce:

- MěÚ Lysá nad Labem – k vyvěšení na úřední desce

Po nabytí účinnosti OOP obdrží:
- SEDOZ DZ, s. r. o.
- Město Lysá nad Labem
- Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, územní odbor Nymburk, Boleslavská 1831, 288 02 Nymburk

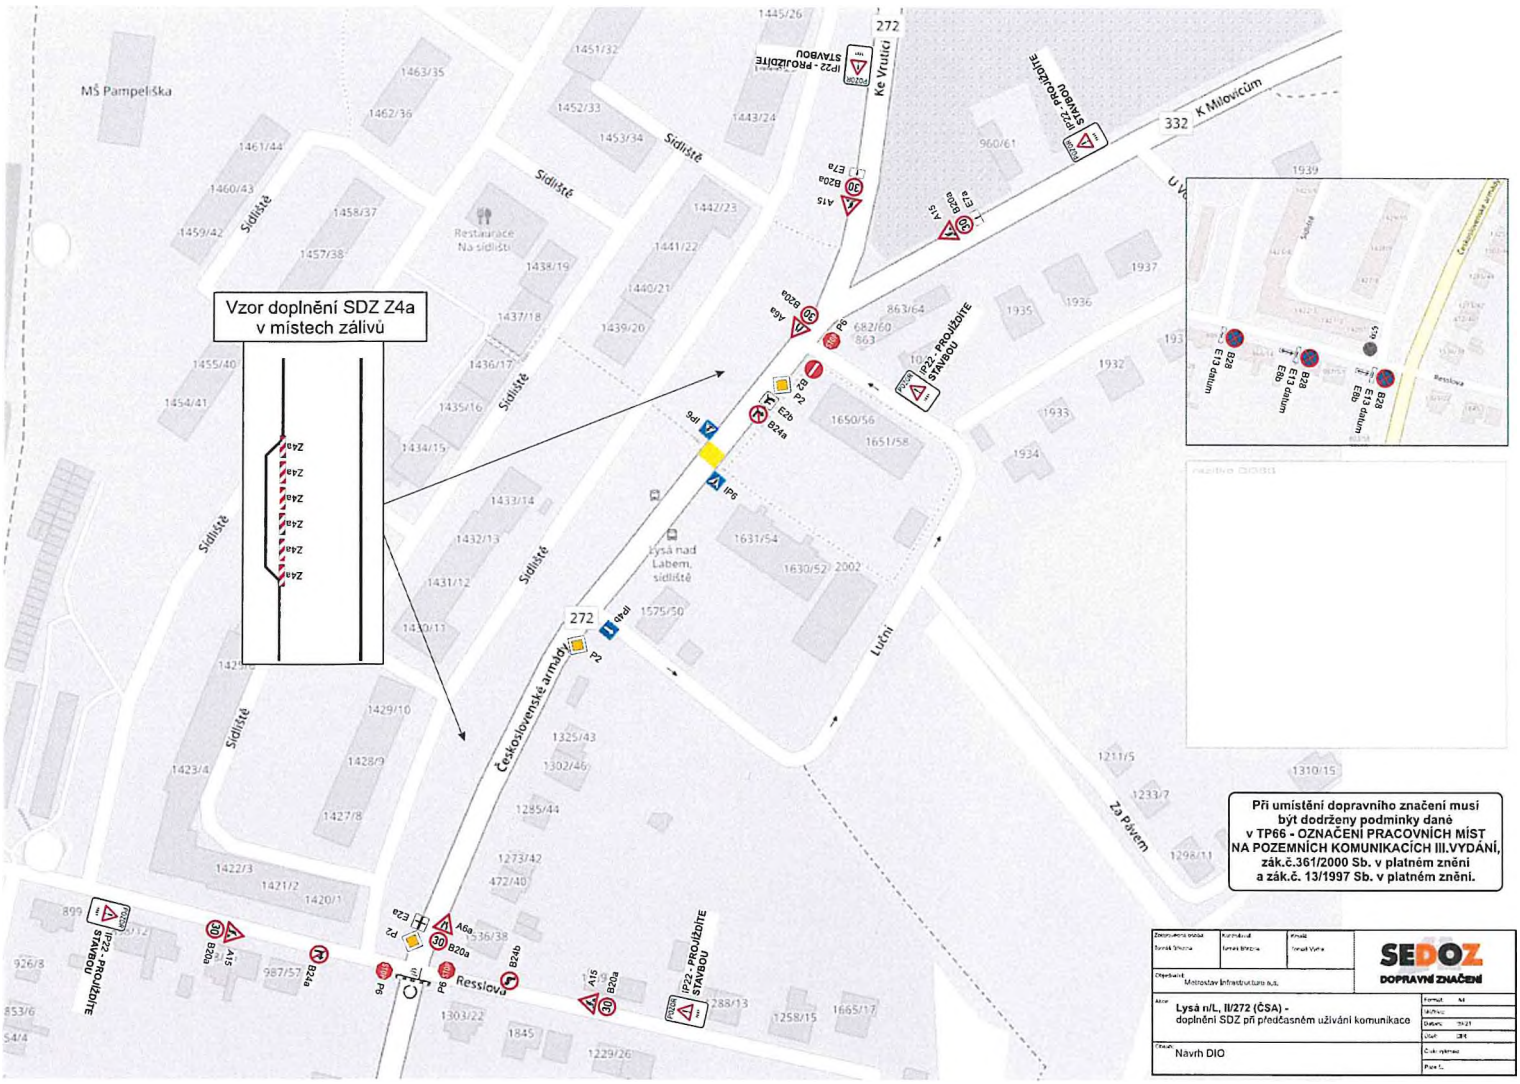


**Při umístění dopravního značení musí být dodrženy podmínky dané v TP66 - OZNAČENÍ PRACOVNÍCH MÍST NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH III.VYDÁNÍ, zák.č.361/2000 Sb. v platném znění a zák.č. 13/1997 Sb. v platném znění.**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Zpracovatelská skupina: Tomáš Šťastná | Kontrolující: Tomáš Březina | Kreslil: Tomáš Vyhlídka | SEDOZ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ |
| Objednatel: Metrostav Infrastructure a.s. | | | |
| Akce: Lysá n/L, II/272 (ČSA) - doplnění SDZ při předčasném užívání komunikace | | | Formát: A3 |
| Obsah: Návrh DIO | | | Měřítko: Datum: 10.21 Číslo: 284 |
| | | | Číslo výkresu: Počet l.: |

PONTEX S.R.O., BEZOVÁ 1658, 147 14 PRAHA 4

**Středočeský kraj**

v zastoupení

**Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje, p. o.**
**Ing. Jan Lichtneger**
Zborovská 11
Praha, 150 00

Čj : PX 2021
V Praze : 14. 12. 2021
Vyřizuje: Martin Teslevič

tel.:
e-m

**Akce:** **II/272 Lysá nad Labem, průtah**
**Věc:** **Vyjádření AD č. 30**

Vážený pane řediteli,

dne 7. 12. 2021 AD obdržel od zhotovitele elektronicky koncept ZBV č. 16, které řeší vliv prodloužení doby výstavby v rámci předcházejících ZBV na soupis prací DIO.

V rámci předcházejících ZBV došlo k prodloužení doby výstavby, která má vliv na denní nájmy přechodného dopravního značení, což je předmětem tohoto ZBV.

AD s návrhem ZBV č. 16 souhlasí.

S pozdravem za Pontex spol. s r.o.

Ing. Pavel Hrdina

PUDIS

**PUDIS a.s.**
Podbabská 1014/20
160 00, Praha 6

**Středočeský kraj**

v zastoupení

**Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje, p. o.**
Zborovská 11
150 00, Praha

V Lysé nad Labem, 14.12.2021

Vyřizuje: Ing. Jindra Flanderková, TDI
Tel:

## Stavba: II/272 Lysá nad Labem, průtah – stavba

### Vyjádření TDI k ZBV 016

Vážení,

na základě požadavku na výměnu šachty SŠ0 (ZBV 004) a vzhledem k nutnosti změně technoligie pažení v úseku kanalizace SŠ0 – SŠ4 (ZBV 003) a kvůli vynuceným zimním technologickým přestávkám došlo k prodloužení termínu pro dokončení stavby o 164 dnů. Na základě oznámených nepředvídatelných fyzických podmínkách na staveništi došlo k prodloužení terminu pro dokončení díla o 30 dnů, tj. na 8 měsíců a 194 dnů.
Zhotovitel tyto skutečnosti oznámil objednateli a předložil návrh ZBV 016.
Uvedené množství u položek SO 921 č. 6 – 11, 16 a 19 odpovídá skutečnosti.
K tomuto návrhu nemám za TDI připomínky.

S pozdravem

Ing. Jindra Flanderková

*Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, IČ 00066001,*
*150 21 PRAHA 5, Zborovská 11*

V Říčanech dne 1. 6. 2021

Metrostav Infrastructure a.s.
Koželužská 2246/5
180 00 Praha 8

**Věc: Oznámení zhotoviteli o změně**

Zhotoviteli stavby „II/272 Lysá nad Labem, průtah" firmě Metrostav Infrastructure a.s., Koželužská 2246/5, 180 00 Praha 8 se dává na vědomí změna osoby ve věcech technických dle článku 15 odst. 15.6 uzavřené Smlouvy o dílo takto:

Původní oprávněná osoba ve věcech technických: Vojtěch Melichar,

Nově oprávněná osoba ve věcech technických: Ing. Milan Peška,

Ing. Jan Lichtneger

ředitel
Krajské správy a údržby silnic
Středočeského kraje,
příspěvkové organizace



*IČ: 00066001*
*DIČ: CZ00066001*
*e-mail*
*telefon*

Metrostav
Infrastructure a.s.

# PLNÁ MOC

Společnost **Metrostav Infrastructure a.s.**, se sídlem Koželužská 2246/5, Libeň, 180 00 Praha 8, identifikační číslo 24204005, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 17819 (dále jen "zmocnitel"), kterou zastupuje představenstvo společnosti jednající Ing. Radimem Čápem, Ph.D., předsedou představenstva, a Ing. Zdeňkem Ludvíkem, místopředsedou představenstva, tímto zmocňuje:

## Ing. Richarda Rakouše

zaměstnance zmocnitele v pozici oblastního ředitele, datum narození 13. 4. 1972, bydliště Beřkovická 310/3, 181 00 Praha 8 (dále jen „zmocněnec")

k jednání za zmocnitele, jako zhotovitele stavby, při administraci změn závazků pro stavbu „II/272 Lysá nad Labem, průtah – stavba". Zmocněnec je takto za zmocnitele oprávněn projednávat změny, podepisovat dokumentaci změny a provádět další úkony a jednání s tím přímo související ve vztahu k objednateli stavby.

V Praze dne 2. 9. 2020

Ing. Radim Čáp, Ph.D.
předseda představenstva
Metrostav Infrastructure a.s.

místo
Me
k
enstva
e a.s.

V Praze dne 2. 9. 2020 zmocnění přijímám:

Ing. Richard Rakouš
oblastní ředitel
Metrostav Infrastructure a.s.
