Harmonogram "Oprava výhybek žst. Moravské Budějovice - I. etapa"

Popis prací	počet pracovních dnů
Záhl. a zhl. směr Třebelovice (Jemnice)	
Zařízení staveniště, vytyčení inženýrských sítí	
Demontáž části nástupiště u koleje č.5	0,5
Demontáž přechodových konstrukcí, kolejového roštu a výhybek	1,5
Odtěžení kolejového lože	3
Montáž srdcovkových částí výhybek na základně	3
Recyklace a předrcení vytěženého kolejového lože	5
Odtěžení pražcového podloží	2
Zřízení odvodnění železničního spodku trativody	2
Urovnání a zhutnění pláně tělesa železničního spodku	0,5
Zřízení konstrukčních vrstev pražcového podloží	3,5
Zřízení předštěrkování	3
Montáž kolejového roštu kolejí a připojů v ose, pokládka výhybek	3
Výměna dřevěných výhybkových a příčných betonových pražců	2
Montáž pražcových kotev	1
Zaštěrkování kolejí a výhybek	1
Směrová a výšková úprava koleje, doplnění kolejového lože	1
Svařování kolejnic, zřízení BK	4
Zřízení nástupiště u koleje č.5 - přesunutí demontované části nástupiště směr Jihlava	1,5
Vyrovnání nástupištní hrany u koleje č.5, úprava a doplnění povrchu ze štěrkodrti	1
Montáž panelů přejezdových k-cí	0,5
Montáž a seřízení ČZ	2,5
Zřízení drážních stezek, umístění námezníků	2,5
Záhl. a zhl. směr Grešlové Mýto (Znojmo)	
Demontáž částí nástupišť u koleje č.2 a 4	1
Demontáž přechodových konstrukcí, kolejového roštu a výhybek	1,5
Odtěžení kolejového lože	4
Montáž srdcovkových částí výhybek	3,5
Odtěžení pražcového podloží	3,5
Recyklace a předrcení vytěženého kolejového lože	5
Zřízení odvodnění železničního spodku	2,5
Urovnání a zhutnění pláně tělesa železničního spodku	1
Zřízení konstrukčních vrstev pražcového podloží	3,5
Zřízení předštěrkování	3
Montáž kolejového roštu, pokládka výhybek	4
Montáž pražcových kotev	1
Provedení zaštěrkování	2
Směrová a výšková úprava koleje, doplnění kolejového lože	2
Svařování kolejnic, zřízení BK	6
Zřízení nástupiště u koleje č.2 a 4 - přesunutí demontovaných částí nástupišť směr Jihlava	3
Vyrovnání nástupištní hrany u koleje č.1, úprava a doplnění povrchu ze štěrkodrti	2
Zpětná montáž přejezdových k-cí	1
Montáž a seřízení ČZ	3
Zřízení drážních stezek, umístění námezníků	4
Zřízení a zaměření zajišťovacích značek	3

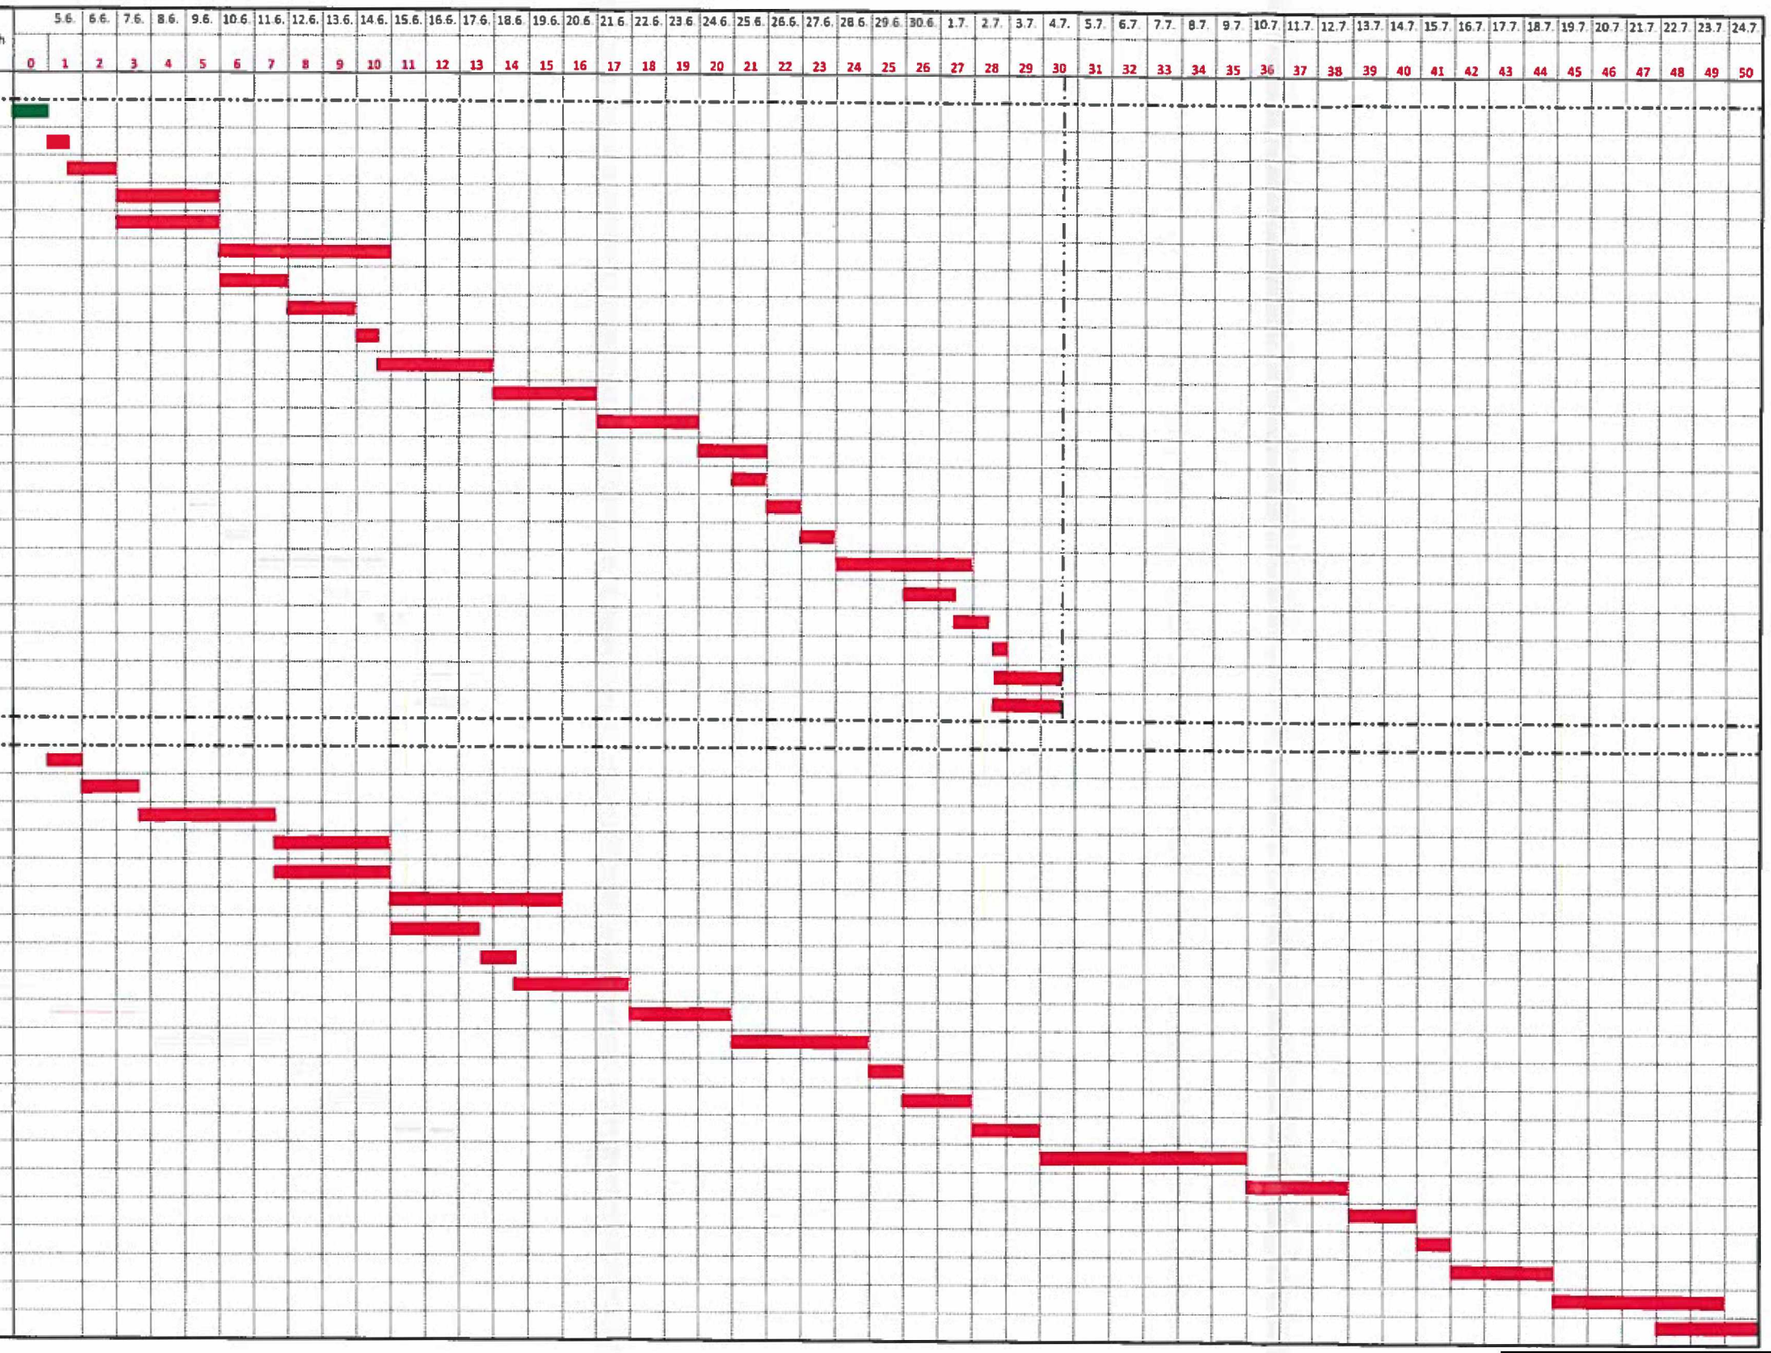

Práce prováděné ve výluce
Práce prováděné před zahájením výluky

Vy [redacted]

SEZEV - REKO, a.s.
rekonstrukce a opravy železnic
Vídeňská 298/135, 619 00 Brno-Přízřenice
IČ: 46904859 • DIČ: CZ46904859
