# Krycí list ZBV

| Název a evidenční číslo Stavby: | Číslo SO/PS / | Číslo ZBV: |
|---|---|---|
| **II/102 hr. hl. města Prahy-Štěchovice, rekonstrukce. ETAPA II** | / číslo Změny SO/PS: | |
| Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): | **103/7** | **24** |
| **Rekonstrukce vozovky - průtah Štěchovicemi** | | |

Objednatel: **Krajská správa a údržba Středočeského kraje, příspěvková organizace**
Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5, Smíchov
IČ: 00066001 DIČ: CZ00066001

Zhotovitel: **STRABAG a. s.**
Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5
IČ: 60838744 DIČ: CZ60838744

**Rekapitulace ZBV č. 24 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5**

| část ZBV č. | Cena navrhovaných Změn záporných | Cena navrhovaných Změn kladných | Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem |
|---|---|---|---|
| 24.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| část ZBV č. | Cena navrhovaných Změn záporných | Cena navrhovaných Změn kladných | Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem |
|---|---|---|---|
| 24.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| část ZBV č. | Cena navrhovaných Změn záporných | Cena navrhovaných Změn kladných | Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem |
|---|---|---|---|
| 24.3 | 0,00 | 386 957,63 | 386 957,63 |

| část ZBV č. | Cena navrhovaných Změn záporných | Cena navrhovaných Změn kladných | Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem |
|---|---|---|---|
| 24.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| část ZBV č. | Cena navrhovaných Změn záporných | Cena navrhovaných Změn kladných | Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem |
|---|---|---|---|
| 24.5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| **Suma ZBV č.** | Cena navrhovaných Změn záporných | Cena navrhovaných Změn kladných | Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem |
|---|---|---|---|
| **24** | **0,00** | **386 957,63** | **386 957,63** |

Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.
Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy
a pro Rozpis ocenění změn položek.

**Příloha č. 2**

# Změnový list

| Název a evidenční číslo Stavby: | Číslo SO/PS / | Číslo ZBV: |
|---|---|---|
| **II/102 hr. hl. města Prahy-Štěchovice, rekonstrukce. ETAPA II** | / číslo Změny SO/PS: | |
| Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): | **103/7** | **24.3** |
| **Rekonstrukce vozovky - průtah Štěchovicemi** | | |

Strany smlouvy o dílo č. S-468/00066001/2020 na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 3.3.2020 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Krajská správa a údržba Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5, Smíchov

Zhotovitel: STRABAG a. s., Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5

Přílohy Změnového listu:

| | | |
|---|---|---|
| 1. Krycí list | 1 | počet listů |
| 2. Změnový list | 1 | počet listů |
| 3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací | 1 | počet listů |
| 4. Rozpis ocenění Změn položek ZBV 7 | 2 | počet listů |
| 5. Přehled zařazení změn do skupin | 1 | počet listů |
| 6. Přehled dalších dokladů | 1 | počet listů |
| Další doklady dle přehledu dokladů | 50 | počet listů |

| Paré č. | Příjemce |
|---|---|
| 1 | Objednatel |
| 2 | Zhotovitel |
| 3 | Projektant (AD) |
| 4 | Stavební dozor |
| 5 | Supervize (Regionální dotační kancelář) |

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis a zdůvodnění Změny:

Změna řeší výškové návaznosti silnice na stávající terén a to konkrétně u domu č. p. 130,132 a 133 ve Štěchovicích, kde vzhledem k údolnicovému oblouku nivelety vozovky navazujícímu na minimální podélný spád silnice 0,5% s přihlédnutím ke stavební toleranci by hrozil vznik hůře odvodnitelných míst a rozstřik vody z vozovky na přilehlé objekty. Změna zahrnuje i doplnění dopravně bezpečnostních zrcadel a zábranu proti ostřiku na základě požadavků účastníků stavebního řízení. Než byla zhotovena definitivní zábrana proti ostřiku, byly instalovány betonové zábrany, které byly po zhotovení definitivní zábrany demontovány (pol. č. 106). Větší část této změny se promítá do SO 334 a to do ZSPD-SO 334.
Na základě výzvy stavebního úřadu (místní šetření) a vyjádření Policie ČR ohledně problematiky odvodnění vozovky, ochrany proti ostřiku a bezpečnosti silničního provozu byly u domu č. p. 130,132 a 133 ve Štěchovicích doplněny: ŠŽ, meadrén a upravena obruba, dopravně bezpečnostní zrcadla a zábrana proti ostřiku a ostatní nezbytné stavební úpravy na které je zpracována PD.

Jedná se o Změnu nepodstatnou, která je podle § 5, odst.1 písm. c), resp. podle § 10 Směrnice R-Sm-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 29. 05. 2017) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek zařazena do **Skupiny 3** jako změna z nepředvídaných důvodů. Zároveň se jedná o změnu, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky.
Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. tato Změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst. 6) se jedná o změnu, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a to z důvodu nepředvídaných fyzických podmínek vzniklých na stavbě v průběhu realizace a hodnota těchto dodatečných stavebních prací nepřekračuje 50 % původní hodnoty závazku.

Údaje v Kč bez DPH:

| Cena navrhovaných Změn záporných | Cena navrhovaných Změn kladných | Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem | Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných |
|---|---|---|---|
| **0,00** | **386 957,63** | **386 957,63** | **386 957,63** |

**Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Zhotovitel (stavbyvedoucí): STRABAG a.s. | jméno | Ing. Karel Šimek | datum | podpis |
| Projektant (autorský dozor): Pontex, spol. s.r.o. | jméno | Ing. David Dvořáček | datum | podpis |
| Stavební dozor: Pragoprojekt, a. s. | jméno | Miroslav Valenta | datum | podpis |
| Supervize (Regionální dotační kancelář) | jméno | | datum | podpis |
| Zástupce Objednatele: KSÚS SK | jméno | Ing. Milan Peška | datum | podpis |

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Objednatel** (Oprávněná osoba Objednatele) | jméno | Ing. Jan Fidler, DiS | datum | podpis |
| **Zhotovitel** | jméno | Ing. Martin Bašár<br>Ing. Karel Klofáč | datum | podpis |

Číslo paré: 1

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
Krajské ředitelství policie Středočeského kraje
Územní odbor Praha venkov - JIH
dopravní inspektorát
Masarykovo nám. 708, 251 64 Mnichovice

Č. j. KRPS-282007-1/ČJ-2020-011406

Mnichovice 27. listopadu 2020
Počet stran: 1

Pontex s.r.o.
Bezová 1658
147 14 Praha 4

**Sdělení k úpravám v rámci akce: II/102 hr. hl. m. Prahy - Štěchovice, rekonstrukce**

Dopravní inspektorát Praha venkov - JIH, jako příslušný orgán Policie české republiky posoudil Vámi zaslanou žádost ze dne 16. listopadu 2020 evidovanou pod Č.j. KRPS - 282007/ČJ-2020-011406 o vyjádření k úpravám v rámci akce: II/102 hr. hl. m Prahy - Štěchovice, rekonstrukce a sděluje následující:

Po prostudování zaslané žádosti bylo provedeno místní šetření. Na tomto bylo zjištěno, že má dojít ke snížení obrubníku v prostoru sdružených sjezdů ke garáži č.p. 132, proluka k č.p. 131 a dřevěná vrata před č.p. 130. K tomuto sdělujeme, že pakliže obruba bude snížena do úrovně nivelity komunikace, může docházet při vydatných dešťových srážkách k vtékání vody z komunikace II/102 do prostoru výše uvedených nemovitostí. Což dle našeho názoru není žádoucí.

K betonovým květináčům zajišťující ochranu přilehlé budovy proti ostřiku sdělujeme, tyto budou tvořit pevnou překážku. S ohledem na jejich umístění není zřejmé, zda bude dodržen bezpečností odstup od komunikace. Na základě místního šetření doporučujeme provést ochranu budovy proti ostřiku např. zábradlím s plastovými deskami příp. plechem. Nebo mobilní zábranou tvořenou ocelovými sloupky s nataženou fólií. Sloupky budou pevně zakotvený v betonovém úžlabí. Krajní sloupky budou označeny reflexními prvky.

Vyřizuje: por. Ing. Milan Nerad
komunikační inženýr

npor. Bc. Pavel Bouček
vedoucí DI Praha venkov - JIH

**Předmět:** Re: II/102 Praha-Štěchovice, II. etapa - ochrana proti ostřiku před čp. 130 ve Štěchovicích
**Od:** "
**Datum:** 9.3.2021 10:40
**Komu:** Dvořáček David Ing.
**Kopie:** Martin Lisa

Dobrý den,

se zábradlím souhlasíme, ovšem, jak jsem již říkal, čím blíže k vjezdu tím se při výjezdu z nemovitosti zhorší rozhledové poměry a to nejen pro majitele pozemku, ale i do jisté míry pro uživatele komunikace II/102. Toto je myšleno, tak aby bylo vidět i vyjíždějící vozidlo z pozemku. V místech, kde by nebylo možné realizovat zábradlí, je možnost zkusit nějakou vodovzdornou omítku, nebo jiné zabezpečení. Bohužel nejsem stavař toto bych asi nechal na odborné firmě.

Děkuji

S pozdravem Nerad

---

Od: Dvořáček David Ing.
Odesláno: úterý 9. března 2021 10:35
Komu: NERAD Milan
Kopie: Martin Lisa
Předmět: Fwd: II/102 Praha-Štěchovice, II. etapa - ochrana proti ostřiku před čp. 130 ve Štěchovicích

Dobrý den,

v návaznosti na telefonickou dohodu znova zasílám prosbu o vyjádření k ochraně proti ostřiku před čp. 130 ve Štěchovicích.

Prosím o Vaši reakci.

Předem děkuji.

S pozdravem

David Dvořáček

-------- Přeposlaná zpráva --------
Předmět: II/102 Praha-Štěchovice, II. etapa - ochrana proti ostřiku před čp. 130 ve Štěchovicích
Datum: Fri, 26 Feb 2021 14:16:21 +0100
Od: Dvořáček David Ing. <
Společnost: Pontex s. r. o.
Komu: |
Kopie: Martin Lisa

Dobrý den,

k akci II/102 Praha-Štěchovice, II. etapa...

V závěru loňského roku bylo kromě jiných bodů zahájeno řešení ochrany proti ostřiku u silnice II/102 před čp. 130 ve Štěchovicích. V návaznosti na dohodu z jednání s paní Peckovou a panem Kupkou bylo navrženo osadit krajnici betonovými truhlíky s květinovou výzdobou. Vzhledem ke stísněným šířkovým poměrům ostrůvku za obrubníkem a pozdějšímu nesouhlasu vlastníků čp. 130 bylo toto řešení odmítnuto.

Jako alternativa bylo rozpracováno řešení, které jste navrhl ve svém sdělení ze dne 27. 11. 2020. Tj. použití zábradlí. Viz pdf v příloze.

**STRABAG a.s.**
Odštěpný závod Praha
Kačírkova 982/4
158 00 Praha5

Vyřizuje:
Ing.Karel Šimek

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje
Ing. Milan Peška
Zborovská 11
150 21 Praha 5

Naše značka:
KSÚS_/24

**Předmět: Oznámení o nové skutečnosti**

**Název stavby: II/102 hr. hl. města Prahy-Štěchovice, rekonstrukce. ETAPA II.**

V souladu se smlouvou o dílo č. **S-468/00066001/2020** Vás informujeme o následujících nově zjištěných skutečnostech.
Na základě výzvy stavebního úřadu a vyjádření policie ČR ohledně problematiky odvodnění vozovky, ochrany proti ostřiku a bezpečnosti silničního provozu budou u domu č. p. 130,132 a 133 ve Štěchovicích doplněny: ŠŽ, meadrén a upravena obruba, osazena dopravně bezpečnostní zrcadla a zábrana proti ostřiku a ostatní nezbytné stavební úpravy na které bude zpracována PD.

Tato skutečnost má vliv na změnu soupisu prací. Žádáme tímto (zapsáno v příslušném stavebním deníku) o písemný pokyn k provedení prací nad rámec smlouvy.

S přátelským pozdravem

Ing. Karel Simek



**STRABAG a.s.**
Ústřední 423/62
102 00 Praha 10/Česká republika

Tel.
Fax

Československá obchodní banka, a.s.

Sídlo společnosti: Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 - Jinonice. Zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, sp. zn. B 7634.
IČO 60838744, DIČ CZ60838744

*Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, IČ 00066001,*
*150 21 PRAHA 5, Zborovská 11*

STRABAG a.s
Kačírkova 982/4,
158 00 Praha 5

Věc: **Souhlasné stanovisko k ZBV**

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace v návaznosti na projednání s TDS a zhotovitelem v rámci akce „II/102 hr. hl. města Prahy-Štěchovice, rekonstrukce. ETAPA II“ **souhlasí** s navrženou a projednanou změnou. Jmenovitě souhlasí se změnou související s výzvou stavebního úřadu směřující k ochraně proti postřiku a bezpečnosti silničního provozu u domů č. p. 130, 132 a 133.
Práce požadujeme provést v koordinaci v souladu s pokyny AD a TDS a v souladu s uzavřenou SOD zpracovat související ZBV.

S pozdravem

Ing. Milan Peška
vedoucí investic EU



*IČ: 00066001*
*DIČ: CZ00066001*
*e-mail:*
*telefon:*

STRABAG

List č.: 3004994

| 1.Nákladové středisko: | 2.Název akce: | 3.Datum: | 4.Den týdne: |
|---|---|---|---|
| 8431200 | II/101 HR. KL. N. PRAHY - STŘEMYSLICE, REKONSTRUKCE, II. ETAPA, SO 334 | 27.7.2020 | ČT |

| 5.Počasí: | 6.Teploty vzduchu: | začátek: | střed: | konec: |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

| 7.Pracovníci: Dělníci: 6+ THP: 1x | 8.Pracovní doba: 8⁰⁰ - 16⁰⁰ | 9.Přestávka: 11⁰⁰ - 12⁰⁰ | 10.Odpracované hodiny celkem: 70 |
|---|---|---|---|

11.Pracovníci (jména a příjmení): MARTIN FEIFALÍK, MICHAL DOMBEK, PAVEL BÍHA, LADISLAV TÓTH, PAVEL MIKULÁŠOVSKÝ, ONDŘEJ MIKULÁŠOVSKÝ, ANDREJ OROS

| 12.Mechanismy: | JCB, BAT N 313 D, JEŘÁBOVÝ KOLEČEK, MOBILNÍ ČERPADLO | 13.Doprava: | IVECO |
|---|---|---|---|

| 14.Provedené práce: | materiál: | Tloušťka: | množství: | staničení (a pod.) |
|---|---|---|---|---|
| - ČIŠTĚNÍ STÁVAJÍCÍ POD PŘÍPOJKY ŠACHET PŘÍPOJNÉHO MATERIÁLU NA SKLÁDCE | | | | |
| - OPRAVENÍ PŘÍPOJKY V ÚSEKU PŘÍPOJKA PŘ 37a - PŘ 30 | | | | |
| - INSTALACE ČERPACÍ SOUPRAVY + PŘEČERPÁNÍ PŘÍTOKOVÉHO LOŽE + POKLÁDKA POTRUBÍ DN 300 SN12 + OBSYP POTRUBÍ | | | | |
| - PROVÁDĚNÍ ČIŠTĚNÍ STÁVAJÍCÍ POD PŘÍPOJKY | | | | |

15.Měření teploty směsi:

16.Zkoušky:

17.Ostatní poznámky: ZÁPIS ZHOTOVITELE: ŠACHTA PŘ 37a + UV 17a (U Č.P. 133): BYLO ZJIŠTĚNO, ŽE V OBDOBÍ MEZI PROVÁDĚNÍM PROVEDOVÉ DOKUMENTACE A REALIZACÍ DOŠLO KE ZMĚNĚ TRASY PŘÍPOJKU SPLAŠKOVÉHO S KOMUNIKACÍ A ZNEPRŮCHODNĚNÍ POD PŘÍPOJKOU VEDENÉHO TRATIVODU. PO NÁSLEDNÉ DOPLNĚNÍ ŠACHTY A VPUSTI ZABEZPEČUJÍCÍ ODTÉKÁNÍ VODY NA UZEMÍ DO Č.P. 133.

ZA TDI : SOUHLASÍ S NÁVRHEM A REALIZACÍ.

18.Stavbyvedouc

19.V nepřítomnosti stavbyvedoucího je pověřen vedením stavby:

STRABAG

List č.: 3004998

| 1.Nákladové středisko: | 2.Název akce: | 3.Datum: | 4.Den týdne: |
|---|---|---|---|
| PRAHA | REKONSTRUKCE, II. ETAPA, SO 334 | 27.7.2020 | ÚT |

| 5.Počasí: | 6.Teploty vzduchu: | začátek: | střed: | konec: |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

| 7.Pracovníci: Dělníci: 6 | THP: 1 | 8.Pracovní doba: 6:00 - 18:30 | 9.Přestávka: 11:00 - 12:00 | 10.Odpracované hodiny celkem: 10 |
|---|---|---|---|---|

11.Pracovníci (jména a příjmení): [illegible]

12.Mechanismy: JCB, CAT 313D, [illegible] PÁSOVÝ, VIBRAČNÍ PRKNO

13.Doprava: [illegible]

| 14.Provedené práce: | materiál: | Tloušťka: | množství: | staničení (a pod.) |
|---|---|---|---|---|
| - ŘEZÁNÍ ASFALTU V ÚSEKU | | | | |
| OD 30 - BĚŽNÝ + ODTOČ PŘEBYT. MATERIÁLU | | | | |
| - ZŘÍZENÍ KOLEJE S EKVIVALENČNÍMI MĚRENÍMI | | | | |
| - ODSTRANĚNÍ OD 29a) (VČ. ZÁSYPU A HUTNĚNÍ) | | | | |
| - ŘEZÁNÍ ASFALTU OD 29a) - OD 29 | | | | |
| - HUTNĚNÍ ZÁKLADOVÉ VRSTVY + PODK. PŘÍDATNÉHO | | | | |
| [illegible] + POKLÁDKA PVC PÁSU [illegible] | | | | |
| - ZŘÍZENÍ PODKL. PÁSKU + ZŘÍZENÍ ZÁSYPU | | | | |
| ZŘÍZENÍ PROVIZORNÍ PŘEJEZDOVÉ + HUTNĚ. PO | PODKLADNÍ | | | |

15.Měření teploty směsi:

16.Zkoušky:

17.Ostatní poznámky: ZÁPIS OHLOVITELNÉ: PO PROVEDENÍ ŘEZNÝCH PRACÍ BYLO ZŘÍZENA PROSTOROVÁ KOLEJ S EKVIVALENČNÍMI MĚŘENÍMI. PO NOVÉM PŮVODNÍM POVRCHU ODT KONTROLNÍ PÁSKY. V NOVÉ VRSTVĚ ZÁSYPU BYLO DOPLNĚNA KONTROLNÍ ŘEZNÍTA (OD 29a). S PŘIHLÉDNUTÍM K MAXIMÁLNÍMU PODÉLNÉMU SKLONU KOMUNIKACE 0,5% NAVRHUJE AD V MÍSTĚ NOVĚ ODŘÍZNUTÉ ŘEZNÍTY DOPLNIT ULIČNÍ VPUST (UV 16a)

ZA TDI: SOUHLASÍM SE ZMĚNOU (AD - ODSOUHLASÍ)

| 18.Stavbyvedoucí | 19.V nepřítomnosti stavbyvedoucího je pověřen vedením stavby: |
|---|---|
| | |

STRABAG

List č.: 3110862

PO 103

Datum: 24. 8. 2020 Den týdne: PO

Základové středisko: [illegible] Název akce: M/102 HR. HZ. N. PRAHY - ŘÍČANY, REKONSTRUKCE, II. ETAPA

Počasí: oblačno + 17°C, + 24°C, + 23°C

Pracovní doba: 7⁰⁰ - 15⁰⁰ Pracovní přestávka: 11⁰⁰ - 12⁰⁰

Pracovníci (jména a příjmení): MILAN HENBLÍK, MIROSLAV DOSTÁL, VLADIMÍR TOUŠA, DOMINIK HENBLÍK, MARTIN ŠEBEK, MAREK HAVRÁNEK, ANTONÍN KRAJNÍČ, MILOŠ LABUDA, BRANISLAV KRAJNÍČ, MIROSLAV RÝSOVSKÝ, ZDENĚK KOUTENSKÝ, JIŘÍ LIBERT, FRANTIŠEK VESELÝ, PAVEL ŠUSTA, MICHAL DIVÍŠ, KAREL FENCL

Mechanismy: JCB, JEDEX TN110, ŘEZNÍ NAKLADAČ KRAMER, 7 TUN, 14 TUN, 14 TUN

Materiál: ŠD FR. 0-32 mm, BETON, SILNIČNÍ OBRUBY, PVC CHRÁNIČKA, BETONOVÉ DLAŽDICE

Zkoušky:

Provedené práce:
- ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉ VOZOVKY KVŮLI DISTRIBUCE A KABELŮ ČETIN
- ROZKOPÁVKA VOZOVKY ŘEZ DISTRIBUCE A KABELŮ ČETIN DO PVC CHRÁNIČEK
- ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍHO ASFALTOVÉHO BETONU V MÍSTECH U OBJEKTŮ č.p. 130, 132 (ZAHÁJENÍ PRÁCE DLE ČSÚ PLYNU A UKONČENÍ KONKRÉTNÍHO DNE 13. 8. 2020)
- ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍHO ODVODŇOVACÍHO ŽLABU
- PŘEPRAVA ZEMINY DO NOVÉ ODVADĚCÍ SKLÁDKY KTERÁ BUDE UMÍSTĚNA PŘED VRATA A MÍSTECH DO ZÁHOZŮ
- ODVOZ ASFALTOVÝCH ŘEZŮ NA SKLÁDKU + NEVHODNÉHO NÁSYPOVÉHO MATERIÁLU
- PROVEDENÍ NOVÝCH KONSTRUKČNÍCH VRSTEV V MÍSTECH DO FR. 0-32 mm + HUTNĚNÍ
- ODVOZ NEVHODNÉHO NÁSYPOVÉHO MATERIÁLU NA SKLÁDKU SKLÁDKA ČISTÍRNY ODPADNÍCH VOD (ČISTÍRNÍ SPOLEČENSTVÍ, VZDÁLENOST 7,340 - 7,160 + ODBĚRATELÉ)

Podpis zástupce investora (TDI): Podpis stavby

STRABAG

List č.: 3110863

SO 103

Datum: 25.9.2020 Den týdne: Út

Základové středisko: 5411B642 Název akce: II/102 HR. HL. N. PRAHY - ŘÍČANY, REKONSTRUKCE, II. ETAPA

Počasí: JASNO + 18°C, + 25°C, + 22°C

Pracovní doba: 5⁰⁰ - 16⁰⁰ Pracovní přestávka: 11⁵⁰ - 12⁰⁰

Pracovníci (jména a příjmení): EDVARD KUNTOSCH, PAVEL BLÁHA, JIŘÍ LUKEŠ, ADAM SKÁLA, JAKUB ŠIKA, KAMIL DOSTÁL, MARTIN ŠIMON, MAREK HRDLIČKA, ANTONÍN RAMEŠ, VLASTIC LABUDA, MIROSLAV BŘEZINA, MICHAL DIVIŠ, KAREL TENCL

Mechanismy: JCB, TEREX TX 170, HAMM, VIBRO, TRAK, ŘEZAČKA ASFALTOVÉHO KRYTU

Materiál: ASFALTOVÁ OBRUBNÍK, BETON, ŽÁRUVODNÁ OMÁČKA

Zkoušky:

Provedené práce:
- PŘEJETÍ A SBALENÍ OBRUBY PODÉL STÁVAJÍCÍCH ŽLABŮ
- ODTĚŽ NEVHODNÉHO PÍSČITÉHO MATERIÁLU NA MEZIDEPONII
- POKLÁDKA ŽÁRUVODNÉ OMÁČKY (ČISTÉMU ZAOZŘENÍ PODKLADNÍHO CHODNÍKU PODÉL KOMUNIKACE V Km 0,340 - 0,440)
- SMĚŠOVÁNÍ PODKLADNÍHO BETONOVÉHO CHODNÍKU PODÉL OBJEKTU Č.P. 130 + ODBOUVÁNÍ (VRUBOVÝ ŘEZ BEZ ÚPRAVY OSTŘÍVKU + ODVODNĚNÍ!)
- POKLÁDKA ASFALTOVÝCH OBRUB DO BETONOVÉHO LOŽE PŘED OBJEKTEM Č.P. 130

Podpis zástupce investora (TDI): Podpis stavbyve

STRABAG

List č.: 3110864

SO 103

Datum: 26.2.2020 Den týdne: ST.

Stavbové středisko: STRABAG Název akce: I/10 HR. HZ. N. PRAHY - STŘEMYSLICE, REKONSTRUKCE, II. ETAPA

Počasí: JASNO +16°C, +27°C, -1,9°C

Pracovní doba: 7⁰⁰-15⁰⁰ Pracovní přestávka: 11⁰⁰-12⁰⁰

Pracovníci (jména a příjmení): BRENNER BOHUSLAV, BENEŠ BLAŽEJ, JIŘÍ LUDEK, FRANTIŠEK JANDÍČEK, MICHAL DIVIŠ, KAREL TENCL, KÁLOV DOMINIK, ADRIAN ČERNÁ, MAREK HANDŠÁK, ANTONÍN DRAHNÍČ, VIKTOR LABUDOŠ, MIROSLAV BUBLÍČEK

Mechanismy: NÁKLAĎÁK, TATRA, TATRA, JCB, JCB, ŘÍZENÍ NAKLADAČE BOBCAT

Práce: ODPOJOVACÍ ŠOUPĚ DN 700 A 300, KANALIZACE + PŘÍPOJKY PVC KOUPELNA DN 150, BETON, BETONOVÁ DLAŽBA

Provedené práce: - ODTĚŽ NEVHODNÉHO ZEMINNÉHO PROSTŘEDÍ NA SKLÁDCE
- ZÁSYP ŠTĚRKOVÉ PLOCHY (ŘÍZENÉ ULOŽENÍ ZÁSYPOVÉHO MATERIÁLU PODÉL KOMUNIKACE V KM 15,340 - 15,760 VRSTVENĚ)
- ZAHLOUBENÍ ZÁSYPU ODPOJOVACÍCH ŠOUPĚ DN 700 A DN 300 PŘED OBJEKTY Č.P. 130 A 132 (NA ŠOUPĚ PŘED OBJEKTY E 03.2.2020 PROVEDENO NAPOJENÍ ODKAPOVÉHO POTRUBÍ) DO BETONOVÉHO ŽLABU

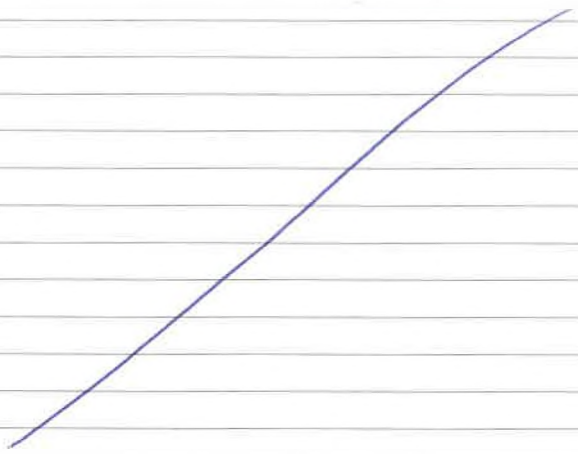

Zástupce investora (TDI): Podpis stavbyve

STRABAG

List č.: 3110865

SO 103

Datum: 9. 6. 2020 Den týdne: ČT

Základové středisko: PRAHA Název akce: II/102 HK. HZ. ST. PRAHY - STŘEDOKLUKY, REKONSTRUKCE, II. ETAPA

Počasí: JASNO +13°C, +25°C, +28°C

Pracovní doba: 7⁰⁰ - 16⁰⁰ Pracovní přestávka: 11⁰⁰ - 12⁰⁰

Pracovníci (jména a příjmení): ZDENĚK HOUTENSKÝ, PAVEL SLÁMA, JIŘÍ LUKEŠ, MICHAL DIVIŠ, KAREL FENCL, FRANTIŠEK JEDLIČKA, MIROSLAV HAJEK, MARTIN ŠVEHLA, MAREK HEJDUČEK, SVATOMÍR KRAMÁŘ, MILOŠ ZAJÍČKOVÁ, MIROSLAV DUŠÍČKA

Mechanismy: TRUCK TATRA, ČELNÍ NAKLADAČ KRAMER, JCB, TATRA, TX VOLVO, TX VOLVO, VIBRAČNÍ DESKA

Materiál: ŠTĚRKODRŤ, ŠD FR. 0-32 mm, BETON

Zkoušky:

Provedené práce: - ODVOZ NEVHODNÉHO MÍSTNÍHO MATERIÁLU NA SKLÁDKU
- ZPRACOVÁNÍ ŠTĚRKODRTI (ORNÉ SMÍCHÁNÍ STÁVAJÍCÍHO ZHOUTNÍKU)
- PROVEDENÍ ZPRACOVÁNÍ ŠTĚRKODRTI DO ŠÍŘKY PŘED OBJEKTEM Č.P. 130 (ÚPRAVA ODTOKU)
- PROVEDENÍ DOPLNĚNÍ KONSTRUKČNÍCH VRSTEV V MÍSTECH V OBJEKTU Č.P. 130 A ZÁ ŠD FR. 0-32 mm + HUTNĚNÍ
- DOKONČOVÁNÍ CHODNÍKU U Č.P. 130

Podpis zástupce investora (TDI): Podpis stavbyvedo

STRABAG

List č.: 3110868

SO 103

Datum: 2.9. 2020 Den týdne: ST.

Skladové středisko: 811/2600 Název akce: 811 100 MR. M.7. PRAHA - STŘEMCHOVICE, CELOMETRÁŽ KCE, II. ETAPA

Počasí: POLOJASNO +14°C, + 10°C, +20°C

Pracovní doba: 8⁰⁰ - 17⁰⁰ Pracovní přestávka:

Pracovníci (jména a příjmení):

Mechanismy: PÁSOVÝ ZÁSOBNÍK BETONU, AUTO S BETONOVOU ČERPADLEM

Materiál: ACO 77

Zkoušky:

Provedené práce: - PROVÁDĚNÍ ŽELEZOBETONOVÉHO BETONU NA KONSTRUKCÍCH U OBJEKTŮ Č.P. 130 A 132 + HUTNĚNÍ

Podpis zástupce investora (TDI): Podpis stavbyved

STRABAG

List č.: 3110958

SO 103

Datum: 26.11.2020 Den týdne: ČT

Nákladové středisko: 8[illegible] Název akce: MÍROVÉ NÁM. ul. PRAHA - ŘEPORYJE, REKONSTRUKCE, I. ETAPA

Počasí: OBLAČNO -2°C + 1°C, +0°C

Pracovní doba: 7[illegible] - 15[illegible] Pracovní přestávka: 11[illegible] - 11[illegible]

Pracovníci (jména a příjmení): ZDENĚK LOVIENSKÝ, PAVEL BLÁHA, MIROSLAV LUKEŠ, FRANTIŠEK JEDLIČKA, PETR SLUKA, ONDŘEJ HANZLÍK, JAROSLAV LEHEČKA, JOSEF HOLÁČEK, VIKTOR LABUDA, LUBOMÍR [illegible], MIROSLAV KOŠŤÁLA

Mechanismy: BOBCAT, VÁLEC BOMAG, 3x NÁKL. AVIA

Materiál: ŠD FR. 0-32 mm A

Zkoušky:

Provedené práce:
- PODKLÁDĚNÍ KONSTRUKČNÍCH VRSTEV Z ŠD FR. 0-32 mm A+ HUTNĚNÍ V ÚM 14,390 - 14,940
- ZÁSYP ZÁMKOVÉ DLAŽBY DO ŠÍŘKY 1,1 M

ZÁPIS ZHOTOVITELE:
DNEŠNÍHO DNE 26.11.2020 BYLY ZAPOČATY PRÁCE NA VÝSTAVBĚ SILNICE P. KARCOVÉ A P. HOLÉ.

- OBOUSTRANNÍ ASFALTOVÉHO PÁSU + ODVOZ NA SKLÁDKU
- ODBOURÁNÍ SILNIČNÍCH OBRUB + BETONOVÉHO LOŽE

Podpis zástupce investora (TDI):

Podpis stavbyvedouc

STRABAG

List č.: 3110959

SO 103

Datum: 27. 11. 2020 Den týdne: PÁ

Skladové středisko: 841/ZGA Název akce: II/102 HD HL. M. PRAHY - ŠTĚCHOVICE, REKONSTRUKCE 4. ETAPA

Počasí:

Pracovní doba: 7⁰⁰ - 15⁰⁰ Pracovní přestávka: 11⁰⁰ - 11³⁰

Pracovníci (jména a příjmení): VLADIMÍR KOLOSEVIČ, PAVEL ZLÁMAL, JIŘÍ LUKEŠ, PETR CHALKA, ~~TADEÁŠ~~ HADAŠÍK

Mechanismy: GREJDR, VÁLEC ZOMAC, 3X NÁKL. AUTO

Materiál: ŠD FR. 0-32 mm A, PILNIČNÍ OBRUSY, BETON

Zbytky:

Provedené práce: - PROVÁDĚNÍ KONSTRUKČNÍCH VRSTEV Z ŠD FR. 0-32 mm A + HUTNĚNÍ V KM 14,390 - 14,940

ZÁPIS ZHOTOVITELE:
DNEŠNÍHO DNE POKRAČOVALI STAVEBNÍ PRÁCE NA ÚPRAVĚ SMĚROVÝ p. KOBCOVÉ A p. HOLÉ

- POKLÁDKA NOVÝCH PILNIČNÍCH OBRUS DO BETONOVÉHO LOŽE
- DOROVNÁNÍ ŠD FR. 0-32 V MÍSTECH

ZÁPIS ZHOTOVITELE: ZÁSTUPCE ZHOTOVITELE (F. STRABAG a.s.) DIS HAGIN A LIŠÍ SE SEDÁ STAVEBNÍ DOZOR INVESTORA p. ING. MILOŠE KLEMENERA O ~~POTŘEBU PŘÍTOMNOSTI~~ PŘEVZETÍ KONSTRUKČNÍCH VRSTEV Z ŠD FR. 0-32A A O POVOLENÍ PROVÁDĚNÍ INFILTRAČNÍHO POSTŘIKU EMULZÍ (1kg/m²) A O POVOLENÍ PROVÁDĚNÍ ASFALTOVÝCH BETONŮ ACP 22+, ACL 16 MODIF. A ACO 11 MODIF. V KM 14,390 - 14,940.

ZÁPIS TDI: Zhotovitel doloží kvalitu provedení vrstev ŠD kontrolními zkouškami a geodetickým zaměřením dle SoD. Vizuálně bez připomínek, lze pokračovat v dalších pracích.

Podpis zástupce investora (TDI): Podpis stavbyved

STRABAG

List č.: 3110961

SO 103

Datum: 7.12.2020 Den týdne: ÚT

Stavební středisko: 541 Plzeň Název akce: III/606 HR. KL. K. PLANÝ - STŘECHOVICE, REKONSTRUKCE, II. ETAPA

Objekt:

Pracovní doba: 7⁰⁰ - 16³⁰ Pracovní přestávka: 11⁰⁰ - 11³⁰

Pracovníci (jména a příjmení): ZDENĚK LOUTENSKÝ, PAVEL SLÁMA, JIŘÍ LUKEŠ, JAROSLAV HAVLÍČEK, VIKTOR LABUDDA, KAROLÍNA DANĚK, MIROSLAV RŮŽIČKA

Mechanismy: 1x FINIŠER, 2x VÁLEC HAMM, 4x VOLVO 8x8, ČELNÍ NAKLADAČ KOMATSU

Materiál: ACO 11 OBRUS., SPOJOVÁCÍ ASFALT, BETON, ŠD FR. 0/32 mm a

Poznámky:

Provedené práce:
- PROVEDENÍ ASFALTOVÉHO BETONU ACO 11 OBRUS. + HUTNĚNÍ VÁLCI HAMM
- ASFALTOVÁNÍ PŘÍČ. SPOJOVACÍCH ASFALTŮ + POSYPÁNÍ PŘÍČ. ŠTĚRKOVÉ DRTÍ (CHODNÍK PRO PĚŠÍ - LEVÁ STRANA V KM 14,890 - 14,940 KE SMĚRU STAROMĚSTÍ)
- PROVÁDĚNÍ PODKLADU ŠD FR. 0-32 mm a + HUTNĚNÍ
- POKLÁDKA SPOJOVACÍCH ASFALTŮ DO BETONOVÉHO LOŽE - CHODNÍK PRO PĚŠÍ

ZÁPIS STAVBYVEDOUCÍHO:
DNEŠNÍHO DNE BYL PROVEDEN, VE VRSTVÁCH P. K NÁSTUPIŠTÍM P. KOLOVÉ A P. HOLÉ ASFALTOVÝ BETON ACO 11 + HUTNĚNÍ. DNE 8.12.2020 BUDE PROVEDENO NAJETÍ PŘÍČNÝCH SPOJŮ DRTÍ, PŘEASFALTOVÁNÍ ŠTĚRBIN A SPOJENÍ OBRUSNÝCH A TÍM ÚPRAVA VRSTVÁCH DOKONČENA.

Podpis zástupce investora (TDI): Podpis stavbyve

ZAV č (8)

TRABAG

List č.: 3004987

| Nákladové středisko: | 2.Název akce: | 3.Datum: | 4.Den týdne: |
|---|---|---|---|
| 841/3641 | I/101 HR. HL. M. PRAHY - ŠTĚRBOHOLCE, REKONSTRUKCE, II. ETAPA, SO 534 | 12.6.2020 | PÁ |

| Počasí: | 6.Teploty vzduchu: | začátek: | střed: | konec: |
|---|---|---|---|---|
| POLOJASNO | | +8°C | +12°C | +13°C |

| Pracovníci: | Dělníci: 6 | 8.Pracovní doba: | 9.Přestávka: | 10.Odpracované hodiny celkem: |
|---|---|---|---|---|
| | THP: 1 | 6:00 - 17:00 | 11:00 - 12:00 | 9 |

Pracovníci (jména a příjmení): MARTIN FAFRLÍK, MICHAL DOMBAJ, ANDREJ OROS, ONDŘEJ MIKULEČKÝ, PAVEL ŘÍHA, MICHAL SOCHOR, PAVEL MIKULÁNTŮ

| Mechanismy: | 13.Doprava: |
|---|---|
| JCB, VIBRAČNÍ PĚCH, VIBRAČNÍ DESKA | AUTO |

| Provedené práce: | materiál: | Tloušťka: | množství: | staničení (a pod.) |
|---|---|---|---|---|
| - ŘEZÁNÍ DÝHY V ÚSEKU ŘŠ 3 - UV + ODSTRANĚNÍ ZÁKLADOVÉ SPÁRY MEZ. PŘÍSTUPU | | | | |
| - PROVEDENÍ PODBETONU (PŘÍSTUP) + PŘIKLÁDKA PVC ROURY DN 200 SN8 DO PŘÍSLUŠNÉHO LOŽE + OBETON PATKY | | | | |
| - PROVEDENÍ ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍ UV | | | | |
| - POKLÁDKA NOVÉ UV - DNO, STĚNY S OTVORY, MÍSENÍ, PODKLADNÍ BET. | | | | |

Měření teploty směsi:

Zkoušky:

Ostatní poznámky: ZÁPIS DODAVATELE: ZÁSTUPCE DODAVATELE (P. PROBOŠ a.s.) MARTIN L. PO UPOZORNĚNÍ STAVEBNÍHO DOZORU INVESTORA O ODSTRANĚNÍ PŮVODNÍ STÁVAJÍCÍ ČÁSTI UV 1. STÁVAJÍCÍ UV 1 BUDE ODSTRANĚNA A BUDE VYBUDOVÁNA NOVÁ UV. DÁLE ZÁSTUPCE DODAVATELE ŽÁDÁ PŮV. DOZOR INVESTORA O POVOLENÍ POKLÁDAT PVC ROURU DN 200 SN 8 DO PŘÍSLUŠNÉHO LOŽE V ÚSEKU ŘŠ 3 - UV 1. ZA TDS:

| Stavbyvedoucí: | 19.V nepřítomnosti stavbyvedoucího je pověřen vedením stavby: |
|---|---|
| | |

STRABAG

List č.: 3004974

| 1.Nákladové středisko: | 2.Název akce: | 3.Datum: | 4.Den týd |
|---|---|---|---|
| 811/1814 | I/101 HR. HL. M. PRAHA - ŘEVNICE, REKONSTRUKCE, II. ETAPA, SO 334 | 30.5.2020 | ST |

| 5.Počasí: | 6.Teploty vzduchu: | začátek: | střed: | konec: |
|---|---|---|---|---|
| JARNO | | +8°C | +19°C | +21°C |

| 7.Pracovníci: | 8.Pracovní doba: | 9.Přestávka: | 10.Odpracované hodi celkem: |
|---|---|---|---|
| Dělníci: 24<br>THP: 1 | 5:00 - 18:00 | 11:00 - 12:00 | 10 |

11.Pracovníci (jména a příjmení): [illegible] FAJFERLÍK, MICHAL DOSTÁL, ANDREJ ORAS, MILOŠ MIKULEČNÝ, VÁCLAV TÓTH, PAVEL ÚJHO, MICHAL KADNÁR, [illegible] MIKULÁŠTÍ

| 12.Mechanismy: | 13.Doprava: |
|---|---|
| BAGR 1x 373 D, JEŘÁB VÁLEČEK, VIBRAČNÍ DESKA, JCB | 1x KPT |

| 14.Provedené práce: | materiál: | Tloušťka: | množství: | staničení (a pod.) |
|---|---|---|---|---|
| - ŘEZÁNÍ ASFALTU V ÚSEKU BŘ1-BŘ4 | | | | |
| - HLOUBENÍ ŠÁRKODLOVÉ RÝHY + PROVÁDĚNÍ PODKLADU POD PVC ROURY DN300 (SN8) | | | | |
| - POKLÁDKA ROUR DN300 (SN8) DO PŘÍSLUŠNÉHO LOŽE, VČETNĚ BŘ4 (OBSYPU ROUR PÍSKEM) | | | | |
| - ZASYPÁNÍ ASFALTU V ÚSEKU BŘ1-BŘ4 VHODNÝM ZÁSYPOVÝM MATERIÁLEM ZE VRCHNÍCH (ČÁSTEČNĚ VÁLEČEK) | | | | |
| - PROVÁDĚNÍ OPLOCENÍ STAVEBNIŠTĚ PÚZLÍ | | | | |

15.Měření teploty směsi:

16.Zkoušky:

17.Ostatní poznámky: ŘÁDKA ZHOTOVITELE: ZAPSÁNÍ ZHOTOVITELE (F. STRABAG a.s.)
PŘEVZETÍ A ZAČÁTEK ŘÁDNÉHO STAVEBNÍHO DOZORU INVESTORA O POKLÁDCE PVC ROUR DN300 (SN8) DO PŘÍSLUŠNÉHO LOŽE V ÚSEKU BŘ1-BŘ4. DÁLE ZÁPIS ZHOTOVITELE O PROBÍHAJÍCÍ STAVEBNÍ DOZOR INVESTORA O OHTĚŽUJÍCÍCH SKUTEČNOSTECH ŠÍŘKY V KM 14,450 - 14,630 LEVÁ STRANA A O OHTĚŽUJÍCÍCH VLIVECH VČETNĚ PŘÍPOJEK SOUČASTNÉHO DO BŘ3 A BŘ1. ODVOZ DO KANALIZ. ŠACHET BŘ3 A BŘ1 BUDOU PROVEDENY VÁLEČKOVÝ VRTÁČKOU Ø DN 200 VČETNĚ PROŘ. KYNETY.
ZA TDI: SOUHLASÍM (VIZ e-mail od Ad ING. ČAJKEL 29.5.2020)

18.Stavbyvedouc

19.V nepřítomnosti stavbyvedoucího je pověřen vedením stavby:

STRABAG

List č.: 3374048

SO 103

Datum: 23.8.2012 Den týdne: ÚT

Hlavní středisko: 8411 Název akce: MOST PŘ. Ř. ST. PRAHY, STŘEDOMOSTÍ, BETONÁŽ PILÍŘŮ II. ET.

Směna: JEDNOZMĚNA, ČÍSLO SMĚNY, POL. SMĚNY, @POL. SMĚNY

Pracovní doba: 8⁰⁰ - 14⁰⁰ Pracovní přestávka: 11⁰⁰ - 12⁰⁰

Pracovníci (jména a příjmení): ALEŠ KUCHAŘ, JAROSLAV ŠÍPEK, PAVEL BUŠINA, JIŘÍ LUKEŠ

Mechanismy: AUTOMIX / ČERPADLO

Materiál: BETONOVÁ OBCHODNÍ, BETON

Poznámky:

Provedené práce (včetně dodavatelů a jejich činností):

AD PROVEDL KONTROLU OCHRANY PROTI OGTŘÍKU V OP. 130 VE STŘEDOMOSTÍ. PRINCIPY ŘEŠENÍ OCHRANY DÍLY PŘI REALIZACI DODRŽENY A OCHRANA Z TOHOTO TITULU PLNÍ SVOJI FUNKCI. AD POŽÁDOVÉ PŘEDLOŽIT MAPLO PŘED BETONÁŽÍ DO BUDOUCÍ (MOŽNOST PŘÍPADNÉ DOTONTÁŽE) A DOPLNIT FKO.

DODAVATEL

- ZHOTOVENÍ ZÁVĚRNÉHO ZAMĚŘENÍ V ČRS 11,308 - (PŘESUN STROJE NE VÝŠKU ZAMĚŘENÍ)
- DOHLED PŘEDEPSANÉHO POSTUPU NA PŘEDBETONU
- ZHOTOVENÍ POLOHOPISNÉHO ZAMĚŘENÍ DO BETONÁŽNÍHO LOŽE V ČRS 11,308 - 10,31 (PŘESUN STROJE NE VÝŠKU ZAMĚŘENÍ)

Podpis zástupce investora (TDI): Podpis stavbyve

(120)

**STRABAG a.s.**
**Dopravní stavitelství**
**direkce TC**
Kačírkova 982/4
CZ – 158 00 Praha 5 / Česká republika

**Stavba:** **II/102 HR. HL.MĚSTA PRAHY – ŠTĚCHOVICE, REKONSTRUKCE**
**Dodavatel:** **STRABAG a.s. Kačírkova 982/4, Praha 5**

**Číslo předávacího protokolu: Š II 72/2021**

**Předmět měření: SO 103-B, C REKONSTRUKCE VOZOVKY, Průtah Štěchovicemi**
**Úprava u č.p. 130 v km 15,280 – 15,300**

| | |
|---|---|
| **Obrubníky** | **43,0 m** |
| **Zámková dlažba** | **6,3 m²** |
| **Živice** | **40,7 m²** |
| **Odvodňovací žlab DN100** | **13,0 m** |
| **Odvodňovací žlab DN300** | **12,0 m** |
| **Odtok do Kocáby DN200** | **36,0 m** |

Měření bylo provedeno GPS TOPCON HR.
Dopustné odchylky měření a výpočtu nebyly překročeny,

**Souřadnicový systém:** S-JTSK
**Výškový systém:** Bpv
**Přílohy:**

| | | |
|---|---|---|
| **Zaměřil:** | 2020 -21 | Ing. S. Bílek |
| **Zpracoval:** | 20.9.2021 | Ing. S. Bílek |
| **Ověřil:** | 20.9.2021 | Ing. S.Bílek |

Ověření výsledků zeměměřických činností ve výstavbě
podle §13 odst.1 písm. c) zák. č. 200/1994 Sb

# OCHRANA PROTI OSTŘIKU U ČP. 130 – ČÁST 2

## PODÉLNÝ POHLED 1:50

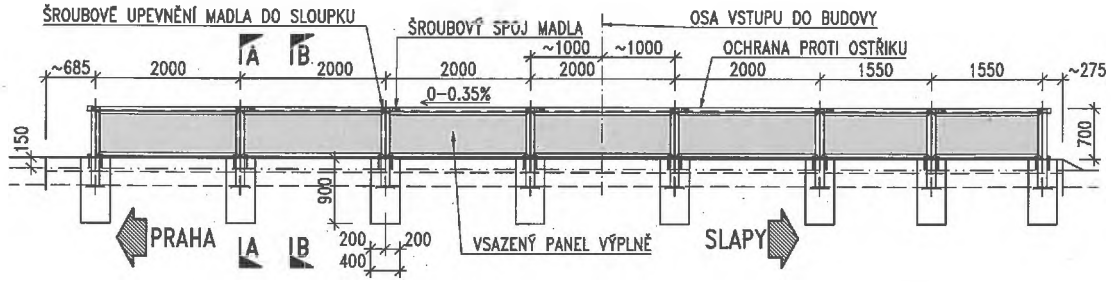


## ŘEZ A–A 1:20

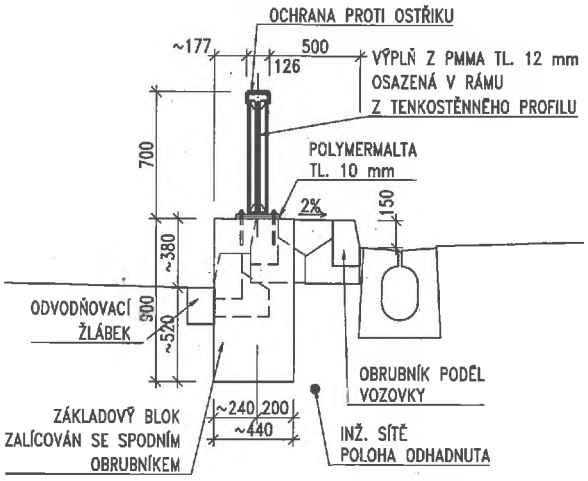


## ŘEZ B–B 1:20

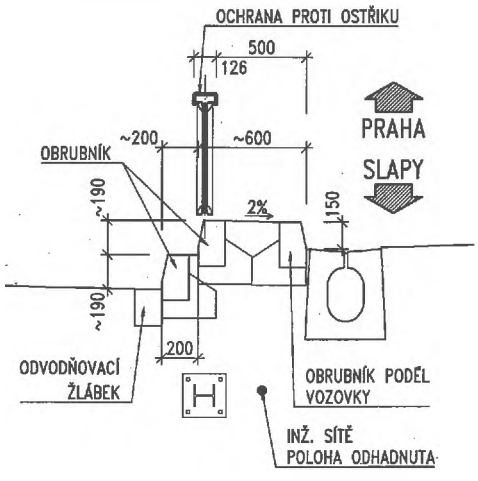

# OCHRANA PROTI OSTŘIKU U ČP. 130 – ČÁST 1

## PŮDORYS 1:50

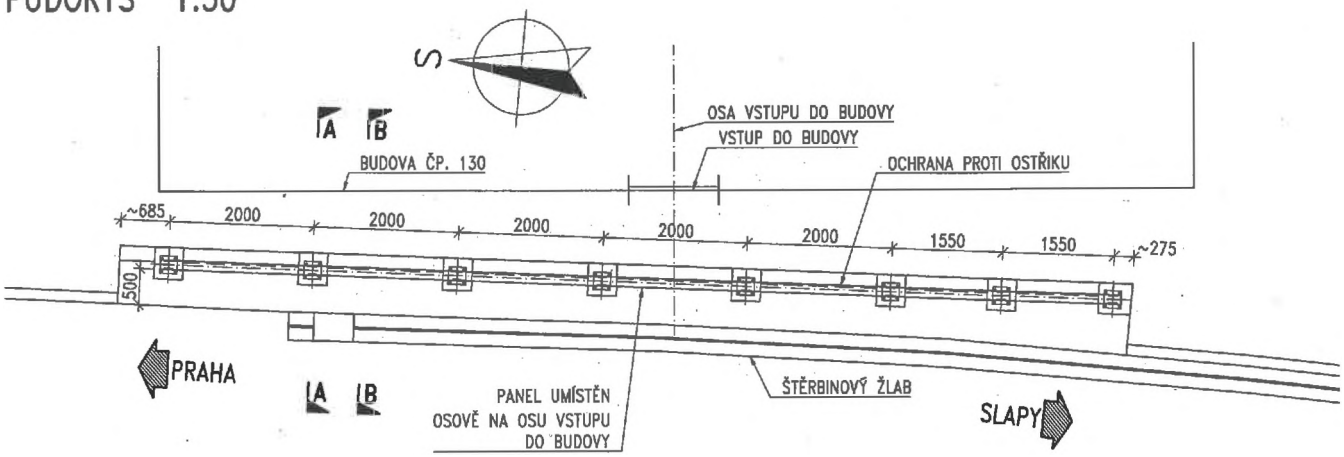


## TECHNICKÁ SPECIFIKACE:

### OCHRANA PROTI OSTŘIKU:

- SE SNADNO DEMONTOVATELNÝM MADLEM A VÝPLNÍ (NE SVARY APOD.)
- PŘED VSTUPEM DO BUDOVY POLE DL. 2.0 m OSAZENO OSOVĚ K OSE VSTUPU
- LÍC MIN. 0.5 m OD OKRAJE VOZOVKY
- POUŽIT VÝROBEK AEROLUX ZPAN1:
  - VÝŠKA 0.7 m
  - SLOUPKY, MADLA, SPOJOVACÍ MATERIÁL: S 235 JR, 1.4401
  - VÝPLŇ: DESKA Z ČIRÉHO PMMA TL. 12 mm OSAZENÁ V RÁMU Z AL PROFILU P86 S TĚSNÍCÍM PROFILEM Z EPDM, NEPRŮZVUČNOST B3, PADAJÍCÍ ÚLOMKY TŘÍDA 2
  - KOTVENÍ: ZÁVITOVÁ TYČ M12 DO VRTU PROFILU 14 mm HLOUBKY 180 mm VLEPENÁ HILTI HIT-RE 500 NEBO PODOBNÝM ZPŮSOBEM
  - PKO: DLE TKP KAP. 19B, TYP: IIIA NEBO [illegible], ODSTÍN RAL 5015 (NEBESKÁ MODRÁ)

### ZÁKLADOVÉ BLOKY:

- Z PROSTÉHO BETONU C 30/37 XF4
- VZDUŠNÝ LÍC ZÁKL. BLOKU ZALÍCOVÁN S NAVAZUJÍCÍM OBRUBNÍKEM
- INŽENÝRSKÉ SÍTĚ V PŘÍPADĚ KONTAKTU SE ZÁKL. BLOKEM VLOŽENY V MÍSTĚ BLOKU DO PŮLENÉ CHRÁNIČKY

## Alice Pavlikova

**Od:** Alice Pavlikova
**Odesláno:** úterý 28. března 2023 14:17
**Komu:** Miroslav Valenta
**Předmět:** Štěchovice II. etapa-prosba SO 103 změna DZ (ZPDS)-ochrana proti ostřiku
**Přílohy:** ZBV č. 24 v3 - SO 103 Ochrana proti ostřiku.xlsx

Dobrý den,
K ZBV č. 24 posílám vyjádření projektanta k zrcadlům a opravený soupis

Pavlíková

---

**From:** Jiří Ctibor
**Sent:** Tuesday, March 28, 2023 1:20:32 PM
**To:** Karel Simek
**Subject:** [EXTERNAL] RE: Štěchovice II. etapa-prosba SO 103 změna DZ (ZPDS)-ochrana proti ostřiku

Dobrý den pane Šimku,
zrcadla se doplňovala na základě dodatečného požadavku účastníků stavebního řízení. Konkrétně je ve změně stavby před dokončením u SO 103 uvedeno toto:
*„2) Na základě dodatečného požadavku účastníků stavebního řízení budou doplněny dvě odrazná dopravně-bezpečnostní zrcadla dle TP 119 vstřícně před sjezdy k čp. 130 a 132 pro zajištění lepších rozhledových poměrů.“*

Změnu stavby SO 103 posílám, zrcadla jsou patrná z přílohy č. 2.2.
Ctibor

**Ing. Jiří Ctibor**
projektant silničních staveb

**Atelier PROMIKA s.r.o.**
Na Pankráci 1062/58
140 00 Praha 4
Mobil:
Email:
Web: http://www.promika.cz
Společnost je držitelem certifikátu ČSN EN ISO 9001:2001

---

**From:** Karel Simek
**Sent:** Tuesday, March 28, 2023 12:44 PM
**To:** Jiří Ctibor
**Subject:** Štěchovice II. etapa-prosba SO 103 změna DZ (ZPDS)-ochrana proti ostřiku

Dobrý den pane Ctibore,
mohu Vás požádat o zaslání elektronické verze SO 103 ,kde je vidět přidání zrcadel SDZ naproti úpravě domu proti ostřiku.
Potřeboval bych zdůvodnit panu Valentovi, proč tam byla přidána 2 zrcadla(asi požadavek z místního šetření nebo PČR).

děkuji Vám a přeji hezký zbytek dne

B 7634/RD683/MSPH
Fj 479008/2022/MSPH

# USNESENÍ

Městský soud v Praze rozhodl vyšší soudní úřednicí Marií Šiškovou v právní věci

navrhovatele: **STRABAG a.s.**, IČO 608 38 744
sídlem Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5

**o návrhu na zápis změny do obchodního rejstříku**

**takto:**

V obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze v oddílu B, vložce číslo 7634

**se vymazává**

Statutární orgán
člen představenstva
Ing. JARMILA POVAŽANOVÁ, dat. nar.

Den vzniku členství: 3. června 2019

Prokura
Ing. RENATA HAMRSKÁ, dat. nar.

Ing. TOMÁŠ HOZA, dat. nar.

Ing. JIŘÍ JAROŠ, dat. na

**se zapisuje**

Statutární orgán
U vymazávané osoby: Ing. JARMILA POVAŽANOVÁ, dat. nar.
Den zániku členství: 7. prosince 2022

člen představenstva
Ing. TOMÁŠ HOZA, dat. nar.

Den vzniku členství: 8. prosince 2022

Prokura
Ing. KAREL KLOFÁČ, dat. nar.

Shodu s prvopisem potvrzuje Ilona Žďárská

Den zápisu změny: Dnem nabytí právní moci

**Poučení:**

Proti tomuto usnesení lze podat odvolání do patnácti dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím nadepsaného soudu.

Praha 19. prosince 2022

Marie Šišková v. r.
vyšší soudní úřednice

Shodu s prvopisem potvrzuje Ilona Žďárská

Naše značka: TD/43/19-120/VM/23
Vaše značka:

Vyřizuje: M. Valenta
Tel. +

e-mail: i
Datum: 31. 3. 2023

**KSÚS Středočeského kraje**

**Ing. Milan PEŠKA**
**Vedoucí investic EU**

**Zborovská 11**
**150 21 Praha 5**

**Stavba: II/102 hr. hl. m Prahy – Štěchovice, rekonstrukce, etapa II.**

**Věc: Stanovisko TDS k návrhu ZBV č. 24 SO 103 Rekonstrukce vozovky - průtah Štěchovicemi.**

Zhotovitel stavby předložil TDS doplněný návrh ZBV č. 24 SO 103 (103/7) Rekonstrukce vozovky - průtah Štěchovicemi (Ochrana proti ostřiku).

Do návrhu ZBV byly zapracovány změny oproti PDPS dle Dodatečného povolení změny stavby z 13. 5. 2022.

TDS potvrzuje skutečnosti uvedené v návrhu ZBV č. 24 SO 103 (103/7) Rekonstrukce vozovky - průtah Štěchovicemi. (Ochrana proti ostřiku).

Položky oceněného soupisu prací SO 103 (103/7) budou fakturovány na základě skutečné provedených prací dle Dodatečného povolení změny stavby doložených měřením a záznamy ve stavebním deníku.

M. Valenta
Technický dozor investora

Na vědomí:
Ing. Milan Fiala
Ing. Karel Šimek
