Krycí list ZBV

Název a evidenční číslo Stavby:	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS:	Číslo ZBV:
II/102 hr. hl. města Prahy-Štěchovice, rekonstrukce. ETAPA II Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): **Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice**	**102/17**	**43**

Objednatel: **Krajská správa a údržba Středočeského kraje, příspěvková organizace**
Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5, Smíchov
IČ: 00066001 DIČ: CZ00066001

Zhotovitel: **STRABAG a. s.**
Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5
IČ: 60838744 DIČ: CZ60838744

Rekapitulace ZBV č. 43 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
43.1	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
43.2	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
43.3	0,00	854 066,44	854 066,44

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
43.4	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
43.5	0,00	0,00	0,00

Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
43	**0,00**	**854 066,44**	**854 066,44**

Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.
Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy
a pro Rozpis ocenění změn položek.

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby:	Číslo SO/PS /	Číslo ZBV:
II/102 hr. hl. města Prahy-Štěchovice, rekonstrukce. ETAPA II	/ číslo Změny SO/PS:	
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):	**102/17**	**43**
Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice		

Strany smlouvy o dílo č. S-468/00066001/2020 na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 3.3.2020 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Krajská správa a údržba Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5, Smíchov

Zhotovitel: STRABAG a. s., Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5

Přílohy Změnového listu:

1. Krycí list	1	počet listů
2. Změnový list	1	počet listů
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	1	počet listů
4. Rozpis ocenění Změn položek	1	počet listů
5. Přehled zařazení změn do skupin	2	počet listů
6. Přehled dalších dokladů	1	počet listů
Další doklady dle přehledu dokladů	58	počet listů

Paré č.	Příjemce
1	Objednatel
2	Zhotovitel
3	Projektant (AD)
4	Stavební dozor
5	Supervize (Regionální dotační kancelář)

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis a zdůvodnění Změny:

Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice /Ocelové svodidlo,dlažba v Davli

Změna během výstavby řeší tyto dvě odlišnosti oproti PDPS dle následujícího:
1) Požadavek městyse Davle (příloha č. 08) na zaasfaltování popřípadě dodláždění v napojení na rekonstruovanou silnici II/102 v Davli v místech, kde dochází k připojení místních komunikací a hrozilo by poškození hrany nové vozovky popřípadě by se zhoršovali odtokové poměry. Tato změna se týká pol. č. 11, 16, 18, 19, 31, 49, 128, 129, 137 v ceně 338 661,28 Kč.
2) Nesoulad v množství demontovaných původních ocelových jednostranných svodidel z titulu jejich nezapočítání do stavebního objektu SO 102 nebo SO 253 - opěrné zdi - Davle - Štěchovice vlevo (a to již od PDPS). Vyjádření AD č. 70 (příloha č. 09). Změna se týká pol. č. 112 v ceně 450 805,47 Kč.

Jedná se o Změnu nepodstatnou, nepředvídanou, která je tak podle § 5, odst. 1, písm.c), resp. podle § 10 Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 01.01.2022) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zařazena do Skupiny 3 (změny z nepředvídaných důvodů). Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky.
Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. Změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst. 6 se jedná o změnu, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a to z důvodu nepředvídaných fyzických podmínek vzniklých na stavbě v průběhu realizace a hodnota těchto dodatečných stavebních prací nepřekračuje 50 % původní hodnoty závazku.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných
0,00	**854 066,44**	**854 066,44**	**854 066,44**

Technická pomoc Objednatele	jméno	Ing. Lubomír Smetana	datum	podpis

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Zhotovitel (stavbyvedoucí): STRABAG a.s.	jméno	Ing. Karel Šimek	datum	podpis
Projektant (autorský dozor): Pontex, spol. s.r.o.	jméno	Ing. David Dvořáček	datum	podpis
Stavební dozor: Pragoprojekt, a. s.	jméno	Miroslav Valenta	datum	podpis
Supervize (Regionální dotační kancelář)	jméno		datum	podpis
Zástupce Objednatele: KSÚS SK	jméno	Ing. Milan Peška	datum	podpis
Zástupce Objednatele odpovědný za cenové projednání Změny	jméno	Ing. Jaroslava Jurková	datum	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele)	jméno	Ing. Jan Fidler, DiS.	datum	podpis
Zhotovitel	jméno	Ing. Martin Bašár Ing. Karel Klofáč	datum	podpis

Číslo paré:

Příloha č. 3

ZÁPIS

o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS) pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 43

Název Stavby: **II/102 hr. hl. města Prahy-Štěchovice, rekonstrukce. ETAPA II**
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: 102/17
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
113 362 946,56

Poznámka: Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	-14 341 186,54	31 240 459,81	130 262 219,83	16 899 273,27

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	0,00	854 066,44	32 094 526,25	28,31%

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1
stavební/montážní práce	-14 341 186,54	131 116 286,27	17 753 339,71	15,66%

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo 43

Evidenční číslo a název stavby: II/102 hr. hl. města Prahy-Štěchovice, rekonstrukce. ETAPA II
Číslo a název SO/PS: SO 102 - Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice
Číslo a název rozpočtu: SO 102 - Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)
102
Skupina změn 3

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11	122101103.	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 1 a 2 objem do 5000 m3	M3	4 322,500	4 363,405	40,905	122,97	531 537,83	0,00	5 030,09	536 567,92	5 030,09	0,95%
16	162701105.	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	M3	15 023,840	15 064,745	40,905	504,88	7 585 236,34	0,00	20 652,12	7 605 888,46	20 652,12	0,27%
18	171201201.	Uložení sypaniny na skládky	M3	10 725,990	10 766,895	40,905	16,70	179 124,03	0,00	683,11	179 807,14	683,11	0,38%
19	171201211.	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	T	22 695,246	22 777,056	81,810	138,17	3 135 802,14	0,00	11 303,69	3 147 105,83	11 303,69	0,36%
31	451317777.	Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu 1:5 z betonu prostého tl do 100 mm	M2	5 223,400	5 314,300	90,900	581,54	3 037 616,04	0,00	52 861,99	3 090 478,03	52 861,99	1,74%
49	594511111.	Dlažba z lomového kamene s provedením lože z betonu	M2	5 226,400	5 317,300	90,900	2 927,76	15 301 644,86	0,00	266 133,38	15 567 778,24	266 133,38	1,74%
112	966005311	Rozebrání a odstranění silničního svodidla s jednou pásnicí	M	2 444,000	3 993,000	1 549,000	291,03	711 277,32	0,00	450 805,47	1 162 082,79	450 805,47	63,38%
128	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	T	5 047,476	5 103,289	55,813	147,76	745 815,05	0,00	8 246,93	754 061,98	8 246,93	1,11%
129	998225194	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živičným, betonovým do 5000 m	T	5 047,476	5 103,289	55,813	29,55	149 152,92	0,00	1 649,27	150 802,19	1 649,27	1,11%
		NOVÉ POLOŽKY											
130	12002000	Geodetické práce - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ	Kč	0,000	4 249,087	4 249,087	1,00	0,00	0,00	4 249,09	4 249,09	4 249,09	100,00%
137	636195111	Vyplnění spár cementovou maltou dosavadní dlažby z lomového kamene melioračních kanálů	M2	0,000	90,900	90,900	357,00	0,00	0,00	32 451,30	32 451,30	32 451,30	100,00%
		Celkem						31 377 206,53	0,00	854 066,44	32 231 272,97	854 066,44	2,72%

Odpovědný zástupce Objednatele i odpovědný zástupce Zhotovitele odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu.
Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny.

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo 43	
Evidenční číslo a název stavby: II/102 hr. hl. města Prahy-Štěchovice, rekonstrukce. ETAPA II	ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)
Číslo a název SO/PS: SO 102 - Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice	102
Číslo a název rozpočtu: SO 102 - Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice	Skupina změn 3

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Za Zhotovitele: Ing. Karel Šimek, (vedoucí projektu)

Za Objednatele: Miroslav Valenta, (TDI)

Datum:

Datum:

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo 43	
Evidenční číslo a název stavby: II/102 hr. hl. města Prahy-Štěchovice, rekonstrukce. ETAPA II	ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)
Číslo a název SO/PS: SO 102 - Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice	102
Číslo a název rozpočtu: SO 102 - Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice	Skupina změn 3

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Podpis:

Podpis:

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN

Název a evidenční číslo Stavby: **II/102 hr. hl. města Prahy-Štěchovice, rekonstrukce. ETAPA II**

1	**Přijatá smluvní částka bez rezervy a DPH**	**377 812 002,59**
2=1+19+20	**Aktuální smluvní částka (cena stavby)**	399 501 717,92
	Aktuální smluvní částka (cena stavby) včetně DPH	**483 397 078,68**
3=(2/1)*100	**Procento změny Přijaté smluvní částky**	**105,74%**
4=(25/1)*100	**Sledování vyhrazených změn (Skupina 1)**	**0,00%**
5=(28/1)*100	**Sledování záměny položek (Skupina 2)**	**0,00%**
40=(19/1)*100	**Sledování limitu 15 % pro podstatnou změnu pro Změny záporné dle § 14, odst. (5), písm. b)**	**-7,27%**

6=32+36	**Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a Skupiny 4**	**22 451 982,68**
7=(6/1)*100	**Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4**	**5,94%**
8=1*0,3	**Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4**	**113 343 600,78**

9=(32A/1)*100	**Sledování limitu 50 % Skupina 3**	**17,99%**
10=(36A/1)*100	**Sledování limitu 50 % Skupina 4**	**1,24%**
10A=32A+36A	**Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných pro Skupinu 3 a Skupinu 4**	**72 636 377,12**
11=1*0,5	**Zákonný limit 50 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4**	**188 906 001,30**

12=(37/1)*100	**Sledování limitu (15%)**	**1,05%**
13=37	**Sledování limitu 137 366 000 Kč**	**3 998 392,61**
14=137366000-37		**133 367 607,39**

					- 1 -			- 2 -			- 3 -				- 4 -				- 5 -	
					Vyhrazené změny (Doměrky) (dle §100 zákona č. 134/2016 Sb.)			Záměna položek (dle §222 odst. (7) zákona č. 134/2016 Sb.)			Změny nepředvídané (dle §222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb.)				Změny nezbytné (dle §222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb.)				Změny de minimus	
SO	**ZBV č.**	**Název SO/PS / předmět Změny**	**Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus)**	**Změny kladné**	**Hodnota ZBV**	**Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus)**	**Změny kladné**	**Suma Změn záporných a Změn kladných**	**Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus)**	**Změny kladné**	**Suma Změn záporných a Změn kladných**	**Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus)**	**Změny kladné**	**Suma Změn záporných a Změn kladných**	**Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných**	**Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus)**	**Změny kladné**	**Suma Změn záporných a Změn kladných**	**Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných**	**Změny de minimus (15% nebo limit 137 366 000,- Kč**	**limit 15 %**
16	**17**	**18**	**19=23+26+29+33**	**20=24+27+30+34+37+39**	**21=19+20**	**23**	**24**	**25=23+24**	**26**	**27**	**28=26+27**	**29**	**30**	**32=29+30**	**32A=ABS(29)+30**	**33**	**34**	**36=33+34**	**36A=ABS(33)+34**	**37**	**38=(37/1)*100**
		II/102 hr. hl. města Prahy-Štěchovice, rekonstrukce. ETAPA II	**- 27 472 527,20**	**49 162 242,53**	**21 689 715,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**- 25 029 643,54**	**42 930 102,22**	**17 900 458,68**	**67 959 745,76**	**- 62 553,68**	**3 656 232,12**	**4 551 524,00**	**4 676 631,36**	**3 998 392,61**	**1,05%**
103	1	Rekonstrukce vozovky - Průtah Štěchovicemi / úprava poklopů a vodoznaků	0,00	124 942,66	124 942,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 942,66	124 942,66	124 942,66	0,00	0,00%
103/2	2	Rekonstrukce vozovky - Průtah Štěchovicemi / přeložka vodovodní přípojky km 14,815-14,895, kolize s kabelem CETIN	0,00	158 202,22	158 202,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 202,22	158 202,22	158 202,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
103/3	3	Rekonstrukce vozovky - Průtah Štěchovicemi / odstranění žulových kostek	- 147 928,60	470 739,23	322 810,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 147 928,60	470 739,23	322 810,63	618 667,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
103/4	4	Rekonstrukce vozovky - Průtah Štěchovicemi / oprava objízdné trasy Masečín	0,00	514 671,37	514 671,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514 671,37	514 671,37	514 671,37	0,00	0,00%
103/5	5	Rekonstrukce vozovky - Průtah Štěchovicemi / kolize kabelů s kanalizací a novým profilem vozovky	0,00	1 072 447,19	1 072 447,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 072 447,19	1 072 447,19	1 072 447,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
102	6	Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice / zvýšené množství odstraňování křovin	- 62 553,68	2 301 662,61	2 239 108,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 62 553,68	2 301 662,61	2 239 108,93	2 364 216,29	0,00	0,00%
901	7	Provizorní most přes Kočábu / změna založení mostního provizoria	- 535 759,98	1 068 988,13	533 228,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 604 748,11	0,42%
207	8	Most ev.č.102-017 / Zajištění skalního svahu	0,00	728 985,00	728 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	728 985,00	728 985,00	728 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
207/2	9	Most ev.č.102-017 / odstranění vrstvy žulových kostek + podkladní vrstva pod OP1	0,00	75 186,27	75 186,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 186,27	75 186,27	75 186,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
102/2	10	Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice/ frézování a doplnění konstrukčních vrstev vozovky	0,00	43 669,94	43 669,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 669,94	43 669,94	43 669,94	0,00	0,00%
103/6	11	Rekonstrukce vozovky - průtah Štěchovicemi / předláždění chodníků, obruby, úprava plotové zídky u křižovatky Hlavní a Školní	0,00	671 285,54	671 285,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	671 285,54	671 285,54	671 285,54	0,00	0,00%
102/3	12	Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice / odvodňovací proužek	- 1 844 570,00	549 074,50	- 1 295 495,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 393 644,50	0,63%
102/4	13	Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice / Úprava svahu dlažbou z lomového kamene km 10,360-10,840 L.S.	0,00	5 693 724,53	5 693 724,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 693 724,53	5 693 724,53	5 693 724,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
253	14	Opěrné zdi - Davle - Štěchovice - vlevo / sanace základové spáry v založení SO 253, zeď č. 61 vlevo	0,00	277 190,48	277 190,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277 190,48	277 190,48	277 190,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
102/5	15	Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice / Km 13,200-13,700 svodidlo, krajnice, žulové kostky	0,00	881 187,01	881 187,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	881 187,01	881 187,01	881 187,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
334	16	Kanalizace ve Štěchovicích / zaslepení nefunkční dešťové kanalizace	0,00	587 837,86	587 837,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	587 837,86	587 837,86	587 837,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
102/6	17	Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice /Změna množství odfrézovaných vrstev AB	- 784 390,50	1 450 696,44	666 305,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 784 390,50	1 450 696,44	666 305,94	2 235 086,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
334/2	18	Kanalizace ve Štěchovicích / Kolize s kabelem ČEZ	0,00	39 769,75	39 769,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 769,75	39 769,75	39 769,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
204	19	Most ev.č. 102-012 / Změna spodní stavby, dobetonávky k původním opěrám	- 13 158,52	158 423,56	145 265,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 13 158,52	158 423,56	145 265,04	171 582,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
102/7	20	Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice / Úprava v kraji vozovky km 13,15-13,202 vlevo	0,00	210 681,35	210 681,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 681,35	210 681,35	210 681,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
102/8	21	Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice / Změna tloušťek AB vrstev	- 685 017,85	2 326 749,68	1 641 731,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 685 017,85	2 326 749,68	1 641 731,83	3 011 767,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
334/3	22	Kanalizace ve Štěchovicích / Štěrbinové žlaby, vpusti, žlaby	- 848 332,68	893 335,27	45 002,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 848 332,68	893 335,27	45 002,59	1 741 667,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102/9	23	Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice / Změna podkladní vrstvy	- 3 315 045,75	4 872 115,58	1 557 069,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 3 315 045,75	4 872 115,58	1 557 069,83	8 187 161,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103/7	24	Rekonstrukce vozovky - Průtah Štěchovicemi / Ochrana proti ostřiku	0,00	386 957,63	386 957,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386 957,63	386 957,63	386 957,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
253/2	25	Opěrné zdi - Davle - Štěchovice - vlevo / změna zatřídění hornin	- 11 482 675,35	4 065 440,24	- 7 417 235,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 11 482 675,35	4 065 440,24	-7 417 235,11	15 548 115,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102/10	26	Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice / zvýšené množství odstraňování křovin	0,00	893 825,06	893 825,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	893 825,06	893 825,06	893 825,06	0,00	0,00
102/11	27	Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice / lokální opravy CB desek	0,00	439 876,30	439 876,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439 876,30	439 876,30	439 876,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103/8	28	Rekonstrukce vozovky - Průtah Štěchovicemi / úpravy v km 14,915, 14,950 a 15,070	0,00	337 421,30	337 421,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337 421,30	337 421,30	337 421,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000/1	29	Vedlejší a ostatní náklady/ RDS vypracování změn	0,00	1 879 064,84	1 879 064,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 879 064,84	1 879 064,84	1 879 064,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
331/1	30	Přeložka kanalizace u mostu 102-012/ doplnění šoupátek	0,00	41 604,72	41 604,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 604,72	41 604,72	41 604,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332/1	31	Přeložka kanalizace u mostu 102-013 / doplnění šoupátek	0,00	41 604,72	41 604,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 604,72	41 604,72	41 604,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333/1	32	Přeložka kanalizace u mostu 102-014 / doplnění šoupátek	0,00	41 604,72	41 604,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 604,72	41 604,72	41 604,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341/1	33	Přeložka vodovodu u mostu 102-012 / doplnění šoupátek	- 13 643,95	26 030,02	12 386,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 13 643,95	26 030,02	12 386,07	39 673,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342/1	34	Přeložka vodovodu u mostu 102-013 / doplnění šoupátek	- 13 643,95	26 030,02	12 386,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 13 643,95	26 030,02	12 386,07	39 673,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

343/1	35	Přeložka vodovodu u mostu 102-014 / doplnění šoupátek	- 13 643,95	26 030,02	12 386,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 13 643,95	26 030,02	12 386,07	39 673,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
181.2/1	36	Přechodné dopravní značení / posunutí semaforu	0,00	64 020,50	64 020,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 020,50	64 020,50	64 020,50	0,00	0,00
102/12	37	Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice / lokální opravy CB desek SAL, zábradlí propustek	- 86 929,80	1 684 180,84	1 597 251,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 86 929,80	1 684 180,84	1 597 251,04	1 771 110,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102/13	38	Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice / betonová svodidla	0,00	1 530 172,61	1 530 172,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 530 172,61	1 530 172,61	1 530 172,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102/14	39	Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice / úprava svahu z lomového kamene	- 6 111 253,89	5 276 219,41	- 835 034,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 6 111 253,89	5 276 219,41	-835 034,48	11 387 473,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
253/3	40	Opěrné zdi - Davle - Štěchovice - vlevo / úprava římsy u OZ č. 71	0,00	272 560,35	272 560,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272 560,35	272 560,35	272 560,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102/15	41	Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice / frézování AB a CS vrstev	- 1 513 978,75	2 868 019,53	1 354 040,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 1 513 978,75	2 868 019,53	1 354 040,78	4 381 998,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102/16	42	Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice /úprava v km 11,780-12,440 vpravo	0,00	3 235 947,09	3 235 947,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 235 947,09	3 235 947,09	3 235 947,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102/17	43	Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice /Ocelové svodidlo,dlažba v	0,00	854 066,44	854 066,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	854 066,44	854 066,44	854 066,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Přehled dalších dokladů

Číslo ZBV:	**43**
Název a evidenční číslo stavby:	**II/102 hr. hl. města Prahy-Štěchovice, rekonstrukce. ETAPA II**
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	102/17

Doklad	**Součást dokumentace ZBV**	
	ANO (počet listů)	**NE - Uloženo**
07 Změnový soupis prací SO 102 po změně 43 pro ZBV 17	36	
08 Požadavek Městyse Davle	1	
09 Vyjádření AD č. 70 -demontáž ocelových svodidel	2	
10 Oznámení zhotovitele o nové skutečnosti	1	
11 Stanovisko KSÚSSK a pokyn ke zpracování ZBV	1	
12 Geodetický protokol - dlažba	5	
13 Geodetický protokol - demontáž svodidla	2	
14 Fotodokumentace - dlažby	1	
15 Zápis Ing. Klofáče do obch. Rejstříku	2	
16 Výpis z obch rejstříku - Ing. Bašár	6	
17 Stanovisko TDS k ZBV 43	1	
Počet listů celkem	58	

Změnový soupis prací SO 102 po změně 17 pro ZBV 43

Evidenční číslo a název stavby: II/102 hr. hl. města Prahy-Štěchovice, rekonstrukce. ETAPA II
Číslo a název SO/PS: SO 102 - Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice
Číslo a název rozpočtu: SO 102 - Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)
102
Celkem

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1		**Zemní práce**											
1	113106122	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z kamenných dlaždic	M2	50,000	150,900	100,900	91,95	4 597,50	0,00	9 277,76	13 875,26	9 277,76	201,80%
		Rozebrání dlažeb a dílců komunikací pro pěší, vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek komunikací pro pěší s ložem z kameniva nebo živice a s výplní spár z kamenných dlaždic nebo desek											
		SoD *100*0.5 stáv. odvodňov. proužek na ZÚ vpravo, odhad šířky 50 cm - vč. odstranění lože=50,000 [A]* *ZBV č. 15* *dle geodetického protokolu č. Š II 3/2022* *km 13,2-13,7 100,9=100,900 [A]*											
2	113106123	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší ze zámkových dlaždic	M2	60,000	60,000	0,000	91,95	5 517,00	0,00	0,00	5 517,00	0,00	0,00%
		Rozebrání dlažeb a dílců komunikací pro pěší, vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek komunikací pro pěší s ložem z kameniva nebo živice a s výplní spár ze zámkové dlažby											
		SoD *(20*0.5)+(100*0.5) chodník na KÚ 60 dlažba před KÚ vpravo - šířka cca 0,5 m z důvodu bourání vozovky 60 příp. rektifikace obrubníku, vč. lože=60,000 [A]*											
3	113107222	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 200 mm	M2	11 027,000	11 027,000	0,000	26,23	289 238,21	0,00	0,00	289 238,21	0,00	0,00%
		Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm											
		SoD *11027 bourání celk. konstrukce stáv. vozovky - štěrk s příměsí jemnozrnné zeminy - tl. 160 mm=11 027,000 [A]*											
4	113107230	Odstranění podkladu pl nad 200 m2 z betonu prostého tl 100 mm	M2	11 027,000	11 027,000	0,000	102,45	1 129 716,15	0,00	0,00	1 129 716,15	0,00	0,00%
		Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 z betonu prostého, o tl. vrstvy do 100 mm											
		SoD *11027 bourání celkové konstrukce stáv. vozovky - stabilizace cementem tl. 60 mm - odhad dle situace 11027 řezů=11 027,000 [A]*											
5	113154334	Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š 2 m pl do 10000 m2 bez překážek v trase	M2	27 731,600	13 881,100	-13 850,500	59,90	1 661 122,84	-835 778,71	6 133,74	831 477,87	-829 644,97	-49,94%
		Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 1 000 do 10 000 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 100 mm											
		SoD *13995 asf. beton v tl. 60 mm - odhad dle situace 13995 řezů=13 995,000 [A]* *2160 asf. beton tl. 100 mm - dle situace 13995 řezů v km 13,2 - 13,7 vlevo, vč. reprofilace příčného sklonu=2 160,000 [B]* *11027 asf.beton tl.60mm - bourání celkové konstrukce vozovky - dle situace 13995 řezů=11 027,000 [C]* *549.6 odfrézování nájezdových klínů=549,600 [D]* *Celkem: 13995+2160+11027+549.6=27 731,600 [E]* *ZBV ZBV č. 10* *dle zaměření tl. 40 mm 60,3=60,300 [A]* *dle zaměření tl. 60 mm 42,1=42,100 [B]* *A+B=102,400 [C]*											

Změnový soupis prací SO 102 po změně 17 pro ZBV 43

Evidenční číslo a název stavby: II/102 hr. hl. města Prahy-Štěchovice, rekonstrukce. ETAPA II
Číslo a název SO/PS: SO 102 - Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice
Číslo a název rozpočtu: SO 102 - Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)
102
Celkem

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
		ZBV č. 17 dle geodetických protokolů *km 12,822 - 12,846 vpravo protokol Š II 51/2021 prům. tl. 46 mm - bez odpočtu plochy 105,6 m2* *km 12,846 - 13,201 vpravo protokol Š II 51/2021 prům. tl. 162 mm - odpočet plochy -1530,8 m2=-1 530,800 [A]* *km 10,360 - 10,840 vpravo protokol Š II 63/2021 prům. tl. 128 mm - odpočet plochy -2374,1 m2=-2 374,100 [B]* *km 13,199 - 13,696 vlevo protokol Š II 88/2021 prům. tl. 133 mm - odpočet plochy -2272,6 m2=-2 272,600 [C]* *km 10,550 - 10,680 vlevo protokol Š II 32/2021 prům. tl. 129 mm - odpočet plochy -595,5 m2=- 595,500 [D]* *km 10,680 - 10,840 vlevo protokol Š II 32/2021 prům. tl. 99 mm - bez odpočtu plochy 790,4 m2* *km 10,360 - 10,550 vlevo protokol Š II 26/2021 prům. tl. 135 mm - odpočet plochy -851,1 m2=- 851,100 [E]* *km 12,820 - 13,200 vlevo protokol Š II 23/2021 prům. tl. 207 mm - odpočet plochy -1411,0 m2=-1 411,000 [F]* *km 12,820 - 13,200 vlevo protokol Š II 23/2021 prům. tl. 103 mm - odpočet plochy -190 m2=- 190,000 [G]* *km 12,820 - 13,200 vlevo protokol Š II 23/2021 prům. tl. 40 mm -bez odpočtu plochy 17 m2* *km 13,199 - 13,696 vpravo protokol Š II 101/2021 prům. tl. 89 mm - bez odpočtu plochy 2042,5 m2* *km 13,396 - 13,427 vpravo protokol Š II 101/2021 dodatečné dofrézování prům. tl. 62 mm - přípočet plochy 125,6 m2=125,600 [H]* *km 12,440 - 12,850 vlevo protokol D 8/2020 prům. tl. 186 mm - odpočet plochy -1654 m2=-1 654,000 [I]* *km 10,250 - 10,360 vpravo protokol D 6/2020 prům. tl. 40 mm - odpočet plochy -580,5 m2=- 580,500 [J]* *km 10,250 - 10,360 vlevo protokol D 3/2020 prům. tl. 100 mm - bez odpočtu plochy 595 m2* *km 12,440 - 12,720 vpravo protokol Š II 5/2022 prům. tl.140 mm - odpočet plochy -1302 m2=-1 302,000 [K]* *km 12,720 - 12,848 vpravo protokol Š II 5/2022 prům. tl.181 mm - odpočet plochy -459 m2=- 459,000 [L]* *A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L =-13 095,000 [M]*												
		ZBV č. 41 *geodetický protokol* *Š II 7/2022 km 9,999-10,117 vlevo prům. tl. 90 mm 765,5=765,500 [A]* *km 10,130-10,246 vlevo prům. tl. 90 mm 600,30=600,300 [B]* *prům. tl. 100 mm 577,10=577,100 [C]* *prům. tl. 100 mm 562,0=562,000 [D]* *Š II 37/2022 km 11,298-11,356 vlevo prům. tl. 98 mm 273,10=273,100 [E]* *Š II 2/2023 km 11,773-12,438 vlevo prům. tl. 178 mm 2*3012,30=6 024,600 [F]* *Š II 20/2023 km13,694-14,114 vpravo prům. tl. 63 mm 1463,80=1 463,800 [G]* *Š II 26/2023 km 14,130-14,429 vpravo prům. tl. 64 mm 1429,50=1 429,500 [H]* *Š II 36/2022 km 14,480-14,522 vlevo prům. tl. 104 mm 198,30=198,300 [I]* *Š II 37/2022 km 11,385-11,780 vlevo prům. tl. 102 mm 1637,8=1 637,800 [J]* *Š II 59/2022 km 14,424-14,580 vpravo prům. tl. 106 mm 137,00=137,000 [K]* *km 14,424-14,580 vpravo prům. tl. 103 mm 43,40=43,400 [L]* *12/2020 Masečím 317,50=317,500 [M]* *Š II 101/2021 -2*125,6=- 251,200 [N]* *odpočet původního množství a ZBV č. 17 množsttví -(27731,6-13095)=-14 636,600 [O]* *A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O=- 857,900 [Q]*												
6	113154335	Frézování živičného krytu tl 200 mm pruh š 2 m pl do 10000 m2 bez překážek v trase	M2	13 516,000	26 061,500	12 545,500	109,73	1 483 110,68	-74 078,72	1 450 696,47	2 859 728,43	1 376 617,75	92,82%
		Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 1 000 do 10 000 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 200 mm											
		SoD *5501+8015 asf. beton tl. 150 mm - bourání v místě změny příčného sklonu - odhad dle situace 13516 řezú=13 516,000 [A]* *ZBV č. 17 dle geodetických protokolů* *km 12,846 - 13,201 vpravo protokol Š II 51/2021 prům. tl. 162 mm 1530,8 m2=1 530,800 [A]* *km 10,360 - 10,840 vpravo protokol Š II 63/2021 prum. tl. 128 mm 2374,1 m2=2 374,100 [B]* *km 13,199 - 13,696 vlevo protokol Š II 88/2021 prum. tl. 133 mm 2272,6 m2=2 272,600 [C]* *km 10,550 - 10,680 vlevo protokol Š II 32/2021 prum. tl. 129 mm 595,5 m2=595,500 [D]* *km 10,360 - 10,550 vlevo protokol Š II 26/2021 prum. tl. 135 mm 851,1 m2=851,100 [E]* *km 12,820 - 13,200 vlevo protokol Š II 23/2021 prum. tl. 103 mm 190 m2=190,000 [F]* *km 12,440 - 12,850 vlevo protokol D 8/2020 prum. tl. 186 mm 1654 m2=1 654,000 [G]* *km 10,250 - 10,360 vpravo protokol D 6/2020 prum. tl. 140 mm 580,5 m2=580,500 [H]* *km 12,440 - 12,720 vpravo protokol Š II 5/2022 prum. tl.140 mm 1302 m2=1 302,000 [I]* *km 12,720 - 12,848 vpravo protokol Š II 5/2022 prum. tl.181 mm 459 m2=459,000 [J]* *km 12,820 - 13,200 vlevo protokol Š II 23/2021 prum. tl. 207 mm 1411,0 m2=1 411,000 [K]* *A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K=13 220,600 [L]*												

Změnový soupis prací SO 102 po změně 17 pro ZBV 43

Evidenční číslo a název stavby: II/102 hr. hl. města Prahy-Štěchovice, rekonstrukce. ETAPA II
Číslo a název SO/PS: SO 102 - Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice
Číslo a název rozpočtu: SO 102 - Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)
102
Celkem

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
		ZBV č. 41 *geodetický protokol* *D 8/2020 km 12,440-12,850 vlevo prům. tl. 200 mm 128,90=128,900 [A]* *Š 101/2021 km 13,199 - 13,696 vpravo tl. 151mm 125,60=125,600 [B]* *Š II 33/2022 km 14,220-14,580 vlevo prům. tl. 155 mm 1618,00=1 618,000 [C]* *Š II 52/2022 km11,278-11,357 vpravo prům. tl. 148 mm 281,10=281,100 [D]* *km11,357-11,381 vpravo prům. tl. 166 mm 137,60 =137,600 [E]* *km11,381-11,780 vpravo prům. tl. 189 mm 1958,90=1 958,900 [F]* *km 14,424-14,580 vpravo prům. tl. 174 mm 506,90=506,900 [G]* *Š II 19/2023 km 11,780-12,437 vpravo prům. tl. 182 mm 2501,20=2 501,200 [H]* *Š II 20/2023 km 13,788-13,934 vpravo prům. tl. 118 mm 299,40=299,400 [I]* *Š II 21/2023 km 13,788-13,934 vpravo prům. tl. 168 mm 2408,90 =2 408,900 [J]* *Š II 6/2022 km 13,695-14,224 vlevo prům. tl, 204 mm 2444,40=2 444,400 [K]* *Š II 33/2022 km 14,580-14,609 vlevo prům. tl. 220 mm 130,50=130,500 [L]* *Š II 37/2022 km 11,519-11,630 vlevo prům. tl. 224 mm 299,50=299,500 [M]* *A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M=12 840,900 [N]* *odpočet původního množství -13516=-13 516,000 [O]* *N+O=- 675,100 [P]*											
7	113155332	Frézování betonového krytu tl 40 mm pruh š 2 m pl do 10000 m2 bez překážek v trase	M2	13 995,000	5 151,720	-8 843,280	74,99	1 049 485,05	-663 157,57	0,00	386 327,48	-663 157,57	-63,19%
		Frézování betonového podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 1 000 do 10 000 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 40 mm											
		SoD *13995 odfrézování na požadovanou niveletu 13995 srovnání do příčného sklonu v místech jen frézování na tl. 60 mm=13 995,000 [A]*											
		ZBV č. 41 *geodetický protokol* *Š II26/2021 km 10,518-10548 vlevo prům. tl. 131 mm 77,10=77,100 [A]* *Š II 63/2021 km 10,580-10663 vpravo prům. tl. 39 mm 433,60=433,600 [B]* *Š II 7/2022 km 10,001-10,117 vlevo prům. tl. 220 mm 751,90=751,900 [C]* *km 10,190-10,234 vlevo prům. tl. 20 mm 158,80=158,800 [D]* *Š II 17/2022 km 10,130-10,192 vpravo prům. tl. 320 mm 307,00=307,000 [E]* *Š II 33/2022 km 14,220-14,480 vlevo prům. tl. 225 mm 1145,00=1 145,000 [F]* *km 14,522-14,570 vlevo prům. tl. 221 mm 225,60=225,600 [G]* *Š II 37/2022 km 11,519-11,630 vlevo prům. tl. 215 mm 299,5=299,500 [H]* *Š II 52/2022 km 11,357-11,381 vpravo prům. tl.40 mm 137,60=137,600 [I]* *Š II 59/2022 km 14,424-14,580 vpravo prům. tl. 224 mm 506,90=506,900 [J]* *Š II 21/2023 km 10,881-11,060 vlevo prům tl. 24 mm 862,50=862,500 [K]* *km 10,060-11,881vlevo prům tl. 25 mm 81,92=81,920 [L]* *Š II 87/2021 km10,520-10,587 vpravo prům. tl. 114 mm 97,90=97,900 [M]* *km 10,741-10,780 vpravo prům. tl. 224 mm 55,10=55,100 [N]* *km 10,748-10,754 vpravo prům. tl. 216 mm 11,30=11,300 [O]* *odpočet původního množství -13995,00=-13 995,000 [P]* *A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P=-8 843,280 [Q]*											
8	113155333	Frézování betonového krytu tl 50 mm pruh š 2 m pl do 10000 m2 bez překážek v trase	M2	11 027,000	2 730,600	-8 296,400	87,43	964 090,61	-725 354,25	0,00	238 736,36	-725 354,25	-75,24%
		Frézování betonového podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 1 000 do 10 000 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 50 mm											
		SoD *11027 bourání celkové konstrukce stáv. vozovky - CB konstrukce fréza v tl. 50 mm - odhad dle situace 11027 řezů=11 027,000 [A]*											
		ZBV č. 41 *geodetivký protokol* *D 3/2020 km 10,250-10,360 vlevo prům. tl. 250 mm 595=595,000 [A]* *D 8/2020 km 12,440-12,850 vlevo prům. tl. 250 mm 1654+228,70=1 882,700 [B]* *Š II 7/2022 km 10,190-10,324 vlevo prům. tl. 50 mm 252,90=252,900 [C]* *odpočet původního množství -11027,00=-11 027,000 [D]* *A+B+C+D=-8 296,400 [E]*											

Změnový soupis prací SO 102 po změně 17 pro ZBV 43													
Evidenční číslo a název stavby: II/102 hr. hl. města Prahy-Štěchovice, rekonstrukce. ETAPA II Číslo a název SO/PS: SO 102 - Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice Číslo a název rozpočtu: SO 102 - Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS) 102 Celkem					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
9	113155334	Frézování betonového krytu tl 100 mm pruh š 2 m pl do 10000 m2 bez překážek v trase	M2	22 029,000	42 028,500	19 999,500	166,82	3 674 877,78	0,00	3 336 316,59	7 011 194,37	3 336 316,59	90,79%
		Frézování betonového podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 1 000 do 10 000 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 100 mm											
		SoD *5501*2 bourání voz. v místě změny příčného sklonu - tl. CB konstrukce tl.200 mm - odhad dle situace 11002 řezů=11 002,000 [A]* *11027 bourání celkové konstrukce stáv. vozovky - tl. CB konstrukce 150 mm - fréza v tl. 100 mm - odhad dle situace 11002 řezů=11 027,000 [B]* *Celkem: 11002+11027=22 029,000 [C]*											
		ZBV č. 41 *geodetický protokol* *D 3/2020 km 10,250-10,360 vlevo prům. tl. 250 mm 2*595=1 190,000 [A]* *D 6/202 km 10,250-10,360 vpravo prům. tl. 100 mm 505,0=505,000 [B]* *D 8/2020 km 12,440-12,850 vlevo prům. tl. 250 mm 2*(1654,0+228,70)=3 765,400 [C]* *Š II23/2021 km12,820-13,200 vlevo prům. tl. 181 mm 2*1382,0=2 764,000 [D]* *Š II 26/2021 km 13,60-10,420 vlevo prům. tl. 292 mm 3*268,80=806,400 [E]* *Š II26/2021 km 10,518-10,548 vlevo prům. tl. 131 mm 77,10=77,100 [F]* *Š II 32/2021 km 10,360-10,680 vlevo prům. tl. 287 mm 3*1194,50=3 583,500 [G]* *km 10,780-10,840 vlevo prům. tl. 289 mm 3*299,60=898,800 [H]* *Š II 51/2021 km 12,917-12,930 vpravo prům. tl. 289 mm 3*57,50=172,500 [I]* *Š II 63/2021 km 10,663-10,680 vpravo prům. tl. 205 mm 2*80,10=160,200 [J]* *km 10,700-10,780 vpravo prům. tl. 88 mm 391=391,000 [K]* *Š II 6/2022 km 13,695-14,224 vpravo prům. tl. 298 mm 3*2418,50=7 255,500 [L]* *Š II 7/2022 km 10,001-10,117 vlevo prům. tl.220 mm 2* 751,90=1 503,800 [M]* *km 10,130-10,190 vlevo prům. tl. 300 mm 3*292,60=877,800 [N]* *km 10,190-10,234 vlevo prům. tl. 300 mm 3*107,00=321,000 [O]* *Š II 17/2022 km 10,020-10,117 vpravo prům. tl. 260 mm 3*537,90=1 613,700 [P]* *km 10,130-10,192 vpravo prům. tl. 320 mm 3*307,00=921,000 [Q]* *Š II 23/2022 km 10,192-10,246 vpravo prům. tl. 270 mm 3*252,90=758,700 [R]* *Š II 33/2022 km 14,220-14,480 vlevo prům. tl. 225 mm 2*1145,00=2 290,000 [S]* *km 14,522-14,570 vlevo prům. tl. 221 mm 2*225,60=451,200 [T]* *Š II 36/2022 km 14,480-14,522 vlevo prům. tl. 205 mm 2*198,40=396,800 [U]* *Š II 37/2022 km 11,519-11,630 vlevo prům. tl. 215 mm 2*299,5=599,000 [V]* *Š II 59/2022 km 14,424-14,580 vpravo prům. tl. 224 mm 2*506,90=1 013,800 [W]* *Š II 5/2023 km 11,779-11,970 vlevo prům. tl. 193 mm 2*396,10=792,200 [X]* *km 11,779-11,970 vlevo prům. tl. 195 mm 2*915,80=1 831,600 [Y]* *Š II 21/2023 km 10,840-10,881 vlevo prům tl. 196 mm 2* 203,60=407,200 [Z]* *km 10,881-11,060 vlevo prům tl. 195 mm 2*67,30=134,600 [AA]* *km 10,060-11,182 vlevo prům tl.194 mm 2*653,20 =1 306,400 [AB]*											
		Š II 87/2021 km10,520-10,587 vpravo prům. tl. 114 mm 97,90=97,900 [AC] *km 10,741-10,780 vpravo prům. tl. 224 mm 2* 55,10=110,200 [AD]* *km 10,748-10,754 vpravo prům. tl. 216 mm 2*11,30=22,600 [AE]* *odpočet fakturovaného množství -22021,8=-22 021,800 [AF]* *A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q+R+S+T+U+V+W+X+Y+Z+AA+AB+AC+AD+AE+AF=14 997,100*											
		ZBV č. 42 *dle geodetického protokolu Š II 14/2023* *km 11,780-12,437 tl. 170 mm 2* 2501,20=5 002,400 [A]*											
10	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	M	88,000	88,000	0,000	91,95	8 091,60	0,00	0,00	8 091,60	0,00	0,00%
		Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých											
		SoD *48+20+20=88,000 [A]*											

Změnový soupis prací SO 102 po změně 17 pro ZBV 43

Evidenční číslo a název stavby: II/102 hr. hl. města Prahy-Štěchovice, rekonstrukce. ETAPA II
Číslo a název SO/PS: SO 102 - Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice
Číslo a název rozpočtu: SO 102 - Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)
102
Celkem

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
11	122101103	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 1 a 2 objem do 5000 m3	M3	4 322,500	6 315,960	1 993,460	122,97	531 537,83	0,00	245 135,78	776 673,61	245 135,78	46,12%
		Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v horninách tř. 1 a 2 přes 1 000 do 5 000 m3											
		SoD *910*4.75 odkop poslední vrstvy vozovky 4322.5 podloží pod vozovkou pro úpravu typu B2 - délka dle sit. x plocha ze vzor.řezu=4 322,500 [A]* *ZBV č. 13* *Odkop svahu se svahovými stupni* *km 10,360 - 10,380 24 m3=24,000 [A]* *km 10,380 - 10,420 190,7 m3 - úprava s geomříží =190,700 [B]* *km 10,420 - 10,465 45 m3=45,000 [C]* *km 10,465 - 10,475 11,9 m3=11,900 [D]* *km 10,476 - 10,485 9,2 m3=9,200 [E]* *km 10,485 - 10,575 126,3 m3=126,300 [F]* *km 10,575 - 10,650 68,2 m3=68,200 [G]* *km 10,706 - 10,840 161,7 m3=161,700 [H]* *A+B+C+D+E+F+G+H=637,000 [I]* *ZBV č. 20* *odkop pro rozšíření vozovky km 13,150-13,210* *1,9*0,37*60,0=42,180 [A]*										
		ZBV č. 39 *geodetické protokoly* *Š II 33/2021 km 13,150-13,190 vlevo 89,90=89,900 [A]* *Š II 10/2022 km 10,140-10,250 vlevo 191,10=191,100 [B]* *Š II 12/2022 km 10,001-10,101 vlevo 112,90=112,900 [C]* *Š II 16/2022 km 10,103-10,140 vlevo 63,0+55,20-77=41,200 [D]* *Š II 27/2022 km 11,430-11,520 vlevo 191,60=191,600 [E]* *Š II 35/2022 km 11,220-11,430 vlevo 67,90+268,30=336,200 [F]* *Š II 43/2022 km 11,520-11663 vlevo 303,20=303,200 [G]* *Š II 45/2022 km 11,140-11,220 vlevo 187,80=187,800 [H]* *Š II 47/2022 km 11,671-11,780 vlevo 215,0=215,000 [I]* *Š II 53/2022 km 14,462-14,580 vlevo 249,30=249,300 [J]* *Š II 62/2022 km 11,056-11,140 vlevo 214,20=214,200 [K]* *Š II 65/2022 km 11,340-11,400 vlevo 47,0+160,30=207,300 [L]* *Š II 1/2023 km 10,840-10947 vlevo 188,7 =188,7 [V]* *Š II 4/2023 km 10,947-11,031 vlevo 165,60=165,600 [M]* *Š II 7/2023 km 11,976-12,440 vlevo 805,30=805,300 [N]* *Š II 8/2023 km 11,780-11,971 vlevo 231,10+1,70=232,800 [O]* *Š II 11/2023 km 14,410-14,460 vlevo 75,40+21,50=96,900 [P]* *Š II 13/2023 km 14,425 vlevo 22,40=22,400 [Q]* *Š II 16/2023 km 11,928-12,060 vpravo 279,50=279,500 [R]* *Š II 27/2023 km 11,733-11,832 vpravo 332,70=332,700 [S]* *(A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q+R+S+V)*0,25=1115,9 [T]*										
		ZBV č. 42 *geodetický protokol Š II 14/2023* *km 11,780-11,868 94,20=94,200 [A]* *km 11,881-11,909 23,50=23,500 [B]* *km 11,923-12,435 512,20=512,200 [C]* *(A+B+C)*0,25=157,475 [D]* *ZBV č. 43* *geodetický protokol Š II 37/2023 dlažba pro obec Davle* *(6,1+9,0+17,2+9,0+10,2+6,0+23,10+10,3)*0,45=40,905 [A]*										
12	122101403	Vykopávky v zemníku na suchu v hornině tř. 1 a 2 objem do 5000 m3	M3	1 701,750	1 701,750	0,000	84,05	143 032,09	0,00	0,00	143 032,09	0,00	0,00%
		Vykopávky v zemnících na suchu s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v horninách tř. 1 a 2 přes 1 000 do 5 000 m3											
		SoD *11345*0.15 potřeba ornice na ohumusování dle pol. 182301132 x tl. 15 cm=1 701,750 [A]*											

Změnový soupis prací SO 102 po změně 17 pro ZBV 43

Evidenční číslo a název stavby: II/102 hr. hl. města Prahy-Štěchovice, rekonstrukce. ETAPA II
Číslo a název SO/PS: SO 102 - Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice
Číslo a název rozpočtu: SO 102 - Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)
102
Celkem

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
13	122201103	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 5000 m3	M3	4 077,490	4 077,490	0,000	122,97	501 408,95	0,00	0,00	501 408,95	0,00	0,00%
		Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 přes 1 000 do 5 000 m3											
		SoD *5501*0.2 Písek hlinitý v místě změny příčného sklonu - odtěžení na požadovanou niveletu, srovnání do příčného sklonu 1100.2 přehutnění=1 100,200 [A]* *11027*0.27 Štěrk hlinitý tl. 270 mm - bourání vozovky komplet=2 977,290 [B]* *Celkem: 1100.2+2977.29=4 077,490 [C]*											
14	122201403	Vykopávky v zemníku na suchu v hornině tř. 3 objem do 5000 m3	M3	3 694,800	3 694,800	0,000	84,05	310 547,94	0,00	0,00	310 547,94	0,00	0,00%
		Vykopávky v zemnících na suchu s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 přes 1 000 do 5 000 m3											
		SoD *910*2.31 délka x plocha v řezu - dle pol. 564581111 - úprava typu B2=2 102,100 [A]* *1410 dle pol. 182201101 x hloubka 60 cm - vhodná zemina pro svahové stupně=1 410,000 [B]* *182.7 dle pol. 174101101 - obsyp propustku v km 12,925=182,700 [C]* *Celkem: 2102.1+1410+182.7=3 694,800 [D]*											
15	131203101	Hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3	M3	0,315	2,865	2,550	4 417,49	1 391,51	0,00	11 264,60	12 656,11	11 264,60	809,52%
		Hloubení zapažených i nezapažených jam ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 soudržných											
		SoD *5*(0.3*0.3*0.7) počet sloupků pro svislé DZ x odhad rozměrů jámy =0,315 [A]* *ZBV č. 37* *zábradlí propustek* *0,5*0,5*0,85*12=2,55*											
16	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	M3	15 023,840	17 689,390	2 665,550	504,88	7 585 236,34	0,00	1 345 782,88	8 931 019,22	1 345 782,88	17,74%
		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m											
		SoD *1701.75 dovoz ornice na ohumusování dle pol. 122101403=1 701,750 [A]* *4322.5 odvoz odkopané zeminy dle pol. 122101103=4 322,500 [B]* *2102.1 dovoz podsypu dle pol. 122201403 pro úpravu svahu typu B2=2 102,100 [C]* *4077.490 odvoz odkopaného hlinitého písku dle pol. 122201103=4 077,490 [D]* *2350*0.6*2 odvoz vykopané zeminy ze svahových stupňů dle pol. 182201101 x odhad hloubky 60cm - 1701.75* *dovoz vhodné zeminy pro zpětný zásyp stupňů=2 820,000 [E]* *Celkem: 1701.75+4322.5+2102.1+4077.49+2820=15 023,840 [F]* *ZBV č. 13* *dle pol. 122101103 637=637,000 [A]* *ZBV č. 20* *odvoz odkopané zeminydle pol. č. 122101103* *42,18=42,18 [A]* *ZBV č. 37* *zábradlí propustek* *0,5*0,5*0,85*12=2,55*											
		ZBV č. 39 *dle pol. č. 122101103 1115,9=1115,9 [A]* *111301111 4463,60*0,15=669,54 [B]* *A+B=1 785,44 [C]* *ZBV č. 42* *dle pol. č. 122101103* *157,475=157,475 [A]* *ZBV č. 43* *dle pol. č. 122101103 40,905=40,905 [A]*											

Změnový soupis prací SO 102 po změně 17 pro ZBV 43

Evidenční číslo a název stavby: II/102 hr. hl. města Prahy-Štěchovice, rekonstrukce. ETAPA II
Číslo a název SO/PS: SO 102 - Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice
Číslo a název rozpočtu: SO 102 - Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)
102
Celkem

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
17	171151222	Strmý svah vyztužením zeminy ocelovou sítí s kamenivem pohled svah přes 2 m do 4 m	M2	2 275,000	0,000	-2 275,000	1 323,12	3 010 098,00	-3 010 098,00	0,00	0,00	-3 010 098,00	-100,00%
		Strmý svah ze zemin vyztužených geosyntetiky s pohledovou plochou upraveného svahu ocelovou sítí vyplněnou kamenivem [RockWall], výšky přes 2 m do 4 m											
		SoD *910*2.5 délka x odhadnutá výška svahu - úprava typ B2=2 275,000 [A]*											
		ZBV č. 39 *odpočet neprovádělo se* *-2275,000=-2275,00*											
18	171201201	Uložení sypaniny na skládky	M3	10 725,990	13 391,540	2 665,550	16,70	179 124,03	0,00	44 514,69	223 638,72	44 514,69	24,85%
		Uložení sypaniny na skládky											
		SoD *4322.500 dle pol. 122101103=4 322,500 [A]* *4580*0.2 plocha krajnic x tl. - dle pol. 938909612=916,000 [B]* *4077.490 hlinitý písek - dle pol. 122201103=4 077,490 [C]* *2350*0.6 odvoz vykopané zeminy ze svahových stupňů dle pol. 182201101 x odhad hloubky 60cm=1 410,000 [D]* *Celkem: 4322.5+916+4077.49+1410=10 725,990 [E]* *ZBV č. 13* *dle pol. 122101103 637=637,000 [A]* *ZBV č. 20* *vykopaná zemina 42,18=42,18 [A]* *ZBV č. 37* *zábradlí propustek* *0,5*0,5*0,85*12=2,55* *ZBV č. 39* *dle pol. č. 1622701105 1785,44=1785,44 [A]* *ZBV č. 42* *dle pol. č. 162701105* *157,475=157,475 [A]* *ZBV č. 43* *dle pol. č. 162701105* *40,905=40,905 [A]*											

Změnový soupis prací SO 102 po změně 17 pro ZBV 43

Evidenční číslo a název stavby: II/102 hr. hl. města Prahy-Štěchovice, rekonstrukce. ETAPA II
Číslo a název SO/PS: SO 102 - Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice
Číslo a název rozpočtu: SO 102 - Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)
102
Celkem

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
19	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	T	22 695,246	27 763,882	5 068,636	138,17	3 135 802,14	0,00	700 333,44	3 836 135,58	700 333,44	22,33%
		Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)											
		SoD *4322.5*1.9 výkop dle pol. 171201201 x koef. přepočtu na tuny=8 212,750 [A]* *2494.356 z čištění příkopů, vpustí 8212.75 propustků dle pol. 997221551a=2 494,356 [B]* *1154.16 ze sejmutí nánosů na krajnicích dle pol. 938909612=1 154,160 [C]* *4077.49*2.0 dle pol. 122201103 x koef. přepočtu na tuny=8 154,980 [D]* *1410*1.9 odvoz vykopané zeminy ze svahových stupňů dle pol. 171201201 x koef. přepočtu na tuny=2 679,000 [E]* *Celkem: 8212.75+2494.356+1154.16+8154.98+2679=22 695,246 [F]* *ZBV č. 13* *dle pol. 122101103 637*1,9=1 210,300 [A]* *ZBV č. 20* *odkopaná zemina 42,18*1,9=80,142 [A]* *ZBV č. 37* *zábradlí propustek* *0,5*0,5*0,85*12*1,9=4,845* *ZBV č. 39* *dle pol. č. 171201201 1785,44*1,9=3 392,336 [A]* *ZBV č. 42* *dle pol. č. 171201201* *157,475*1,9=299,203 [A]* *ZBV č. 43* *dle pol. č. 171201201* *40,905*1,9=81,81 [A]*											
20	171201211a	Poplatek za zemník	T	10 481,925	10 481,925	0,000	23,03	241 398,73	0,00	0,00	241 398,73	0,00	0,00%
		Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)											
		SoD *1701.75*1.9 dle pol. 122101402 x koef. 1,9 pro přepočet na tuny=3 233,325 [A]* *2102.1*2.0 dle pol. 122201403 x koef.2,0 pro přepočet na tuny=4 204,200 [B]* *1410*1.9 dle pol. 182201101 x hloubka 60 cm - vhodná zemina pro svahové stupně=2 679,000 [C]* *182.7*2.0 dle pol. 174101101 - obsyp propustku v km 12,925=365,400 [D]* *Celkem: 3233.325+4204.2+2679+365.4=10 481,925 [E]*											
21	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	M3	182,700	182,700	0,000	254,57	46 509,94	0,00	0,00	46 509,94	0,00	0,00%
		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách											
		SoD *14.5*(5.3*2+2.0) délka x plocha v řezu - obsyp propustku v km 12,925=182,700 [A]*											

Změnový soupis prací SO 102 po změně 17 pro ZBV 43

Evidenční číslo a název stavby: II/102 hr. hl. města Prahy-Štěchovice, rekonstrukce. ETAPA II
Číslo a název SO/PS: SO 102 - Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice
Číslo a název rozpočtu: SO 102 - Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)
102
Celkem

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
22	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	M2	11 027,000	12 217,200	1 190,200	33,80	372 712,60	0,00	40 228,76	412 941,36	40 228,76	2,25%
		Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním											
		ZBV č. 15 *dle geodetického protokolu č. Š II 3/2022* *km 13,2-13,7* *žlaby 69,4=69,400 [A]* *žulové kostky 100,9=100,900 [B]* *A+B=170,300 [C]* *ZBV č. 20* *1,9*60=114,00 [A]* *ZBV ZBV č. 27* *geodetický protokol Š II 51/2022 92,2 m2=92,200 [A]* *geodetický protokol Š II 58/2022 183,8 m2 =183,800 [B]* *A+B=276,000 [C]*											
		ZBV č. 42 *geodetický protokol Š II 14/2023* *km 11,780-11,868 94,20=94,200 [A]* *km 11,881-11,909 23,50=23,500 [B]* *km 11,923-12,435 512,20=512,200 [C]* *A+B+C=629,900 [D]*											
23	182201101	Svahování násypů	M2	2 350,000	7 944,300	5 594,300	43,01	101 073,50	0,00	240 610,84	341 684,34	240 610,84	36,22%
		Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním výkopku při svahování násypů v jakékoliv hornině											
		SoD *(420+50)*5 zřízení svahových stupňů v km 11,720 - 12,140 2350 v km 12,030 - 12,080 - délka x odhad prům.šířky ve svahu=2 350,000 [A]* *ZBV č. 13* *dle geodetického zaměření* *km 10,360 - 10,422 111,9 m2=111,900 [A]* *km 10,422 - 10,454 48,7 m2=48,700 [B]* *km 10,455 - 10,476 44,9 m2 =44,900 [C]* *km 10,480 - 10,654 369,6 m2=369,600 [D]* *km 10,706 - 10,730 41,4 m2=41,400 [E]* *km 10,730 - 10,840 234,7 m2=234,700 [F]* *A+B+C+D+E+F=851,200 [G]*											
		ZBV č. 39 *geodetické protokoly* *Š II 33/2021 km 13,150-13,190 vlevo 89,90=89,900 [A]* *Š II 10/2022 km 10,140-10,250 vlevo 191,10=191,100 [B]* *Š II 12/2022 km 10,001-10,101 vlevo 112,90=112,900 [C]* *Š II 16/2022 km 10,103-10,140 vlevo 63,0+55,20-77=41,200 [D]* *Š II 27/2022 km 11,430-11,520 vlevo 191,60=191,600 [E]* *Š II 35/2022 km 11,220-11,430 vlevo 67,90+268,30=336,200 [F]* *Š II 43/2022 km 11,520-11663 vlevo 303,20=303,200 [G]* *Š II 45/2022 km 11,140-11,220 vlevo 187,80=187,800 [H]* *Š II 47/2022 km 11,671-11,780 vlevo 215,0=215,000 [I]* *Š II 53/2022 km 14,462-14,580 vlevo 249,30=249,300 [J]* *Š II 62/2022 km 11,056-11,140 vlevo 214,20=214,200 [K]* *Š II 65/2022 km 11,340-11,400 vlevo 47,0+160,30=207,300 [L]* *Š II 1/2023 km 10,840-10947 vlevo 188,7 =188,7 [V]* *Š II 4/2023 km 10,947-11,031 vlevo 165,60=165,600 [M]* *Š II 7/2023 km 11,976-12,440 vlevo 805,30=805,300 [N]* *Š II 8/2023 km 11,780-11,971 vlevo 231,10+1,70=232,800 [O]* *Š II 11/2023 km 14,410-14,460 vlevo 75,40+21,50=96,900 [P]* *Š II 13/2023 km 14,425 vlevo 22,40=22,400 [Q]* *Š II 16/2023 km 11,928-12,060 vpravo 279,50=279,500 [R]* *Š II 27/2023 km 11,733-11,832 vpravo 332,70=332,700 [S]* *celkem A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q+R+S+V=4463,60 [U]*											

Změnový soupis prací SO 102 po změně 17 pro ZBV 43

Evidenční číslo a název stavby: II/102 hr. hl. města Prahy-Štěchovice, rekonstrukce. ETAPA II
Číslo a název SO/PS: SO 102 - Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice
Číslo a název rozpočtu: SO 102 - Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)
102
Celkem

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
		ZBV č. 42 *geodetický protokol Š II 16/2023* *km 11,928-12,060 279,50=279,500 [A]*											
24	182301132	Rozprostření ornice pl přes 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 150 mm	M2	11 345,000	80,110	-11 264,890	36,89	418 517,05	-415 561,78	0,00	2 955,27	-415 561,78	-99,29%
		Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy přes 100 do 150 mm											
		SoD *490*5.0 délka dle situace x odhad šířky - úprava svahu typu 2450=2 450,000 [A]* *910*3.0*2 délka dle situace x odhad šířky x na obou stranách - úprava svahu typu B2=5 460,000 [B]* *4580*1.5*0.5 délka trasy x odhadnutá šířka ohumusování x odhad 50 %=3 435,000 [C]* *Celkem: 2450+5460+3435=11 345,000 [D* *ZBV č. 39* *odpočet, neprovádělo se* *-11264,89=-11 264,890 [A]*											
25	183405211	Výsev trávníku hydroosevem na ornici	M2	11 345,000	11 345,000	0,000	20,49	232 459,05	0,00	0,00	232 459,05	0,00	0,00%
26	005724740	osivo směs travní krajinná - svahová	KG	283,625	283,625	0,000	155,44	44 086,67	0,00	0,00	44 086,67	0,00	0,00%
27	184802631	Chemické odplevelení po založení kultury postřikem na široko ve svahu do 1:1	M2	11 345,000	11 345,000	0,000	4,26	48 329,70	0,00	0,00	48 329,70	0,00	0,00%
		Chemické odplevelení po založení kultury na svahu přes 1:2 do 1:1 postřikem na široko											
28	185803113	Ošetření trávníku shrabáním ve svahu do 1:1	M2	11 345,000	11 345,000	0,000	4,61	52 300,45	0,00	0,00	52 300,45	0,00	0,00%
		Ošetření trávníku jednorázové na svahu přes 1:2 do 1:1											
29	185804312	Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2	M3	340,350	340,350	0,000	556,12	189 275,44	0,00	0,00	189 275,44	0,00	0,00%
		Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2											
		SoD *11345.000*0.01*3=340,350 [A]*											
	2	**Zakládání**											
30	213221111	Ochranná vrstva na základové spáře z bet. prost. se zvýš. nároky na prostředí C 25/30 tl do 150 mm	M3	16,530	16,530	0,000	3 321,98	54 912,33	0,00	0,00	54 912,33	0,00	0,00%
		Ochranná vrstva na základové spáře z prostého betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30 tl. do 150 mm											
		SoD *1.7*3.0*0.30 Betonové lože C25/30-XF3 pod stupně z lomového kamene u propustku v km 12,925=1,530 [A]* *2.5*20.0*0.3 betonové lože C25/30-XF3 pod propustkem=15,000 [B]* *Celkem: 1.53+15=16,530 [C]*											
	4	**Vodorovné konstrukce**											
31	451317777	Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu 1:5 z betonu prostého tl do 100 mm	M2	5 223,400	5 430,800	207,400	581,54	3 037 616,04	-441 854,09	562 465,49	3 158 227,44	120 611,40	3,97%
		Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5, tloušťky od 50 do 100 mm z betonu prostého											
		ZBV č. 13 dle geoetického zaměření Š II 37/2021 km 10,360 - 10,422 111,9 m2=111,900 [A] Š II 30/2021 km 10,422 - 10,454 48,7 m2=48,700 [B] Š II 34/2021 km 10,455 - 10,476 44,9 m2 =44,900 [C] Š II 30/2021 km 10,480 - 10,654 369,6 m2=369,600 [D] Š II 30/2021 km 10,706 - 10,730 41,4 m2=41,400 [E] Š II 38/2021 km 10,730 - 10,840 234,7 m2=234,700 [F] A+B+C+D+E+F=851,200 [G]											

Změnový soupis prací SO 102 po změně 17 pro ZBV 43

Evidenční číslo a název stavby: II/102 hr. hl. města Prahy-Štěchovice, rekonstrukce. ETAPA II
Číslo a název SO/PS: SO 102 - Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice
Číslo a název rozpočtu: SO 102 - Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)
102
Celkem

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
		ZBV č. 39 geodetické protokoly Š II 33/2021 km 13,150-13,190 vlevo 89,90=89,900 [A] Š II 10/2022 km 10,140-10,250 vlevo 191,10=191,100 [B] Š II 12/2022 km 10,001-10,101 vlevo 112,90=112,900 [C] Š II 16/2022 km 10,103-10,140 vlevo 63,0+55,20-77=41,200 [D] Š II 27/2022 km 11,430-11,520 vlevo 191,60=191,600 [E] Š II 35/2022 km 11,220-11,430 vlevo 67,90+268,30=336,200 [F] Š II 43/2022 km 11,520-11663 vlevo 303,20=303,200 [G] Š II 45/2022 km 11,140-11,220 vlevo 187,80=187,800 [H] Š II 47/2022 km 11,671-11,780 vlevo 215,0=215,000 [I] Š II 53/2022 km 14,462-14,580 vlevo 249,30=249,300 [J] Š II 62/2022 km 11,056-11,140 vlevo 214,20=214,200 [K] Š II 65/2022 km 11,340-11,400 vlevo 47,0+160,30=207,300 [L] Š II 1/2023 km 10,840-10947 vlevo 188,7=188,700 [M] Š II 4/2023 km 10,947-11,031 vlevo 165,60=165,600 [N] Š II 7/2023 km 11,976-12,440 vlevo 805,30=805,300 [O] Š II 8/2023 km 11,780-11,971 vlevo 231,10+1,70=232,800 [P] Š II 11/2023 km 14,410-14,460 vlevo 75,40+21,50=96,900 [Q] Š II 13/2023 km 14,425 vlevo 22,40=22,400 [R] Š II 16/2023 km 11,928-12,060 vpravo 279,5=279,500 [S] Š II 27/2023 km 11,733-11,832 vpravo 332,70=332,700 [T] celkem A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q+R+S+T=4 463,600 [U] odpočet původního množství -5223,4=-5 223,400 [V] celkem U+V=- 759,800 [W]											
		ZBV č. 42 geodetický protokol Š II 34/2023 km 11,904-11,930 25,10=25,100 [A]											
		ZBV č. 43 geodetický protokol Š II 37/2023 dlažba pro obec Davle km 10,474 vlevo 6,1=6,100 [A] km 10,590 vpravo 9,0=9,000 [B] km 10,675-10,690 vpravo17,2 =17,200 [C] km 11,049 vlevo 9,0=9,000 [D] km 11,082 vpravo 10,2=10,200 [E] km 11,166 vlevo 6,0=6,000 [F] km 11,255-11,286 vlevo 23,10=23,100 [G] km 11,666-11,673 vlevo 10,3=10,300 [H] A+B+C+D+E+F+G+H=90,900 [I]											
32	452318510	Zajišťovací práh z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí	M3	9,950	9,950	0,000	8 203,04	81 620,25	0,00	0,00	81 620,25	0,00	0,00%
		Zajišťovací práh z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí na dně a ve svahu melioračních kanálů s patkami nebo bez patek											
		SoD *(0.5*0.8*2.5)*2+(0.3*0.8*2.5)*2+(0.5*1.8*2.5)*3 =9,950 [A]*											
33	464511111	Pohoz z lomového kamene neupraveného tříděného z terénu	M3	3,000	0,000	-3,000	3 481,56	10 444,68	-10 444,68	0,00	0,00	-10 444,68	-100,00%
		Pohoz dna nebo svahů jakékoliv tloušťky z lomového kamene neupraveného tříděného z terénu											
		SoD *5.0*3.0*0.2 Zpevnění dna toku pohozeným lomovým kamenem =3,000 [A]*											
		ZBV č. 39 *odpočet neprovádělo se* *-3,00=-3,00*											
	5	**Komunikace pozemní**											
34	564251111	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 150 mm	M2	63,750	63,750	0,000	152,90	9 747,38	0,00	0,00	9 747,38	0,00	0,00%
		Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP s rozprostřením, vlhčením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm											
		SoD *(0.5*2.5)*5+(0.3*2.5)*2 podsyp pod betonové prahy=7,750 [A]* *20.0*2.8 ŠP podsyp od propustkem=56,000 [B]* *Celkem: 7.75+56=63,750 [C]*											
35	564581111	Zřízení podsypu nebo podkladu ze spaniny tl 300 mm	M2	6 552,000	6 552,000	0,000	154,21	1 010 383,92	0,00	0,00	1 010 383,92	0,00	0,00%
		Zřízení podsypu nebo podkladu ze spaniny s rozprostřením, vlhčením, a zhutněním, po zhutnění tl. 300 mm											
		SoD *(910*3.6)*2 délka x šířka x dvakrát do tl. 600mm - úprava typu B2=6 552,000 [A]*											

Změnový soupis prací SO 102 po změně 17 pro ZBV 43

Evidenční číslo a název stavby: II/102 hr. hl. města Prahy-Štěchovice, rekonstrukce. ETAPA II
Číslo a název SO/PS: SO 102 - Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice
Číslo a název rozpočtu: SO 102 - Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)
102
Celkem

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
36	564861113	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 220 mm	M2	17 520,100	17 910,100	390,000	215,26	3 771 376,73	0,00	83 951,40	3 855 328,13	83 951,40	2,23%
		Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 220 mm											
		SoD *11027*1.3 výměna celé konstrukce vozovky=14 335,100 [A]* *910*3.5 délka x šířka - úprava svahu typu B2=3 185,000 [B]* *Celkem: 14335.1+3185=17 520,100 [C]* *ZBV č. 20* *podklad ze ŠD v rozšíření* *1,9*60=114,00 [A]* *ZBV ZBV č. 27* *geodetický protokol Š II 51/2022 92,2 m2=92,200 [A]* *geodetický protokol Š II 58/2022 183,8 m2 =183,800 [B]* *A+B=276,000 [C]*											
37	564871111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm	M2	3 731,000	4 360,900	629,900	298,95	1 115 382,45	0,00	188 308,61	1 303 691,06	188 308,61	16,88%
		Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 250 mm											
		SoD *910*4.1 délka x šířka - polštář ze ŠD v min.tl.0,25m - úprava typu B2=3 731,000 [A]* *ZBV č. 42* *geodetický protokol Š II 14/2023 - rozšíření vozovky* *km 11,780-11,868 94,20=94,200 [A]* *km 11,881-11,909 23,50=23,500 [B]* *km 11,923-12,435 512,20=512,200 [C]* *A+B+C=629,900 [D]*											
38	564951413R	Recyklovaná směs (v mísícím centru) RS 0/32 C3/4 CA (TP 208), tl. 150 mm	M2	19 007,200	0,000	-19 007,200	174,41	3 315 045,75	-3 315 045,75	0,00	0,00	-3 315 045,75	-100,00%
		Podklad nebo podsyp z asfaltového recyklátu s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm											
		SoD *11027*1.15 výměna celé konstrukce vozovky=12 681,050 [A]* *5501*1.15 změna příčného sklonu=6 326,150 [B]* *Celkem: 12681.05+6326.15=19 007,200 [C]*											
		ZBV č. 23 *odpočet původního množství -19 007,20* *nahrazeno novou položkou č. 151*											

Změnový soupis prací SO 102 po změně 17 pro ZBV 43

Evidenční číslo a název stavby: II/102 hr. hl. města Prahy-Štěchovice, rekonstrukce. ETAPA II
Číslo a název SO/PS: SO 102 - Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice
Číslo a název rozpočtu: SO 102 - Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)
102
Celkem

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
39	565125000R	Asfaltová vrstva se zvýšenou odolností proti šíření trhlin SAL tl. 30 mm	M2	13 995,000	20 155,500	6 160,500	246,93	3 455 785,35	0,00	1 521 212,27	4 976 997,62	1 521 212,27	44,02%
		Asfaltová vrstva se zvýšenou odolností proti šíření trhlin SAL tl. 30 mm											
		SoD *13995 frézování v tl. 60mm=13 995,000 [A]* *ZBV č. 37* *vrstva SAL* *Geodetický protokol* *D 6/2020 505,00=505,000 [A]* *D 13/2020 1873,00=1 873,000 [B]* *Š II 60/2021 450,00=450,000 [C]* *Š II 78/2021 1562,30=1 562,300 [D]* *Š II 100/2021 2203,30=2 203,300 [E]* *Š II 15/2022 251,90=251,900 [F]* *Š II 49/2022 2175,00=2 175,000 [G]* *Š II 63/2022 143,30=143,300 [H]* *Š II 66/2022 1957,40=1 957,400 [I]* *Š II 10/2023 2982,70=2 982,700 [J]* *Š II 22/2023 827,40+467,80=1 295,200 [K]* *Š II 23/2023 1859,90=1 859,900 [L]* *Š II 25/2023 1414,50=1 414,500 [M]* *Š II 30/2023 1482,00=1 482,000 [N]* *odpočet původního množství -13995,00=-13 995,000 [O]* *Celkem A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O=6 160,500 [P]*										
40	565135111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š do 3 m	M2	18 180,800	18 882,900	702,100	235,41	4 279 942,13	0,00	165 281,36	4 445 223,49	165 281,36	3,86%
		Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm											
		SoD *11027*1.1 výměna celé konstrukce vozovky=12 129,700 [A]* *5501*1.1 frézování v tl. 150 mm - změna příčného sklonu=6 051,100 [B]* *Celkem: 12129.7+6051.1=18 180,800 [C]* *ZBV ZBV č. 12* *náhrada odvodňovacího proužku v místě nové opěrné zdi1300*0,5=650,000 [A]* *ZBV č. 21* *protokol Š II 100/2021 km 10,360-10,841 vpravo* *vrstva navíc 52,1=52,100 [A]*										
41	569851111	Zpevnění krajnic štěrkodrtí (recyklát) tl 150 mm	M2	3 435,000	3 435,000	0,000	402,88	1 383 892,80	0,00	0,00	1 383 892,80	0,00	0,00%
		Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění štěrkodrtí tl. 150 mm											
		SoD *4580*0.5*2*0.75 délka x šířka x obě strany - odhad 75%=3 435,000 [A]*											
130	572241112	Vyspravení výtluků asfaltovým betonem ACO (AB) tl do 60 mm při vyspravované ploše do 10% na 1 km	M2	2 034,900	2 034,900	0,000	362,06	736 755,89	0,00	0,00	736 755,89	0,00	0,00%
		Vyspravení výtluků materiálem na bázi asfaltu s řezáním, vysekáním, očištěním, zaplněním směsí a zhutněním asfaltovým betonem ACO (AB) při vyspravované ploše na 1 km komunikace do 10 % tl. přes 40 do 60 mm											
		SoD *(11027+13995+2160+5501+8015)*0.05 5% z plochy obrusné vrstvy=2 034,900 [A]*											
42	572531131	Oprava trhlin asfaltovou sanační hmotou š do 40 mm	M	6 674,400	6 674,400	0,000	128,96	860 730,62	0,00	0,00	860 730,62	0,00	0,00%
		Vyspravení trhlin dosavadního krytu asfaltovou sanační hmotou oprava trhlin šířky přes 30 do 40 mm											
		SoD *21600*1.03*0.3=6 674,400 [A]*											
43	573191111	Nátěr infiltrační kationaktivní v množství emulzí 1 kg/m2	M2	38 153,750	38 803,750	650,000	28,06	1 070 594,23	0,00	18 239,00	1 088 833,23	18 239,00	1,70%
		Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1,00 kg/m2											
		SoD *11027*1.25 výměna celé konstrukce vozovky=13 783,750 [A]* *13995*1.25 frézování v tl. 60mm=17 493,750 [B]* *5501*1.25 frézování v tl. 150 mm při změně příčného sklonu=6 876,250 [C]* *Celkem: 13783.75+17493.75+6876.25=38 153,750 [D]* *ZBV ZBV č. 12* *náhrada odvodňovacího proužku v místě nové opěrné zdi1300*0,5=650,000 [A]*										

Změnový soupis prací SO 102 po změně 17 pro ZBV 43

Evidenční číslo a název stavby: II/102 hr. hl. města Prahy-Štěchovice, rekonstrukce. ETAPA II
Číslo a název SO/PS: SO 102 - Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice
Číslo a název rozpočtu: SO 102 - Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)
102
Celkem

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
44	573231106	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze modif v množství 0,30 kg/m2	M2	40 367,809	47 238,609	6 870,800	12,24	494 101,98	0,00	84 098,59	578 200,57	84 098,59	17,02%
		Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,30 kg/m2											
		ZBV ZBV č. 10 *60,3 dle zaměření =60,300 [A]* *ZBV ZBV č. 12* *náhrada odvodňovacího proužku v místě nové opěrné zdi1300*0,5=650,000 [A]*											
		ZBV č. 37 *vrstva SAL* *dle pol. č. 565125000R* *6160,50 m2*											
45	573231113R	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze modif v množství 1,20 kg/m2	M2	41 348,000	41 554,400	206,400	30,47	1 259 873,56	0,00	6 289,01	1 266 162,57	6 289,01	0,50%
		Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,80 kg/m2											
		SoD *11027 výměna celé konstrukce vozovky=11 027,000 [A]* *1300*0.5 v odvodňovacím proužku v místě nové opěrné zdi=650,000 [B]* *13995 frézování v tl. 60mm=13 995,000 [C]* *2160 frézování tl. 100 mm=2 160,000 [D]* *5501+8015 frézování v tl. 150 mm=13 516,000 [E]* *Celkem: 11027+650+13995+2160+13516=41 348,000 [F]* *ZBV ZBV č. 10* *42,1 dle zaměření =42,100 [A]* *ZBV č. 21* *protokol Š II 100/21 km 10,360 -10,841 vpravo* *ACL 16 vyrovnávka tl. 60 mm.....164,3 m2 - přípočet (vrstva navíc)* *164,30=164,300 [A]*											
46	577134131	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu	M2	40 698,000	41 408,300	710,300	241,37	9 823 276,26	0,00	171 445,11	9 994 721,37	171 445,11	1,75%
		Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 40 mm											
		SoD *11027 výměna celé konstrukce vozovky=11 027,000 [A]* *13995 frézování v tl. 60mm=13 995,000 [B]* *2160 frézování tl. 100 mm=2 160,000 [C]* *5501+8015 frézování v tl. 150 mm 11027 při změně příčného sklonu=13 516,000 [D]* *Celkem: 11027+13995+2160+13516=40 698,000 [E]* *ZBV ZBV č. 10* *60,3 dle zaměření =60,300 [A]* *ZBV ZBV č. 12* *náhrada odvodňovacího proužku v místě nové opěrné zdi1300*0,5=650,000 [A]*											

Změnový soupis prací SO 102 po změně 17 pro ZBV 43													
Evidenční číslo a název stavby: II/102 hr. hl. města Prahy-Štěchovice, rekonstrukce. ETAPA II Číslo a název SO/PS: SO 102 - Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice Číslo a název rozpočtu: SO 102 - Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS) 102 Celkem					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
47	577155132	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu	M2	44 402,580	43 003,980	-1 398,600	327,65	14 548 505,34	-685 017,86	226 766,57	14 090 254,05	-458 251,29	-3,15%
		Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 60 mm											
		SoD *11027*1.01 výměna celé konstrukce vozovky=11 137,270 [A]* *13995*1.01 frézování v tl. 60mm=14 134,950 [B]* *2160*1.01 frézování tl. 100 mm=2 181,600 [C]* *(5501+8015)*1.01 frézování v tl. 150 mm 11137.27 při změně příčného sklonu=13 651,160 [D]* *(4580*0.40)*1.5 vyrovnávací vrstva - odhad 40 % délky x šířka=2 748,000 [E]* *183.2*3 délka příčné spáry x délka klínu=549,600 [F]* *Celkem: 11137.27+14134.95+2181.6+13651.16+2748+549.6=44 402,580 [G]* *ZBV ZBV č. 10* *42,1 dle zaměření =42,100 [A]* *ZBV ZBV č. 12* *náhrada odvodňovacího proužku v místě nové opěrné zdi1300*0,5=650,000 [A]* *ZBV č. 21* *protokol Š II 89/21 km 13,199 - 13,696 vlevo* *ACL 16 modif. prům tl. 84,1 mm -2255=-2 255,000 [A]* *protokol Š II 100/2021 km 10,360 -10,841 vpravo* *ACL 16 vyrovnávka tl. 60 mm (vrstva navíc) 164,3=164,300 [B]* *A+B=-2 090,700 [C]*											
48	578133131	Litý asfalt MA 11 IV tl 30 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu	M2	3 250,000	0,000	-3 250,000	518,12	1 683 890,00	-1 683 890,00	0,00	0,00	-1 683 890,00	-100,00%
		Litý asfalt MA 11 (LAS) s rozprostřením z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tl. 30 mm											
		SoD *1300*0.5*5 v odvodňovacím proužku v místě nové opěrné zdi x počet vrstev pro dosažení tl. 60+90=150mm=3 250,000 [A]* *ZBV ZBV č. 12* *odpočet dle SOD - proužek nahrazen konstrukčními vrstvami přilehlé vozovky - 3 250*											
49	594511111	Dlažba z lomového kamene s provedením lože z betonu	M2	5 226,400	5 430,800	204,400	2 927,76	15 301 644,86	-2 233 295,33	2 831 729,47	15 900 079,00	598 434,14	3,91%
		Dlažba nebo přídlažba z lomového kamene lomařsky upraveného rigolového v ploše vodorovné nebo ve sklonu tl. do 250 mm, bez vyplnění spár, s provedením lože tl. 50 mm z betonu											
		SoD *(2*4.5)+(4*3)+(4*1.7*3.0) odláždění šikmých čel u propustku v km 12,925 41.4 zpevnění stupňů u propustku =41,400 [A]* *970*3.0 odláždění svahu - úprava typu B1 - odhad prům.šířky=2 910,000 [B]* *910*2.5 obložení povrchu svahu s obalovanými čely - úprava typu B2 - odhad prům.šířky=2 275,000 [C]* *Celkem: 41.4+2910+2275=5 226,400 [D]* *ZBV č. 13* *dle geoetického zaměření* *Š II 37/2021 km 10,360 - 10,422 111,9 m2=111,900 [A]* *Š II 30/2021 km 10,422 - 10,454 48,7 m2=48,700 [B]* *Š II 34/2021 km 10,455 - 10,476 44,9 m2 =44,900 [C]* *Š II 30/2021 km 10,480 - 10,654 369,6 m2=369,600 [D]* *Š II 30/2021 km 10,706 - 10,730 41,4 m2=41,400 [E]* *Š II 38/2021 km 10,730 - 10,840 234,7 m2=234,700 [F]* *A+B+C+D+E+F=851,200 [G]*											

Změnový soupis prací SO 102 po změně 17 pro ZBV 43

Evidenční číslo a název stavby: II/102 hr. hl. města Prahy-Štěchovice, rekonstrukce. ETAPA II
Číslo a název SO/PS: SO 102 - Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice
Číslo a název rozpočtu: SO 102 - Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)
102
Celkem

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
		ZBV č. 39 geodetické protokoly Š II 33/2021 km 13,150-13,190 vlevo 89,90=89,900 [A] Š II 10/2022 km 10,140-10,250 vlevo 191,10=191,100 [B] Š II 12/2022 km 10,001-10,101 vlevo 112,90=112,900 [C] Š II 16/2022 km 10,103-10,140 vlevo 63,0+55,20-77=41,200 [D] Š II 27/2022 km 11,430-11,520 vlevo 191,60=191,600 [E] Š II 35/2022 km 11,220-11,430 vlevo 67,90+268,30=336,200 [F] Š II 43/2022 km 11,520-11663 vlevo 303,20=303,200 [G] Š II 45/2022 km 11,140-11,220 vlevo 187,80=187,800 [H] Š II 47/2022 km 11,671-11,780 vlevo 215,0=215,000 [I] Š II 53/2022 km 14,462-14,580 vlevo 249,30=249,300 [J] Š II 62/2022 km 11,056-11,140 vlevo 214,20=214,200 [K] Š II 65/2022 km 11,340-11,400 vlevo 47,0+160,30=207,300 [L] Š II 1/2023 km 10,840-10947 vlevo 188,7=188,700 [M] Š II 4/2023 km 10,947-11,031 vlevo 165,60=165,600 [N] Š II 7/2023 km 11,976-12,440 vlevo 805,30=805,300 [O] Š II 8/2023 km 11,780-11,971 vlevo 231,10+1,70=232,800 [P] Š II 11/2023 km 14,410-14,460 vlevo 75,40+21,50=96,900 [Q] Š II 13/2023 km 14,425 vlevo 22,40=22,400 [R] Š II 16/2023 km 11,928-12,060 vpravo 279,5=279,500 [S] Š II 27/2023 km 11,733-11,832 vpravo 332,70=332,700 [T] celkem A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q+R+S+T=4 463,600 [U] odpočet původního množství -5226,4=-5 226,400 [V] celkem U+V=- 762,800 [W]											
		ZBV č. 42 geodetický protokol Š II 34/2023 km 11,904-11,930 25,10=25,100 [A] ZBV č. 43 geodetický protokol Š II 37/2023 dlažba pro obec Davle dle pol. č. 451317777 90,90=90,90											
50	596811221	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva vel do 0,25 m2 plochy do 100 m2	M2	60,000	60,000	0,000	396,53	23 791,80	0,00	0,00	23 791,80	0,00	0,00%
		Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikací pro pěší s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m s ložem z kameniva těženého tl. do 30 mm velikosti dlaždic přes 0,09 m2 do 0,25 m2, pro plochy přes 50 do 100 m2											
51	59245212	dlažba zámková profilová základní 19,6x16,1x6 cm přírodní	M2	12,000	12,000	0,000	237,30	2 847,60	0,00	0,00	2 847,60	0,00	0,00%
		dlažba zámková profilová základní 19,6x16,1x6 cm přírodní											
		SoD *60*0.20 cca 20 % nové dlažby při obnově chodníků, předpokládá se především využití stávající=12,000 [A]*											

Změnový soupis prací SO 102 po změně 17 pro ZBV 43

Evidenční číslo a název stavby: II/102 hr. hl. města Prahy-Štěchovice, rekonstrukce. ETAPA II
Číslo a název SO/PS: SO 102 - Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice
Číslo a název rozpočtu: SO 102 - Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)
102
Celkem

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
	8	**Trubní vedení**											
56	592238200	vpusť betonová uliční TBV-Q 500/290 K /skruž/ 29x50x5 cm	KUS	2,000	2,000	0,000	609,76	1 219,52	0,00	0,00	1 219,52	0,00	0,00%
		vpusť betonová uliční /skruž/ 29x50x5 cm											
57	592238210	vpusť betonová uliční TBV-Q 660/180 /prstenec/ 18x66x10 cm	KUS	2,000	2,000	0,000	676,46	1 352,92	0,00	0,00	1 352,92	0,00	0,00%
		vpusť betonová uliční prstenec 18x66x10 cm											
55	592238230	vpusť betonová uliční TBV-Q 500/626 D /dno/ 62,6 x 49,5 x 5 cm	KUS	2,000	2,000	0,000	1 041,47	2 082,94	0,00	0,00	2 082,94	0,00	0,00%
		vpusť betonová uliční dno 62,6 x 49,5 x 5 cm											
52	871315241	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC vícevrstvé tuhost třídy SN12 DN 150	M	20,000	20,000	0,000	1 295,34	25 906,80	0,00	0,00	25 906,80	0,00	0,00%
		Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného vícevrstvého, tuhost třídy SN 12 DN 150											
		*2*10 přípojky k novým UV - odhad=20,000 [A]*											
53	895931111	Vpusti kanalizačních horské z betonu prostého C12/15 velikosti 1200/600 mm	KUS	1,000	1,000	0,000	35 858,74	35 858,74	0,00	0,00	35 858,74	0,00	0,00%
		Vpusti kanalizační horské z betonu prostého tř. C 12/15 velikosti 1200/600 mm											
54	895941111	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální	KUS	2,000	2,000	0,000	6 416,78	12 833,56	0,00	0,00	12 833,56	0,00	0,00%
		Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální											
58	898121129	Sanace potrubí DN 600 polyuretanový nástřik tl.2,4 mm	M	32,000	32,000	0,000	5 181,24	165 799,68	0,00	0,00	165 799,68	0,00	0,00%
		Sanace vodovodního potrubí litinového, ocelového nebo betonového polyuretanový nástřik sanační tloušťka 2,4 mm DN 600											
		SoD *13+19 sanace propustků 32 vtok. objektů přespárováním v km 11,917 32 12,086=32,000 [A]*											
59	898161134	Sanace potrubí vložkování skelným rukávcem DN 1000 tl.8,0 mm	M	32,000	32,000	0,000	22 912,62	733 203,84	0,00	0,00	733 203,84	0,00	0,00%
		Sanace vodovodního potrubí litinového, ocelového nebo betonového vložkování stávajícího potrubí skelným rukávcem [UV-Liner] sanační tloušťky 8 mm DN 1000											
		SoD *13+19 sanace vyvložkováním propustků, příp.vtok.objektů, v km 11,917 32 12,086=32,000 [A]*											
60	899131115R	Bourání uličních vpustí kompletních	KUS	3,000	3,000	0,000	1 344,82	4 034,46	0,00	0,00	4 034,46	0,00	0,00%
		Výměna šachtového rámu [technologií Hermes] tř. D 400 včetně poklopu s osazením a dodáním nového rámu z litiny a betonu [typ BEGU]											
		SoD *2+1 vč. odvozu 3 uložení na skládku=3,000 [A]*											
	9	**Ostatní konstrukce a práce, bourání**											
67	40445158	sloupek silniční směrový plastový 1200mm	KUS	66,168	66,168	0,000	363,84	24 074,57	0,00	0,00	24 074,57	0,00	0,00%
69	40445175	odrazka na svodidla V.1.B	KUS	54,800	54,800	0,000	716,16	39 245,57	0,00	0,00	39 245,57	0,00	0,00%
		odrazka na svodidla V.1.B											
71	40445175a	odrazka na svodidla M.1.B	KUS	4,000	4,000	0,000	941,84	3 767,36	0,00	0,00	3 767,36	0,00	0,00%
73	404454040	značka dopravní svislá nereflexní FeZn prolis, 500 x 700 mm	KUS	1,000	1,000	0,000	1 306,83	1 306,83	0,00	0,00	1 306,83	0,00	0,00%
74	404454070	značka dopravní svislá nereflexní FeZn prolis, 1100 x 330 mm	KUS	2,000	2,000	0,000	1 862,95	3 725,90	0,00	0,00	3 725,90	0,00	0,00%
75	404454320	značka dopravní svislá nereflexní FeZn-Al rám., D 700 mm	KUS	2,000	2,000	0,000	1 377,06	2 754,12	0,00	0,00	2 754,12	0,00	0,00%
62	55391534	zábradelní systém Pz s výplní ze svislých ocelových tyčí ZSNH4/H2	M	10,000	0,000	-10,000	7 829,44	78 294,40	-78 294,40	0,00	0,00	-78 294,40	-100,00%
		ZBV č. 37 *neprovádělo se*											

Změnový soupis prací SO 102 po změně 17 pro ZBV 43

Evidenční číslo a název stavby: II/102 hr. hl. města Prahy-Štěchovice, rekonstrukce. ETAPA II
Číslo a název SO/PS: SO 102 - Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice
Číslo a název rozpočtu: SO 102 - Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)
102
Celkem

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
93	59217031	obrubník betonový silniční 100 x 15 x 25 cm	M	46,000	70,000	24,000	135,29	6 223,34	0,00	3 246,96	9 470,30	3 246,96	52,17%
		ZBV č. 38 *podklad pod svodidla* *12*2=24*											
97	59222001	trouba hrdlová přímá železobetonová s integrovaným těsněním 60 x 250 x 10 cm	M	13,000	13,000	0,000	1 784,45	23 197,85	0,00	0,00	23 197,85	0,00	0,00%
99	59222003	trouba hrdlová přímá železobetonová s integrovaným těsněním 100 x 250 x 13 cm	M	20,000	20,000	0,000	6 372,85	127 457,00	0,00	0,00	127 457,00	0,00	0,00%
61	911121111	Montáž zábradlí ocelového přichyceného vruty do betonového podkladu	M	10,000	0,000	-10,000	863,54	8 635,40	-8 635,40	0,00	0,00	-8 635,40	-100,00%
		ZBV č. 37 *neprovádělo se*											
63	911331135	Svodidlo ocelové jednostranné zádržnosti H1 typ KB1 RH1 V se zaberaněním sloupků v rozmezí do 4 m	M	2 740,000	2 749,000	9,000	1 093,82	2 997 066,80	0,00	9 844,38	3 006 911,18	9 844,38	0,33%
		Silniční svodidlo s osazením sloupků zaberaněním ocelové úroveň zádržnosti H1 vzdálenosti sloupků přes 2 do 4 m jednostranné [KB1 RH1 V]											
		SoD *150+120+26+70 vpravo - dle situace + u benzinky=366,000 [A]* *2374 vlevo - výměna stávajícího svodidla=2 374,000 [B]* *Celkem: 366+2374=2 740,000 [C]* *ZBV č. 38* *geodetický protokol Š II 39/2023* *km 13,887-13,896 v pravo* *9=9*											
64	911381124	Silniční svodidlo betonové jednostranné průběžné délky 4 m výšky 1,2 m	M	48,000	208,000	160,000	5 181,24	248 699,52	0,00	828 998,40	1 077 697,92	828 998,40	333,33%
		SoD *24+24=48,000 [A]* *ZBV č. 38* *geodetický protokol Š II 39/2023* *km 13,764-13,888 vpravo 124 m* *km 13,895-13,979 vpravo 84 m* *124+84=208* *odpočet původního množství -48* *208-48=160,00*											
65	911381813	Odstranění silničního betonového svodidla délky 2 m výšky 1,0 m	M	24,000	24,000	0,000	2 302,78	55 266,72	0,00	0,00	55 266,72	0,00	0,00%
		Odstranění silničního betonového svodidla s naložením na dopravní prostředek délky 2 m, výšky 1,0 m											
		SoD *24 dle situace - bude nahrazeno novým beton. svodidlem=24,000 [A]*											
66	912211111	Montáž směrového sloupku silničního plastového prosté uložení bez betonového základu	KUS	66,240	66,240	0,000	276,33	18 304,10	0,00	0,00	18 304,10	0,00	0,00%
		Montáž směrového sloupku plastového s odrazkou prostým uložením bez betonového základu silničního											
		SoD *(2880/50)*1.15 km 11,700 - 14,580=66,240 [A]*											
68	912311111	Montáž odrazky na ocelové svodidlo	KUS	54,800	54,800	0,000	217,61	11 925,03	0,00	0,00	11 925,03	0,00	0,00%
		SoD *2740/50 délka svodidla dle pol. 911331135/odrazky po 50-ti metrech - jen na jedné straně silnice, na druhé straně budou směrové sloupky=54,800 [A]*											
70	912321111	Montáž odrazky na betonové svodidlo	KUS	4,000	4,000	0,000	316,63	1 266,52	0,00	0,00	1 266,52	0,00	0,00%
72	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	KUS	5,000	5,000	0,000	609,08	3 045,40	0,00	0,00	3 045,40	0,00	0,00%
		Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly											
		SoD *2+1+2 2 x Z4a 5 1 x IJ4c + B21a 5 B21b=5,000 [A]*											

Změnový soupis prací SO 102 po změně 17 pro ZBV 43

Evidenční číslo a název stavby: II/102 hr. hl. města Prahy-Štěchovice, rekonstrukce. ETAPA II
Číslo a název SO/PS: SO 102 - Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice
Číslo a název rozpočtu: SO 102 - Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)
102
Celkem

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
76	914511111	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem	KUS	5,000	5,000	0,000	995,95	4 979,75	0,00	0,00	4 979,75	0,00	0,00%
		Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do betonového základu											
77	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou	KUS	7,000	7,000	0,000	995,95	6 971,65	0,00	0,00	6 971,65	0,00	0,00%
		Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do hliníkové patky											
78	915111111	Vodorovné dopravní značení dělící čáry souvislé š 125 mm základní bílá barva	M	2 450,000	2 450,000	0,000	13,24	32 438,00	0,00	0,00	32 438,00	0,00	0,00%
		Vodorovné dopravní značení stříkané barvou dělící čára šířky 125 mm souvislá bílá základní											
		SoD *2450 V1a - dle situace=2 450,000 [A]*											
79	915111115	Vodorovné dopravní značení dělící čáry souvislé š 125 mm základní žlutá barva	M	137,000	137,000	0,000	19,57	2 681,09	0,00	0,00	2 681,09	0,00	0,00%
		Vodorovné dopravní značení stříkané barvou dělící čára šířky 125 mm souvislá žlutá základní											
		SoD *35+38+64 V11a (0,125) - dle situace=137,000 [A]*											
80	915111121	Vodorovné dopravní značení dělící čáry přerušované š 125 mm základní bílá barva	M	1 050,000	1 050,000	0,000	11,51	12 085,50	0,00	0,00	12 085,50	0,00	0,00%
		Vodorovné dopravní značení stříkané barvou dělící čára šířky 125 mm přerušovaná bílá základní											
		SoD *550 V2a (3/6/0,125) - dle situace=550,000 [A]* *450 V2b (3/1,5/0,125) - dle situace=450,000 [B]* *50 V2b (1,5/1,5/0,12) - dle situace=50,000 [C]* *Celkem: 550+450+50=1 050,000 [D]*											
81	915121111	Vodorovné dopravní značení vodící čáry souvislé š 250 mm základní bíllá barva	M	9 466,000	9 466,000	0,000	23,03	218 001,98	0,00	0,00	218 001,98	0,00	0,00%
		Vodorovné dopravní značení stříkané barvou vodící čára bílá šířky 250 mm souvislá základní											
		SoD *9466 V4 (0,25) - dle situace=9 466,000 [A]*											
82	915131111	Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly základní bílá barva	M2	116,750	116,750	0,000	110,53	12 904,38	0,00	0,00	12 904,38	0,00	0,00%
		Vodorovné dopravní značení stříkané barvou přechody pro chodce, šipky, symboly bílé základní											
		SoD *100 V13a - dle situace=100,000 [A]* *10*1.5 V9a - dle situace - 10 ks x plocha jedné šipky=15,000 [B]* *3.5*0.5 V5(0,5) - dle situace - STOP čára=1,750 [C]* *Celkem: 100+15+1.75=116,750 [D]*											
83	915131115	Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly základní žlutá barva	M2	18,000	18,000	0,000	234,88	4 227,84	0,00	0,00	4 227,84	0,00	0,00%
		Vodorovné dopravní značení stříkané barvou přechody pro chodce, šipky, symboly žluté základní											
		SoD *(3.0*1.0)*6 nápisy BUS - rozměry dle TZ x 6 kusů=18,000 [A]*											
84	915211112	Vodorovné dopravní značení dělící čáry souvislé š 125 mm retroreflexní bílý plast	M	2 450,000	2 450,000	0,000	39,15	95 917,50	0,00	0,00	95 917,50	0,00	0,00%
		Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem dělící čára šířky 125 mm souvislá bílá retroreflexní											
		SoD *2450 V1a - dle situace=2 450,000 [A]*											
85	915211116	Vodorovné dopravní značení dělící čáry souvislé š 125 mm retroreflexní žlutý plast	M	137,000	137,000	0,000	55,27	7 571,99	0,00	0,00	7 571,99	0,00	0,00%
		Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem dělící čára šířky 125 mm souvislá žlutá retroreflexní											
		SoD *35+38+64 V11a (0,125) - dle situace=137,000 [A]*											

Změnový soupis prací SO 102 po změně 17 pro ZBV 43

Evidenční číslo a název stavby: II/102 hr. hl. města Prahy-Štěchovice, rekonstrukce. ETAPA II
Číslo a název SO/PS: SO 102 - Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice
Číslo a název rozpočtu: SO 102 - Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)
102
Celkem

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
86	915211122	Vodorovné dopravní značení dělící čáry přerušované š 125 mm retroreflexní bílý plast	M	1 050,000	1 050,000	0,000	39,15	41 107,50	0,00	0,00	41 107,50	0,00	0,00%
		Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem dělící čára šířky 125 mm přerušovaná bílá retroreflexní											
		SoD *550 V2a (3/6/0,125) - dle situace=550,000 [A]* *450 V2b (3/1,5/0,125) - dle situace=450,000 [B]* *50 V2b (1,5/1,5/0,12) - dle situace=50,000 [C]* *Celkem: 550+450+50=1 050,000 [D]*											
87	915221112	Vodorovné dopravní značení vodící čáry souvislé š 250 mm retroreflexní bílý plast	M	9 466,000	9 466,000	0,000	78,29	741 093,14	0,00	0,00	741 093,14	0,00	0,00%
		Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem vodící čára bílá šířky 250 mm souvislá retroreflexní											
		SoD *9466 V4 (0,25) - dle situace=9 466,000 [A]*											
88	915231112	Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly retroreflexní bílý plast	M2	116,750	116,750	0,000	385,71	45 031,64	0,00	0,00	45 031,64	0,00	0,00%
		Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem přechody pro chodce, šipky, symboly nápisy bílé retroreflexní											
		SoD *100 V13a - dle situace=100,000 [A]* *10*1.5 V9a - dle situace - 10 ks x plocha jedné šipky=15,000 [B]* *3.5*0.5 V5(0,5) - dle situace - STOP čára=1,750 [C]* *Celkem: 100+15+1.75=116,750 [D]*											
89	915231116	Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly retroreflexní žlutý plast	M2	18,000	18,000	0,000	690,83	12 434,94	0,00	0,00	12 434,94	0,00	0,00%
		Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem přechody pro chodce, šipky, symboly nápisy žluté retroreflexní											
		SoD *(3.0*1.0)*6 nápisy BUS - rozměry dle TZ x 6 kusů=18,000 [A]*											
90	915611111	Předznačení vodorovného liniového značení	M	13 103,000	13 103,000	0,000	2,88	37 736,64	0,00	0,00	37 736,64	0,00	0,00%
		Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot liniové dělicí čáry, vodicí proužky											
		SoD *2450+137+1050+9466 dle pol. 915111111, 915111115, 915111121 13103 915121111=13 103,000 [A]*											
91	915621111	Předznačení vodorovného plošného značení	M2	134,750	134,750	0,000	6,91	931,12	0,00	0,00	931,12	0,00	0,00%
		Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot plošné šipky, symboly, nápisy											
		SoD *116.75+18 dle pol. 915131111 134.75 915131115=134,750 [A]*											
92	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	M	46,000	46,000	0,000	518,95	23 871,70	0,00	0,00	23 871,70	0,00	0,00%
		Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z betonu prostého téže značky											
		SoD *29+17 dle situace=46,000 [A]*											
94	919122122	Těsnění spár zálivkou za tepla pro komůrky š 15 mm hl 30 mm s těsnicím profilem	M	696,000	46,000	-650,000	116,82	81 306,72	-75 933,00	0,00	5 373,72	-75 933,00	-93,39%
		Utěsnění dilatačních spár zálivkou za tepla v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezního nátěru s těsnicím profilem pod zálivkou, pro komůrky šířky 15 mm, hloubky 30 mm											
		SoD *1300*0.5 v odvodňovacím proužku v místě nové opěrné zdi=650,000 [A]* *46 podél obrubníku=46,000 [B]* *Celkem: 650+46=696,000 [C]* *ZBV ZBV č. 12* *odpočet dle SOD - proužek nahrazen konstrukčními vrstvami přilehlé vozovkyč. 12 odpočet -650*											
95	919131210R	Kotvení na povrchu z betonářské výztuže dl. do 3m	KUS	227,500	227,500	0,000	4 029,86	916 793,15	0,00	0,00	916 793,15	0,00	0,00%
		Vyztužení dilatačních spár v cementobetonovém krytu kotvami průměru 16 mm, délky 1 200 mm											
		SoD *910/1.0/4 kotvy po jednom metru, potřebná délka cca 600mm, tzn. jedna výztuž dl.3,0m rozdělená na čtvrtiny=227,500 [A]*											
96	919521140	Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo ŽB DN 600	M	13,000	13,000	0,000	3 333,04	43 329,52	0,00	0,00	43 329,52	0,00	0,00%
		Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo železobetonových DN 600 mm											
		SoD *13 v km 13,89=13,000 [A]*											

Změnový soupis prací SO 102 po změně 17 pro ZBV 43

Evidenční číslo a název stavby: II/102 hr. hl. města Prahy-Štěchovice, rekonstrukce. ETAPA II
Číslo a název SO/PS: SO 102 - Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice
Číslo a název rozpočtu: SO 102 - Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)
102
Celkem

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
98	919521180	Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo ŽB DN 1000	M	20,000	20,000	0,000	5 724,70	114 494,00	0,00	0,00	114 494,00	0,00	0,00%
		Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo železobetonových DN 1000 mm											
		SoD *20 v km 12,925=20,000 [A]*											
100	919535558	Obetonování trubního propustku betonem prostým tř. C 20/25	M3	29,680	29,680	0,000	4 081,06	121 125,86	0,00	0,00	121 125,86	0,00	0,00%
		Obetonování trubního propustku betonem prostým bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25											
		SoD *(13*0.50)+(19*1.22) délka x plocha obetonování v řezu =29,680 [A]*											
101	919716111	Výztuž cementobetonového krytu ze svařovaných sítí KARI hmotnosti do 7,5 kg/m2	T	0,077	0,077	0,000	32 954,10	2 537,47	0,00	0,00	2 537,47	0,00	0,00%
		Ocelová výztuž cementobetonového krytu ze svařovaných sítí KARI hmotnosti do 7,5 kg/m2											
		SoD *((1.7*3.0)*7.5*2)*0.001 vyztužení betonového lože dle v.č. 5=0,077 [A]*											
102	919721101	Geomříž pro stabilizaci podkladu tkaná z PP podélná pevnost v tahu do 50 kN/m	M2	3 185,000	3 185,000	0,000	176,12	560 942,20	0,00	0,00	560 942,20	0,00	0,00%
		Geomříž pro stabilizaci podkladu tkaná z polyesteru, podélná pevnost v tahu do 50 kN/m											
		SoD *910*3.5 délka x šířka - úprava svahu typu B2=3 185,000 [A]*											
103	919721202	Geomříž pro vyztužení asfaltového povrchu z PP s geotextilií	M2	40 698,000	40 698,000	0,000	102,22	4 160 149,56	0,00	0,00	4 160 149,56	0,00	0,00%
		Geomříž pro vyztužení asfaltového povrchu z polypropylénu s geotextilií											
		SoD *11027 bouraná vozovka v celé tloušťce =11 027,000 [A]* *13995+5501+8015+2160 frézování v různých tloušťkách=29 671,000 [B]* *Celkem: 11027+29671=40 698,000 [C]*											
104	919732221	Styčná spára napojení nového živičného povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm bez prořezání	M	4 826,200	5 068,200	242,000	116,82	563 796,68	0,00	28 270,44	592 067,12	28 270,44	5,01%
		Styčná pracovní spára při napojení nového živičného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm bez prořezání spáry											
		SoD *(55+8) řezání v napojeních na vedl.ulice + na ZÚ 63 na KÚ - při napojování vrstev=63,000 [A]* *4580 podélná spára=4 580,000 [B]* *(4580/200)*8.0 příčné spáry - předpoklad stavebních úseků po 200 m=183,200 [C]* *Celkem: 63+4580+183.2=4 826,200 [D]* *ZBV ZBV č. 10* *33,0 + 2*0,5 dle zaměření km 10,250 - 10,283 =34,000 [A]* *ZBV č. 38* *nové betonové svodidlo 208*											
105	919735113	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 150 mm	M	5 585,200	4 935,200	-650,000	130,38	728 198,38	-84 747,00	0,00	643 451,38	-84 747,00	-11,64%
		Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm											
		SoD *(55+8)*2 řezání v napojeních na vedl.ulice + na ZÚ 126 na KÚ - při frézování 126 při napojování vrstev=126,000 [A]* *46 podél obrubníku=46,000 [B]* *4580 podélná spára=4 580,000 [C]* *(4580/200)*8.0 příčné spáry - předpoklad stavebních úseků po 200 m=183,200 [D]* *650 v odvodňovacím proužku v místě nové opěrné zdi=650,000 [E]* *Celkem: 126+46+4580+183.2+650=5 585,200 [F]* *ZBV č. 12* *odpočet -650*											

Změnový soupis prací SO 102 po změně 17 pro ZBV 43

Evidenční číslo a název stavby: II/102 hr. hl. města Prahy-Štěchovice, rekonstrukce. ETAPA II
Číslo a název SO/PS: SO 102 - Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice
Číslo a název rozpočtu: SO 102 - Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)
102
Celkem

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
106	938902113	Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosu do 0,5 m3/m	M	2 290,000	2 290,000	0,000	95,49	218 672,10	0,00	0,00	218 672,10	0,00	0,00%
		Profilace a čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem s odstraněním travnatého porostu nebo nánosu, s úpravou dna a svahů do předepsaného profilu a s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m nezpevněných nebo zpevněných objemu nánosu přes 0,30 do 0,50 m3/m											
		SoD *4580/2 odhad půlka trasy=2 290,000 [A]*											
107	938902462	Čištění propustků ručně D do 1000 mm při tl nánosu do 50% DN	M	32,000	32,000	0,000	481,28	15 400,96	0,00	0,00	15 400,96	0,00	0,00%
		Čištění propustků s odstraněním travnatého porostu nebo nánosu, s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m ručně tloušťky nánosu přes 25 do 50% průměru propustku přes 500 do 1000 mm											
		SoD *8 propust v km 12,068 - větší délka než 8 m musí být v příplatku - dle pol. 938902499=8,000 [A]* *8 propust v km 11,917 - větší délka než 8 m musí být v příplatku - dle pol. 938902499=8,000 [B]* *2*8 čištění přípojek v km 11,612 8 11,262 u výměny UV=16,000 [C]* *Celkem: 8+8+16=32,000 [D]*											
108	938902499	Příplatek k čištění propustků delších než 8 m za každý další 1 m délky	M	16,000	16,000	0,000	96,26	1 540,16	0,00	0,00	1 540,16	0,00	0,00%
		Čištění propustků s odstraněním travnatého porostu nebo nánosu, s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m Příplatek k cenám za délku propustku přes 8 m za každý další 1 m											
		SoD *(19-8)+(13-8) =16,000 [A]*											
109	938902500R	Čištění stávajících uličních vpustí	KUS	43,000	43,000	0,000	2 562,99	110 208,57	0,00	0,00	110 208,57	0,00	0,00%
		SoD *7*2 7 kusů dvojitých horských vpustí dle situace=14,000 [A]* *29 UV dle situace=29,000 [B]* *Celkem: 14+29=43,000 [C]*											
110	938909331	Čištění vozovek metením ručně podkladu nebo krytu betonového nebo živičného	M2	29 671,000	29 731,300	60,300	3,65	108 299,15	0,00	220,09	108 519,24	220,09	0,20%
		Čištění vozovek metením bláta, prachu nebo hlinitého nánosu s odklizením na hromady na vzdálenost do 20 m nebo naložením na dopravní prostředek ručně povrchu podkladu nebo krytu betonového nebo živičného											
		SoD *13995+(5501+8015)+2160 po frézování asf. krytu 29671 CB konstrukce=29 671,000 [A]* *ZBV ZBV č. 10* *60,3 dle zaměření =60,300 [A]*											
111	938909612	Odstranění nánosu na krajnicích tl do 200 mm	M2	4 580,000	4 580,000	0,000	376,22	1 723 087,60	0,00	0,00	1 723 087,60	0,00	0,00%
		Čištění krajnic odstraněním nánosu (ulehlého, popř. zaježděného) naneseného vlivem silničního provozu, s přemístěním na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ale bez složení průměrné tloušťky přes 100 do 200 mm											
		SoD *4580*0.5*2=4 580,000 [A]*											
112	966005311	Rozebrání a odstranění silničního svodidla s jednou pásnicí	M	2 444,000	4 393,000	1 949,000	291,03	711 277,32	0,00	567 217,47	1 278 494,79	567 217,47	79,75%
		Rozebrání a odstranění silničního zábradlí a ocelových svodidel s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 10 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásypem jam po odstraněných sloupcích a s jeho zhutněním svodidla včetně sloupků, s jednou pásnicí silničního											
		SoD *2374 VLEVO=2 374,000 [A]* *70 vpravo v km 14,3 u benzinky=70,000 [B]* *Celkem: 2374+70=2 444,000 [C]* *ZBV č. 15* *dle geodetického protokolu č. Š II 3/2022* *km 13,196-13,596 400=400,000 [A]* *ZBV. Č. 43* *geodetický protokol Š II 35/2023* *vlevo celkem 3233=3 233,000 [A]* *vpravo celkem 760=760,000 [B]* *odpočet původního množství -2444=-2 444,000 [C]* *A+B+C=1 549,000 [D]*											

Změnový soupis prací SO 102 po změně 17 pro ZBV 43

Evidenční číslo a název stavby: II/102 hr. hl. města Prahy-Štěchovice, rekonstrukce. ETAPA II
Číslo a název SO/PS: SO 102 - Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice
Číslo a název rozpočtu: SO 102 - Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)
102
Celkem

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
113	966006132	Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami	KUS	10,000	10,000	0,000	1 727,08	17 270,80	0,00	0,00	17 270,80	0,00	0,00%
		Odstranění dopravních nebo orientačních značek se sloupkem s uložením hmot na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásypem jam a jeho zhutněním s betonovou patkou											
		SoD *2 dle situace vč. sloupků=2,000 [A]* *6+2 odstranění stáv. značek s ponecháním na místě - nově zabudovat do římsy dle SO 253=8,000 [B]* *Celkem: 2+8=10,000 [C]*											
114	966006211	Odstranění svislých dopravních značek ze sloupů, sloupků nebo konzol	KUS	2,000	2,000	0,000	103,62	207,24	0,00	0,00	207,24	0,00	0,00%
		Odstranění (demontáž) svislých dopravních značek s odklizením materiálu na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ze sloupů, sloupků nebo konzol											
115	966008113	Bourání trubního propustku do DN 800	M	13,000	13,000	0,000	1 135,27	14 758,51	0,00	0,00	14 758,51	0,00	0,00%
		Bourání trubního propustku s odklizením a uložením vybouraného materiálu na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z trub DN přes 500 do 800 mm											
		13 v km 13,890 výměna trubního propustku DN 600=13,000 [A]											
116	966008116R	Bourání trubního propustku do DN 1200	M	15,000	15,000	0,000	1 892,11	28 381,65	0,00	0,00	28 381,65	0,00	0,00%
		Bourání trubního propustku s odklizením a uložením vybouraného materiálu na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z trub DN přes 800 do 1200 mm											
		15 km 12,925 vpravo - bourání kamenného propustku se ŽB deskou vč.zemních prací, bude nahrazen trubním prop. DN 1000 se šikmými čely=15,000 [A]											
117	977141132	Vrty pro kotvy do betonu průměru 32 mm hloubky 220 mm s vyplněním epoxidovým tmelem	KUS	7,000	7,000	0,000	287,85	2 014,95	0,00	0,00	2 014,95	0,00	0,00%
		Vrty pro kotvy do betonu s vyplněním epoxidovým tmelem, průměru 32 mm, hloubky 220 mm											
118	979071121	Očištění dlažebních kostek drobných s původním spárováním kamenivem těženým	M2	10,000	110,900	100,900	84,40	844,00	0,00	8 515,96	9 359,96	8 515,96	1009,00%
		Očištění vybouraných dlažebních kostek od spojovacího materiálu, s uložením očištěných kostek na skládku, s odklizením odpadových hmot na hromady a s odklizením vybouraných kostek na vzdálenost do 3 m drobných, s původním vyplněním spár kamenivem těženým											
		SoD *10 dlažba z chodníku na ZÚ=10,000 [A]* *ZBV č. 15* *dle geodetického protokolu č. Š II 3/2022* *km 13,2-13,7 100,9=100,900 [A]*											
	997	**Přesun sutě**											
119	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	T	3 197,830	4 039,152	841,322	13,82	44 194,01	0,00	11 627,07	55 821,08	11 627,07	26,31%
		Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km											
		SoD *3197.83=3 197,830 [A]* *ZBV ZBV č. 27* *geodetický protokol Š II 51/2022 92,2 m2=92,200 [A]* *geodetický protokol Š II 58/2022 183,8 m2 =183,800 [B]* *dle pol. č. 153 výměna podloží 60% z celkového množství 276 m2, tl. 20-30 cm* *(276*0,6)*0,25*2=82,8 [C]* *(A+B)*0,22*2,0+82,8=204,24 [D]* *ZBV č. 38* *dle pol. č. 113107223 a 132151101* *325,5*(0,25+0,3)/2*1,9+0,9*1,9=171,784* *ZBV č. 41* *(574,1*0,04+327,1*0,05+2818,2*0,1-675,1*0,2)*2,5=465,298 [A]*											
120	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	T	2 494,356	2 494,356	0,000	13,82	34 472,00	0,00	0,00	34 472,00	0,00	0,00%
		Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km											
		SoD *741.96+4.128+0.688+593.42+1154.16=2 494,356 [A]*											

Změnový soupis prací SO 102 po změně 17 pro ZBV 43

Evidenční číslo a název stavby: II/102 hr. hl. města Prahy-Štěchovice, rekonstrukce. ETAPA II
Číslo a název SO/PS: SO 102 - Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice
Číslo a název rozpočtu: SO 102 - Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)
102
Celkem

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
121	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	T	79 690,604	91 469,112	11 778,508	7,03	560 224,95	0,00	82 802,91	643 027,86	82 802,91	14,78%
		Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km											
		SoD *(3197.83+2494.356)*14 celková vzdálenost odvozu 15 km =79 690,604 [A]* *ZBV ZBV č. 27* *dle pol. č. 997221551* *204,24*14=2859,36 [A]* *ZBV č. 38* *dle pol. č. 997221551* *171,784*14=2404,976* *ZBV č. 41* *dle pol .č. 997221551* *465,298*14=6 514,172 [A]*											
122	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	T	11 138,845	11 239,165	100,320	27,06	301 417,15	0,00	2 714,66	304 131,81	2 714,66	0,90%
		Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km											
		SoD *2646.48+1441.485+1411.456+5639.424=11 138,845 [A]* *ZBV č. 38* *svodidlo (36+48+48)*0,76=100,32*											
123	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	T	155 943,830	156 837,590	893,760	0,58	90 447,42	0,00	518,38	90 965,80	518,38	0,57%
		Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km											
		SoD *11138.845*14 celkem vzdálenost skládky 15 km - odhad=155 943,830 [A]* *ZBV č. 38* *dle pol. č. 997221561* *63,84*14=893,76*											
124	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	T	310,867	6 931,006	6 620,139	51,81	16 106,02	0,00	342 989,40	359 095,42	342 989,40	2129,57%
		Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km											
		11.75+15.6+18.04+21.072+170.268+0.172+26.715+45.9 +1.35=310,867 [A] *ZBV č. 13* *dle pol. 114203103 297,85*2,6=774,410 [A]* *ZBV č. 15* *žlab 69,4*0,134=9,300 [A]* *podkla. beton (69,4+100,9)*0,24=40,872 [B]* *svodidlo 400*0,042=16,800 [C]* *A+B+C=66,972 [D]* *ZBV ZBV č. 27* *geodetický protokol Š II 51/2022 92,2 m2=92,200 [A]* *geodetický protokol Š II 58/2022 183,8 m2 =183,800 [B]* *(A+B)*0,15*2,3=95,220 [C]* *ZBV č. 39* *dle pol. 114203102 1562,26*2,6=4061,876 [A]* *ZBV č. 41* *(8843,28*0,04 8296,4*0,05+14097,1*0,1)*2,3=1 608,549[A]*											

Změnový soupis prací SO 102 po změně 17 pro ZBV 43

Evidenční číslo a název stavby: II/102 hr. hl. města Prahy-Štěchovice, rekonstrukce. ETAPA II
Číslo a název SO/PS: SO 102 - Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice
Číslo a název rozpočtu: SO 102 - Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)
102
Celkem

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
		ZBV č. 42 *odbourání původní zdi propustku* *geodetický protokol Š II 18/2023* *vpravo 3,26=3,260 [A]* *vlevo 2,70=2,700 [B]* *(A+B)*2,2=13,112 [C]*											
125	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	T	4 352,138	97 033,776	92 681,638	5,76	25 068,31	0,00	533 846,23	558 914,54	533 846,23	2129,57%
		Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km											
		SoD *310.867*14 celkem vzdálenost skládky 15 km - odhad=4 352,138 [A]* *ZBV č. 13* *do vzdálenosti 15 km* *dle pol. 114203103 297,85*2,6*14=10 841,740 [A]* *ZBV č. 15* *do vzdálenosti 15 km* *dle pol č. 997221571* *66,972*14=937,608 [A]* *ZBV ZBV č. 27* *dle pol. č. 997221571* *95,22*14=1 333,080 [A]* *ZBV č. 39* *dlle pol. č. 997221571* *4061,876*14=56866,264 [A]* *ZBV č. 41* *dle pol. č. 997221571* *1608,527*14=22 519,378 [A]*											
		ZBV č. 42 *dle pol. č. 997221571* *13,112*14=183,568 [A]*											
126	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	T	10 352,419	10 574,763	222,344	34,54	357 572,55	0,00	7 679,76	365 252,31	7 679,76	2,15%
		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) betonového											
		SoD *310.867-170.268 dle pol. 997221571 - odečet ocelového svodidla dle pol. 966005311=140,599 [A]* *10211.82 dle pol. 997221561=10 211,820 [B]* *Celkem: 140.599+10211.82=10 352,419 [C]* *ZBV č. 15* *dle pol č. 997221571* *50,172=50,172 [A]* *ZBV ZBV č. 27* *dle pol. č. 9777221571* *95,22=95,220 [A]* *ZBV č. 38* *svodidlo (36+48)*0,76=63,84* *ZBV č. 42* *dle pol. č. 997221571* *13,112=13,112 [A]*											

Změnový soupis prací SO 102 po změně 17 pro ZBV 43

Evidenční číslo a název stavby: II/102 hr. hl. města Prahy-Štěchovice, rekonstrukce. ETAPA II
Číslo a název SO/PS: SO 102 - Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice
Číslo a název rozpočtu: SO 102 - Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)
102
Celkem

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
127	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	T	3 197,830	4 348,264	1 150,43	34,54	110 453,05	0,00	39 735,99	150 189,04	39 735,99	100,00%
		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z kameniva											
		SoD *3197.83 dle pol. 997221551=3 197,830 [A]* *ZBV č. 13* *dle pol. 114203103 297,85*2,6=774,410 [A]* *ZBV ZBV č. 27* *dle pol. č. 997221551* *204,24=204,24 [A]* *ZBV č. 38* *dle pol. č. 997111551* *171,784=171,784*											
	998	**Přesun hmot**											
128	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	T	5 047,476	5 824,017	776,54	147,76	745 815,05	0,00	114 741,70	860 556,75	114 741,70	100,00%
		Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu											
		ZBV č. 13 *dle pol. 594511111 851,2*0,614=522,637 [A]* *ZBV č. 15* *dle geodetického protokolu č. Š II 3/2022* *km 13,2-13,7* *žlaby 69,4*0,134=9,300 [A]* *ZBV č. 38* *svodidlo160*0,76=121,6* *dlažba 15*0,101=1,515* *palisáda 75*0,6702=50,265* *celkem 121,60+1,515+50,265=173,38* *ZBV č. 42* *dle pol. 594511111 25,10*0,614=15,411 [A]* *ZBV č. 43* *dle pol. 594511111 90,90*0,614=55,813 [A]*											
129	998225194	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živičným, betonovým do 5000 m	T	5 047,476	5 824,017	776,54	29,55	149 152,92	0,00	22 946,79	172 099,71	22 946,79	100,00%
		Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 5000 m											
		ZBV č. 13 dle pol. 998225111 851,2*0,614=522,637 [A] ZBV č. 15 dle geodetického protokolu č. Š II 3/2022 km 13,2-13,7 žlaby 69,4*0,134=9,300 [A] ZBV č. 38 dle pol. č. 998225111 173,38=173,38 ZBV č. 42 dle pol. 594511111 25,10*0,614=15,411 [A] ZBV č. 43 dle pol. 594511111 90,90*0,614=55,813 [A]											

Změnový soupis prací SO 102 po změně 17 pro ZBV 43

Evidenční číslo a název stavby: II/102 hr. hl. města Prahy-Štěchovice, rekonstrukce. ETAPA II
Číslo a název SO/PS: SO 102 - Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice
Číslo a název rozpočtu: SO 102 - Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)
102
Celkem

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
		NOVÉ POLOŽKY											
130	12002000	Geodetické práce - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ	KČ	0,000	79 895,82	79 895,817	1,00	0,00	0,00	79 895,82	79 895,82	79 895,82	100,00%
		Cena položky dle kompletní položky z SO 000, tj. 0,5 % z hodnoty prací											
		"ZBV ZBV č. 10 217,26=217,260 [A] ZBV ZBV č. 13 19214,04=19 214,040 [A]" ZBV č. 15 3566,36=3566,36 ZBV č. 20 1048,17=1048,17 ZBV č. 27 2188,111=2188,111 ZBV č. 38 7717,175=7717,175 ZBV č. 39 26 386,609=26 386,609 ZBV č. 42 15 309,005=15 309,005 ZBV č. 43											
131	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm	M	0,000	34,000	34,00	81,10	0,00	0,00	2 757,40	2 757,40	2 757,40	100,00%
		Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm											
		ZBV ZBV č. 10 *33,0 + 2*0,5 dle zaměření km 10,250 - 10,283 =34,000 [A]*											
132	111301111	SEJMUTÍ DRNU	M2	0,000	5 400,600	5 400,600	44,17	0,00	0,00	238 544,50	238 544,50	238 544,50	100,00%
		Cena položky dle SoD SO 901 pol. 11											
		ZBV č. 13 Nánosy na stávajícícm svahu, dle zaměření 937 m2=937,000 [A] ZBV č. 39 geodetické protokoly Š II 33/2021 km 13,150-13,190 vlevo 89,90=89,900 [A] Š II 10/2022 km 10,140-10,250 vlevo 191,10=191,100 [B] Š II 12/2022 km 10,001-10,101 vlevo 112,90=112,900 [C] Š II 16/2022 km 10,103-10,140 vlevo 63,0+55,20-77=41,200 [D] Š II 27/2022 km 11,430-11,520 vlevo 191,60=191,600 [E] Š II 35/2022 km 11,220-11,430 vlevo 67,90+268,30=336,200 [F] Š II 43/2022 km 11,520-11663 vlevo 303,20=303,200 [G] Š II 45/2022 km 11,140-11,220 vlevo 187,80=187,800 [H] Š II 47/2022 km 11,671-11,780 vlevo 215,0=215,000 [I] Š II 53/2022 km 14,462-14,580 vlevo 249,30=249,300 [J] Š II 62/2022 km 11,056-11,140 vlevo 214,20=214,200 [K] Š II 65/2022 km 11,340-11,400 vlevo 47,0+160,30=207,300 [L] Š II 1/2023 km 10,840-10947 vlevo 188,7 =188,7 [V] Š II 4/2023 km 10,947-11,031 vlevo 165,60=165,600 [M] Š II 7/2023 km 11,976-12,440 vlevo 805,30=805,300 [N] Š II 8/2023 km 11,780-11,971 vlevo 231,10+1,70=232,800 [O] Š II 11/2023 km 14,410-14,460 vlevo 75,40+21,50=96,900 [P] Š II 13/2023 km 14,425 vlevo 22,40=22,400 [Q] Š II 16/2023 km 11,928-12,060 vpravo 279,50=279,500 [R] Š II 27/2023 km 11,733-11,832 vpravo 332,70=332,700 [S] celkem A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q+R+S+V=4463,60 [T]											
133	114203102	Rozebrání dlažeb z lomového kamene nebo betonových tvárnic nasucho se zalitými spárami cementovou maltou	M3	0,000	1 860,110	1 860,110	763,00	0,00	0,00	1 419 263,94	1 419 263,94	1 419 263,94	100,00%
		Cena položky dle ÚRS 2021 02											
		ZBV č. 13 851*0,35=297,850 [A]											

Změnový soupis prací SO 102 po změně 17 pro ZBV 43

Evidenční číslo a název stavby: II/102 hr. hl. města Prahy-Štěchovice, rekonstrukce. ETAPA II
Číslo a název SO/PS: SO 102 - Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice
Číslo a název rozpočtu: SO 102 - Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)
102
Celkem

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
		ZBV č. 39 geodetické protokoly Š II 33/2021 km 13,150-13,190 vlevo 89,90=89,900 [A] Š II 10/2022 km 10,140-10,250 vlevo 191,10=191,100 [B] Š II 12/2022 km 10,001-10,101 vlevo 112,90=112,900 [C] Š II 16/2022 km 10,103-10,140 vlevo 63,0+55,20-77=41,200 [D] Š II 27/2022 km 11,430-11,520 vlevo 191,60=191,600 [E] Š II 35/2022 km 11,220-11,430 vlevo 67,90+268,30=336,200 [F] Š II 43/2022 km 11,520-11663 vlevo 303,20=303,200 [G] Š II 45/2022 km 11,140-11,220 vlevo 187,80=187,800 [H] Š II 47/2022 km 11,671-11,780 vlevo 215,0=215,000 [I] Š II 53/2022 km 14,462-14,580 vlevo 249,30=249,300 [J] Š II 62/2022 km 11,056-11,140 vlevo 214,20=214,200 [K] Š II 65/2022 km 11,340-11,400 vlevo 47,0+160,30=207,300 [L] Š II 1/2023 km 10,840-10947 vlevo 188,7 =188,7 [V] Š II 4/2023 km 10,947-11,031 vlevo 165,60=165,600 [M] Š II 7/2023 km 11,976-12,440 vlevo 805,30=805,300 [N] Š II 8/2023 km 11,780-11,971 vlevo 231,10+1,70=232,800 [O] Š II 11/2023 km 14,410-14,460 vlevo 75,40+21,50=96,900 [P] Š II 13/2023 km 14,425 vlevo 22,40=22,400 [Q] Š II 16/2023 km 11,928-12,060 vpravo 279,50=279,500 [R] Š II 27/2023 km 11,733-11,832 vpravo 332,70=332,700 [S] celkem A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q+R+S+V=4463,60 [T] 4463,60*0,35=1 562,26[W]												
134	153311212	Zřízení armování svahů, násypů a opěrných stěn vrstvou z geomříže tuhé sklonu přes 1:2 do 1:1	M2	0,000	936,000	936,000	74,90	0,00	0,00	70 106,40	70 106,40	70 106,40	100,00%
		Cena položky dle ÚRS 2021 02											
		ZBV č. 13 Požadavek Povodí Vltavy z 6.4.2021 vyztužení svahu v km 10,381 - 10,420 vlevo vyztužení svahu 6 vrstvami geomříže prům. šířky 3,5 m + 0,5 přesah na zajištění v úseku svahu délky 39 m 6*(3,5+0,5)*39=936,000 [A]											
135	271922211	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z recyklátu betonového	M3	0,000	637,000	637,000	964,00	0,00	0,00	614 068,00	614 068,00	614 068,00	100,00%
		Cena položky dle ÚRS 2020 01											
		položka zahrnuje dodávku betonového recyklátu, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak											
		ZBV č. 13 dle geodetického zaměření km 10,360 - 10,380 24 m3=24,000 [A] km 10,380 - 10,420 190,7 m3 - úprava s geomříží =190,700 [B] km 10,420 - 10,465 45 m3=45,000 [C] km 10,465 - 10,475 11,9 m3=11,900 [D] km 10,476 - 10,485 9,2 m3=9,200 [E] km 10,485 - 10,575 126,3 m3=126,300 [F] km 10,575 - 10,650 68,2 m3=68,200 [G] km 10,706 - 10,840 161,7 m3=161,700 [H] A+B+C+D+E+F+G+H=637,000 [I]											
136	452313141R	ZÁKLADY Z PROST BETONU C 16/20 včetně bednění	M3	0,000	91,875	91,875	3 200,00	0,00	0,00	294 000,00	294 000,00	294 000,00	100,00%
		Cena položky převzata z SOD SO 341 pol. 6											
		ZBV č. 13 Betonové patky v patě svahu km 10,360 - 10,381 21*0,5*0,5/2 m3=2,625 [A] km 10,381 - 10,420 39*1,5*1,5/2 m3=43,875 [B] km 10,420 - 10,475 55*0,5*0,5/2 m3 =6,875 [C] km 10,476 - 10,650 174*0,5*0,5/2 m3=21,750 [D] km 10,706 - 10,840 134*0,5*0,5/2 m2=16,750 [F] A+B+C+D+F=91,875 [G]											

Změnový soupis prací SO 102 po změně 17 pro ZBV 43

Evidenční číslo a název stavby: II/102 hr. hl. města Prahy-Štěchovice, rekonstrukce. ETAPA II
Číslo a název SO/PS: SO 102 - Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice
Číslo a název rozpočtu: SO 102 - Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)
102
Celkem

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
137	636195111R	Vyplnění spár cementovou maltou dosavadní dlažby z lomového kamene melioračních kanálů	M2	0,000	5 405,700	5 405,700	357,00	0,00	0,00	1 929 834,90	1 929 834,90	1 929 834,90	100,00%
		Cena položky dle ÚRS 2021 02											
		ZBV č. 13 Požadavek Povodí Vltavy na vyplnění spár odláždění cementovou maltou dle geodetického zaměření km 10,360 - 10,422 111,9 m2=111,900 [A] km 10,422 - 10,454 48,7 m2=48,700 [B] km 10,455 - 10,476 44,9 m2 =44,900 [C] km 10,480 - 10,654 369,6 m2=369,600 [D] km 10,706 - 10,730 41,4 m2=41,400 [E] km 10,730 - 10,840 234,7 m2=234,700 [F] A+B+C+D+E+F=851,200 [G]											
		ZBV č. 39 geodetické protokoly Š II 33/2021 km 13,150-13,190 vlevo 89,90=89,900 [A] Š II 10/2022 km 10,140-10,250 vlevo 191,10=191,100 [B] Š II 12/2022 km 10,001-10,101 vlevo 112,90=112,900 [C] Š II 16/2022 km 10,103-10,140 vlevo 63,0+55,20-77=41,200 [D] Š II 27/2022 km 11,430-11,520 vlevo 191,60=191,600 [E] Š II 35/2022 km 11,220-11,430 vlevo 67,90+268,30=336,200 [F] Š II 43/2022 km 11,520-11663 vlevo 303,20=303,200 [G] Š II 45/2022 km 11,140-11,220 vlevo 187,80=187,800 [H] Š II 47/2022 km 11,671-11,780 vlevo 215,0=215,000 [I] Š II 53/2022 km 14,462-14,580 vlevo 249,30=249,300 [J] Š II 62/2022 km 11,056-11,140 vlevo 214,20=214,200 [K] Š II 65/2022 km 11,340-11,400 vlevo 47,0+160,30=207,300 [L] Š II 1/2023 km 10,840-10947 vlevo 188,7 =188,700 [T] Š II 4/2023 km 10,947-11,031 vlevo 165,6=165,600 [M]] Š II 7/2023 km 11,976-12,440 vlevo 805,3=805,300 [N]] Š II 8/2023 km 11,780-11,971 vlevo 231,10+1,7=232,800 [O]] Š II 11/2023 km 14,410-14,460 vlevo 75,40+21,5=96,900 [P]] Š II 13/2023 km 14,425 vlevo 22,4=22,400 [Q]] Š II 16/2023 km 11,928-12,060 vpravo 279,5=279,500 [R]] Š II 27/2023 km 11,733-11,832 vpravo 332,7=332,700 [S]] celkem A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q+R+S+T=4 463,600 [U] ZBV č. 43 geodetický protokol Š II 37/2023 dlažba pro obec Davle dle pol. č.594511111 90,9=90,900 [A]											
138	69321023	celkem A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q+R+S+T=4 463,600 [U]	M2	0,000	1 076,400	1 076,400	144,00	0,00	0,00	155 001,60	155 001,60	155 001,60	100,00%
		Cena položky dle ÚRS 2021 02											
		ZBV č. 13 Požadavek Povodí Vltavy z 6.4.2021 a vyjádření AD č. 28 vyztužení svahu v km 10,381 - 10,420 vlevo 6 vrstev prům. šířky 3,5 m + přesah do čela svahu 0,5 m , ztratné 15% 6*(3,5+0,5)*39*1,15=1 076,400 [A]											
139	113107170	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2do 200 m2 z betonu prostého tl. 100mm	M2	0,000	170,300	170,300	149,00	0,00	0,00	25 374,70	25 374,70	25 374,70	100,00%
		Cena položky dle ÚRS 2021 02											
		ZBV č. 15 dle geodetického protokolu č. Š II 3/2022 km 13,2-13,7 žlaby 69,4=69,400 [A] žulové kostky 100,9=100,900 [B] A+B=170,300 [C]											
140	451319777	Podklad nebo lože pod dlažbu příplatek k cenám za každých dalších i započatých 100 mm podkladu nebo lože z betonu prostého	M2	0,000	115,900	115,900	30,40	0,00	0,00	3 523,36	3 523,36	3 523,36	100,00%
		Cena položky dle ÚRS 2021 02											

Změnový soupis prací SO 102 po změně 17 pro ZBV 43

Evidenční číslo a název stavby: II/102 hr. hl. města Prahy-Štěchovice, rekonstrukce. ETAPA II
Číslo a název SO/PS: SO 102 - Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice
Číslo a název rozpočtu: SO 102 - Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)
102
Celkem

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
		ZBV č. 15 dle geodetického protokolu č. Š II 3/2022 km 13,2-13,7 žulové kostky 100,9=100,900 [A] ZBV č. 38 okolo HV 7,5*2=15											
141	591141111	Kladení dlažby z kostek velkých z kamene, do lože z cementové malty s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici	M2	0,000	115,900	115,900	608,00	0,00	0,00	70 467,20	70 467,20	70 467,20	100,00%
		Cena položky dle ÚRS 2021 02											
		ZBV č. 15 dle geodetického protokolu č. Š II 3/2022 krajnice ze žulových kostek km 13,2-13,7 100,9=100,900 [A] ZBV č. 38 okolo HV 7,5*2=15											
142	59227029	Žlabovka příkopová betonová 500x680x60	M	0,000	76,340	76,340	415,00	0,00	0,00	31 681,10	31 681,10	31 681,10	100,00%
		Cena položky dle ÚRS 2021 02											
		položka zahrnuje dodávku betonového recyklátu, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak											
		ZBV č. 15 dle geodetického protokolu č. Š II 3/2022 km 13,2-13,7 64,9 m+ 10% ztratné žlaby 69,4*1,1=76,340 [A]											
143	911331123	Silniční svodidlo s osazením sloupků zaberaněním ocelové úroveň zádržnosti N2 vzdálenosti sloupků přes 2 do 4 m jednostranné	M	0,000	400,000	400,000	1 450,00	0,00	0,00	580 000,00	580 000,00	580 000,00	100,00%
		Cena položky dle ÚRS 2021 02											
		ZBV č. 15 dle geodetického protokolu č. Š II 3/2022 km 13,196-13,596 400=400,000 [A]											
144	935112211	Osazení betonového příkopového žlabu z betonových příkopových tvárnic šířky přes 500 do800 mm do lože z betonu tl. 100 mm	M	0,000	69,400	69,400	271,00	0,00	0,00	18 807,40	18 807,40	18 807,40	100,00%
		Cena položky dle ÚRS 2021 02											

Změnový soupis prací SO 102 po změně 17 pro ZBV 43													
Evidenční číslo a název stavby: II/102 hr. hl. města Prahy-Štěchovice, rekonstrukce. ETAPA II								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
Číslo a název SO/PS: SO 102 - Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice								102					
Číslo a název rozpočtu: SO 102 - Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice								Celkem					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
		ZBV č. 15 dle geodetického protokolu č. Š II 3/2022 km 13,2-13,7 žlaby 69,4=69,400 [A]											
145	966008212	Bourání odvodňovacího žlabu z betonových příkopových tvátnic šířky přes 500 do 800 mm	M	0,000	69,400	69,400	73,90	0,00	0,00	5 128,66	5 128,66	5 128,66	100,00%
		Cena položky dle ÚRS 2021 02											
		ZBV č. 15 dle geodetického protokolu č. Š II 3/2022 km 13,2-13,7 žlaby 69,4=69,400 [A]											
146	275351111	Bednění základových konstrukcí bloků tradiční oboustranné	M2	0,000	250,500	250,500	580,00	0,00	0,00	145 290,00	145 290,00	145 290,00	100,00%
		Cena položky dle ÚRS 2021 02											
		ZBV č. 13 Betonové patky v patě svahu km 10,360 - 10,381 21*0,5=10,50 [A] km 10,381 - 10,420 39*1,5*=58,50 [B]											
147	567123114	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 5/6 (KSC II) tl 150 mm	M2	0,000	102,000	102,000	340,00	0,00	0,00	34 680,00	34 680,00	34 680,00	100,00%
		Cena položky dle ÚRS 2021 02											
		ZBV č. 20 *podklad ze směsi SC 5/6 v rozšíření vozovky t. 150 mm* *1,7*60,0=102,000 [A]*											
148	567133111	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 5/6 (KSC II) tl 160 mm	M2	0,000	300,000	300,000	361,00	0,00	0,00	108 300,00	108 300,00	108 300,00	100,00%
		Cena položky dle ÚRS 2021 02											
		ZBV č. 20 *podklad ze směsi SC 5/6 doplnění konstrukce s šíří 4,99m tl. 120-200 mm* *průměrná tl. 160 mm* *5,0*52,0=300,00 [A]*											
149	565125111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 40 mm š do 3 m	M2	0,000	2 259,400	2 259,40	244,00	0,00	0,00	551 293,60	551 293,60	551 293,60	100,00%
		Cena převzata z ÚRS 2021/02											
		ZBV č. 21 protokol Š II 71/2021 km 10,360 - 10,840 vlevo ACP 16 prům tl. 89,9 mm (nadspotřeba 40 mm) 2259,4=2 259,400 [A]											
150	577135132	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 40 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu	M2	0,000	1 342,000	1 342,00	270,00	0,00	0,00	362 340,00	362 340,00	362 340,00	100,00%
		Cena převzata z ÚRS 2021/01											
		ZBV č. 21 protokol D 13/2020 km 12,440 - 12,850 vpravo ACL 16 modif. prům tl. 30,7 mm (vrstva navíc) 1342=1 342,000 [A]											
151	577145132	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 50 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu	M2	0,000	4 510,000	4 510,00	349,00	0,00	0,00	1 573 990,00	1 573 990,00	1 573 990,00	100,00%
		Cena převzata z ÚRS 2021/02											
		ZBV č. 21 protokol Š II 89/21 13,199 - 13,696 vlevo ACL 16 modif. tl. 100 mm tloušťka 2x50 2255*2=4 510,000 [A]											
152	567123114a	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 5/6 (KSC II) tl 150 mm	M2	0,000	19 283,200	19 283,20	256,33	0,00	0,00	4 942 862,66	4 942 862,66	4 942 862,66	100,00%
		cena dle kalkulace z SoD (záměna recyklované směsi za SC 5/6)											
		ZBV č. 23 nahrazuje pol. č. 38 19007,2=19 007,200 [A] ZBV ZBV č. 27 geodetický protokol Š II 51/2022 92,2 m2=92,200 [A] geodetický protokol Š II 58/2022 183,8 m2 =183,800 [B] A+B=276,000 [C]											

Změnový soupis prací SO 102 po změně 17 pro ZBV 43

Evidenční číslo a název stavby: II/102 hr. hl. města Prahy-Štěchovice, rekonstrukce. ETAPA II
Číslo a název SO/PS: SO 102 - Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice
Číslo a název rozpočtu: SO 102 - Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)
102
Celkem

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
153	113107323	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 do 300 mm strojně pl do 50 m2	M2	0,000	441,600	441,600	110,00	0,00	0,00	48 576,00	48 576,00	48 576,00	100,00%
		Cena položky dle ÚRS 2022 02											
		ZBV ZBV č. 27 *geodetický protokol Š II 51/2022 92,2 m2=92,200 [A]* *geodetický protokol Š II 58/2022 183,8 m2 =183,800 [B]* *(183,8+92,2)*0,6=165,600 [C]* *A+B+C=441,600 [C]*											
154	113107331	Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 100 do 150 mm strojně pl do 50 m2	M2	0,000	276,000	276,000	256,00	0,00	0,00	70 656,00	70 656,00	70 656,00	100,00%
		Cena položky dle ÚRS 2022 02											
		ZBV ZBV č. 27 *geodetický protokol Š II 51/2022 92,2 m2=92,200 [A]* *geodetický protokol Š II 58/2022 183,8 m2 =183,800 [B]* *A+B=276,000 [C]*											
155	564970315	Podklad z betonového recyklátu plochy do 100 m2 tl 250 mm	M2	0,000	165,600	165,600	240,00	0,00	0,00	39 744,00	39 744,00	39 744,00	100,00%
		Cena položky dle ÚRS 2022 02											
		ZBV ZBV č. 27 *výměna podloží 60% z celkového množství 276 m2, tl. 20-30 cm* *276*0,6=165,600 [A]*											
156	919735123	Řezání stávajícího betonového krytu hl přes 100 do 150 mm	M	0,000	318,585	318,585	293,00	0,00	0,00	93 345,40	93 345,40	93 345,40	100,00%
		Cena položky dle ÚRS 2022 02											
		ZBV ZBV č. 27 *318,585=318,585*											
157	275313711	Základové patky z betonu tř. C 20/25	M3	0,000	2,250	2,250	4 160,00	0,00	0,00	9 360,00	9 360,00	9 360,00	100,00%
		Cena položky dle ÚRS 2023 02											
		ZBV č. 37 *zábradlí propustek* *0,5*0,5*0,75*12*											
158	91111111	Montáž zábradlí ocelového zabetonovaného	M	0,000	20,000	20,000	192,00	0,00	0,00	3 840,00	3 840,00	3 840,00	100,00%
		Cena položky dle ÚRS 2023 02											
		ZBV č. 37 *zábradlí propustek 6+4+6+4=20*											
225	74910606	zábradlí městské obloukové bezpečnostní lakovaný povrch 2000x1000mm	KUS	0,000	10,000	10,000	6 110,00	0,00	0,00	61 100,00	61 100,00	61 100,00	
		Cena položky dle ÚRS 2023 02											
		ZBV č. 37 *zábradlí propustek 6+4+6+4=20m*											
159	113107223	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 do 300 mm strojně pl přes 200 m2	M2	0,000	315,000	315,000	64,80	0,00	0,00	20 412,00	20 412,00	20 412,00	100,00%
		cena dle URS 2023/1											
		ZBV č. 38 krajnice pod svodidla km 13,7647-13,8887 km 13,8963-139803 210*1,5m=315,00 tl. 250-300mm											
160	132151101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 20 m3 strojně	M3	0,000	0,900	0,900	585,00	0,00	0,00	526,50	526,50	526,50	100,00%
		cena dle URS 2023/1											
		ZBV č. 38 1,0*0,25*0,15*24=0,9											

Změnový soupis prací SO 102 po změně 17 pro ZBV 43													
Evidenční číslo a název stavby: II/102 hr. hl. města Prahy-Štěchovice, rekonstrukce. ETAPA II Číslo a název SO/PS: SO 102 - Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice Číslo a název rozpočtu: SO 102 - Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS) 102 Celkem					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
161	339921112	Osazování betonových palisád do betonového základu jednotlivě výšky prvku přes 0,5 do 1m	KUS	0,000	75,000	75,000	216,00	0,00	0,00	16 200,00	16 200,00	16 200,00	100,00%
		cena dle URS 2023/1											
		ZBV č. 38 u HV 7,5/0,11*1,1=75											
162	273313911	Základové desky z betonu tř. C 30/37	M3	0,000	47,250	47,250	4 180,00	0,00	0,00	197 505,00	197 505,00	197 505,00	100,00%
		cena dle URS 2023/1											
		ZBV č. 38 betonový práh pod nová svodidla km 13,7647-13,8887 km 13,8963-13,9803 210*1,5*0,15=47,25											
163	273351121	Zřízení bednění základových desek	M2	0,000	63,900	63,900	560,00	0,00	0,00	35 784,00	35 784,00	35 784,00	100,00%
		cena dle URS 2023/1											
		ZBV č. 38 km 13,7647-13,8887 km 13,8963-13,9803 210*2*0,15+1,5*0,15*4=63,90											
164	273351122	Odstranění bednění základových desek	M2	0,000	63,900	63,900	138,00	0,00	0,00	8 818,20	8 818,20	8 818,20	100,00%
		cena dle URS 2023/1											
		ZBV č. 38 viz pol. č. 274354111											
165	564841112	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 130 mm	M2	0,000	315,000	315,000	167,00	0,00	0,00	52 605,00	52 605,00	52 605,00	100,00%
		cena dle URS 2023/1											
		ZBV č. 38 pod nová svodidla 210*1,5=315,00											
166	59228408	palisáda betonová tyčová hranatá přírodní 110x110x600mm	KUS	0,000	75,000	75,000	181,00	0,00	0,00	13 575,00	13 575,00	13 575,00	100,00%
		Cena položky dle ÚRS 2023 01											
		ZBV č. 38 7,5/0,11*1,1=75											
170	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 150 mm	M2	0,000	48,000	48,000	139,52	0,00	0,00	6 696,96	6 696,96	6 696,96	100,00%
		Cena položky dle SoD SO 103 pol.č. 16											
		ZBV č. 38 pod stávající svodidlo 48*1,0=48,000 [A]											
167	911381124a	Silniční svodidlo betonové jednostranné průběžné délky 4 m výšky 1,2 m montáž s přesunem (bez dodávky)	M	0,000	48,000	48,000	1 381,67	0,00	0,00	66 320,16	66 320,16	66 320,16	100,00%
		položka převzata z SoD SO 901pol. č. 911EC3											
		dle geodetického protokolu Š II 36/2023 km 14,351-14,399 vpravo 48 m											
168	911381824	Odstranění silničního betonového svodidla délky 4 m výšky 1,2 m	M	0,000	132,000	132,000	939,00	0,00	0,00	123 948,00	123 948,00	123 948,00	100,00%
		URS 2023/1											
		ZBV č. 38 geodetický protokol Š II 36/2023 km 13,763-13,799 vpravo 36m km 13,843-13,891 vpravo 48m km 14,351-14,399 vpravo 48m 36+48+48=132											

Změnový soupis prací SO 102 po změně 17 pro ZBV 43

Evidenční číslo a název stavby: II/102 hr. hl. města Prahy-Štěchovice, rekonstrukce. ETAPA II
Číslo a název SO/PS: SO 102 - Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice
Číslo a název rozpočtu: SO 102 - Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)
102
Celkem

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
171	58381008	Kostka štípaná dlažební žula velká 15/17	M2	0,000	16,500	16,500	1 610,00	0,00	0,00	26 565,00	26 565,00	26 565,00	100,00%
		Cena dle URS 2023/1											
		ZBV č. 38 okolo HV 7,5*2*1,1=16,5											
172	919735111	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm	M	0,000	208,000	208,00	77,60	0,00	0,00	16 140,80	16 140,80	16 140,80	100,00%
		Cena dle URS 2023/1											
		ZBV č. 38 nové betonové svodidlo 208=208											
169	113154122	Frézování živičného krytu tl 40 mm pruh š přes 0,5 do 1 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	M2	0,000	574,100	574,100	108,00	0,00	0,00	62 002,80	62 002,80	62 002,80	1,75%
		Cena dle URS 2022/2											
		ZBV č. 41 geodetický protokol Š II17/2022 km 10,020-10,246 vpravo prům. tl. 40 mm 18,10=18,100 [A] Š II 33/2022 km 14,580-14,608 vlevo prům. tl. 41 mm 39,1=39,100 [B] nájezd k MOL km 14,130-14429 vpravo prům. tl. 42 mm - bez odpočtu plochy 37,9=37,900 [C] výjezd od MOL km 14,130-14429 vpravo prům. tl. 42 mm - bez odpočtu plochy 49,0=49,000 [D] Š II 33/2022 km 14,580-14,609 vlevo prům. tl. 220 mm 130,50=130,500 [E] Š II 37/2022 km 11,519-11,630 vlevo prům. tl. 224 mm 299,50=299,500 [F] A+B+C+D+E+F=574,100 [G]											
226	113154123	Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š přes 0,5 do 1 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	M2	0,000	327,100	327,100	119,00	0,00	0,00	38 924,90	38 924,90	38 924,90	1,75%
		Cena dle URS 2022/2											
		ZBV č. 41 geodetický protokol Š II 23/2022 km 10,222 -10,246 vpravo prům. tl. 50 mm 70,10=70,100 [A] kaslíky km 14,226-14,273 vpravo prům. tl. 51 mm - bez odpočtu plochy 92,40=92,400 [B] km 14,302-14,343 vpravo prům. tl. 53 mm - bez odpočtu plochy 86,80=86,800 [C] km 14,354-14,393 vpravo prům. tl. 51 mm - bez odpočtu plochy 77,80=77,800 [D] A+B+C+D=327,100 [E]											
173	171152501	Zhutnění podloží z hornin soudržných nebo nesoudržných pod násypy (SAT)	M2	0,000	629,900	629,900	8,19	0,00	0,00	5 158,88	5 158,88	5 158,88	100,00%
		Cena dle URS 2023/1											
		ZBV č. 42 geodetický protokol Š II 14/2023 - rozšíření vozovky km 11,780-11,868 94,20=94,200 [A] km 11,881-11,909 23,50=23,500 [B] km 11,923-12,435 512,20=512,200 [C] A+B+C=629,900 [D]											
174	273311128	Základové desky z betonu prostého C 30/37	M3	0,000	3,500	3,500	4 980,00	0,00	0,00	17 430,00	17 430,00	17 430,00	100,00%
		Cena dle URS 2023/1											
		ZBV č. 42 geodetický protokol Š II 41/2023 3,5=3,500 [A]											
175	273311191	Příplatek k základovým deskám za betonáž malého rozsahu do 25 m3	M3	0,000	3,500	3,500	618,00	0,00	0,00	2 163,00	2 163,00	2 163,00	100,00%
		Cena dle URS 2023/1											
		ZBV č. 42 dle pol. č. 273311191 3,5=3,500 [A]											
176	317321118	Mostní římsy ze ŽB C 30/37	M3	0,000	32,750	32,750	6 520,00	0,00	0,00	213 530,00	213 530,00	213 530,00	100,00%
		Cena dle URS 2023/1											
		ZBV č. 42 geodetický protokol Š II 41/2023 římsa pravá 9,25=9,250 [A] levá 23,50=23,500 [B] A+B=32,750 [C]											
177	317353121	Bednění mostních říms všech tvarů - zřízení	M2	0,000	69,123	69,123	2 340,00	0,00	0,00	161 747,82	161 747,82	161 747,82	100,00%
		Cena dle URS 2023/1											

Změnový soupis prací SO 102 po změně 17 pro ZBV 43

Evidenční číslo a název stavby: II/102 hr. hl. města Prahy-Štěchovice, rekonstrukce. ETAPA II
Číslo a název SO/PS: SO 102 - Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice
Číslo a název rozpočtu: SO 102 - Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)
102
Celkem

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
		ZBV č. 42 levá (0,295+1,2+0,847+0,15)*14=34,888 [A] 2*1,6*((1,2+0,847+0,15)/2)=3,515 [B] pravá (0,245+1,05+0,15+0,511)*14=27,384 [C] 2*1,95*((1,05+0,15+0,511)/2)=3,336 [D] A+B+C+D=69,123 [E]											

Změnový soupis prací SO 102 po změně 17 pro ZBV 43

Evidenční číslo a název stavby: II/102 hr. hl. města Prahy-Štěchovice, rekonstrukce. ETAPA II
Číslo a název SO/PS: SO 102 - Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice
Číslo a název rozpočtu: SO 102 - Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)
102
Celkem

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
178	317353221	Bednění mostních říms všech tvarů - odstranění	M2	0,000	69,123	69,123	182,00	0,00	0,00	12 580,39	12 580,39	12 580,39	100,00%
		Cena dle URS 2023/1											
		ZBV č. 42											
179	317361116	Výztuž mostních říms z betonářské oceli 10 505	T	0,000	2,623	2,623	62 900,00	0,00	0,00	164 986,70	164 986,70	164 986,70	100,00%
		Cena dle URS 2023/1											
		ZBV č. 42											
180	317171126	Kotvení monolitického betonu římsy do mostovky kotvou do vývrtu	KUS	0,000	24,000	24,000	868,00	0,00	0,00	20 832,00	20 832,00	20 832,00	100,00%
		Cena dle URS 2023/1											
		ZBV č. 42											
181	464531112	Pohoz z hrubého drceného kameniva zrno 63 až 125 mm z terénu	M3	0,000	55,900	55,900	1 290,00	0,00	0,00	72 111,00	72 111,00	72 111,00	100,00%
		Cena dle URS 2023/1											
		ZBV č. 42 geodetický protokol Š II 16/2023 km 11928-12,060 279,5*0,2=55,900 [A]											
182	55342284R	ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ LANKOVÉ - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	0,000	27,200	27,200	4 605,55	0,00	0,00	125 270,96	125 270,96	125 270,96	100,00%
		Cena srovnatelná s cenou z SoD SO 207 pol. č. 9111C1											
		ZBV č. 42 geodetický protokol Š II 40/2023 vpravo 13,60=13,600 [A] vlevo 13,60=13,600 [B] A+B=27,200 [C]											
183	567511121	Recyklace za studena tl. 150mm	M2	0,000	2 959,200	2 959,20	119,00	0,00	0,00	352 144,80	352 144,80	352 144,80	100,00%
		Cena dle URS 2023/1											
		ZBV č. 42 Geodetický protokol Š II 17/2023 km 11,771-12,436 vpravo 2959,20=2 959,200 [A]											
184	58522150	cement	T	0,000	34,623	34,623	3 770,00	0,00	0,00	130 528,71	130 528,71	130 528,71	100,00%
		Cena dle URS 2023/1											
		ZBV č. 42 6% cementu (1300*0,06/1000)*2959,2*0,15=34,623											
185	11162540	emulze asfaltová obalovací pro použití za studena	T	0,000	7,546	7,546	37 000,00	0,00	0,00	279 202,00	279 202,00	279 202,00	100,00%
		Cena dle URS 2023/1											
		ZBV č. 42 1% asfaltu (1700*0,01/1000)*2959,2*0,15=7,546											
186	911334111	Svodidlo ocelové zábradelní zádržnosti H2 kotvené do římsy bez výplně	M	0,000	38,000	38,000	8 289,99	0,00	0,00	315 019,62	315 019,62	315 019,62	100,00%
		cena srovnatelná s cenou z SoD SO 204,205,206 pol. č. 9117C1											
		ZBV č 42 geodetický protokol Š II 40/2023 vpravo 19=19,000 [A] vlevo 19=19,000 [B] A+B=38,000 [C]											
187	963051111	Bourání mostní nosné konstrukce z ŽB Odboudání původní zdi propustu ŽB geodetický protokol Š II km 11,917 3,26+2,70	M3	0,000	5,960	5,960	9 390,00	0,00	0,00	55 964,40	55 964,40	55 964,40	100,00%
		Cena dle URS 2023/1											

Změnový soupis prací SO 102 po změně 17 pro ZBV 43

Evidenční číslo a název stavby: II/102 hr. hl. města Prahy-Štěchovice, rekonstrukce. ETAPA II
Číslo a název SO/PS: SO 102 - Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice
Číslo a název rozpočtu: SO 102 - Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)
102
Celkem

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
		ZBV č. 42 Odboudání původní zdi propustu ŽB geodetický protokol Š II 18/2023 km 11,917 3,26+2,70=5,960 [A]											
		Celkem						113 362 946,56	- 14 341 186,54	32 094 526,25	131 116 286,27	17 753 339,71	15,66%

MĚSTYS DAVLE

Městys Davle, Na náměstí 63, 252 06 Davle, e-mail: starosta@obecdavle.cz, Telefon: 257 770 257

V Davli dne 16. května 2023

Č.j.: 873/2023/UMD

Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, příspěvková organizace
Ing. Milan Peška
Vedoucí investic EU
Zborovská 11
150 21 Praha 5

Věc: Požadavek „II/102 hr. hl. m. Prahy – Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA II"

Vážený pane inženýre,

na základě dokončovaného díla rekonstrukce komunikace „II/102 hr. hl. m. Prahy – Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA II", požadujeme doasfaltování, případně zadláždění (tzv. nohavičky) v místech, kde dochází k výjezdu ze silnice II/102 na místní komunikace. Pokud by ke zpevnění výjezdu nedošlo, bude docházet při výjezdech a nájezdech k destrukci nově vytvořeného díla. V některých případech by dokonce voda ze strání mohla způsobit poddolování nově vytvořeného díla. V příloze zasíláme mapky sjezdů v Davli u nově vybudované komunikace II/102.

Děkujeme za vstřícnost a s pozdravem

Mgr. Jiří Prokůpek

starosta

MĚSTYS DAVLE

Sjezd na parc. č. 618,
k.ú. Davle - lesní cesta

Přihlásit
Vyhledat adresu
Moje mapy
Základní data
Správní hranice
Katastrální mapa KN
Katastrální mapa WMS ČR
Věcná břemena
Ortofotomapa
Majetek obce
Názvy ulic
Čísla popisná a evidenční
Terminálové katastrální mapy
Stavební objekty RÚIAN
Topografická mapa
Turistická mapa
Turistika
Volební okrsky
Další podklady
Ostatní
Letecké snímky
109
1034

Sjezd u fary - asfalt k
odvodňovacímu žlabu
617
874
107
Vrstevnice
Odpad
Veřejné osvětlení
Občanská vybavenost
Doprava
Památky
GEPRO

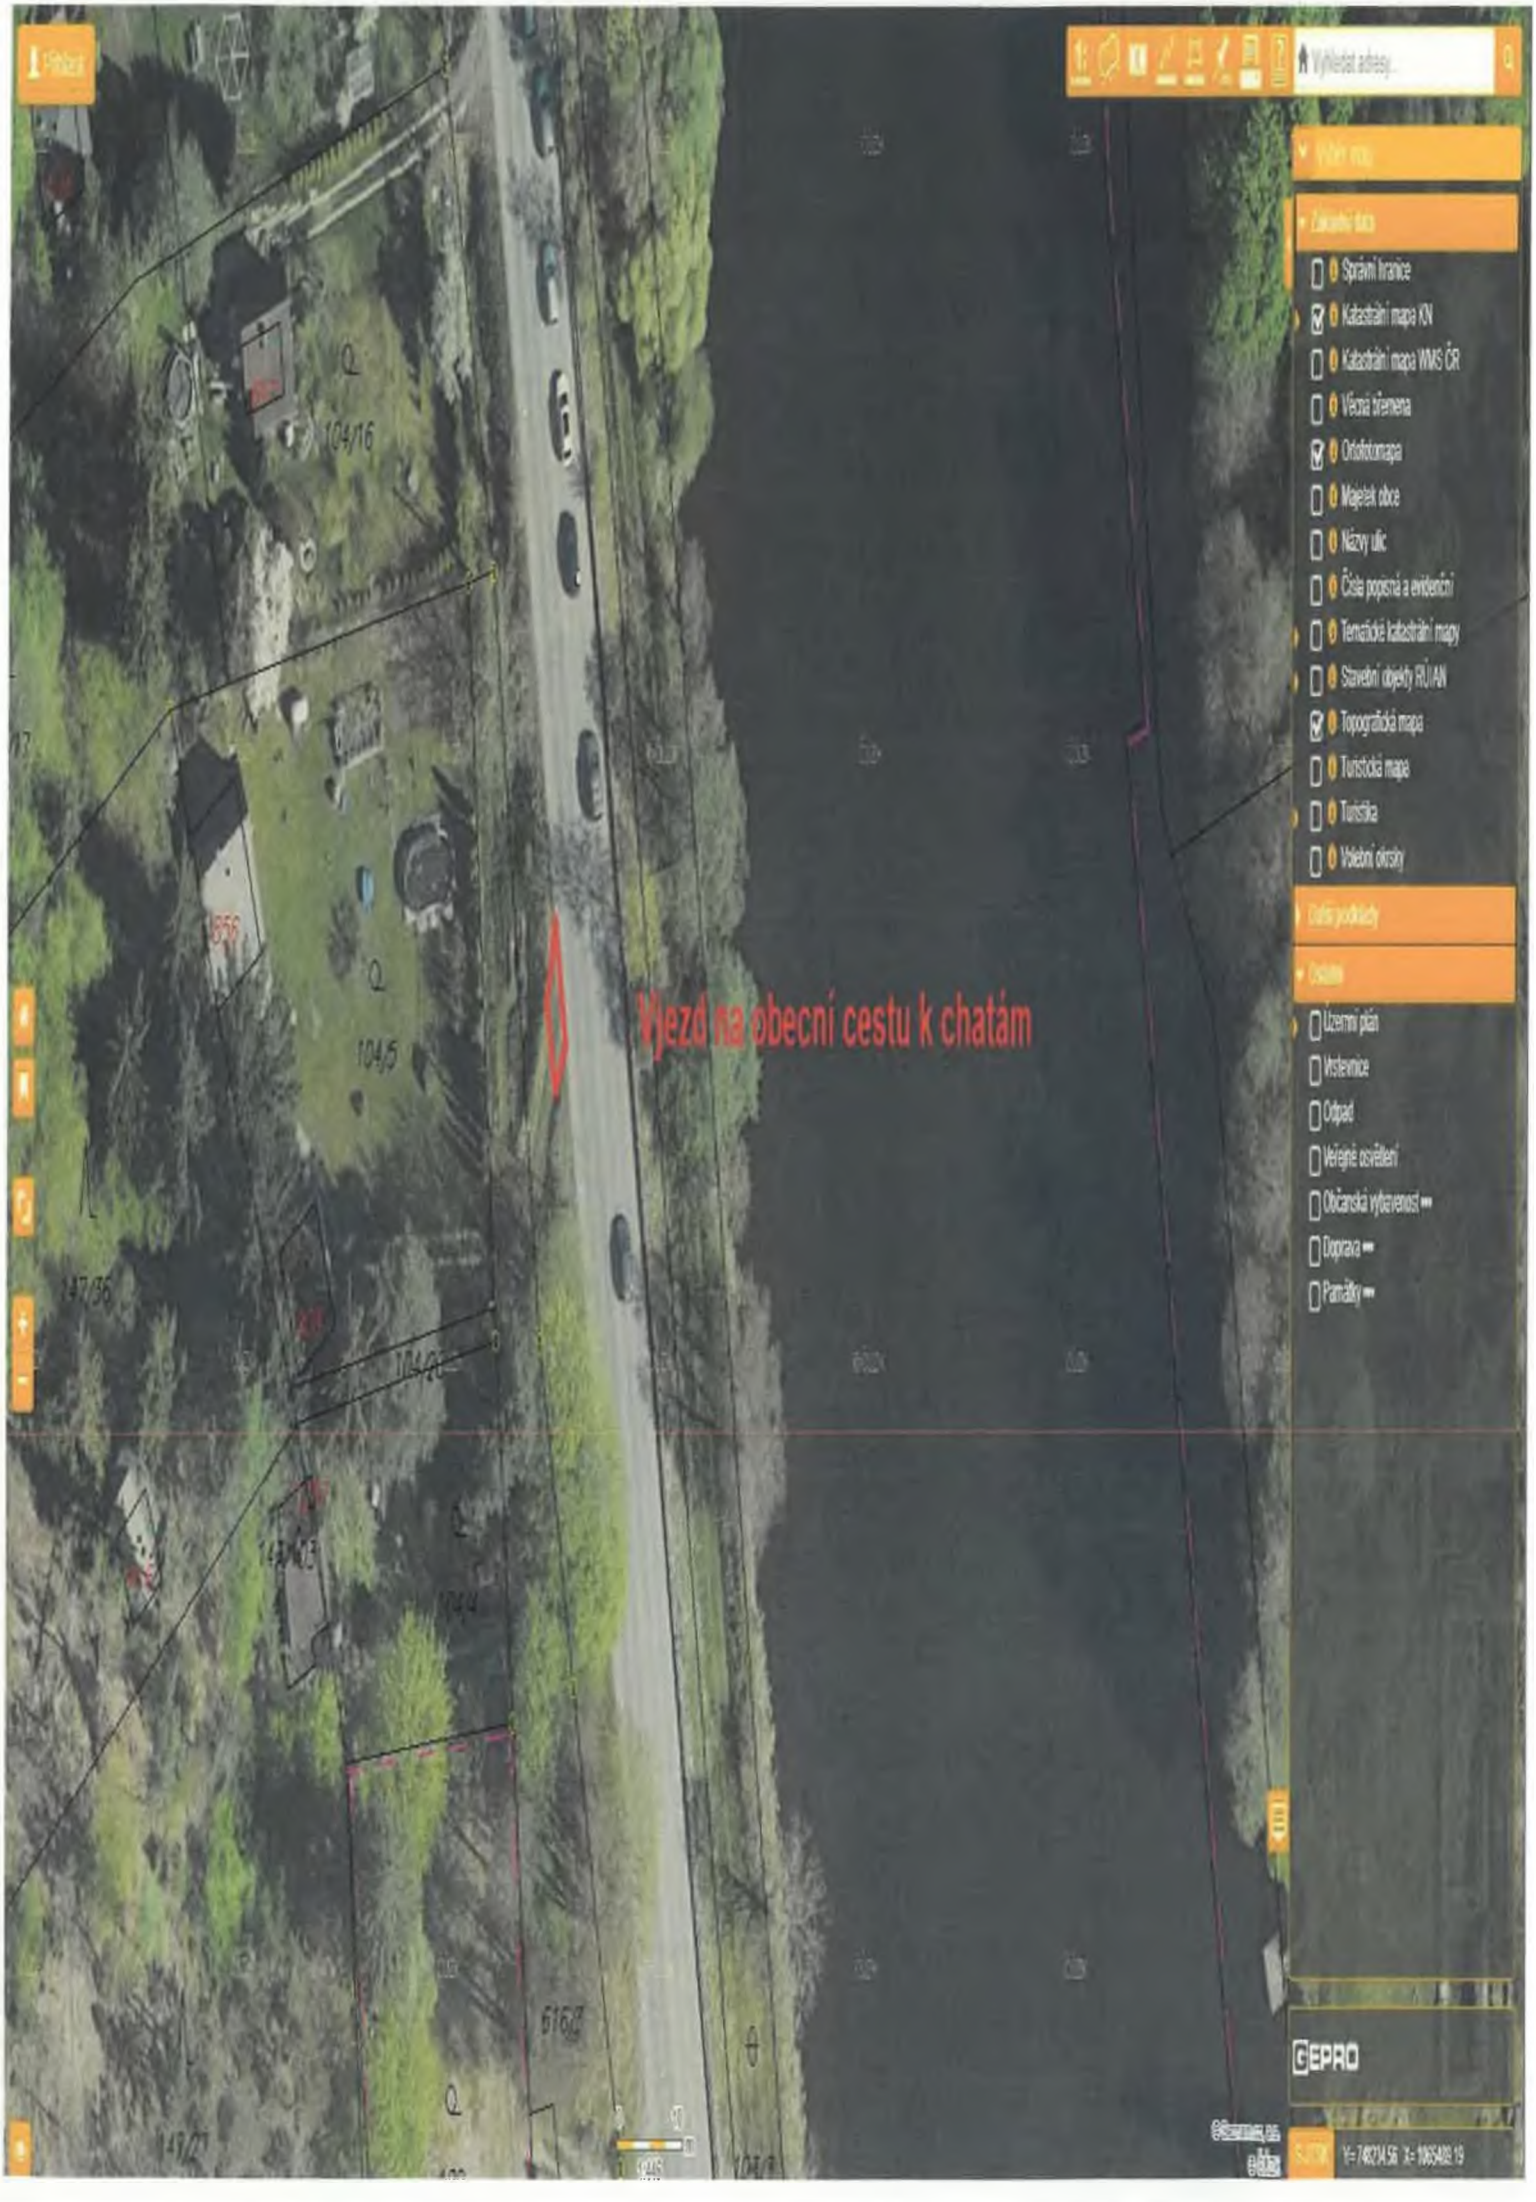
Výjezd na obecní cestu k chatám
Výběr vrstev
Základní data
Správní hranice
Katastrální mapa KN
Katastrální mapa WMS ČR
Věcná břemena
Ortofotomapa
Majetek obce
Názvy ulic
Čísla popisná a evidenční
Tematické katastrální mapy
Stavební objekty RÚIAN
Topografická mapa
Turistická mapa
Turistika
Volební okrsky
Další podklady
Ostatní
Územní plán
Vrstevnice
Odpad
Veřejné osvětlení
Občanská vybavenost
Doprava
Památky
GEPRO

Vjezd na náplavku

Vjezd na obecní cestu - 104/1, k.ú. Davle

Vjezd na obecni cestu a veřejné prostranství
parc.č. 616/7, k.ú. Davle

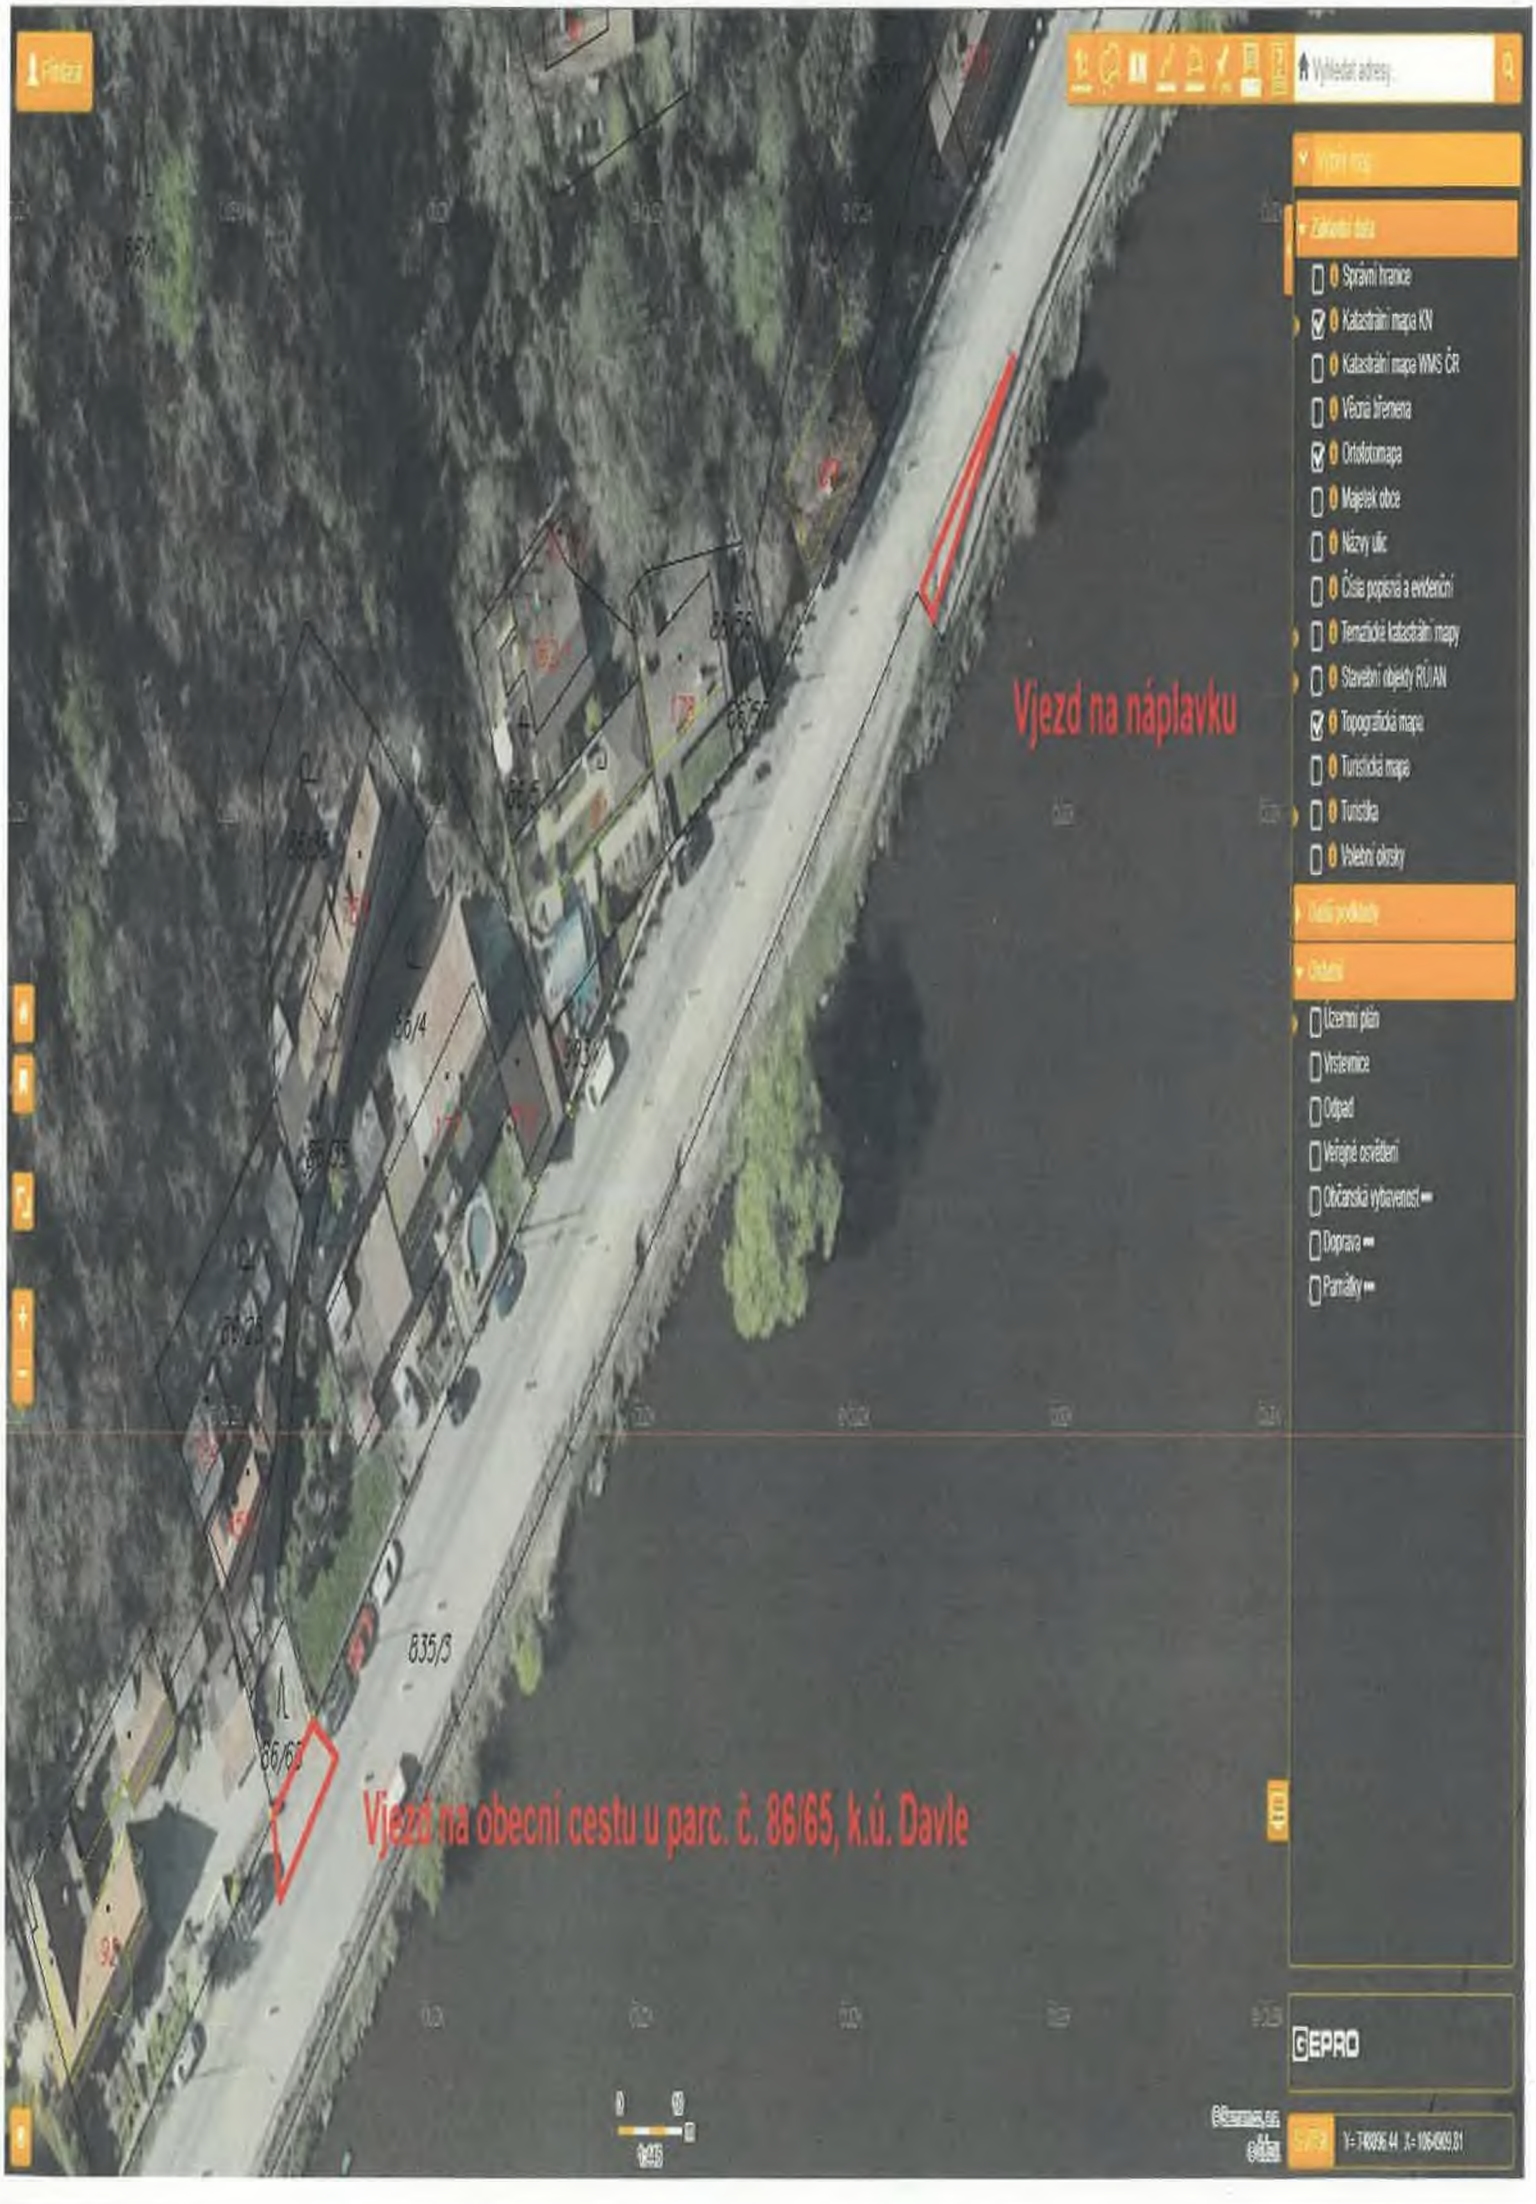
Vjezd na náplavku
Vjezd na obecní cestu u parc. č. 86/65, k.ú. Davle
86/4
86/5
86/6
86/7
86/8
86/9
86/10
86/11
86/12
86/13
86/14
86/15
86/16
86/17
86/18
86/19
86/20
86/21
86/22
86/23
86/24
86/25
86/26
86/27
86/28
86/29
86/30
86/31
86/32
86/33
86/34
86/35
86/36
86/37
835/3
92
Správní hranice
Katastrální mapa KN
Katastrální mapa WMS ČR
Věcná břemena
Ortofotomapa
Majetek obce
Názvy ulic
Čísla popisná a evidenční
Tematické katastrální mapy
Stavební objekty RÚIAN
Topografická mapa
Turistická mapa
Turistika
Volební okrsky
Územní plán
Vinařství
Odpad
Veřejné osvětlení
Občanská vybavenost
Doprava
Parcely
GEPRO
Y= 748936.44 X= 1064909.81

Sjezd k řece - Portus
Vjezd Portus
122/6
128/5
128/22
1220

Pontex, spol. s r. o., Bezová 1658/1, 147 00 Praha 4 - Braník

KSÚS Středočeského kraje
Ing. Milan Peška
Zborovská 81/11
150 00 Praha 5

Č. j.: Px 4373/2023/DDv
Datum: 22. 6. 2023
Vyřizuje: Ing. David Dvořáček, *tel* [redacted]

II/102 hr. hl. m. Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, II. etapa
Vyjádření autorského dozoru č. 70 - SO 253, demontáž ocelových svodidel

---

Zástupcem zhotovitele jsme byli požádáni o prověření soupisu prací přípravné dokumentace s hledem na řešení demontáže stávajícího ocelového svodidla v oblasti opěrné zdi SO 253.

Prověřili jsme danou skutečnost a sdělujeme, že demontáž ocelových stávajících ocelových svodidel je řešena v rámci SO 102. Výměra uvažovaná v tomto objektu však neobsahuje výměru svodidel v oblasti opěrné zdi SO 253. Výměra demontáže stávajících ocelových svodidel v oblasti opěrné zdi SO 253 v přípravné dokumentaci chybí.

Za komplikace s tímto spojené se omlouváme.

S pozdravem

Ing. David Dvořáček,
hlavní inženýr projektu

[redacted]

[redacted]

Na vědomí (zasláno pouze elektronicky):

1. Objednatel, KSÚS, Ing. Mi
2. Objednatel, KSÚS, Ing. Al
3. TDI, Pragoprojekt, a. s., In
4. Strabag, a. s., Karel Šimek,
5. Strabag, a. s., Martin Lísa,
6. Atelier PROMIKA, s. r. o.,

STRABAG a.s.
Odštěpný závod Praha
Kačírkova 982/4
158 00 Praha5

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje
Ing. Milan Peška
Zborovská 11
150 21 Praha 5

Vyřizuje:
Ing.Karel Šimek
[redacted]

Naše značka:
KSÚS_/43

Předmět: Oznámení o nové skutečnosti

Název stavby: II/102 hr. hl. města Prahy-Štěchovice, rekonstrukce. ETAPA II.

V souladu se smlouvou o dílo č. **S-468/00066001/2020** Vás informujeme o následujících nově zjištěných skutečnostech.
1) Na žádost městyse Davle, který požaduje zaasfaltování, popřípadě dodláždění v napojení na rekonstruovanou silnici II/102 v Davli v místech, kde dochází k připojení místních komunikací a hrozilo by poškození hrany nové vozovky popřípadě by se zhoršovali odtokové poměry - viz příloha.
2) Při technické prohlídce z 21.6.2023 vznikl požadavek zástupců objednatele na osazení zádržného systému – mostního zábradlí v km 15,360-15,380 vlevo pro zvýšení bezpečnosti chodců v rámci silničního provozu.
3) Vznikl nesoulad v množství demontovaných původních ocelových jednostranných svodidel z titulu jejich nezapočítání do buď stavebního objektu SO 102 nebo SO 253 - opěrné zdi – Davle - Štěchovice vlevo (a to již od PDPS).

Tato skutečnost má vliv na změnu soupisu prací. Žádáme tímto (zapsáno v příslušném stavebním deníku) o písemný pokyn k provedení prací nad rámec smlouvy.

S přátelským pozdravem

[redacted]

Ing. Karel Šimek

[redacted]

STRABAG a.s.
Ústřední 423/62
102 00 Praha 10/Česká republika

Tel. +420 272 701-667
Fax +420 272 701-701

[redacted]

Sídlo společnosti: Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 - Jinonice. Zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, sp. zn. B 7634.
IČO 60838744, DIČ CZ60838744

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, IČ 00066001,
150 21 PRAHA 5, Zborovská 11

STRABAG a.s
Kačírkova 982/4,
158 00 Praha 5

Věc: **Souhlasné stanovisko k ZBV**

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace v návaznosti na projednání s TDS a zhotovitelem v rámci akce „II/102 hr. hl. města Prahy-Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA II" **souhlasí** s navrženou a projednanou změnou. Jmenovitě souhlasí se změnami realizovanými na základě požadavků městyse Davle, konkrétně úpravy v místech napojení místních komunikací a osazení mostního zábradlí v km 15,360 – 15,380 vlevo. Dále souhlasí se skutečně zjištěným počtem demontovaných původních ocelových svodidel u opěrné zdi SO 253.
Další práce požadujeme provést v koordinaci v souladu s pokyny AD a TDS a v souladu s uzavřenou SOD.

S pozdravem

Ing. Milan Peška
technicko – provozní náměstek

IČ 00066001
DIČ CZ00066001

STRABAG a.s.
Dopravní stavitelství
direkce TC
Kačírkova 982/4
CZ – 158 00 Praha 5 / Česká republika

Stavba: II/102 HR. HL.MĚSTA PRAHY – ŠTĚCHOVICE, REKONSTRUKCE
Dodavatel: STRABAG a.s. Kačírkova 982/4, Praha 5

Číslo předávacího protokolu: Š II 37/2023

Předmět měření: SO 102 – REKONSTRUKCE VOZOVKY - DAVLE - ŠTĚCHOVICE
Zpevnění krajnice kamenem – pro obec Davle

km 10,474	– vlevo	**6,1 m²**
km 10,590	– vpravo	**9,0 m²**
km 10,675 – 10,690	– vpravo	**17,2 m²**
km 11,049	– vlevo	**9,0 m²**
km 11,082	– vpravo	**10,2 m²**
km 11,166	– vlevo	**6,0 m²**
km 11,255 – 11,286	– vlevo	**23,10 m²**
km 11,666 – 11,673	– vlevo	**10,3 m²**

Měření bylo provedeno totální stanicí TOPCON IS 305.
Dopustné odchylky měření a výpočtu nebyly překročeny.

Souřadnicový systém: S-JTSK
Výškový systém:
Přílohy:

Zaměřil:	3.8.2023	Ing. S. Bílek
Zpracoval:	4.8.2023	Ing. S. Bílek
Ověřil:	4.8.2023	Ing. S.Bílek

Ověření výsledků zeměměřických činností ve výstavbě
podle §13 odst.1 písm. c) zák. č. 200/1994 Sb

II/102 HR. HL.MĚSTA PRAHY – ŠTĚCHOVICE, REKONSTRUKCE, etapa II

SO 102 – REKONSTRUKCE VOZOVKY - DAVLE - ŠTĚCHOVICE

Zpevnění krajnice kamenem – pro obec Davle

Seznam souřadnic

Bod	Y	X	Výška
1	748084.75	1064883.02	202.87
2	748085.47	1064882.18	202.92
3	748089.39	1064885.41	202.98
4	748088.56	1064886.32	202.89
5	748086.93	1064884.99	202.87
6	748178.92	1064949.10	203.13
7	748179.71	1064948.09	203.10
8	748180.81	1064949.09	203.09
9	748183.17	1064951.04	203.11
10	748185.30	1064952.97	203.07
11	748184.59	1064953.85	203.16
12	748242.79	1065012.12	203.28
13	748243.65	1065011.57	203.33
14	748246.52	1065017.32	203.31
15	748247.48	1065016.79	203.30
16	748250.12	1065020.75	203.34
17	748249.08	1065021.31	203.31
18	748251.09	1065024.65	203.34
19	748252.23	1065024.05	203.29
20	748291.15	1065370.39	203.60
21	748290.03	1065370.16	203.56
22	748288.19	1065377.39	203.50
23	748289.43	1065377.59	203.59
24	748292.16	1065404.84	203.90
25	748294.22	1065405.33	203.49
26	748293.15	1065409.89	203.43
27	748291.02	1065409.55	203.83
28	748273.27	1065485.73	203.85
29	748274.48	1065486.10	203.81
30	748273.46	1065490.59	203.66
31	748272.20	1065490.43	203.87
32	748243.20	1065573.83	204.22
33	748242.66	1065573.65	203.90
34	748240.82	1065585.00	204.28
35	748239.95	1065585.28	204.01
36	748240.48	1065585.42	204.27
37	748240.28	1065586.47	204.26
38	748239.76	1065586.39	203.99
39	748237.81	1065595.50	203.95
40	748238.51	1065595.63	204.29
41	748236.61	1065604.21	204.26
42	748236.00	1065604.02	203.95
47	748176.50	1065987.71	204.22
48	748175.33	1065987.40	204.08
49	748175.42	1065983.90	204.00
50	748176.11	1065980.67	203.96
51	748177.47	1065980.79	204.16

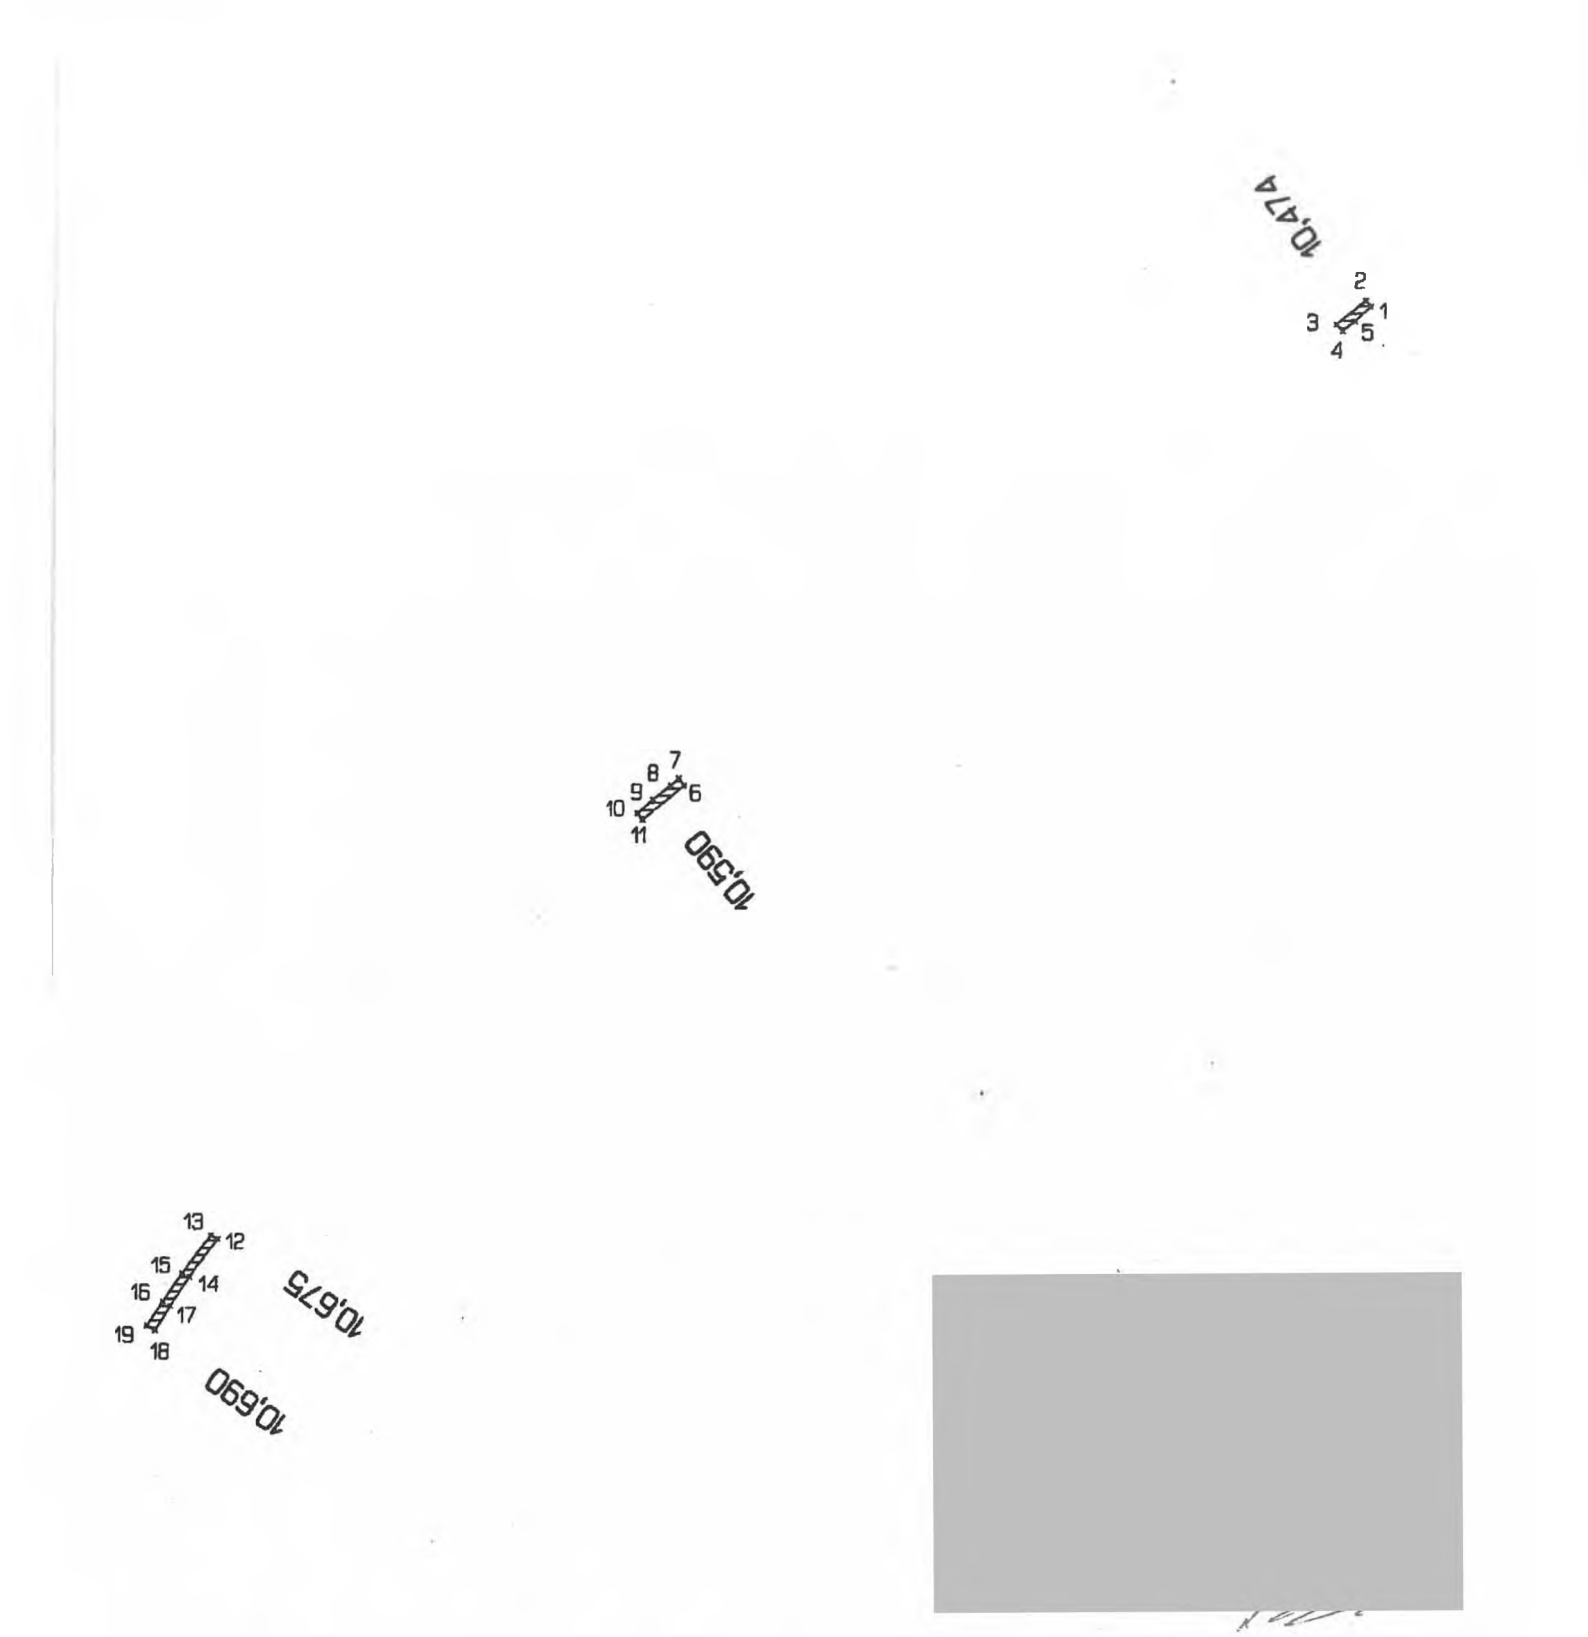

STRABAG a.s. Kačírkova 982/41, Praha 5	číslo zakázky		
	ověřil	Ing. S. Brlek	
	datum	4.8.2023	
	číslo ověření	č) 111/2023	
akce **II/102 Hr. Hl. Města Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, etapa II** SO 102 Rekonstrukce vozovky, Davle - Štěchovice Zpevnění krajnice kamenem - pro obec Davle			výkres číslo 1
		měřítko	1 : 1000
zaměřil	Ing. Stanislav Brlek	datum 3.8.2023	souř. systém S-JTSK
kreslil	Ing. Stanislav Brlek	datum 4.8.2023	výšk. systém Bpv

STRABAG a.s. Kačírkova 982/41, Praha 5		číslo zakázky	
		ověřil	Ing. S. Brlek
		datum	4.8.2023
		číslo ověření	čj 111/2023
akce **II/102 Hr. hl. Města Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, etapa II** **SO 102 Rekonstrukce vozovky, Davle - Štěchovice** Zpevnění krajnice kamenem - pro obec Davle			výkres číslo 2
			měřítko 1 : 1000
zaměřil Ing. Stanislav Brlek	datum 3.8.2023	souř. systém S-JTSK	
kreslil Ing. Stanislav Brlek	datum 4.8.2023	výšk. systém Bpv	

STRABAG a.s. Kačírkova 982/41, Praha 5			číslo zakázky		
			ověřil	Ing. S. Brlek	
			datum	4.8.2023	
			číslo ověření	č) 111/2023	
akce **II/102 Hr. Hl. Města Prahy – Štěchovice, rekonstrukce, etapa II** SO 102 Rekonstrukce vozovky, Davle – Štěchovice Zpevnění krajnice kamenem – pro obec Davle					výkres číslo 3
				měřítko	1 : 1000
zaměřil	Ing. Stanislav Brlek	datum	3.8.2023	souř. systém	S-JTSK
kreslil	Ing. Stanislav Brlek	datum	4.8.2023	výšk. systém	Bpv

STRABAG a.s.
Dopravní stavitelství
direkce TC
Kačírkova 982/4
CZ – 158 00 Praha 5 / Česká republika

Stavba: **II/102 HR. HL.MĚSTA PRAHY – ŠTĚCHOVICE, REKONSTRUKCE**
Dodavatel: **STRABAG a.s. Kačírkova 982/4, Praha 5**

Číslo předávacího protokolu: Š II 35/2023

Předmět měření: **SO 102 – REKONSTRUKCE VOZOVKY - DAVLE - ŠTĚCHOVICE**
Demontáž starých ocelových svodidel

vlevo celkem - 3233 m - viz příloha
vpravo celkem - 760 m - viz příloha

Měření bylo provedeno totální stanicí TOPCON IS 305.
Dopustné odchylky měření a výpočtu nebyly překročeny,

Souřadnicový systém: S-JTSK
Výškový systém:
Přílohy: Seznam

Zaměřil:	2020 – 23	Ing. S. Bílek
Zpracoval:	14.7.2023	Ing. S. Bílek
Ověřil:	14.7.2023	Ing. S.Bílek

Ověření výsledků zeměměřických činností ve výstavbě
podle §13 odst.1 písm. c) zák. č. 200/1994 Sb

II/102 HR. HL. MĚSTA PRAHY - ŠTĚCHOVICE, REKONSTRUKCE, ETAPA II

SO 102 - Rekonstrukce komunikace, Davle - Štěchovice

Demontáž starých ocelových svodidel

vlevo				vpravo		
začátek	konec	délka		začátek	konec	délka
10,000	10,122	122				
10,135	10,250	115				
10,250	10,360	110				
10,360	10,478	118				
10,480	10,660	180				
10,683	11,048	365				
11,052	11,359	307				
11,381	11,628	247				
				11,720	11,870	150
11,670	11,970	300				
				11,880	12,050	170
11,975	12,440	465				
13,150	13,202	52				
				13,200	13,578	388
13,718	14,226	508				
				14,215	14,267	52
14,226	14,390	164				
14,390	14,406	16				
14,409	14,461	52				
14,468	14,580	112				
celkem		3233				760

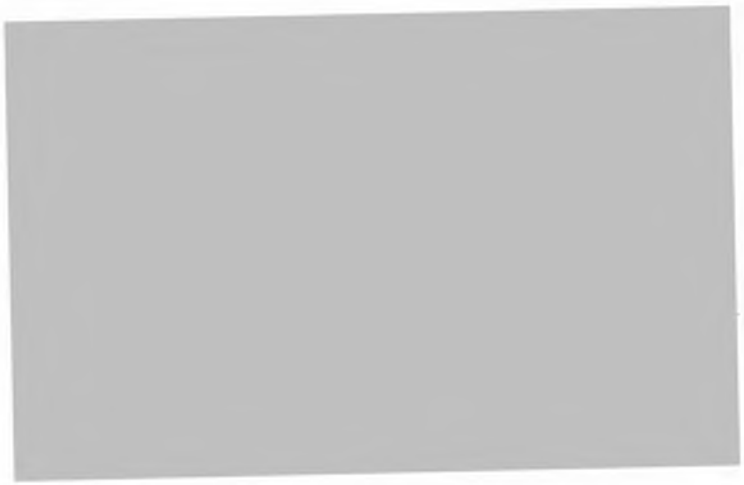

B 7634/RD683/MSPH
Fj 479008/2022/MSPH

USNESENÍ

Městský soud v Praze rozhodl vyšší soudní úřednicí Marií Šiškovou v právní věci

navrhovatele: **STRABAG a.s.**, IČO 608 38 744
sídlem Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5

o návrhu na zápis změny do obchodního rejstříku

takto:

V obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze v oddílu B, vložce číslo 7634

se vymazává

Statutární orgán
člen představenstva
Ing. JARMILA POVAŽANOVÁ, dat. nar. 19. října 1962, r.č. 626019/6514
82101 Bratislava, Drieňova 16175/1B, Slovenská republika
Den vzniku členství: 3. června 2019

Prokura
Ing. RENATA HAMRSKÁ, dat. nar. 19. března 1961, r.č. 615319/0153
Hvozdíková 837, Liberec XXV-Vesec, 463 12 Liberec

Ing. TOMÁŠ HOZA, dat. nar. 8. května 1969, r.č. 690508/4406
Purkyňova 749/10, 767 01 Kroměříž

Ing. JIŘÍ JAROŠ, dat. nar. 31. ledna 1962, r.č. 620131/0643
Plachého 272/25, České Budějovice 1, 370 01 České Budějovice

se zapisuje

Statutární orgán
U vymazávané osoby: Ing. JARMILA POVAŽANOVÁ, dat. nar.19. října 1962, r.č.626019/6514
Den zániku členství: 7. prosince 2022

člen představenstva
Ing. TOMÁŠ HOZA, dat. nar. 8. května 1969, r.č. 690508/4406
Purkyňova 749/10, 767 01 Kroměříž
Den vzniku členství: 8. prosince 2022

Prokura
Ing. KAREL KLOFÁČ, dat. nar. 18. června 1973, r.č. 730618/2972
U Rybníčku 4041, 580 01 Havlíčkův Brod

Shodu s prvopisem potvrzuje Ilona Žďárská

Den zápisu změny: Dnem nabytí právní moci

Poučení:

Proti tomuto usnesení lze podat odvolání do patnácti dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím nadepsaného soudu.

Praha 19. prosince 2022

Marie Šišková v. r.
vyšší soudní úřednice

Shodu s prvopisem potvrzuje Ilona Žďárská

Výpis

z obchodního rejstříku, vedeného
Městským soudem v Praze
oddíl B, vložka 7634

Datum vzniku a zápisu:
1. března 1994

Spisová značka:
B 7634 vedená u Městského soudu v Praze

Obchodní firma:
STRABAG a.s.

Sídlo:
Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5

Identifikační číslo:
608 38 744

Právní forma:
Akciová společnost

Předmět podnikání:
Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

projektová činnost ve výstavbě

výroba betonu a obalovaných živičných směsí

opravy silničních vozidel

hornická činnost a činnost prováděná hornickým způsobem v rozsahu: (otvírka, příprava a dobývání výhradních ložisek s omezením pro povrchové dobývání; zřizování, zajišťování a likvidace důlních děl; úprava a zušlechťování nerostů prováděné v souvislosti s jejich dobýváním; zřizování a provozování odvalů, výsypek a odkališť; dobývání ložisek nevyhrazených nerostů, vyhledávání a průzkum ložisek nevyhrazených nerostů; podzemní sanační práce; zemní práce prováděné za použití strojů a výbušnin; podzemní práce spočívající v hloubení důlních jam a studní, v ražení štol a tunelů)

silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny, - vnitrostátní příležitostná osobní, - mezinárodní příležitostná osobní

výkon zeměměřických činností

provádění trhacích a ohňostrojných prací

výzkum, vývoj, výroba, ničení, zneškodňování, zpracování, nákup a prodej výbušnin

zámečnictví, nástrojářství

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení

poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

distribuce pohonných hmot

Statutární orgán:

předseda představenstva:

Dipl. Ing. MORITZ FREYBORN, dat. nar. 1. září 1975
1180 Vídeň, Haizingergasse 1-3/32, Rakouská republika
Den vzniku funkce: 1. listopadu 2022
Den vzniku členství: 1. listopadu 2022

člen představenstva:

Ing. PAVEL BRYCHCÍN, dat. nar. 25. května 1972
Zakšínská 607/11, Střížkov, 190 00 Praha 9

Den vzniku členství: 1. července 2020

člen představenstva:

Ing. TOMÁŠ HOZA, dat. nar. 8. května 1969
Purkyňova 749/10, 767 01 Kroměříž
Den vzniku členství: 8. prosince 2022

Počet členů:

3

Způsob jednání:

Statutárním orgánem je představenstvo. Jménem společnosti jedná vůči třetím osobám, před soudy, správními a samosprávnými orgány ve všech záležitostech představenstvo a to vždy předseda představenstva s dalším členem představenstva nebo dva členové představenstva. Podepisování se děje tím způsobem, že k napsané firmě společnosti nebo otisku razítka připojí svůj podpis předseda představenstva s dalším členem představenstva nebo dva členové představenstva s označením své funkce.

Prokura:

Ing. RADEK HRADIL, dat. nar. 2. února 1964
Okružní 660, Mařatice, 686 05 Uherské Hradiště

Ing. ROSTISLAV KRONES, dat. nar. 8. května 1968
č.p. 46, 592 03 Kadov

Ing. JIŘÍ HORÁLEK, dat. nar. 16. listopadu 1964
Ludvíka Podéště 777/16, Stránice, 602 00 Brno

Ing. JAN HÝZL, dat. nar. 6. ledna 1976
Profesora Fuky 1276/4, Nová Ulice, 779 00 Olomouc

Ing. JAN CHROMÝ, dat. nar. 30. června 1974
Litvínovice - Mokré 119, PSČ 37001

Ing. PAVEL KLAS, dat. nar. 22. listopadu 1964
č.p. 5, 386 01 Radošovice

Ing. RADIM AULICKÝ, dat. nar. 22. června 1974
Oldřicha Nového 833, 252 64 Velké Přílepy

Ing. ALEXEJ KOROTKOV, dat. nar. 1. dubna 1978
Lechowiczova 2827/11, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava

Ing. LUKÁŠ PŘIBYL, dat. nar. 21. prosince 1982
Slunečná 333, 373 71 Adamov

Ing. RICHARD FISCHER, dat. nar. 7. října 1975
V Podhradí 33, 250 73 Jenštejn

Ing. Mag. MICHAL PRISTAŠ, dat. nar. 14. dubna 1981
2460 Bruckneudorf, Marc Aurel Strasse 2f, Rakouská republika
Ing. Mag. Michal Pristaš je oprávněn zastupovat Společnost spolu s dalším prokuristou. Toto zmocnění zahrnuje i oprávnění nabýt, zcizit nebo zatížit nemovitou věc.

MICHAL VANĚČEK, dat. nar. 27. března 1978
Pod Nouzovem 1007/25, Kbely, 197 00 Praha 9

Ing. MICHAL KOPPER, dat. nar. 15. května 1979
82104 Bratislava - Ružinov, Doležalova 3424/15F, Slovenská republika
Ing. Michal Kopper je oprávněn zastupovat Společnost spolu s dalším prokuristou. Toto zmocnění zahrnuje i oprávnění nabýt, zcizit nebo zatížit nemovitou věc.

Ing. TOMÁŠ RYS, dat. nar. 17. listopadu 1981
U sanatoria 737/20, Radotín, 153 00 Praha 5

PETR KAFKA, dat. nar. 21. února 1962
Sadová 246, Nemošice, 530 03 Pardubice

Ing. arch. JAN HAVELKA, dat. nar. 9. srpna 1988
č.p. 228, 373 32 Jílovice

Ing. JIŘÍ SVOBODA, Ph.D., dat. nar. 27. září 1984

U Hřiště 456, Mladcová, 760 01 Zlín

Ing. KAREL KLOFÁČ, dat. nar. 18. června 1973
U Rybníčku 4041, 580 01 Havlíčkův Brod

Ing. MARTIN BAŠÁR, dat. nar. 3. září 1979
Dělnická 443, 252 41 Dolní Břežany

K zastupování a podepisování za společnost jsou oprávněni vždy dva prokuristé. Prokuristé podepisují tím způsobem, že k firmě společnosti připojí svůj podpis s dodatkem označujícím prokuru.

Dozorčí rada:

předseda dozorčí rady:

Dipl. Ing. (FH) ALFRED WATZL, dat. nar. 13. září 1970
05-080 Izabelin C, Krasinskiego 37, Polská republika
Den vzniku funkce: 13. června 2022
Den vzniku členství: 13. června 2022

člen dozorčí rady:

Mgr. KARIN BÍLKOVÁ, dat. nar. 18. dubna 1975
Bezručova 603, 250 91 Zeleneč
Den vzniku členství: 4. prosince 2018

člen dozorčí rady:

Mag. HERIBERT HERZOG, dat. nar. 15. září 1964
7423 Grafenschachen, Grafenschachen 22, Rakouská republika
Den vzniku členství: 12. ledna 2023

Počet členů:

3

Jediný akcionář:

Bau Holding Beteiligungs GmbH
9800 Spittal an der Drau, Ortenburgerstraße 27, Rakouská republika
Registrační číslo: FN 117476 i
Právní forma: společnost s ručeným omezeným

Akcie:

1 000 ks kmenové akcie na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 10 000,- Kč

11 096 ks kmenové akcie na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 100 000,- Kč

Základní kapitál:

1 119 600 000,- Kč
Splaceno: 1 119 600 000,- Kč

Ostatní skutečnosti:

Akciová společnost byla založena notářským zápisem osvědčenou zakladatelskou listinou tří zakladatelů, fyzických osob, ze dne 23.2.1994, rozdělením současně zrušené společnosti s ručením omezeným SAREMO, se sídlem České Budějovice, ul.Plachého 27, na dvě nově vzniklé společnosti SAREMO a.s. a HYDROLINE s.r.o., se sídlem České Budějovice, Lidická 1131.
Zakladatelé současně schválili stanovy a.s. a zvolili členy orgánů společnosti.
Notářský zápis, zakladatelská smlouva a stanovy a.s. byly přiloženy.

Základní jmění je splaceno v plném rozsahu.

Valná hromada společnosti rozhodla dne 30.6.1999 o sloučení se společností STRABAG ČR a.s.

Na společnost STRABAG a.s. se sídlem Praha 5, Na Bělidle 198/21, PSČ 150 00, IČ 608 38 744, jako nástupnickou společnost, přešlo na základě smlouvy o fúzi sloučením ze dne 20. 11. 2006 s rozhodným dnem sloučení 1. 10. 2006 jmění společnosti ILBAU Plzeň a.s. se sídlem České Budějovice , Vrbenská 31,

IČ 648 34 352, jako zanikající společnosti.
Společnost STRABAG a.s. se sídlem Praha 5, Na Bělidle 198/21, PSČ 150 00 , IČ 608 38 744 je právním nástupcem bez likvidace zrušené a zaniklé společnosti ILBAU Plzeň a.s. se sídlem České Budějovice, Vrbenská 31, IČ 648 34 352, dosud zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích oddílu B vložce 1148.

Na společnost STRABAG a.s. se sídlem Praha 5, Na Bělidle 198/21, PSČ 150 00, IČ 608 38 744, jako nástupnickou společnost, přešlo na základě smlouvy o fúzi sloučením ze dne 20.11.2006 s rozhodným dnem sloučení 1.10.2006 jmění společnosti Stavební technologie, spol. s r.o. se sídlem Humpolec, Nádražní 729, okres Pelhřimov, PSČ 396 01, IČ 251 83 133, jajo zanikající společnosti.
Společnost STRABAG a.s. se sídlem Praha 5, Na Bělidle 198/21, PSČ 150 00, IČ 608 38 744 je právním nástupcem bez likvidace zrušené a zaniklé společnosti Stavební technologie, spol. s r.o. se sídlem Humpolec, Nádražní 729, okres Pelhřimov, PSČ 396 01, IČ 251 83 133, dosud zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích C 8266.

Obchodní společnost STRABAG a.s. jako společnost nástupnická převzala v důsledku vnitrostátní fúze sloučením jmění zanikající společnosti STRABAG konstrukce s.r.o., IČ 252 63 579, se sídlem Chrudim, Tovární 209.

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.

Na společnost STRABAG a.s., jako na společnost nástupnickou, přešlo v důsledku fúze sloučením jmění zanikajících společností JHP spol. s r.o., se sídlem Ústřední 423/62, Štěrboholy, 102 00 Praha 10, identifikační číslo 45798290 a MiTTaG spol. s r.o. pozemní a průmyslové stavitelství, se sídlem Na bělidle 198/21, Smíchov, 150 00 Praha 5, identifikační číslo 00547514. Rozhodným dnem fúze byl 1. leden 2016.

Na základě projektu vnitrostátní fúze sloučením ze dne 11.8.2017 došlo ke sloučení společnosti Dálniční stavby Praha, a.s., se sídlem Praha 5, Na Bělidle 198/21, PSČ 15000, identifikační číslo 40614948, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu B, vložce 744, jako zanikající společnosti, do společnosti STRABAG a.s., jako nástupnické společnosti, přičemž na nástupnickou společnost STRABAG a.s. přešlo jmění zanikající společnosti Dálniční stavby Praha, a.s.

Odštěpné závody:

Odštěpný závod:

Označení odštěpného závodu:

STRABAG a.s. odštěpný závod Praha

Sídlo nebo umístění:

Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5

Předmět podnikání:

montáž, opravy údržba revize vyhrazených el. zařízení

výroba betonu a obalovaných živičných směsí

výkon zeměměřických činností

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

zámečnictví, nástrojářství

opravy silničních vozidel

provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Vedoucí odštěpného závodu:

Ing. MARTIN BAŠÁR, dat. nar. 3. září 1979
Dělnická 443, 252 41 Dolní Břežany

Odštěpný závod:

Označení odštěpného závodu:

STRABAG a.s. odštěpný závod České Budějovice

Sídlo nebo umístění:

České Budějovice, Vrbenská 31, PSČ 37006

Předmět podnikání:

výkon zeměměřičských činností

projektová činnost ve výstavbě

výroba betonu a obalovaných živičných směsí

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

zámečnictví, nástrojářství

opravy silničních vozidel

provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Vedoucí odštěpného závodu:

Ing. PAVEL KLAS, dat. nar. 22. listopadu 1964
č.p. 5, 386 01 Radošovice

Odštěpný závod:

Označení odštěpného závodu:

STRABAG a.s. odštěpný závod Morava

Sídlo nebo umístění:

Holická 1004/29, Hodolany, 779 00 Olomouc

Předmět podnikání:

výroba betonu a obalovaných živičných směsí

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

opravy silničních vozidel

provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Vedoucí odštěpného závodu:

Ing. JAN HÝZL, dat. nar. 6. ledna 1976
Profesora Fuky 1276/4, Nová Ulice, 779 00 Olomouc

Odštěpný závod:

Označení odštěpného závodu:

STRABAG a.s. odštěpný závod pozemní a inženýrské stavitelství Praha

Sídlo nebo umístění:

Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5

Předmět podnikání:

výroba betonu a obalovaných živičných směsí

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny, - vnitrostátní příležitostná osobní, - mezinárodní příležitostná osobní

provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Vedoucí odštěpného závodu:

PETR KAFKA, dat. nar. 21. února 1962
Sadová 246, Nemošice, 530 03 Pardubice

Odštěpný závod:

Označení odštěpného závodu:

STRABAG a.s. odštěpný závod pozemní a inženýrské stavitelství České Budějovice

Sídlo nebo umístění:

České Budějovice, Vrbenská /31, PSČ 37006

Předmět podnikání:

- Provádění staveb, jejich změn a odstraňování
- projektová činnost ve výstavbě
- výkon zeměměřických činností
- zámečnictví, nástrojářství
- silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, -

nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny, - vnitrostátní příležitostná osobní, - mezinárodní příležitostná osobní
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
- montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení

Vedoucí odštěpného závodu:

Ing. JAN CHROMÝ, dat. nar. 30. června 1974
Mokré 119, 370 01 Litvínovice

Odštěpný závod:

Označení odštěpného závodu:

STRABAG a.s. odštěpný závod STRABAG Real Estate

Sídlo nebo umístění:

Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5

Předmět podnikání:

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor

Vedoucí odštěpného závodu:

Dipl. Ing. SONJA WERTITSCH, dat. nar. 29. září 1976
1210 Vídeň, Kugelfanggasse 79a, Rakouská republika

Tento výpis je neprodejný a byl pořízen na Internetu (http://www.justice.cz).
Dne: 7.9.2023 10:56
Údaje platné ke dni 7.9.2023 03:54

Naše značka: TD/303/19-120/VM/23
Vaše značka:

Vyřizuje: M. Valenta

Datum: 7. 11. 2023

KSÚS Středočeského kraje

Ing. Milan PEŠKA
Technicko-provozní náměstek

Zborovská 11
150 21 Praha 5

Stavba: II/102 hr. hl. m Prahy – Štěchovice, rekonstrukce, etapa II.

Věc: Stanovisko TDS k návrhu ZBV č. 43 SO 102 Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice (Ocelové svodidlo, dlažba v Davli).

Zhotovitel stavby dne 22. 8. 2023 předložil a po připomínkách TDS z 9. 10. doplnil 11.10. 2023 návrh ZBV č. 43 SO 102 (102/17) Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice (Ocelové svodidlo, dlažba v Davli).

Návrh změny řeší požadavek městyse Davle na zpevnění plochy v místech sjezdů ze silnice II/102.
Změna měla vliv na položky č. 11, 16, 18, 19, 31, 49, 128, 129 a položky nové č. 130 a 137.

Dále řeší změnu množství demontovaných ocelových svodidel viz stanovisko AD č. 70 z 22. 6. 2023.
Změna měla vliv na položku č. 112 a novou položku č. 130.

TDS potvrzuje skutečnosti uvedené v návrhu ZBV č. 43 SO 102 (102/17) Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice (Ocelové svodidlo, dlažba v Davli).

M. Valenta
Technický dozor investora

Na vědomí: Ing. Karel Šimek

Krycí list ZBV

Název a evidenční číslo Stavby:	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS:	Číslo ZBV:
II/102 hr. hl. města Prahy-Štěchovice, rekonstrukce. ETAPA II Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): **Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice**	**102/18**	**44**

Objednatel: **Krajská správa a údržba Středočeského kraje, příspěvková organizace**
Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5, Smíchov
IČ: 00066001 DIČ: CZ00066001

Zhotovitel: **STRABAG a. s.**
Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5
IČ: 60838744 DIČ: CZ60838744

Rekapitulace ZBV č. 44 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
44.1	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
44.2	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
44.3	-141 683,84	574 840,90	433 157,06

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
44.4	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
44.5	0,00	0,00	0,00

Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
44	**-141 683,84**	**574 840,90**	**433 157,06**

Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.
Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy
a pro Rozpis ocenění změn položek.

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby:	Číslo SO/PS /	Číslo ZBV:
II/102 hr. hl. města Prahy-Štěchovice, rekonstrukce. ETAPA II Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): **Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice**	/ číslo Změny SO/PS: **102/18**	**44**

Strany smlouvy o dílo č. S-468/00066001/2020 na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 3.3.2020 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Krajská správa a údržba Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5, Smíchov

Zhotovitel: STRABAG a. s., Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5

Přílohy Změnového listu:

1. Krycí list	1	počet listů
2. Změnový list	1	počet listů
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	1	počet listů
4. Rozpis ocenění Změn položek	1	počet listů
5. Přehled zařazení změn do skupin	4	počet listů
6. Přehled dalších dokladů	1	počet listů
Další doklady dle přehledu dokladů	73	počet listů

Paré č.	Příjemce
1	Objednatel
2	Zhotovitel
3	Projektant (AD)
4	Stavební dozor
5	Supervize (Regionální dotační kancelář)

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis a zdůvodnění Změny:

Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice / Změna DZ

Změna byla vyvolána požadavkem městyse Davle z důvodu zlepšení podmínek bezpečnosti chodců v rámci silničního provozu pohybujících se podél silnice II/102 v intravilánu Davle. Rozsah změny se týká úseku v provozním staničení km 10,0-11,960, tedy těsně za hranice městyse. Byla projednána s IDSK, policií ČR a městysem Davle a objednatelem. Zahrnuje šířkovou úpravu jízdních pruhů-zúžení, vytvoření koridoru pro pěší ohraničeném VDZ a SDZ doplněném o balisety, dopravní knoflíky u pravé vodící čáry rekonstruované silnice a piktogramy na asfaltobetonové vozovce. Změna se týká položek č. 70, 71, 77, 78, 79, 81, 82, 83, 85, 87, 90, 113, 114 a nových položek č. 189-192.

Jedná se o Změnu nepodstatnou, nepředvídanou, která je tak podle § 5, odst. 1, písm.c), resp. podle § 10 Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 01.01.2022) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zařazena do Skupiny 3 (změny z nepředvídaných důvodů). Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. Změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst. 6 se jedná o změnu, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a to z důvodu nepředvídaných fyzických podmínek vzniklých na stavbě v průběhu realizace a hodnota těchto dodatečných stavebních prací nepřekračuje 50 % původní hodnoty závazku.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných
-141 683,84	**574 840,90**	**433 157,06**	**716 524,74**

Technická pomoc Objednatele	jméno	Ing. Lubomír Smetana	datum	podpis

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Zhotovitel (stavbyvedoucí): STRABAG a.s.	jméno	Ing. Karel Šimek	datum	podpis
Projektant (autorský dozor): Pontex, spol. s.r.o.	jméno	Ing. David Dvořáček	datum	podpis
Stavební dozor: Pragoprojekt, a. s.	jméno	Miroslav Valenta	datum	podpis
Supervize (Regionální dotační kancelář)	jméno		datum	podpis
Zástupce Objednatele: KSÚS SK	jméno	Ing. Milan Peška	datum	podpis
Zástupce Objednatele odpovědný za cenové projednání Změny	jméno	Ing. Jaroslava Jurková	datum	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele)	jméno	Ing. Jan Fidler, DiS.	datum	podpis
Zhotovitel	jméno	Ing. Martin Bašár Ing. Karel Klofáč	datum	podpis

Číslo paré:

ZÁPIS

o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS) pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 44

Název Stavby: **II/102 hr. hl. města Prahy-Štěchovice, rekonstrukce. ETAPA II**
ČísloSO/PS / číslo Změny SO/PS: 102/18
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): **Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice**

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
113 362 946,56

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	-14 341 186,54	32 094 526,25	131 116 286,27	17 753 339,71

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	-141 683,84	574 840,90	32 669 367,15	28,82%

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1
stavební/montážní práce	-14 482 870,38	131 549 443,33	18 186 496,77	16,04%

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo 44

Evidenční číslo a název stavby: II/102 hr. hl. města Prahy-Štěchovice, rekonstrukce. ETAPA II

Číslo a název SO/PS: SO 102 - Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice

Číslo a název rozpočtu: SO 102 - Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

č. 18

Skupina změn 3

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
71	40445175a	odrazka na svodidla M.1.B	KUS	4,000	3,000	-1,000	941,84	3 767,36	-941,84	0,00	2 825,52	-941,84	-25,00%
70	912321111	Montáž odrazky na betonové svodidlo	KUS	4,000	0,000	-4,000	316,63	1 266,52	-1 266,52	0,00	0,00	-1 266,52	-100,00%
77	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou	KUS	7,000	6,000	-1,000	995,95	6 971,65	-995,95	0,00	5 975,70	-995,95	-14,29%
78	915111111	Vodorovné dopravní značení dělící čáry souvislé š 125 mm základní bílá barva	M	2 450,000	1 281,000	-1 169,000	13,24	32 438,00	-15 477,56	0,00	16 960,44	-15 477,56	-47,71%
79	915111115	Vodorovné dopravní značení dělící čáry souvislé š 125 mm základní žlutá barva	M	137,000	0,000	-137,000	19,57	2 681,09	-2 681,09	0,00	0,00	-2 681,09	-100,00%
81	915121111	Vodorovné dopravní značení vodící čáry souvislé š 250 mm základní bíllá barva	M	9 466,000	6 642,000	-2 824,000	23,03	218 001,98	-65 036,72	0,00	152 965,26	-65 036,72	-29,83%
82	915131111	Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly základní bílá barva	M2	116,750	109,750	-7,000	110,53	12 904,38	-773,71	0,00	12 130,67	-773,71	-6,00%
83	915131115	Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly základní žlutá barva	M2	18,000	0,000	-18,000	234,88	4 227,84	-4 227,84	0,00	0,00	-4 227,84	-100,00%
85	915211116	Vodorovné dopravní značení dělící čáry souvislé š 125 mm retroreflexní žlutý plast	M	137,000	0,000	-137,000	55,27	7 571,99	-7 571,99	0,00	0,00	-7 571,99	-100,00%
87	915221112	Vodorovné dopravní značení vodící čáry souvislé š 250 mm retroreflexní bílý plast	M	9 466,000	9 160,000	-306,000	78,29	741 093,14	-23 956,74	0,00	717 136,40	-23 956,74	-3,23%
90	915611111	Předznačení vodorovného liniového značení	M	13 103,000	12 660,000	-443,000	2,88	37 736,64	-1 275,84	0,00	36 460,80	-1 275,84	-3,38%
113	966006132	Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami	KUS	10,000	0,000	-10,000	1 727,08	17 270,80	-17 270,80	0,00	0,00	-17 270,80	-100,00%
114	966006211	Odstranění svislých dopravních značek ze sloupů, sloupků nebo konzol	KUS	2,000	0,000	-2,000	103,62	207,24	-207,24	0,00	0,00	-207,24	-100,00%
		NOVÉ POLOŽKY											
189	914111100a	Svislé dopravní značení	SOUB	0,000	1,000	1,000	107 888,40	0,00	0,00	107 888,40	107 888,40	107 888,40	100,00%
190	915211100a	Vodorovné dopravní značení	SOUB	0,000	1,000	1,000	262 878,50	0,00	0,00	262 878,50	262 878,50	262 878,50	100,00%
191	912521111	Montáž dopravního knoflíku zapuštěného do komunikace	KUS	0,000	167,000	167,000	272,00	0,00	0,00	45 424,00	45 424,00	45 424,00	100,00%
192	56288005	Knoflík trvalý zafrézovaný pro dopravní značení	KUS	0,000	167,000	167,000	950,00	0,00	0,00	158 650,00	158 650,00	158 650,00	100,00%
		Celkem						1 082 371,27	- 141 683,84	574 840,90	1 519 295,69	433 157,06	71,24%

Odpovědný zástupce Objednatele i odpovědný zástupce Zhotovitele odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu.
Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny.

Za Zhotovitele: Ing. Karel Šimek, (vedoucí projektu)

Datum:

Podpis:

Za Objednatele: Miroslav Valenta, (TDI)

Datum:

Podpis:

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN

Název a evidenční číslo Stavby: **II/102 hr. hl. města Prahy-Štěchovice, rekonstrukce. ETAPA II**

1	**Přijatá smluvní částka bez rezervy a DPH**	**377 812 002,59**
2=1+19+20	**Aktuální smluvní částka (cena stavby)**	399 934 874,98
	Aktuální smluvní částka (cena stavby) včetně DPH	**483 921 198,73**
3=(2/1)*100	**Procento změny Přijaté smluvní částky**	**105,86%**
4=(25/1)*100	**Sledování vyhrazených změn (Skupina 1)**	**0,00%**
5=(28/1)*100	**Sledování záměny položek (Skupina 2)**	**0,00%**
40=(19/1)*100	**Sledování limitu 15 % pro podstatnou změnu pro Změny záporné dle § 14, odst. (5), písm. b)**	**-7,31%**

6=32+36	**Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a Skupiny 4**	**22 885 139,74**
7=(6/1)*100	**Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4**	**6,06%**
8=1*0,3	**Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4**	**113 343 600,78**

9=(32A/1)*100	**Sledování limitu 50 % Skupina 3**	**18,18%**
10=(36A/1)*100	**Sledování limitu 50 % Skupina 4**	**1,24%**
10A=32A+36A	**Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných pro Skupinu 3 a Skupinu 4**	**73 352 901,86**
11=1*0,5	**Zákonný limit 50 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4**	**188 906 001,30**

12=(37/1)*100	**Sledování limitu (15%)**	**1,05%**
13=37	**Sledování limitu 137 366 000 Kč**	**3 998 392,61**
14=137366000-37		**133 367 607,39**

		- 1 -			- 2 -			- 3 -				- 4 -				- 5 -	
					Vyhrazené změny (Doměrky) (dle §100 zákona č. 134/2016 Sb.)			Záměna položek (dle §222 odst. (7) zákona č. 134/2016 Sb.)			Změny nepředvídané (dle §222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb.)				Změny nezbytné (dle §222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb.)				Změny de minimis	
SO	**ZBV č.**	**Název SO/PS / předmět Změny**	**Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus)**	**Změny kladné**	**Hodnota ZBV**	**Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus)**	**Změny kladné**	**Suma Změn záporných a Změn kladných**	**Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus)**	**Změny kladné**	**Suma Změn záporných a Změn kladných**	**Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus)**	**Změny kladné**	**Suma Změn záporných a Změn kladných**	**Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných**	**Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus)**	**Změny kladné**	**Suma Změn záporných a Změn kladných**	**Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných**	**Změny de minimus (15% nebo limit 137 366 000,- Kč**	**limit 15 %**
16	**17**	**18**	**19=23+26+29+33**	**20=24+27+30+34+37+39**	**21=19+20**	**23**	**24**	**25=23+24**	**26**	**27**	**28=26+27**	**29**	**30**	**32=29+30**	**32A=ABS(29)+30**	**33**	**34**	**36=33+34**	**36A=ABS(33)+34**	**37**	**38=(37/1)*100**
		II/102 hr. hl. města Prahy-Štěchovice, rekonstrukce. ETAPA II	**- 27 614 211,04**	**49 737 083,43**	**22 122 872,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**- 25 171 327,38**	**43 504 943,12**	**18 333 615,74**	**68 676 270,50**	**- 62 553,68**	**3 656 232,12**	**4 551 524,00**	**4 676 631,36**	**3 998 392,61**	**1,05%**
103	1	Rekonstrukce vozovky - Průtah Štěchovicemi / úprava poklopů a vodoznaků	0,00	124 942,66	124 942,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 942,66	124 942,66	124 942,66	0,00	0,00%
103/2	2	Rekonstrukce vozovky - Průtah Štěchovicemi / přeložka vodovodní přípojky km 14,815-14,895, kolize s kabelem CETIN	0,00	158 202,22	158 202,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 202,22	158 202,22	158 202,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
103/3	3	Rekonstrukce vozovky - Průtah Štěchovicemi / odstranění žulových kostek	- 147 928,60	470 739,23	322 810,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 147 928,60	470 739,23	322 810,63	618 667,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
103/4	4	Rekonstrukce vozovky - Průtah Štěchovicemi / oprava objízdné trasy Masečín	0,00	514 671,37	514 671,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514 671,37	514 671,37	514 671,37	0,00	0,00%
103/5	5	Rekonstrukce vozovky - Průtah Štěchovicemi / kolize kabelů s kanalizací a novým profilem vozovky	0,00	1 072 447,19	1 072 447,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 072 447,19	1 072 447,19	1 072 447,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
102	6	Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice / zvýšené množství odstraňování křovin	- 62 553,68	2 301 662,61	2 239 108,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 62 553,68	2 301 662,61	2 239 108,93	2 364 216,29	0,00	0,00%
901	7	Provizorní most přes Kočábu / změna založení mostního provizoria	- 535 759,98	1 068 988,13	533 228,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 604 748,11	0,42%
207	8	Most ev.č.102-017 / Zajištění skalního svahu	0,00	728 985,00	728 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	728 985,00	728 985,00	728 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
207/2	9	Most ev.č.102-017 / odstranění vrstvy žulových kostek + podkladní vrstva pod OP1	0,00	75 186,27	75 186,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 186,27	75 186,27	75 186,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
102/2	10	Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice/ frézování a doplnění konstrukčních vrstev vozovky	0,00	43 669,94	43 669,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 669,94	43 669,94	43 669,94	0,00	0,00%
103/6	11	Rekonstrukce vozovky - průtah Štěchovicemi / předlážděni chodníků, obruby, úprava plotové zídky u křižovatky Hlavní a Školní	0,00	671 285,54	671 285,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	671 285,54	671 285,54	671 285,54	0,00	0,00%
102/3	12	Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice / odvodňovací proužek	- 1 844 570,00	549 074,50	- 1 295 495,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 393 644,50	0,63%
102/4	13	Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice / Úprava svahu dlažbou z lomového kamene km 10,360-10,840 L.S.	0,00	5 693 724,53	5 693 724,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 693 724,53	5 693 724,53	5 693 724,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
253	14	Opěrné zdi - Davle - Štěchovice - vlevo / sanace základové spáry v založení SO 253, zeď č. 61 vlevo	0,00	277 190,48	277 190,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277 190,48	277 190,48	277 190,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
102/5	15	Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice / Km 13,200-13,700 svodidlo, krajnice, žulové kostky	0,00	881 187,01	881 187,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	881 187,01	881 187,01	881 187,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
334	16	Kanalizace ve Štěchovicích / zaslepení nefunkční dešťové kanalizace	0,00	587 837,86	587 837,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	587 837,86	587 837,86	587 837,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
102/6	17	Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice /Změna množství odfrézovaných vrstev AB	- 784 390,50	1 450 696,44	666 305,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 784 390,50	1 450 696,44	666 305,94	2 235 086,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
334/2	18	Kanalizace ve Štěchovicích / Kolize s kabelem ČEZ	0,00	39 769,75	39 769,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 769,75	39 769,75	39 769,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
204	19	Most ev.č. 102-012 / Změna spodní stavby, dobetonávky k původním opěrám	- 13 158,52	158 423,56	145 265,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 13 158,52	158 423,56	145 265,04	171 582,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
102/7	20	Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice / Úprava v kraji vozovky km 13,15-13,202 vlevo	0,00	210 681,35	210 681,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 681,35	210 681,35	210 681,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
102/8	21	Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice / Změna tlouštěk AB vrstev	- 685 017,85	2 326 749,68	1 641 731,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 685 017,85	2 326 749,68	1 641 731,83	3 011 767,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
334/3	22	Kanalizace ve Štěchovicích / Štěrbinové žlaby, vpusti, žlaby	- 848 332,68	893 335,27	45 002,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 848 332,68	893 335,27	45 002,59	1 741 667,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102/9	23	Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice / Změna podkladní vrstvy	- 3 315 045,75	4 872 115,58	1 557 069,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 3 315 045,75	4 872 115,58	1 557 069,83	8 187 161,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103/7	24	Rekonstrukce vozovky - Průtah Štěchovicemi / Ochrana proti ostřiku	0,00	386 957,63	386 957,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386 957,63	386 957,63	386 957,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
253/2	25	Opěrné zdi - Davle - Štěchovice - vlevo / změna zatřídění hornin	- 11 482 675,35	4 065 440,24	- 7 417 235,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 11 482 675,35	4 065 440,24	-7 417 235,11	15 548 115,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102/10	26	Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice / zvýšené množství odstraňování křovin	0,00	893 825,06	893 825,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	893 825,06	893 825,06	893 825,06	0,00	0,00
102/11	27	Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice / lokální opravy CB desek	0,00	439 876,30	439 876,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439 876,30	439 876,30	439 876,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103/8	28	Rekonstrukce vozovky - Průtah Štěchovicemi / úpravy v km 14,915, 14,950 a 15,070	0,00	337 421,30	337 421,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337 421,30	337 421,30	337 421,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000/1	29	Vedlejší a ostatní náklady/ RDS vypracování změn	0,00	1 879 064,84	1 879 064,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 879 064,84	1 879 064,84	1 879 064,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

331/1	30	Přeložka kanalizace u mostu 102-012/ doplnění šoupátek	0,00	41 604,72	41 604,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 604,72	41 604,72	41 604,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332/1	31	Přeložka kanalizace u mostu 102-013 / doplnění šoupátek	0,00	41 604,72	41 604,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 604,72	41 604,72	41 604,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333/1	32	Přeložka kanalizace u mostu 102-014 / doplnění šoupátek	0,00	41 604,72	41 604,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 604,72	41 604,72	41 604,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341/1	33	Přeložka vodovodu u mostu 102-012 / doplnění šoupátek	- 13 643,95	26 030,02	12 386,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 13 643,95	26 030,02	12 386,07	39 673,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342/1	34	Přeložka vodovodu u mostu 102-013 / doplnění šoupátek	- 13 643,95	26 030,02	12 386,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 13 643,95	26 030,02	12 386,07	39 673,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343/1	35	Přeložka vodovodu u mostu 102-014 / doplnění šoupátek	- 13 643,95	26 030,02	12 386,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 13 643,95	26 030,02	12 386,07	39 673,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
181.2/1	36	Přechodné dopravní značení / posunutí semaforu	0,00	64 020,50	64 020,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 020,50	64 020,50	64 020,50	0,00	0,00
102/12	37	Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice / lokální opravy CB desek SAL, zábradlí propustek	- 86 929,80	1 684 180,84	1 597 251,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 86 929,80	1 684 180,84	1 597 251,04	1 771 110,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102/13	38	Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice / betonová svodidla	0,00	1 530 172,61	1 530 172,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 530 172,61	1 530 172,61	1 530 172,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102/14	39	Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice / úprava svahu z lomového kamene	- 6 111 253,89	5 276 219,41	- 835 034,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 6 111 253,89	5 276 219,41	-835 034,48	11 387 473,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
253/3	40	Opěrné zdi - Davle - Štěchovice - vlevo / úprava římsy u OZ č. 71	0,00	272 560,35	272 560,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272 560,35	272 560,35	272 560,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102/15	41	Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice / frézování AB a CS vrstev	- 1 513 978,75	2 868 019,53	1 354 040,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 1 513 978,75	2 868 019,53	1 354 040,78	4 381 998,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102/16	42	Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice /úprava v km 11,780-12,440 vpravo	0,00	3 235 947,09	3 235 947,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 235 947,09	3 235 947,09	3 235 947,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102/17	43	Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice /Ocelové svodidlo,dlažba v Davli	0,00	854 066,44	854 066,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	854 066,44	854 066,44	854 066,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102/18	44	Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice / Změna DZ	- 141 683,84	574 840,90	433 157,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 141 683,84	574 840,90	433 157,06	716 524,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Přehled dalších dokladů

Číslo ZBV:	**44**
Název a evidenční číslo stavby:	**II/102 hr. hl. města Prahy-Štěchovice, rekonstrukce. ETAPA II**
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	102/18

Doklad	**Součást dokumentace ZBV**	
	ANO (počet listů)	**NE - Uloženo**
07 Změnový soupis prací SO 102 po změně 44 pro ZBV 18	36	
08 Městy Davle - žádost	2	
09 Městy Davle - komunikace s projektantem	2	
10 Městy Davle - Vyjádření k PD - úprava v Davli	1	
11 Policie ČR - vyjádření	2	
12 PiD Stanovisko Davle úprava DZ	2	
13 Projekt SO 102 Změna DZ	10	
14 Oznámení o nové skutečnosti	1	
15 Stanovisko KSÚSSK a pokyn ke zpracování ZBV	1	
16 Změna DZ Davle výkaz výměr	1	
17 Fakrury - dodavatele	4	
18 Nabídka Proznak	1	
19 Nabídka Adsum	1	
20 Zápis Ing. Klofáče do obch. Rejstříku	2	
21 Výpis z obch rejstříku - Ing. Bašár	6	
22 Stanovisko TDS k ZBV 43	1	
Počet listů celkem	73	

Změnový soupis prací SO 102 po změně 18 pro ZBV 44

Evidenční číslo a název stavby: II/102 hr. hl. města Prahy-Štěchovice, rekonstrukce. ETAPA II
Číslo a název SO/PS: SO 102 - Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice
Číslo a název rozpočtu: SO 102 - Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)
102
Celkem

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	**Zemní práce**												
1	113106122	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z kamenných dlaždic	M2	50,000	150,900	100,900	91,95	4 597,50	0,00	9 277,76	13 875,26	9 277,76	201,80%
		Rozebrání dlažeb a dílců komunikací pro pěší, vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek komunikací pro pěší s ložem z kameniva nebo živice a s výplní spár z kamenných dlaždic nebo desek											
		SoD *100*0.5 stáv. odvodňov. proužek na ZÚ vpravo, odhad šířky 50 cm - vč. odstranění lože=50,000 [A]* *ZBV č. 15* *dle geodetického protokolu č. Š II 3/2022* *km 13,2-13,7 100,9=100,900 [A]*											
2	113106123	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší ze zámkových dlaždic	M2	60,000	60,000	0,000	91,95	5 517,00	0,00	0,00	5 517,00	0,00	0,00%
		Rozebrání dlažeb a dílců komunikací pro pěší, vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek komunikací pro pěší s ložem z kameniva nebo živice a s výplní spár ze zámkové dlažby											
		SoD *(20*0.5)+(100*0.5) chodník na KÚ 60 dlažba před KÚ vpravo - šířka cca 0,5 m z důvodu bourání vozovky 60 příp. rektifikace obrubníku, vč. lože=60,000 [A]*											
3	113107222	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 200 mm	M2	11 027,000	11 027,000	0,000	26,23	289 238,21	0,00	0,00	289 238,21	0,00	0,00%
		Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm											
		SoD *11027 bourání celk. konstrukce stáv. vozovky - štěrk s příměsí jemnozrnné zeminy - tl. 160 mm=11 027,000 [A]*											
4	113107230	Odstranění podkladu pl nad 200 m2 z betonu prostého tl 100 mm	M2	11 027,000	11 027,000	0,000	102,45	1 129 716,15	0,00	0,00	1 129 716,15	0,00	0,00%
		Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 z betonu prostého, o tl. vrstvy do 100 mm											
		SoD *11027 bourání celkové konstrukce stáv. vozovky - stabilizace cementem tl. 60 mm - odhad dle situace 11027 řezů=11 027,000 [A]*											

Změnový soupis prací SO 102 po změně 18 pro ZBV 44

Evidenční číslo a název stavby: II/102 hr. hl. města Prahy-Štěchovice, rekonstrukce. ETAPA II
Číslo a název SO/PS: SO 102 - Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice
Číslo a název rozpočtu: SO 102 - Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)
102
Celkem

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	113154334	Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š 2 m pl do 10000 m2 bez překážek v trase	M2	27 731,600	13 881,100	-13 850,500	59,90	1 661 122,84	-835 778,71	6 133,74	831 477,87	-829 644,97	-49,94%
		Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 1 000 do 10 000 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 100 mm											
		SoD *13995 asf. beton v tl. 60 mm - odhad dle situace 13995 řezů=13 995,000 [A]* *2160 asf. beton tl. 100 mm - dle situace 13995 řezů v km 13,2 - 13,7 vlevo, vč. reprofilace příčného sklonu=2 160,000 [B]* *11027 asf.beton tl.60mm - bourání celkové konstrukce vozovky - dle situace 13995 řezů=11 027,000 [C]* *549.6 odfrézování nájezdových klínů=549,600 [D]* *Celkem: 13995+2160+11027+549.6=27 731,600 [E]* *ZBV ZBV č. 10* *dle zaměření tl. 40 mm 60,3=60,300 [A]* *dle zaměření tl. 60 mm 42,1=42,100 [B]* *A+B=102,400 [C]*											
		ZBV č. 17 dle geodetických protokolů *km 12,822 - 12,846 vpravo protokol Š II 51/2021 prům. tl. 46 mm - bez odpočtu plochy 105,6 m2* *km 12,846 - 13,201 vpravo protokol Š II 51/2021 prům. tl. 162 mm - odpočet plochy -1530,8 m2=-1 530,800 [A]* *km 10,360 - 10,840 vpravo protokol Š II 63/2021 prům. tl. 128 mm - odpočet plochy -2374,1 m2=-2 374,100 [B]* *km 13,199 - 13,696 vlevo protokol Š II 88/2021 prům. tl. 133 mm - odpočet plochy -2272,6 m2=-2 272,600 [C]* *km 10,550 - 10,680 vlevo protokol Š II 32/2021 prům. tl. 129 mm - odpočet plochy -595,5 m2=- 595,500 [D]* *km 10,680 - 10,840 vlevo protokol Š II 32/2021 prům. tl. 99 mm - bez odpočtu plochy 790,4 m2* *km 10,360 - 10,550 vlevo protokol Š II 26/2021 prům. tl. 135 mm - odpočet plochy -851,1 m2=- 851,100 [E]* *km 12,820 - 13,200 vlevo protokol Š II 23/2021 prům. tl. 207 mm - odpočet plochy -1411,0 m2=-1 411,000 [F]* *km 12,820 - 13,200 vlevo protokol Š II 23/2021 prům. tl. 103 mm - odpočet plochy -190 m2=- 190,000 [G]* *km 12,820 - 13,200 vlevo protokol Š II 23/2021 prům. tl. 40 mm -bez odpočtu plochy 17 m2* *km 13,199 - 13,696 vpravo protokol Š II 101/2021 prům. tl. 89 mm - bez odpočtu plochy 2042,5 m2* *km 13,396 - 13,427 vpravo protokol Š II 101/2021 dodatečné dofrézování prům. tl. 62 mm - přípočet plochy 125,6 m2=125,600 [H]* *km 12,440 - 12,850 vlevo protokol D 8/2020 prům. tl. 186 mm - odpočet plochy -1654 m2=-1 654,000 [I]* *km 10,250 - 10,360 vpravo protokol D 6/2020 prům. tl. 40 mm - odpočet plochy -580,5 m2=- 580,500 [J]* *km 10,250 - 10,360 vlevo protokol D 3/2020 prům. tl. 100 mm - bez odpočtu plochy 595 m2* *km 12,440 - 12,720 vpravo protokol Š II 5/2022 prům. tl.140 mm - odpočet plochy -1302 m2=-1 302,000 [K]* *km 12,720 - 12,848 vpravo protokol Š II 5/2022 prům. tl.181 mm - odpočet plochy -459 m2=- 459,000 [L]* *A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L =-13 095,000 [M]*											
		ZBV č. 41 *geodetický protokol* *Š II 7/2022 km 9,999-10,117 vlevo prům. tl. 90 mm 765,5=765,500 [A]* *km 10,130-10,246 vlevo prům. tl. 90 mm 600,30=600,300 [B]* *prům. tl. 100 mm 577,10=577,100 [C]* *prům. tl. 100 mm 562,0=562,000 [D]* *Š II 37/2022 km 11,298-11,356 vlevo prům. tl. 98 mm 273,10=273,100 [E]* *Š II 2/2023 km 11,773-12,438 vlevo prům. tl. 178 mm 2*3012,30=6 024,600 [F]* *Š II 20/2023 km13,694-14,114 vpravo prům. tl. 63 mm 1463,80=1 463,800 [G]* *Š II 26/2023 km 14,130-14,429 vpravo prům. tl. 64 mm 1429,50=1 429,500 [H]* *Š II 36/2022 km 14,480-14,522 vlevo prům. tl. 104 mm 198,30=198,300 [I]* *Š II 37/2022 km 11,385-11,780 vlevo prům. tl. 102 mm 1637,8=1 637,800 [J]* *Š II 59/2022 km 14,424-14,580 vpravo prům. tl. 106 mm 137,00=137,000 [K]* *km 14,424-14,580 vpravo prům. tl. 103 mm 43,40=43,400 [L]* *12/2020 Masečím 317,50=317,500 [M]* *Š II 101/2021 -2*125,6=- 251,200 [N]* *odpočet původního množství a ZBV č. 17 množstství -(27731,6-13095)=-14 636,600 [O]* *A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O=- 857,900 [Q]*											

Změnový soupis prací SO 102 po změně 18 pro ZBV 44

Evidenční číslo a název stavby: II/102 hr. hl. města Prahy-Štěchovice, rekonstrukce. ETAPA II
Číslo a název SO/PS: SO 102 - Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice
Číslo a název rozpočtu: SO 102 - Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)
102
Celkem

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6	113154335	Frézování živičného krytu tl 200 mm pruh š 2 m pl do 10000 m2 bez překážek v trase	M2	13 516,000	26 061,500	12 545,500	109,73	1 483 110,68	-74 078,72	1 450 696,47	2 859 728,43	1 376 617,75	92,82%
		Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 1 000 do 10 000 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 200 mm											
		SoD *5501+8015 asf. beton tl. 150 mm - bourání v místě změny příčného sklonu - odhad dle situace 13516 řezů=13 516,000 [A]* *ZBV č. 17 dle geodetických protokolů* *km 12,846 - 13,201 vpravo protokol Š II 51/2021 prům. tl. 162 mm 1530,8 m2=1 530,800 [A]* *km 10,360 - 10,840 vpravo protokol Š II 63/2021 prum. tl. 128 mm 2374,1 m2=2 374,100 [B]* *km 13,199 - 13,696 vlevo protokol Š II 88/2021 prum. tl. 133 mm 2272,6 m2=2 272,600 [C]* *km 10,550 - 10,680 vlevo protokol Š II 32/2021 prum. tl. 129 mm 595,5 m2=595,500 [D]* *km 10,360 - 10,550 vlevo protokol Š II 26/2021 prum. tl. 135 mm 851,1 m2=851,100 [E]* *km 12,820 - 13,200 vlevo protokol Š II 23/2021 prum. tl. 103 mm 190 m2=190,000 [F]* *km 12,440 - 12,850 vlevo protokol D 8/2020 prum. tl. 186 mm 1654 m2=1 654,000 [G]* *km 10,250 - 10,360 vpravo protokol D 6/2020 prum. tl. 140 mm 580,5 m2=580,500 [H]* *km 12,440 - 12,720 vpravo protokol Š II 5/2022 prum. tl.140 mm 1302 m2=1 302,000 [I]* *km 12,720 - 12,848 vpravo protokol Š II 5/2022 prum. tl.181 mm 459 m2=459,000 [J]* *km 12,820 - 13,200 vlevo protokol Š II 23/2021 prum. tl. 207 mm 1411,0 m2=1 411,000 [K]* *A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K=13 220,600 [L]*											
		ZBV č. 41 *geodetický protokol* *D 8/2020 km 12,440-12,850 vlevo prům. tl. 200 mm 128,90=128,900 [A]* *Š 101/2021 km 13,199 - 13,696 vpravo tl. 151mm 125,60=125,600 [B]* *Š II 33/2022 km 14,220-14,580 vlevo prům. tl. 155 mm 1618,00=1 618,000 [C]* *Š II 52/2022 km11,278-11,357 vpravo prům. tl. 148 mm 281,10=281,100 [D]* *km11,357-11,381 vpravo prům. tl. 166 mm 137,60 =137,600 [E]* *km11,381-11,780 vpravo prům. tl. 189 mm 1958,90=1 958,900 [F]* *km 14,424-14,580 vpravo prům. tl. 174 mm 506,90=506,900 [G]* *Š II 19/2023 km 11,780-12,437 vpravo prům. tl. 182 mm 2501,20=2 501,200 [H]* *Š II 20/2023 km 13,788-13,934 vpravo prům. tl. 118 mm 299,40=299,400 [I]* *Š II 21/2023 km 13,788-13,934 vpravo prům. tl. 168 mm 2408,90 =2 408,900 [J]* *Š II 6/2022 km 13,695-14,224 vlevo prům. tl, 204 mm 2444,40=2 444,400 [K]* *Š II 33/2022 km 14,580-14,609 vlevo prům. tl. 220 mm 130,50=130,500 [L]* *Š II 37/2022 km 11,519-11,630 vlevo prům. tl. 224 mm 299,50=299,500 [M]* *A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M=12 840,900 [N]* *odpočet původního množství -13516=-13 516,000 [O]* *N+O=- 675,100 [P]*											
7	113155332	Frézování betonového krytu tl 40 mm pruh š 2 m pl do 10000 m2 bez překážek v trase	M2	13 995,000	5 151,720	-8 843,280	74,99	1 049 485,05	-663 157,57	0,00	386 327,48	-663 157,57	-63,19%

Změnový soupis prací SO 102 po změně 18 pro ZBV 44

Evidenční číslo a název stavby: II/102 hr. hl. města Prahy-Štěchovice, rekonstrukce. ETAPA II
Číslo a název SO/PS: SO 102 - Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice
Číslo a název rozpočtu: SO 102 - Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)
102
Celkem

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Frézování betonového podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 1 000 do 10 000 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 40 mm											
		SoD *13995 odfrézování na požadovanou niveletu 13995 srovnání do příčného sklonu v místech jen frézování na tl. 60 mm=13 995,000 [A]*											
		ZBV č. 41 *geodetický protokol* *Š II26/2021 km 10,518-10548 vlevo prům. tl. 131 mm 77,10=77,100 [A]* *Š II 63/2021 km 10,580-10663 vpravo prům. tl. 39 mm 433,60=433,600 [B]* *Š II 7/2022 km 10,001-10,117 vlevo prům. tl. 220 mm 751,90=751,900 [C]* *km 10,190-10,234 vlevo prům. tl. 20 mm 158,80=158,800 [D]* *Š II 17/2022 km 10,130-10,192 vpravo prům. tl. 320 mm 307,00=307,000 [E]* *Š II 33/2022 km 14,220-14,480 vlevo prům. tl. 225 mm 1145,00=1 145,000 [F]* *km 14,522-14,570 vlevo prům. tl. 221 mm 225,60=225,600 [G]* *Š II 37/2022 km 11,519-11,630 vlevo prům. tl. 215 mm 299,5=299,500 [H]* *Š II 52/2022 km 11,357-11,381 vpravo prům. tl.40 mm 137,60=137,600 [I]* *Š II 59/2022 km 14,424-14,580 vpravo prům. tl. 224 mm 506,90=506,900 [J]* *Š II 21/2023 km 10,881-11,060 vlevo prům tl. 24 mm 862,50=862,500 [K]* *km 10,060-11,881vlevo prům tl. 25 mm 81,92=81,920 [L]* *Š II 87/2021 km10,520-10,587 vpravo prům. tl. 114 mm 97,90=97,900 [M]* *km 10,741-10,780 vpravo prům. tl. 224 mm 55,10=55,100 [N]* *km 10,748-10,754 vpravo prům. tl. 216 mm 11,30=11,300 [O]* *odpočet původního množství -13995,00=-13 995,000 [P]* *A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P=-8 843,280 [Q]*											
8	113155333	Frézování betonového krytu tl 50 mm pruh š 2 m pl do 10000 m2 bez překážek v trase	M2	11 027,000	2 730,600	-8 296,400	87,43	964 090,61	-725 354,25	0,00	238 736,36	-725 354,25	-75,24%
		Frézování betonového podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 1 000 do 10 000 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 50 mm											
		SoD *11027 bourání celkové konstrukce stáv. vozovky - CB konstrukce fréza v tl. 50 mm - odhad dle situace 11027 řezů=11 027,000 [A]*											
		ZBV č. 41 *geodetivký protokol* *D 3/2020 km 10,250-10,360 vlevo prům. tl. 250 mm 595=595,000 [A]* *D 8/2020 km 12,440-12,850 vlevo prům. tl. 250 mm 1654+228,70=1 882,700 [B]* *Š II 7/2022 km 10,190-10,324 vlevo prům. tl. 50 mm 252,90=252,900 [C]* *odpočet původního množství -11027,00=-11 027,000 [D]* *A+B+C+D=-8 296,400 [E]*											
9	113155334	Frézování betonového krytu tl 100 mm pruh š 2 m pl do 10000 m2 bez překážek v trase	M2	22 029,000	42 028,500	19 999,500	166,82	3 674 877,78	0,00	3 336 316,59	7 011 194,37	3 336 316,59	90,79%
		Frézování betonového podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 1 000 do 10 000 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 100 mm											
		SoD *5501*2 bourání voz. v místě změny příčného sklonu - tl. CB konstrukce tl.200 mm - odhad dle situace 11002 řezů=11 002,000 [A]* *11027 bourání celkové konstrukce stáv. vozovky - tl. CB konstrukce 150 mm - fréza v tl. 100 mm - odhad dle situace 11002 řezů=11 027,000 [B]* *Celkem: 11002+11027=22 029,000 [C]*											

Změnový soupis prací SO 102 po změně 18 pro ZBV 44

Evidenční číslo a název stavby: II/102 hr. hl. města Prahy-Štěchovice, rekonstrukce. ETAPA II
Číslo a název SO/PS: SO 102 - Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice
Číslo a název rozpočtu: SO 102 - Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)
102
Celkem

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		ZBV č. 41 *geodetický protokol* *D 3/2020 km 10,250-10,360 vlevo prům. tl. 250 mm 2*595=1 190,000 [A]* *D 6/202 km 10,250-10,360 vpravo prům. tl. 100 mm 505,0=505,000 [B]* *D 8/2020 km 12,440-12,850 vlevo prům. tl. 250 mm 2*(1654,0+228,70)=3 765,400 [C]* *Š II23/2021 km12,820-13,200 vlevo prům. tl. 181 mm 2*1382,0=2 764,000 [D]* *Š II 26/2021 km 13,60-10,420 vlevo prům. tl. 292 mm 3*268,80=806,400 [E]* *Š II26/2021 km 10,518-10,548 vlevo prům. tl. 131 mm 77,10=77,100 [F]* *Š II 32/2021 km 10,360-10,680 vlevo prům. tl. 287 mm 3*1194,50=3 583,500 [G]* *km 10,780-10,840 vlevo prům. tl. 289 mm 3*299,60=898,800 [H]* *Š II 51/2021 km 12,917-12,930 vpravo prům. tl. 289 mm 3*57,50=172,500 [I]* *Š II 63/2021 km 10,663-10,680 vpravo prům. tl. 205 mm 2*80,10=160,200 [J]* *km 10,700-10,780 vpravo prům. tl. 88 mm 391=391,000 [K]* *Š II 6/2022 km 13,695-14,224 vpravo prům. tl. 298 mm 3*2418,50=7 255,500 [L]* *Š II 7/2022 km 10,001-10,117 vlevo prům. tl.220 mm 2* 751,90=1 503,800 [M]* *km 10,130-10,190 vlevo prům. tl. 300 mm 3*292,60=877,800 [N]* *km 10,190-10,234 vlevo prům. tl. 300 mm 3*107,00=321,000 [O]* *Š II 17/2022 km 10,020-10,117 vpravo prům. tl. 260 mm 3*537,90=1 613,700 [P]* *km 10,130-10,192 vpravo prům. tl. 320 mm 3*307,00=921,000 [Q]* *Š II 23/2022 km 10,192-10,246 vpravo prům. tl. 270 mm 3*252,90=758,700 [R]* *Š II 33/2022 km 14,220-14,480 vlevo prům. tl. 225 mm 2*1145,00=2 290,000 [S]* *km 14,522-14,570 vlevo prům. tl. 221 mm 2*225,60=451,200 [T]* *Š II 36/2022 km 14,480-14,522 vlevo prům. tl. 205 mm 2*198,40=396,800 [U]* *Š II 37/2022 km 11,519-11,630 vlevo prům. tl. 215 mm 2*299,5=599,000 [V]* *Š II 59/2022 km 14,424-14,580 vpravo prům. tl. 224 mm 2*506,90=1 013,800 [W]* *Š II 5/2023 km 11,779-11,970 vlevo prům. tl. 193 mm 2*396,10=792,200 [X]* *km 11,779-11,970 vlevo prům. tl. 195 mm 2*915,80=1 831,600 [Y]* *Š II 21/2023 km 10,840-10,881 vlevo prům tl. 196 mm 2* 203,60=407,200 [Z]* *km 10,881-11,060 vlevo prům tl. 195 mm 2*67,30=134,600 [AA]* *km 10,060-11,182 vlevo prům tl.194 mm 2*653,20 =1 306,400 [AB]*												
		Š II 87/2021 km10,520-10,587 vpravo prům. tl. 114 mm 97,90=97,900 [AC] *km 10,741-10,780 vpravo prům. tl. 224 mm 2* 55,10=110,200 [AD]* *km 10,748-10,754 vpravo prům. tl. 216 mm 2*11,30=22,600 [AE]* *odpočet fakturovaného množství -22021,8=-22 021,800 [AF]* *A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q+R+S+T+U+V+W+X+Y+Z+AA+AB+AC+AD+AE+AF=14 997,100*												
		ZBV č. 42 *dle geodetického protokolu Š II 14/2023* *km 11,780-12,437 tl. 170 mm 2* 2501,20=5 002,400 [A]*											
10	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	M	88,000	88,000	0,000	91,95	8 091,60	0,00	0,00	8 091,60	0,00	0,00%
		Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých											
		SoD *48+20+20=88,000 [A]*											

Změnový soupis prací SO 102 po změně 18 pro ZBV 44

Evidenční číslo a název stavby: II/102 hr. hl. města Prahy-Štěchovice, rekonstrukce. ETAPA II
Číslo a název SO/PS: SO 102 - Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice
Číslo a název rozpočtu: SO 102 - Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)
102
Celkem

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11	122101103	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 1 a 2 objem do 5000 m3	M3	4 322,500	6 315,960	1 993,460	122,97	531 537,83	0,00	245 135,78	776 673,61	245 135,78	46,12%
		Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v horninách tř. 1 a 2 přes 1 000 do 5 000 m3											
		SoD *910*4.75 odkop poslední vrstvy vozovky 4322.5 podloží pod vozovkou pro úpravu typu B2 - délka dle sit. x plocha ze vzor.řezu=4 322,500 [A]* *ZBV č. 13* *Odkop svahu se svahovými stupni* *km 10,360 - 10,380 24 m3=24,000 [A]* *km 10,380 - 10,420 190,7 m3 - úprava s geomříží =190,700 [B]* *km 10,420 - 10,465 45 m3=45,000 [C]* *km 10,465 - 10,475 11,9 m3=11,900 [D]* *km 10,476 - 10,485 9,2 m3=9,200 [E]* *km 10,485 - 10,575 126,3 m3=126,300 [F]* *km 10,575 - 10,650 68,2 m3=68,200 [G]* *km 10,706 - 10,840 161,7 m3=161,700 [H]* *A+B+C+D+E+F+G+H=637,000 [I]* *ZBV č. 20* *odkop pro rozšíření vozovky km 13,150-13,210* *1,9*0,37*60,0=42,180 [A]*											
		ZBV č. 39 *geodetické protokoly* *Š II 33/2021 km 13,150-13,190 vlevo 89,90=89,900 [A]* *Š II 10/2022 km 10,140-10,250 vlevo 191,10=191,100 [B]* *Š II 12/2022 km 10,001-10,101 vlevo 112,90=112,900 [C]* *Š II 16/2022 km 10,103-10,140 vlevo 63,0+55,20-77=41,200 [D]* *Š II 27/2022 km 11,430-11,520 vlevo 191,60=191,600 [E]* *Š II 35/2022 km 11,220-11,430 vlevo 67,90+268,30=336,200 [F]* *Š II 43/2022 km 11,520-11663 vlevo 303,20=303,200 [G]* *Š II 45/2022 km 11,140-11,220 vlevo 187,80=187,800 [H]* *Š II 47/2022 km 11,671-11,780 vlevo 215,0=215,000 [I]* *Š II 53/2022 km 14,462-14,580 vlevo 249,30=249,300 [J]* *Š II 62/2022 km 11,056-11,140 vlevo 214,20=214,200 [K]* *Š II 65/2022 km 11,340-11,400 vlevo 47,0+160,30=207,300 [L]* *Š II 1/2023 km 10,840-10947 vlevo 188,7 =188,7 [V]* *Š II 4/2023 km 10,947-11,031 vlevo 165,60=165,600 [M]* *Š II 7/2023 km 11,976-12,440 vlevo 805,30=805,300 [N]* *Š II 8/2023 km 11,780-11,971 vlevo 231,10+1,70=232,800 [O]* *Š II 11/2023 km 14,410-14,460 vlevo 75,40+21,50=96,900 [P]* *Š II 13/2023 km 14,425 vlevo 22,40=22,400 [Q]* *Š II 16/2023 km 11,928-12,060 vpravo 279,50=279,500 [R]* *Š II 27/2023 km 11,733-11,832 vpravo 332,70=332,700 [S]* *(A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q+R+S+V)*0,25=1115,9 [T]*											
		ZBV č. 42 *geodetický protokol Š II 14/2023* *km 11,780-11,868 94,20=94,200 [A]* *km 11,881-11,909 23,50=23,500 [B]* *km 11,923-12,435 512,20=512,200 [C]* *(A+B+C)*0,25=157,475 [D]* *ZBV č. 43* *geodetický protokol Š II 37/2023 dlažba pro obec Davle* *(6,1+9,0+17,2+9,0+10,2+6,0+23,10+10,3)*0,45=40,905 [A]*											
12	122101403	Vykopávky v zemníku na suchu v hornině tř. 1 a 2 objem do 5000 m3	M3	1 701,750	1 701,750	0,000	84,05	143 032,09	0,00	0,00	143 032,09	0,00	0,00%
		Vykopávky v zemnících na suchu s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v horninách tř. 1 a 2 přes 1 000 do 5 000 m3											
		SoD *11345*0.15 potřeba ornice na ohumusování dle pol. 182301132 x tl. 15 cm=1 701,750 [A]*											

Změnový soupis prací SO 102 po změně 18 pro ZBV 44

Evidenční číslo a název stavby: II/102 hr. hl. města Prahy-Štěchovice, rekonstrukce. ETAPA II
Číslo a název SO/PS: SO 102 - Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice
Číslo a název rozpočtu: SO 102 - Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)
102
Celkem

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13	122201103	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 5000 m3	M3	4 077,490	4 077,490	0,000	122,97	501 408,95	0,00	0,00	501 408,95	0,00	0,00%
		Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 přes 1 000 do 5 000 m3											
		SoD *5501*0.2 Písek hlinitý v místě změny příčného sklonu - odtěžení na požadovanou niveletu, srovnání do příčného sklonu 1100.2 přehutnění=1 100,200 [A]* *11027*0.27 Štěrk hlinitý tl. 270 mm - bourání vozovky komplet=2 977,290 [B]* *Celkem: 1100.2+2977.29=4 077,490 [C]*											
14	122201403	Vykopávky v zemníku na suchu v hornině tř. 3 objem do 5000 m3	M3	3 694,800	3 694,800	0,000	84,05	310 547,94	0,00	0,00	310 547,94	0,00	0,00%
		Vykopávky v zemnících na suchu s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 přes 1 000 do 5 000 m3											
		SoD *910*2.31 délka x plocha v řezu - dle pol. 564581111 - úprava typu B2=2 102,100 [A]* *1410 dle pol. 182201101 x hloubka 60 cm - vhodná zemina pro svahové stupně=1 410,000 [B]* *182.7 dle pol. 174101101 - obsyp propustku v km 12,925=182,700 [C]* *Celkem: 2102.1+1410+182.7=3 694,800 [D]*											
15	131203101	Hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3	M3	0,315	2,865	2,550	4 417,49	1 391,51	0,00	11 264,60	12 656,11	11 264,60	809,52%
		Hloubení zapažených i nezapažených jam ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 soudržných											
		SoD *5*(0.3*0.3*0.7) počet sloupků pro svislé DZ x odhad rozměrů jámy =0,315 [A]* *ZBV č. 37* *zábradlí propustek* *0,5*0,5*0,85*12=2,55*											
16	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	M3	15 023,840	17 689,390	2 665,550	504,88	7 585 236,34	0,00	1 345 782,88	8 931 019,22	1 345 782,88	17,74%
		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m											
		SoD *1701.75 dovoz ornice na ohumusování dle pol. 122101403=1 701,750 [A]* *4322.5 odvoz odkopané zeminy dle pol. 122101103=4 322,500 [B]* *2102.1 dovoz podsypu dle pol. 122201403 pro úpravu svahu typu B2=2 102,100 [C]* *4077.490 odvoz odkopaného hlinitého písku dle pol. 122201103=4 077,490 [D]* *2350*0.6*2 odvoz vykopané zeminy ze svahových stupňů dle pol. 182201101 x odhad hloubky 60cm - 1701.75* *dovoz vhodné zeminy pro zpětný zásyp stupňů=2 820,000 [E]* *Celkem: 1701.75+4322.5+2102.1+4077.49+2820=15 023,840 [F]* *ZBV č. 13* *dle pol. 122101103 637=637,000 [A]* *ZBV č. 20* *odvoz odkopané zeminydle pol. č. 122101103* *42,18=42,18 [A]* *ZBV č. 37* *zábradlí propustek* *0,5*0,5*0,85*12=2,55*											
		ZBV č. 39 *dle pol. č. 122101103 1115,9=1115,9 [A]* *111301111 4463,60*0,15=669,54 [B]* *A+B=1 785,44 [C]* *ZBV č. 42* *dle pol. č. 122101103* *157,475=157,475 [A]* *ZBV č. 43* *dle pol. č. 122101103 40,905=40,905 [A]*											

Změnový soupis prací SO 102 po změně 18 pro ZBV 44

Evidenční číslo a název stavby: II/102 hr. hl. města Prahy-Štěchovice, rekonstrukce. ETAPA II
Číslo a název SO/PS: SO 102 - Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice
Číslo a název rozpočtu: SO 102 - Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)
102
Celkem

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17	171151222	Strmý svah vyztužením zeminy ocelovou sítí s kamenivem pohled svah přes 2 m do 4 m	M2	2 275,000	0,000	-2 275,000	1 323,12	3 010 098,00	-3 010 098,00	0,00	0,00	-3 010 098,00	-100,00%
		Strmý svah ze zemin vyztužených geosyntetiky s pohledovou plochou upraveného svahu ocelovou sítí vyplněnou kamenivem [RockWall], výšky přes 2 m do 4 m											
		SoD *910*2.5 délka x odhadnutá výška svahu - úprava typ B2=2 275,000 [A]*											
		ZBV č. 39 *odpočet neprovádělo se* *-2275,000=-2275,00*											
18	171201201	Uložení sypaniny na skládky	M3	10 725,990	13 391,540	2 665,550	16,70	179 124,03	0,00	44 514,69	223 638,72	44 514,69	24,85%
		Uložení sypaniny na skládky											
		SoD *4322.500 dle pol. 122101103=4 322,500 [A]* *4580*0.2 plocha krajnic x tl. - dle pol. 938909612=916,000 [B]* *4077.490 hlinitý písek - dle pol. 122201103=4 077,490 [C]* *2350*0.6 odvoz vykopané zeminy ze svahových stupňů dle pol. 182201101 x odhad hloubky 60cm=1 410,000 [D]* *Celkem: 4322.5+916+4077.49+1410=10 725,990 [E]* *ZBV č. 13* *dle pol. 122101103 637=637,000 [A]* *ZBV č. 20* *vykopaná zemina 42,18=42,18 [A]* *ZBV č. 37* *zábradlí propustek* *0,5*0,5*0,85*12=2,55* *ZBV č. 39* *dle pol. č. 1622701105 1785,44=1785,44 [A]* *ZBV č. 42* *dle pol. č. 162701105* *157,475=157,475 [A]* *ZBV č. 43* *dle pol. č. 162701105* *40,905=40,905 [A]*											

Změnový soupis prací SO 102 po změně 18 pro ZBV 44

Evidenční číslo a název stavby: II/102 hr. hl. města Prahy-Štěchovice, rekonstrukce. ETAPA II
Číslo a název SO/PS: SO 102 - Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice
Číslo a název rozpočtu: SO 102 - Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)
102
Celkem

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
19	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	T	22 695,246	27 763,882	5 068,636	138,17	3 135 802,14	0,00	700 333,44	3 836 135,58	700 333,44	22,33%
		Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)											
		SoD *4322.5*1.9 výkop dle pol. 171201201 x koef. přepočtu na tuny=8 212,750 [A]* *2494.356 z čištění příkopů, vpustí 8212.75 propustků dle pol. 997221551a=2 494,356 [B]* *1154.16 ze sejmutí nánosů na krajnicích dle pol. 938909612=1 154,160 [C]* *4077.49*2.0 dle pol. 122201103 x koef. přepočtu na tuny=8 154,980 [D]* *1410*1.9 odvoz vykopané zeminy ze svahových stupňů dle pol. 171201201 x koef. přepočtu na tuny=2 679,000 [E]* *Celkem: 8212.75+2494.356+1154.16+8154.98+2679=22 695,246 [F]* *ZBV č. 13* *dle pol. 122101103 637*1,9=1 210,300 [A]* *ZBV č. 20* *odkopaná zemina 42,18*1,9=80,142 [A]* *ZBV č. 37* *zábradlí propustek* *0,5*0,5*0,85*12*1,9=4,845* *ZBV č. 39* *dle pol. č. 171201201 1785,44*1,9=3 392,336 [A]* *ZBV č. 42* *dle pol. č. 171201201* *157,475*1,9=299,203 [A]* *ZBV č. 43* *dle pol. č. 171201201* *40,905*1,9=81,81 [A]*											
20	171201211a	Poplatek za zemník	T	10 481,925	10 481,925	0,000	23,03	241 398,73	0,00	0,00	241 398,73	0,00	0,00%
		Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)											
		SoD *1701.75*1.9 dle pol. 122101402 x koef. 1,9 pro přepočet na tuny=3 233,325 [A]* *2102.1*2.0 dle pol. 122201403 x koef.2,0 pro přepočet na tuny=4 204,200 [B]* *1410*1.9 dle pol. 182201101 x hloubka 60 cm - vhodná zemina pro svahové stupně=2 679,000 [C]* *182.7*2.0 dle pol. 174101101 - obsyp propustku v km 12,925=365,400 [D]* *Celkem: 3233.325+4204.2+2679+365.4=10 481,925 [E]*											
21	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	M3	182,700	182,700	0,000	254,57	46 509,94	0,00	0,00	46 509,94	0,00	0,00%
		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách											
		SoD *14.5*(5.3*2+2.0) délka x plocha v řezu - obsyp propustku v km 12,925=182,700 [A]*											

Změnový soupis prací SO 102 po změně 18 pro ZBV 44

Evidenční číslo a název stavby: II/102 hr. hl. města Prahy-Štěchovice, rekonstrukce. ETAPA II
Číslo a název SO/PS: SO 102 - Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice
Číslo a název rozpočtu: SO 102 - Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)
102
Celkem

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
22	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	M2	11 027,000	12 217,200	1 190,200	33,80	372 712,60	0,00	40 228,76	412 941,36	40 228,76	2,25%
		Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním											
		ZBV č. 15 *dle geodetického protokolu č. Š II 3/2022* *km 13,2-13,7* *žlaby 69,4=69,400 [A]* *žulové kostky 100,9=100,900 [B]* *A+B=170,300 [C]* *ZBV č. 20* *1,9*60=114,00 [A]* *ZBV ZBV č. 27* *geodetický protokol Š II 51/2022 92,2 m2=92,200 [A]* *geodetický protokol Š II 58/2022 183,8 m2 =183,800 [B]* *A+B=276,000 [C]*											
		ZBV č. 42 *geodetický protokol Š II 14/2023* *km 11,780-11,868 94,20=94,200 [A]* *km 11,881-11,909 23,50=23,500 [B]* *km 11,923-12,435 512,20=512,200 [C]* *A+B+C=629,900 [D]*											
23	182201101	Svahování násypů	M2	2 350,000	7 944,300	5 594,300	43,01	101 073,50	0,00	240 610,84	341 684,34	240 610,84	36,22%
		Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním výkopku při svahování násypů v jakékoliv hornině											
		SoD *(420+50)*5 zřízení svahových stupňů v km 11,720 - 12,140 2350 v km 12,030 - 12,080 - délka x odhad prům.šířky ve svahu=2 350,000 [A]* *ZBV č. 13* *dle geodetického zaměření* *km 10,360 - 10,422 111,9 m2=111,900 [A]* *km 10,422 - 10,454 48,7 m2=48,700 [B]* *km 10,455 - 10,476 44,9 m2 =44,900 [C]* *km 10,480 - 10,654 369,6 m2=369,600 [D]* *km 10,706 - 10,730 41,4 m2=41,400 [E]* *km 10,730 - 10,840 234,7 m2=234,700 [F]* *A+B+C+D+E+F=851,200 [G]*											
		ZBV č. 39 *geodetické protokoly* *Š II 33/2021 km 13,150-13,190 vlevo 89,90=89,900 [A]* *Š II 10/2022 km 10,140-10,250 vlevo 191,10=191,100 [B]* *Š II 12/2022 km 10,001-10,101 vlevo 112,90=112,900 [C]* *Š II 16/2022 km 10,103-10,140 vlevo 63,0+55,20-77=41,200 [D]* *Š II 27/2022 km 11,430-11,520 vlevo 191,60=191,600 [E]* *Š II 35/2022 km 11,220-11,430 vlevo 67,90+268,30=336,200 [F]* *Š II 43/2022 km 11,520-11663 vlevo 303,20=303,200 [G]* *Š II 45/2022 km 11,140-11,220 vlevo 187,80=187,800 [H]* *Š II 47/2022 km 11,671-11,780 vlevo 215,0=215,000 [I]* *Š II 53/2022 km 14,462-14,580 vlevo 249,30=249,300 [J]* *Š II 62/2022 km 11,056-11,140 vlevo 214,20=214,200 [K]* *Š II 65/2022 km 11,340-11,400 vlevo 47,0+160,30=207,300 [L]* *Š II 1/2023 km 10,840-10947 vlevo 188,7 =188,7 [V]* *Š II 4/2023 km 10,947-11,031 vlevo 165,60=165,600 [M]* *Š II 7/2023 km 11,976-12,440 vlevo 805,30=805,300 [N]* *Š II 8/2023 km 11,780-11,971 vlevo 231,10+1,70=232,800 [O]* *Š II 11/2023 km 14,410-14,460 vlevo 75,40+21,50=96,900 [P]* *Š II 13/2023 km 14,425 vlevo 22,40=22,400 [Q]* *Š II 16/2023 km 11,928-12,060 vpravo 279,50=279,500 [R]* *Š II 27/2023 km 11,733-11,832 vpravo 332,70=332,700 [S]* *celkem A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q+R+S+V=4463,60 [U]*											

Změnový soupis prací SO 102 po změně 18 pro ZBV 44

Evidenční číslo a název stavby: II/102 hr. hl. města Prahy-Štěchovice, rekonstrukce. ETAPA II
Číslo a název SO/PS: SO 102 - Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice
Číslo a název rozpočtu: SO 102 - Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)
102
Celkem

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		ZBV č. 42 *geodetický protokol Š II 16/2023* *km 11,928-12,060 279,50=279,500 [A]*											
24	182301132	Rozprostření ornice pl přes 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 150 mm	M2	11 345,000	80,110	-11 264,890	36,89	418 517,05	-415 561,78	0,00	2 955,27	-415 561,78	-99,29%
		Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy přes 100 do 150 mm											
		SoD *490*5.0 délka dle situace x odhad šířky - úprava svahu typu 2450=2 450,000 [A]* *910*3.0*2 délka dle situace x odhad šířky x na obou stranách - úprava svahu typu B2=5 460,000 [B]* *4580*1.5*0.5 délka trasy x odhadnutá šířka ohumusování x odhad 50 %=3 435,000 [C]* *Celkem: 2450+5460+3435=11 345,000 [D* *ZBV č. 39* *odpočet, neprovádělo se* *-11264,89=-11 264,890 [A]*											
25	183405211	Výsev trávníku hydroosevem na ornici	M2	11 345,000	11 345,000	0,000	20,49	232 459,05	0,00	0,00	232 459,05	0,00	0,00%
26	005724740	osivo směs travní krajinná - svahová	KG	283,625	283,625	0,000	155,44	44 086,67	0,00	0,00	44 086,67	0,00	0,00%
27	184802631	Chemické odplevelení po založení kultury postřikem na široko ve svahu do 1:1	M2	11 345,000	11 345,000	0,000	4,26	48 329,70	0,00	0,00	48 329,70	0,00	0,00%
		Chemické odplevelení po založení kultury na svahu přes 1:2 do 1:1 postřikem na široko											
28	185803113	Ošetření trávníku shrabáním ve svahu do 1:1	M2	11 345,000	11 345,000	0,000	4,61	52 300,45	0,00	0,00	52 300,45	0,00	0,00%
		Ošetření trávníku jednorázové na svahu přes 1:2 do 1:1											
29	185804312	Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2	M3	340,350	340,350	0,000	556,12	189 275,44	0,00	0,00	189 275,44	0,00	0,00%
		Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2											
		SoD *11345.000*0.01*3=340,350 [A]*											
	2	**Zakládání**											
30	213221111	Ochranná vrstva na základové spáře z bet. prost. se zvýš. nároky na prostředí C 25/30 tl do 150 mm	M3	16,530	16,530	0,000	3 321,98	54 912,33	0,00	0,00	54 912,33	0,00	0,00%
		Ochranná vrstva na základové spáře z prostého betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30 tl. do 150 mm											
		SoD *1.7*3.0*0.30 Betonové lože C25/30-XF3 pod stupně z lomového kamene u propustku v km 12,925=1,530 [A]* *2.5*20.0*0.3 betonové lože C25/30-XF3 pod propustkem=15,000 [B]* *Celkem: 1.53+15=16,530 [C]*											
	4	**Vodorovné konstrukce**											
31	451317777	Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu 1:5 z betonu prostého tl do 100 mm	M2	5 223,400	5 430,800	207,400	581,54	3 037 616,04	-441 854,09	562 465,49	3 158 227,44	120 611,40	3,97%
		Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5, tloušťky od 50 do 100 mm z betonu prostého											
		ZBV č. 13 dle geoetického zaměření Š II 37/2021 km 10,360 - 10,422 111,9 m2=111,900 [A] Š II 30/2021 km 10,422 - 10,454 48,7 m2=48,700 [B] Š II 34/2021 km 10,455 - 10,476 44,9 m2 =44,900 [C] Š II 30/2021 km 10,480 - 10,654 369,6 m2=369,600 [D] Š II 30/2021 km 10,706 - 10,730 41,4 m2=41,400 [E] Š II 38/2021 km 10,730 - 10,840 234,7 m2=234,700 [F] A+B+C+D+E+F=851,200 [G]											

Změnový soupis prací SO 102 po změně 18 pro ZBV 44

Evidenční číslo a název stavby: II/102 hr. hl. města Prahy-Štěchovice, rekonstrukce. ETAPA II
Číslo a název SO/PS: SO 102 - Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice
Číslo a název rozpočtu: SO 102 - Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)
102
Celkem

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		ZBV č. 39 geodetické protokoly Š II 33/2021 km 13,150-13,190 vlevo 89,90=89,900 [A] Š II 10/2022 km 10,140-10,250 vlevo 191,10=191,100 [B] Š II 12/2022 km 10,001-10,101 vlevo 112,90=112,900 [C] Š II 16/2022 km 10,103-10,140 vlevo 63,0+55,20-77=41,200 [D] Š II 27/2022 km 11,430-11,520 vlevo 191,60=191,600 [E] Š II 35/2022 km 11,220-11,430 vlevo 67,90+268,30=336,200 [F] Š II 43/2022 km 11,520-11663 vlevo 303,20=303,200 [G] Š II 45/2022 km 11,140-11,220 vlevo 187,80=187,800 [H] Š II 47/2022 km 11,671-11,780 vlevo 215,0=215,000 [I] Š II 53/2022 km 14,462-14,580 vlevo 249,30=249,300 [J] Š II 62/2022 km 11,056-11,140 vlevo 214,20=214,200 [K] Š II 65/2022 km 11,340-11,400 vlevo 47,0+160,30=207,300 [L] Š II 1/2023 km 10,840-10947 vlevo 188,7=188,700 [M] Š II 4/2023 km 10,947-11,031 vlevo 165,60=165,600 [N] Š II 7/2023 km 11,976-12,440 vlevo 805,30=805,300 [O] Š II 8/2023 km 11,780-11,971 vlevo 231,10+1,70=232,800 [P] Š II 11/2023 km 14,410-14,460 vlevo 75,40+21,50=96,900 [Q] Š II 13/2023 km 14,425 vlevo 22,40=22,400 [R] Š II 16/2023 km 11,928-12,060 vpravo 279,5=279,500 [S] Š II 27/2023 km 11,733-11,832 vpravo 332,70=332,700 [T] celkem A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q+R+S+T=4 463,600 [U] odpočet původního množství -5223,4=-5 223,400 [V] celkem U+V=- 759,800 [W]												
		ZBV č. 42 geodetický protokol Š II 34/2023 km 11,904-11,930 25,10=25,100 [A]											
		ZBV č. 43 geodetický protokol Š II 37/2023 dlažba pro obec Davle km 10,474 vlevo 6,1=6,100 [A] km 10,590 vpravo 9,0=9,000 [B] km 10,675-10,690 vpravo17,2 =17,200 [C] km 11,049 vlevo 9,0=9,000 [D] km 11,082 vpravo 10,2=10,200 [E] km 11,166 vlevo 6,0=6,000 [F] km 11,255-11,286 vlevo 23,10=23,100 [G] km 11,666-11,673 vlevo 10,3=10,300 [H] A+B+C+D+E+F+G+H=90,900 [I]											
32	452318510	Zajišťovací práh z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí	M3	9,950	9,950	0,000	8 203,04	81 620,25	0,00	0,00	81 620,25	0,00	0,00%
		Zajišťovací práh z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí na dně a ve svahu melioračních kanálů s patkami nebo bez patek											
		SoD *(0.5*0.8*2.5)*2+(0.3*0.8*2.5)*2+(0.5*1.8*2.5)*3 =9,950 [A]*											
33	464511111	Pohoz z lomového kamene neupraveného tříděného z terénu	M3	3,000	0,000	-3,000	3 481,56	10 444,68	-10 444,68	0,00	0,00	-10 444,68	-100,00%
		Pohoz dna nebo svahů jakékoliv tloušťky z lomového kamene neupraveného tříděného z terénu											
		SoD *5.0*3.0*0.2 Zpevnění dna toku pohozeným lomovým kamenem =3,000 [A]*											
		ZBV č. 39 *odpočet neprovádělo se* *-3,00=-3,00*											

Změnový soupis prací SO 102 po změně 18 pro ZBV 44

Evidenční číslo a název stavby: II/102 hr. hl. města Prahy-Štěchovice, rekonstrukce. ETAPA II
Číslo a název SO/PS: SO 102 - Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice
Číslo a název rozpočtu: SO 102 - Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)
102
Celkem

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	5	**Komunikace pozemní**											
34	564251111	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 150 mm	M2	63,750	63,750	0,000	152,90	9 747,38	0,00	0,00	9 747,38	0,00	0,00%
		Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP s rozprostřením, vlhčením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm											
		SoD *(0.5*2.5)*5+(0.3*2.5)*2 podsyp pod betonové prahy=7,750 [A]* *20.0*2.8 ŠP podsyp od propustkem=56,000 [B]* *Celkem: 7.75+56=63,750 [C]*											
35	564581111	Zřízení podsypu nebo podkladu ze sypaniny tl 300 mm	M2	6 552,000	6 552,000	0,000	154,21	1 010 383,92	0,00	0,00	1 010 383,92	0,00	0,00%
		Zřízení podsypu nebo podkladu ze sypaniny s rozprostřením, vlhčením, a zhutněním, po zhutnění tl. 300 mm											
		SoD *(910*3.6)*2 délka x šířka x dvakrát do tl. 600mm - úprava typu B2=6 552,000 [A]*											
36	564861113	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 220 mm	M2	17 520,100	17 910,100	390,000	215,26	3 771 376,73	0,00	83 951,40	3 855 328,13	83 951,40	2,23%
		Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 220 mm											
		SoD *11027*1.3 výměna celé konstrukce vozovky=14 335,100 [A]* *910*3.5 délka x šířka - úprava svahu typu B2=3 185,000 [B]* *Celkem: 14335.1+3185=17 520,100 [C]* *ZBV č. 20* *podklad ze ŠD v rozšíření* *1,9*60=114,00 [A]* *ZBV ZBV č. 27* *geodetický protokol Š II 51/2022 92,2 m2=92,200 [A]* *geodetický protokol Š II 58/2022 183,8 m2 =183,800 [B]* *A+B=276,000 [C]*											
37	564871111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm	M2	3 731,000	4 360,900	629,900	298,95	1 115 382,45	0,00	188 308,61	1 303 691,06	188 308,61	16,88%
		Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 250 mm											
		SoD *910*4.1 délka x šířka - polštář ze ŠD v min.tl.0,25m - úprava typu B2=3 731,000 [A]* *ZBV č. 42* *geodetický protokol Š II 14/2023 - rozšíření vozovky* *km 11,780-11,868 94,20=94,200 [A]* *km 11,881-11,909 23,50=23,500 [B]* *km 11,923-12,435 512,20=512,200 [C]* *A+B+C=629,900 [D]*											

Změnový soupis prací SO 102 po změně 18 pro ZBV 44

Evidenční číslo a název stavby: II/102 hr. hl. města Prahy-Štěchovice, rekonstrukce. ETAPA II
Číslo a název SO/PS: SO 102 - Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice
Číslo a název rozpočtu: SO 102 - Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)
102
Celkem

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
38	564951413R	Recyklovaná směs (v místícím centru) RS 0/32 C3/4 CA (TP 208), tl. 150 mm	M2	19 007,200	0,000	-19 007,200	174,41	3 315 045,75	-3 315 045,75	0,00	0,00	-3 315 045,75	-100,00%
		Podklad nebo podsyp z asfaltového recyklátu s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm											
		SoD *11027*1.15 výměna celé konstrukce vozovky=12 681,050 [A]* *5501*1.15 změna příčného sklonu=6 326,150 [B]* *Celkem: 12681.05+6326.15=19 007,200 [C]*											
		ZBV č. 23 *odpočet původního množství -19 007,20* *nahrazeno novou položkou č. 151*											
39	565125000R	Asfaltová vrstva se zvýšenou odolností proti šíření trhlin SAL tl. 30 mm	M2	13 995,000	20 155,500	6 160,500	246,93	3 455 785,35	0,00	1 521 212,27	4 976 997,62	1 521 212,27	44,02%
		Asfaltová vrstva se zvýšenou odolností proti šíření trhlin SAL tl. 30 mm											
		SoD *13995 frézování v tl. 60mm=13 995,000 [A]* *ZBV č. 37* *vrstva SAL* *Geodetický protokol* *D 6/2020 505,00=505,000 [A]* *D 13/2020 1873,00=1 873,000 [B]* *Š II 60/2021 450,00=450,000 [C]* *Š II 78/2021 1562,30=1 562,300 [D]* *Š II 100/2021 2203,30=2 203,300 [E]* *Š II 15/2022 251,90=251,900 [F]* *Š II 49/2022 2175,00=2 175,000 [G]* *Š II 63/2022 143,30=143,300 [H]* *Š II 66/2022 1957,40=1 957,400 [I]* *Š II 10/2023 2982,70=2 982,700 [J]* *Š II 22/2023 827,40+467,80=1 295,200 [K]* *Š II 23/2023 1859,90=1 859,900 [L]* *Š II 25/2023 1414,50=1 414,500 [M]* *Š II 30/2023 1482,00=1 482,000 [N]* *odpočet původního množství -13995,00=-13 995,000 [O]* *Celkem A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O=6 160,500 [P]*											
40	565135111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š do 3 m	M2	18 180,800	18 882,900	702,100	235,41	4 279 942,13	0,00	165 281,36	4 445 223,49	165 281,36	3,86%
		Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm											
		SoD *11027*1.1 výměna celé konstrukce vozovky=12 129,700 [A]* *5501*1.1 frézování v tl. 150 mm - změna příčného sklonu=6 051,100 [B]* *Celkem: 12129.7+6051.1=18 180,800 [C]* *ZBV ZBV č. 12* *náhrada odvodňovacího proužku v místě nové opěrné zdi1300*0,5=650,000 [A]* *ZBV č. 21* *protokol Š II 100/2021 km 10,360-10,841 vpravo* *vrstva navíc 52,1=52,100 [A]*											
41	569851111	Zpevnění krajnic štěrkodrtí (recyklát) tl 150 mm	M2	3 435,000	3 435,000	0,000	402,88	1 383 892,80	0,00	0,00	1 383 892,80	0,00	0,00%
		Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění štěrkodrtí tl. 150 mm											
		SoD *4580*0.5*2*0.75 délka x šířka x obě strany - odhad 75%=3 435,000 [A]*											
130	572241112	Vyspravení výtluků asfaltovým betonem ACO (AB) tl do 60 mm při vyspravované ploše do 10% na 1 km	M2	2 034,900	2 034,900	0,000	362,06	736 755,89	0,00	0,00	736 755,89	0,00	0,00%
		Vyspravení výtluků materiálem na bázi asfaltu s řezáním, vysekáním, očištěním, zaplněním směsí a zhutněním asfaltovým betonem ACO (AB) při vyspravované ploše na 1 km komunikace do 10 % tl. přes 40 do 60 mm											
		SoD *(11027+13995+2160+5501+8015)*0.05 5% z plochy obrusné vrstvy=2 034,900 [A]*											
42	572531131	Oprava trhlin asfaltovou sanační hmotou š do 40 mm	M	6 674,400	6 674,400	0,000	128,96	860 730,62	0,00	0,00	860 730,62	0,00	0,00%
		Vyspravení trhlin dosavadního krytu asfaltovou sanační hmotou oprava trhlin šířky přes 30 do 40 mm											
		SoD *21600*1.03*0.3=6 674,400 [A]*											

Změnový soupis prací SO 102 po změně 18 pro ZBV 44

Evidenční číslo a název stavby: II/102 hr. hl. města Prahy-Štěchovice, rekonstrukce. ETAPA II
Číslo a název SO/PS: SO 102 - Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice
Číslo a název rozpočtu: SO 102 - Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)
102
Celkem

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
43	573191111	Nátěr infiltrační kationaktivní v množství emulzí 1 kg/m2	M2	38 153,750	38 803,750	650,000	28,06	1 070 594,23	0,00	18 239,00	1 088 833,23	18 239,00	1,70%
		Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1,00 kg/m2											
		SoD *11027*1.25 výměna celé konstrukce vozovky=13 783,750 [A]* *13995*1.25 frézování v tl. 60mm=17 493,750 [B]* *5501*1.25 frézování v tl. 150 mm při změně příčného sklonu=6 876,250 [C]* *Celkem: 13783.75+17493.75+6876.25=38 153,750 [D]* *ZBV ZBV č. 12* *náhrada odvodňovacího proužku v místě nové opěrné zdi1300*0,5=650,000 [A]*											
44	573231106	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze modif v množství 0,30 kg/m2	M2	40 367,809	47 238,609	6 870,800	12,24	494 101,98	0,00	84 098,59	578 200,57	84 098,59	17,02%
		Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,30 kg/m2											
		ZBV ZBV č. 10 *60,3 dle zaměření =60,300 [A]* *ZBV ZBV č. 12* *náhrada odvodňovacího proužku v místě nové opěrné zdi1300*0,5=650,000 [A]*											
		ZBV č. 37 *vrstva SAL* *dle pol. č. 565125000R* *6160,50 m2*											
45	573231113R	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze modif v množství 1,20 kg/m2	M2	41 348,000	41 554,400	206,400	30,47	1 259 873,56	0,00	6 289,01	1 266 162,57	6 289,01	0,50%
		Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,80 kg/m2											
		SoD *11027 výměna celé konstrukce vozovky=11 027,000 [A]* *1300*0.5 v odvodňovacím proužku v místě nové opěrné zdi=650,000 [B]* *13995 frézování v tl. 60mm=13 995,000 [C]* *2160 frézování tl. 100 mm=2 160,000 [D]* *5501+8015 frézování v tl. 150 mm=13 516,000 [E]* *Celkem: 11027+650+13995+2160+13516=41 348,000 [F]* *ZBV ZBV č. 10* *42,1 dle zaměření =42,100 [A]* *ZBV č. 21* *protokol Š II 100/21 km 10,360 -10,841 vpravo* *ACL 16 vyrovnávka tl. 60 mm.....164,3 m2 - přípočet (vrstva navíc)* *164,30=164,300 [A]*											
46	577134131	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu	M2	40 698,000	41 408,300	710,300	241,37	9 823 276,26	0,00	171 445,11	9 994 721,37	171 445,11	1,75%
		Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 40 mm											
		SoD *11027 výměna celé konstrukce vozovky=11 027,000 [A]* *13995 frézování v tl. 60mm=13 995,000 [B]* *2160 frézování tl. 100 mm=2 160,000 [C]* *5501+8015 frézování v tl. 150 mm 11027 při změně příčného sklonu=13 516,000 [D]* *Celkem: 11027+13995+2160+13516=40 698,000 [E]* *ZBV ZBV č. 10* *60,3 dle zaměření =60,300 [A]* *ZBV ZBV č. 12* *náhrada odvodňovacího proužku v místě nové opěrné zdi1300*0,5=650,000 [A]*											

Změnový soupis prací SO 102 po změně 18 pro ZBV 44

Evidenční číslo a název stavby: II/102 hr. hl. města Prahy-Štěchovice, rekonstrukce. ETAPA II
Číslo a název SO/PS: SO 102 - Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice
Číslo a název rozpočtu: SO 102 - Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)
102
Celkem

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
47	577155132	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu	M2	44 402,580	43 003,980	-1 398,600	327,65	14 548 505,34	-685 017,86	226 766,57	14 090 254,05	-458 251,29	-3,15%
		Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 60 mm											
		SoD *11027*1.01 výměna celé konstrukce vozovky=11 137,270 [A]* *13995*1.01 frézování v tl. 60mm=14 134,950 [B]* *2160*1.01 frézování tl. 100 mm=2 181,600 [C]* *(5501+8015)*1.01 frézování v tl. 150 mm 11137.27 při změně příčného sklonu=13 651,160 [D]* *(4580*0.40)*1.5 vyrovnávací vrstva - odhad 40 % délky x šířka=2 748,000 [E]* *183.2*3 délka příčné spáry x délka klínu=549,600 [F]* *Celkem: 11137.27+14134.95+2181.6+13651.16+2748+549.6=44 402,580 [G]* *ZBV ZBV č. 10* *42,1 dle zaměření =42,100 [A]* *ZBV ZBV č. 12* *náhrada odvodňovacího proužku v místě nové opěrné zdi1300*0,5=650,000 [A]* *ZBV č. 21* *protokol Š II 89/21 km 13,199 - 13,696 vlevo* *ACL 16 modif. prům tl. 84,1 mm -2255=-2 255,000 [A]* *protokol Š II 100/2021 km 10,360 -10,841 vpravo* *ACL 16 vyrovnávka tl. 60 mm (vrstva navíc) 164,3=164,300 [B]* *A+B=-2 090,700 [C]*											
48	578133131	Litý asfalt MA 11 IV tl 30 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu	M2	3 250,000	0,000	-3 250,000	518,12	1 683 890,00	-1 683 890,00	0,00	0,00	-1 683 890,00	-100,00%
		Litý asfalt MA 11 (LAS) s rozprostřením z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tl. 30 mm											
		SoD *1300*0.5*5 v odvodňovacím proužku v místě nové opěrné zdi x počet vrstev pro dosažení tl. 60+90=150mm=3 250,000 [A]* *ZBV ZBV č. 12* *odpočet dle SOD - proužek nahrazen konstrukčními vrstvami přilehlé vozovky - 3 250*											
49	594511111	Dlažba z lomového kamene s provedením lože z betonu	M2	5 226,400	5 430,800	204,400	2 927,76	15 301 644,86	-2 233 295,33	2 831 729,47	15 900 079,00	598 434,14	3,91%
		Dlažba nebo přídlažba z lomového kamene lomařsky upraveného rigolového v ploše vodorovné nebo ve sklonu tl. do 250 mm, bez vyplnění spár, s provedením lože tl. 50 mm z betonu											
		SoD *(2*4.5)+(4*3)+(4*1.7*3.0) odláždění šikmých čel u propustku v km 12,925 41.4 zpevnění stupňů u propustku =41,400 [A]* *970*3.0 odláždění svahu - úprava typu B1 - odhad prům.šířky=2 910,000 [B]* *910*2.5 obložení povrchu svahu s obalovanými čely - úprava typu B2 - odhad prům.šířky=2 275,000 [C]* *Celkem: 41.4+2910+2275=5 226,400 [D]* *ZBV č. 13* *dle geoetického zaměření* *Š II 37/2021 km 10,360 - 10,422 111,9 m2=111,900 [A]* *Š II 30/2021 km 10,422 - 10,454 48,7 m2=48,700 [B]* *Š II 34/2021 km 10,455 - 10,476 44,9 m2 =44,900 [C]* *Š II 30/2021 km 10,480 - 10,654 369,6 m2=369,600 [D]* *Š II 30/2021 km 10,706 - 10,730 41,4 m2=41,400 [E]* *Š II 38/2021 km 10,730 - 10,840 234,7 m2=234,700 [F]* *A+B+C+D+E+F=851,200 [G]*											

Změnový soupis prací SO 102 po změně 18 pro ZBV 44

Evidenční číslo a název stavby: II/102 hr. hl. města Prahy-Štěchovice, rekonstrukce. ETAPA II
Číslo a název SO/PS: SO 102 - Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice
Číslo a název rozpočtu: SO 102 - Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)
102
Celkem

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		ZBV č. 39 geodetické protokoly Š II 33/2021 km 13,150-13,190 vlevo 89,90=89,900 [A] Š II 10/2022 km 10,140-10,250 vlevo 191,10=191,100 [B] Š II 12/2022 km 10,001-10,101 vlevo 112,90=112,900 [C] Š II 16/2022 km 10,103-10,140 vlevo 63,0+55,20-77=41,200 [D] Š II 27/2022 km 11,430-11,520 vlevo 191,60=191,600 [E] Š II 35/2022 km 11,220-11,430 vlevo 67,90+268,30=336,200 [F] Š II 43/2022 km 11,520-11663 vlevo 303,20=303,200 [G] Š II 45/2022 km 11,140-11,220 vlevo 187,80=187,800 [H] Š II 47/2022 km 11,671-11,780 vlevo 215,0=215,000 [I] Š II 53/2022 km 14,462-14,580 vlevo 249,30=249,300 [J] Š II 62/2022 km 11,056-11,140 vlevo 214,20=214,200 [K] Š II 65/2022 km 11,340-11,400 vlevo 47,0+160,30=207,300 [L] Š II 1/2023 km 10,840-10947 vlevo 188,7=188,700 [M] Š II 4/2023 km 10,947-11,031 vlevo 165,60=165,600 [N] Š II 7/2023 km 11,976-12,440 vlevo 805,30=805,300 [O] Š II 8/2023 km 11,780-11,971 vlevo 231,10+1,70=232,800 [P] Š II 11/2023 km 14,410-14,460 vlevo 75,40+21,50=96,900 [Q] Š II 13/2023 km 14,425 vlevo 22,40=22,400 [R] Š II 16/2023 km 11,928-12,060 vpravo 279,5=279,500 [S] Š II 27/2023 km 11,733-11,832 vpravo 332,70=332,700 [T] celkem A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q+R+S+T=4 463,600 [U] odpočet původního množství -5226,4=-5 226,400 [V] celkem U+V=- 762,800 [W]												
		ZBV č. 42 geodetický protokol Š II 34/2023 km 11,904-11,930 25,10=25,100 [A] ZBV č. 43 dle pol. č. 451317777 90,90=90,90											
50	596811221	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva vel do 0,25 m2 plochy do 100 m2	M2	60,000	60,000	0,000	396,53	23 791,80	0,00	0,00	23 791,80	0,00	0,00%
		Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikací pro pěší s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m s ložem z kameniva těženého tl. do 30 mm velikosti dlaždic přes 0,09 m2 do 0,25 m2, pro plochy přes 50 do 100 m2											
51	59245212	dlažba zámková profilová základní 19,6x16,1x6 cm přírodní	M2	12,000	12,000	0,000	237,30	2 847,60	0,00	0,00	2 847,60	0,00	0,00%
		dlažba zámková profilová základní 19,6x16,1x6 cm přírodní											
		SoD *60*0.20 cca 20 % nové dlažby při obnově chodníků, předpokládá se především využití stávající=12,000 [A]*											
	8	**Trubní vedení**											
56	592238200	vpusť betonová uliční TBV-Q 500/290 K /skruž/ 29x50x5 cm	KUS	2,000	2,000	0,000	609,76	1 219,52	0,00	0,00	1 219,52	0,00	0,00%
		vpusť betonová uliční /skruž/ 29x50x5 cm											
57	592238210	vpusť betonová uliční TBV-Q 660/180 /prstenec/ 18x66x10 cm	KUS	2,000	2,000	0,000	676,46	1 352,92	0,00	0,00	1 352,92	0,00	0,00%
		vpusť betonová uliční prstenec 18x66x10 cm											
55	592238230	vpusť betonová uliční TBV-Q 500/626 D /dno/ 62,6 x 49,5 x 5 cm	KUS	2,000	2,000	0,000	1 041,47	2 082,94	0,00	0,00	2 082,94	0,00	0,00%
		vpusť betonová uliční dno 62,6 x 49,5 x 5 cm											
52	871315241	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC vícevrstvé tuhost třídy SN12 DN 150	M	20,000	20,000	0,000	1 295,34	25 906,80	0,00	0,00	25 906,80	0,00	0,00%
		Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného vícevrstvého, tuhost třídy SN 12 DN 150											
		*2*10 přípojky k novým UV - odhad=20,000 [A]*											
53	895931111	Vpusti kanalizačních horské z betonu prostého C12/15 velikosti 1200/600 mm	KUS	1,000	1,000	0,000	35 858,74	35 858,74	0,00	0,00	35 858,74	0,00	0,00%
		Vpusti kanalizační horské z betonu prostého tř. C 12/15 velikosti 1200/600 mm											
54	895941111	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální	KUS	2,000	2,000	0,000	6 416,78	12 833,56	0,00	0,00	12 833,56	0,00	0,00%
		Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální											
58	898121129	Sanace potrubí DN 600 polyuretanový nástřik tl.2,4 mm	M	32,000	32,000	0,000	5 181,24	165 799,68	0,00	0,00	165 799,68	0,00	0,00%
		Sanace vodovodního potrubí litinového, ocelového nebo betonového polyuretanový nástřik sanační tloušťka 2,4 mm DN 600											

Změnový soupis prací SO 102 po změně 18 pro ZBV 44														
Evidenční číslo a název stavby: II/102 hr. hl. města Prahy-Štěchovice, rekonstrukce. ETAPA II Číslo a název SO/PS: SO 102 - Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice Číslo a název rozpočtu: SO 102 - Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS) 102 Celkem						
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
		SoD *13+19 sanace propustků 32 vtok. objektů přespárováním v km 11,917 32 12,086=32,000 [A]*												

Změnový soupis prací SO 102 po změně 18 pro ZBV 44

Evidenční číslo a název stavby: II/102 hr. hl. města Prahy-Štěchovice, rekonstrukce. ETAPA II
Číslo a název SO/PS: SO 102 - Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice
Číslo a název rozpočtu: SO 102 - Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)
102
Celkem

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
59	898161134	Sanace potrubí vložkování skelným rukávcem DN 1000 tl.8,0 mm	M	32,000	32,000	0,000	22 912,62	733 203,84	0,00	0,00	733 203,84	0,00	0,00%
		Sanace vodovodního potrubí litinového, ocelového nebo betonového vložkování stávajícího potrubí skelným rukávcem [UV-Liner] sanační tloušťky 8 mm DN 1000											
		SoD *13+19 sanace vyvložkováním propustků, příp.vtok.objektů, v km 11,917 32 12,086=32,000 [A]*											
60	899131115R	Bourání uličních vpustí kompletních	KUS	3,000	3,000	0,000	1 344,82	4 034,46	0,00	0,00	4 034,46	0,00	0,00%
		Výměna šachtového rámu [technologií Hermes] tř. D 400 včetně poklopu s osazením a dodáním nového rámu z litiny a betonu [typ BEGU]											
		SoD *2+1 vč. odvozu 3 uložení na skládku=3,000 [A]*											
	9	**Ostatní konstrukce a práce, bourání**											
67	40445158	sloupek silniční směrový plastový 1200mm	KUS	66,168	66,168	0,000	363,84	24 074,57	0,00	0,00	24 074,57	0,00	0,00%
69	40445175	odrazka na svodidla V.1.B	KUS	54,800	54,800	0,000	716,16	39 245,57	0,00	0,00	39 245,57	0,00	0,00%
		odrazka na svodidla V.1.B											
71	40445175a	odrazka na svodidla M.1.B	KUS	4,000	3,000	-1,000	941,84	3 767,36	-941,84	0,00	2 825,52	-941,84	-25,00%
		ZBV č. 44 *odpočet množství skutečnost* *-1=-1,000 [A]*											
73	404454040	značka dopravní svislá nereflexní FeZn prolis, 500 x 700 mm	KUS	1,000	1,000	0,000	1 306,83	1 306,83	0,00	0,00	1 306,83	0,00	0,00%
74	404454070	značka dopravní svislá nereflexní FeZn prolis, 1100 x 330 mm	KUS	2,000	2,000	0,000	1 862,95	3 725,90	0,00	0,00	3 725,90	0,00	0,00%
75	404454320	značka dopravní svislá nereflexní FeZn-Al rám., D 700 mm	KUS	2,000	2,000	0,000	1 377,06	2 754,12	0,00	0,00	2 754,12	0,00	0,00%
62	55391534	zábradelní systém Pz s výplní ze svislých ocelových tyčí ZSNH4/H2	M	10,000	0,000	-10,000	7 829,44	78 294,40	-78 294,40	0,00	0,00	-78 294,40	-100,00%
		ZBV č. 37 *neprovádělo se*											
93	59217031	obrubník betonový silniční 100 x 15 x 25 cm	M	46,000	70,000	24,000	135,29	6 223,34	0,00	3 246,96	9 470,30	3 246,96	52,17%
		ZBV č. 38 *podklad pod svodidla* *12*2=24*											
97	59222001	trouba hrdlová přímá železobetonová s integrovaným těsněním 60 x 250 x 10 cm	M	13,000	13,000	0,000	1 784,45	23 197,85	0,00	0,00	23 197,85	0,00	0,00%
99	59222003	trouba hrdlová přímá železobetonová s integrovaným těsněním 100 x 250 x 13 cm	M	20,000	20,000	0,000	6 372,85	127 457,00	0,00	0,00	127 457,00	0,00	0,00%
61	911121111	Montáž zábradlí ocelového přichyceného vruty do betonového podkladu	M	10,000	0,000	-10,000	863,54	8 635,40	-8 635,40	0,00	0,00	-8 635,40	-100,00%
		ZBV č. 37 *neprovádělo se*											
63	911331135	Svodidlo ocelové jednostranné zádržnosti H1 typ KB1 RH1 V se zaberaněním sloupků v rozmezí do 4 m	M	2 740,000	2 749,000	9,000	1 093,82	2 997 066,80	0,00	9 844,38	3 006 911,18	9 844,38	0,33%
		Silniční svodidlo s osazením sloupků zaberaněním ocelové úroveň zádržnosti H1 vzdálenosti sloupků přes 2 do 4 m jednostranné [KB1 RH1 V]											
		SoD *150+120+26+70 vpravo - dle situace + u benzinky=366,000 [A]* *2374 vlevo - výměna stávajícího svodidla=2 374,000 [B]* *Celkem: 366+2374=2 740,000 [C]* *ZBV č. 38* *geodetický protokol Š II 39/2023* *km 13,887-13,896 v pravo* *9=9*											

Změnový soupis prací SO 102 po změně 18 pro ZBV 44

Evidenční číslo a název stavby: II/102 hr. hl. města Prahy-Štěchovice, rekonstrukce. ETAPA II
Číslo a název SO/PS: SO 102 - Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice
Číslo a název rozpočtu: SO 102 - Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)
102
Celkem

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
64	911381124	Silniční svodidlo betonové jednostranné průběžné délky 4 m výšky 1,2 m	M	48,000	208,000	160,000	5 181,24	248 699,52	0,00	828 998,40	1 077 697,92	828 998,40	333,33%
		SoD *24+24=48,000 [A]* *ZBV č. 38* *geodetický protokol Š II 39/2023* *km 13,764-13,888 vpravo 124 m* *km 13,895-13,979 vpravo 84 m* *124+84=208* *odpočet původního množství -48* *208-48=160,00*											
65	911381813	Odstranění silničního betonového svodidla délky 2 m výšky 1,0 m	M	24,000	24,000	0,000	2 302,78	55 266,72	0,00	0,00	55 266,72	0,00	0,00%
		Odstranění silničního betonového svodidla s naložením na dopravní prostředek délky 2 m, výšky 1,0 m											
		SoD *24 dle situace - bude nahrazeno novým beton. svodidlem=24,000 [A]*											
66	912211111	Montáž směrového sloupku silničního plastového prosté uložení bez betonového základu	KUS	66,240	66,240	0,000	276,33	18 304,10	0,00	0,00	18 304,10	0,00	0,00%
		Montáž směrového sloupku plastového s odrazkou prostým uložením bez betonového základu silničního											
		SoD *(2880/50)*1.15 km 11,700 - 14,580=66,240 [A]*											
68	912311111	Montáž odrazky na ocelové svodidlo	KUS	54,800	54,800	0,000	217,61	11 925,03	0,00	0,00	11 925,03	0,00	0,00%
		SoD *2740/50 délka svodidla dle pol. 911331135/odrazky po 50-ti metrech - jen na jedné straně silnice, na druhé straně budou směrové sloupky=54,800 [A]*											
70	912321111	Montáž odrazky na betonové svodidlo	KUS	4,000	0,000	-4,000	316,63	1 266,52	-1 266,52	0,00	0,00	-1 266,52	-100,00%
		ZBV č. 44 *odpočet množství skutečnost* *-4=-4,000 [A]*											
72	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	KUS	5,000	5,000	0,000	609,08	3 045,40	0,00	0,00	3 045,40	0,00	0,00%
		Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly											
		SoD *2+1+2 2 x Z4a 5 1 x IJ4c + B21a 5 B21b=5,000 [A]*											
76	914511111	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem	KUS	5,000	5,000	0,000	995,95	4 979,75	0,00	0,00	4 979,75	0,00	0,00%
		Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do betonového základu											
77	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou	KUS	7,000	6,000	-1,000	995,95	6 971,65	-995,95	0,00	5 975,70	-995,95	-14,29%
		ZBV č. 44 *odpočet množství skutečnost* *-1=-1,000 [A]*											
78	915111111	Vodorovné dopravní značení dělící čáry souvislé š 125 mm základní bílá barva	M	2 450,000	1 281,000	-1 169,000	13,24	32 438,00	-15 477,56	0,00	16 960,44	-15 477,56	-47,71%
		Vodorovné dopravní značení stříkané barvou dělící čára šířky 125 mm souvislá bílá základní											
		SoD *2450 V1a - dle situace=2 450,000 [A]*											
		ZBV č. 44 *odpočet množství skutečnost* *-1169=-1 169,000 [A]*											
79	915111115	Vodorovné dopravní značení dělící čáry souvislé š 125 mm základní žlutá barva	M	137,000	0,000	-137,000	19,57	2 681,09	-2 681,09	0,00	0,00	-2 681,09	-100,00%
		Vodorovné dopravní značení stříkané barvou dělící čára šířky 125 mm souvislá žlutá základní											
		SoD *35+38+64 V11a (0,125) - dle situace=137,000 [A]* *ZBV č. 44* *odpočet množství skutečnost* *-137,0=-137,00 [A]*											
80	915111121	Vodorovné dopravní značení dělící čáry přerušované š 125 mm základní bílá barva	M	1 050,000	1 050,000	0,000	11,51	12 085,50	0,00	0,00	12 085,50	0,00	0,00%
		Vodorovné dopravní značení stříkané barvou dělící čára šířky 125 mm přerušovaná bílá základní											
		SoD *550 V2a (3/6/0,125) - dle situace=550,000 [A]* *450 V2b (3/1,5/0,125) - dle situace=450,000 [B]* *50 V2b (1,5/1,5/0,12) - dle situace=50,000 [C]* *Celkem: 550+450+50=1 050,000 [D]*											

Změnový soupis prací SO 102 po změně 18 pro ZBV 44

Evidenční číslo a název stavby: II/102 hr. hl. města Prahy-Štěchovice, rekonstrukce. ETAPA II
Číslo a název SO/PS: SO 102 - Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice
Číslo a název rozpočtu: SO 102 - Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)
102
Celkem

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
81	915121111	Vodorovné dopravní značení vodící čáry souvislé š 250 mm základní bíllá barva	M	9 466,000	6 642,000	-2 824,000	23,03	218 001,98	-65 036,72	0,00	152 965,26	-65 036,72	-29,83%
		Vodorovné dopravní značení stříkané barvou vodící čára bílá šířky 250 mm souvislá základní											
		SoD *9466 V4 (0,25) - dle situace=9 466,000 [A]*											
		ZBV č. 44 *odpočet množství skutečnost* *-2824=-2824*											
82	915131111	Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly základní bílá barva	M2	116,750	109,750	-7,000	110,53	12 904,38	-773,71	0,00	12 130,67	-773,71	-6,00%
		Vodorovné dopravní značení stříkané barvou přechody pro chodce, šipky, symboly bílé základní											
		SoD *100 V13a - dle situace=100,000 [A]* *10*1.5 V9a - dle situace - 10 ks x plocha jedné šipky=15,000 [B]* *3.5*0.5 V5(0,5) - dle situace - STOP čára=1,750 [C]* *Celkem: 100+15+1.75=116,750 [D]* *ZBV č. 44* *odpočet množství skutečnost* *-7=-7*											
83	915131115	Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly základní žlutá barva	M2	18,000	0,000	-18,000	234,88	4 227,84	-4 227,84	0,00	0,00	-4 227,84	-100,00%
		Vodorovné dopravní značení stříkané barvou přechody pro chodce, šipky, symboly žluté základní											
		SoD *(3.0*1.0)*6 nápisy BUS - rozměry dle TZ x 6 kusů=18,000 [A]* *ZBV č. 44* *odpočet množství skutečnost* *-18=-18*											
84	915211112	Vodorovné dopravní značení dělící čáry souvislé š 125 mm retroreflexní bílý plast	M	2 450,000	2 450,000	0,000	39,15	95 917,50	0,00	0,00	95 917,50	0,00	0,00%
		Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem dělící čára šířky 125 mm souvislá bílá retroreflexní											
		SoD *2450 V1a - dle situace=2 450,000 [A]*											
85	915211116	Vodorovné dopravní značení dělící čáry souvislé š 125 mm retroreflexní žlutý plast	M	137,000	0,000	-137,000	55,27	7 571,99	-7 571,99	0,00	0,00	-7 571,99	-100,00%
		Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem dělící čára šířky 125 mm souvislá žlutá retroreflexní											
		SoD *35+38+64 V11a (0,125) - dle situace=137,000 [A]* *ZBV č. 44* *odpočet množství skutečnost* *-137=-137*											
86	915211122	Vodorovné dopravní značení dělící čáry přerušované š 125 mm retroreflexní bílý plast	M	1 050,000	1 050,000	0,000	39,15	41 107,50	0,00	0,00	41 107,50	0,00	0,00%
		Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem dělící čára šířky 125 mm přerušovaná bílá retroreflexní											
		SoD *550 V2a (3/6/0,125) - dle situace=550,000 [A]* *450 V2b (3/1,5/0,125) - dle situace=450,000 [B]* *50 V2b (1,5/1,5/0,12) - dle situace=50,000 [C]* *Celkem: 550+450+50=1 050,000 [D]*											
87	915221112	Vodorovné dopravní značení vodící čáry souvislé š 250 mm retroreflexní bílý plast	M	9 466,000	9 160,000	-306,000	78,29	741 093,14	-23 956,74	0,00	717 136,40	-23 956,74	-3,23%
		Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem vodící čára bílá šířky 250 mm souvislá retroreflexní											
		SoD *9466 V4 (0,25) - dle situace=9 466,000 [A]* *ZBV č. 44* *odpočet množství skutečnost* *-306=-306*											
88	915231112	Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly retroreflexní bílý plast	M2	116,750	116,750	0,000	385,71	45 031,64	0,00	0,00	45 031,64	0,00	0,00%
		Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem přechody pro chodce, šipky, symboly nápisy bílé retroreflexní											
		SoD *100 V13a - dle situace=100,000 [A]* *10*1.5 V9a - dle situace - 10 ks x plocha jedné šipky=15,000 [B]* *3.5*0.5 V5(0,5) - dle situace - STOP čára=1,750 [C]* *Celkem: 100+15+1.75=116,750 [D]*											

Změnový soupis prací SO 102 po změně 18 pro ZBV 44

Evidenční číslo a název stavby: II/102 hr. hl. města Prahy-Štěchovice, rekonstrukce. ETAPA II
Číslo a název SO/PS: SO 102 - Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice
Číslo a název rozpočtu: SO 102 - Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)
102
Celkem

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
89	915231116	Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly retroreflexní žlutý plast	M2	18,000	18,000	0,000	690,83	12 434,94	0,00	0,00	12 434,94	0,00	0,00%
		Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem přechody pro chodce, šipky, symboly nápisy žluté retroreflexní											
		SoD *(3.0*1.0)*6 nápisy BUS - rozměry dle TZ x 6 kusů=18,000 [A]*											
90	915611111	Předznačení vodorovného liniového značení	M	13 103,000	12 660,000	-443,000	2,88	37 736,64	-1 275,84	0,00	36 460,80	-1 275,84	-3,38%
		Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot liniové dělicí čáry, vodicí proužky											
		SoD *2450+137+1050+9466 dle pol. 915111111, 915111115, 915111121 13103 915121111=13 103,000 [A]* *ZBV č. 44* *odpočet množství skutečnost* *-443=-443*											
91	915621111	Předznačení vodorovného plošného značení	M2	134,750	134,750	0,000	6,91	931,12	0,00	0,00	931,12	0,00	0,00%
		Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot plošné šipky, symboly, nápisy											
		SoD *116.75+18 dle pol. 915131111 134.75 915131115=134,750 [A]*											
92	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	M	46,000	46,000	0,000	518,95	23 871,70	0,00	0,00	23 871,70	0,00	0,00%
		Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z betonu prostého téže značky											
		SoD *29+17 dle situace=46,000 [A]*											
94	919122122	Těsnění spár zálivkou za tepla pro komůrky š 15 mm hl 30 mm s těsnicím profilem	M	696,000	46,000	-650,000	116,82	81 306,72	-75 933,00	0,00	5 373,72	-75 933,00	-93,39%
		Utěsnění dilatačních spár zálivkou za tepla v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezního nátěru s těsnicím profilem pod zálivkou, pro komůrky šířky 15 mm, hloubky 30 mm											
		SoD *1300*0.5 v odvodňovacím proužku v místě nové opěrné zdi=650,000 [A]* *46 podél obrubníku=46,000 [B]* *Celkem: 650+46=696,000 [C]* *ZBV ZBV č. 12* *odpočet dle SOD - proužek nahrazen konstrukčními vrstvami přilehlé vozovkyč. 12 odpočet -650*											
95	919131210R	Kotvení na povrchu z betonářské výztuže dl. do 3m	KUS	227,500	227,500	0,000	4 029,86	916 793,15	0,00	0,00	916 793,15	0,00	0,00%
		Vyztužení dilatačních spár v cementobetonovém krytu kotvami průměru 16 mm, délky 1 200 mm											
		SoD *910/1.0/4 kotvy po jednom metru, potřebná délka cca 600mm, tzn. jedna výztuž dl.3,0m rozdělená na čtvrtiny=227,500 [A]*											
96	919521140	Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo ŽB DN 600	M	13,000	13,000	0,000	3 333,04	43 329,52	0,00	0,00	43 329,52	0,00	0,00%
		Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo železobetonových DN 600 mm											
		SoD *13 v km 13,89=13,000 [A]*											
98	919521180	Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo ŽB DN 1000	M	20,000	20,000	0,000	5 724,70	114 494,00	0,00	0,00	114 494,00	0,00	0,00%
		Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo železobetonových DN 1000 mm											
		SoD *20 v km 12,925=20,000 [A]*											
100	919535558	Obetonování trubního propustku betonem prostým tř. C 20/25	M3	29,680	29,680	0,000	4 081,06	121 125,86	0,00	0,00	121 125,86	0,00	0,00%
		Obetonování trubního propustku betonem prostým bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25											
		SoD *(13*0.50)+(19*1.22) délka x plocha obetonování v řezu =29,680 [A]*											
101	919716111	Výztuž cementobetonového krytu ze svařovaných sítí KARI hmotnosti do 7,5 kg/m2	T	0,077	0,077	0,000	32 954,10	2 537,47	0,00	0,00	2 537,47	0,00	0,00%
		Ocelová výztuž cementobetonového krytu ze svařovaných sítí KARI hmotnosti do 7,5 kg/m2											
		SoD *((1.7*3.0)*7.5*2)*0.001 vyztužení betonového lože dle v.č. 5=0,077 [A]*											
102	919721101	Geomříž pro stabilizaci podkladu tkaná z PP podélná pevnost v tahu do 50 kN/m	M2	3 185,000	3 185,000	0,000	176,12	560 942,20	0,00	0,00	560 942,20	0,00	0,00%
		Geomříž pro stabilizaci podkladu tkaná z polyesteru, podélná pevnost v tahu do 50 kN/m											
		SoD *910*3.5 délka x šířka - úprava svahu typu B2=3 185,000 [A]*											

Změnový soupis prací SO 102 po změně 18 pro ZBV 44

Evidenční číslo a název stavby: II/102 hr. hl. města Prahy-Štěchovice, rekonstrukce. ETAPA II
Číslo a název SO/PS: SO 102 - Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice
Číslo a název rozpočtu: SO 102 - Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)
102
Celkem

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
103	919721202	Geomříž pro vyztužení asfaltového povrchu z PP s geotextilií	M2	40 698,000	40 698,000	0,000	102,22	4 160 149,56	0,00	0,00	4 160 149,56	0,00	0,00%
		Geomříž pro vyztužení asfaltového povrchu z polypropylénu s geotextilií											
		SoD *11027 bouraná vozovka v celé tloušťce =11 027,000 [A]* *13995+5501+8015+2160 frézování v různých tloušťkách=29 671,000 [B]* *Celkem: 11027+29671=40 698,000 [C]*											
104	919732221	Styčná spára napojení nového živičného povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm bez prořezání	M	4 826,200	5 068,200	242,000	116,82	563 796,68	0,00	28 270,44	592 067,12	28 270,44	5,01%
		Styčná pracovní spára při napojení nového živičného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm bez prořezání spáry											
		SoD *(55+8) řezání v napojeních na vedl.ulice + na ZÚ 63 na KÚ - při napojování vrstev=63,000 [A]* *4580 podélná spára=4 580,000 [B]* *(4580/200)*8.0 příčné spáry - předpoklad stavebních úseků po 200 m=183,200 [C]* *Celkem: 63+4580+183.2=4 826,200 [D]* *ZBV ZBV č. 10* *33,0 + 2*0,5 dle zaměření km 10,250 - 10,283 =34,000 [A]* *ZBV č. 38* *nové betonové svodidlo 208*											
105	919735113	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 150 mm	M	5 585,200	4 935,200	-650,000	130,38	728 198,38	-84 747,00	0,00	643 451,38	-84 747,00	-11,64%
		Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm											
		SoD *(55+8)*2 řezání v napojeních na vedl.ulice + na ZÚ 126 na KÚ - při frézování 126 při napojování vrstev=126,000 [A]* *46 podél obrubníku=46,000 [B]* *4580 podélná spára=4 580,000 [C]* *(4580/200)*8.0 příčné spáry - předpoklad stavebních úseků po 200 m=183,200 [D]* *650 v odvodňovacím proužku v místě nové opěrné zdi=650,000 [E]* *Celkem: 126+46+4580+183.2+650=5 585,200 [F]* *ZBV č. 12* *odpočet -650*											
106	938902113	Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosu do 0,5 m3/m	M	2 290,000	2 290,000	0,000	95,49	218 672,10	0,00	0,00	218 672,10	0,00	0,00%
		Profilace a čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem s odstraněním travnatého porostu nebo nánosu, s úpravou dna a svahů do předepsaného profilu a s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m nezpevněných nebo zpevněných objemu nánosu přes 0,30 do 0,50 m3/m											
		SoD *4580/2 odhad půlka trasy=2 290,000 [A]*											
107	938902462	Čištění propustků ručně D do 1000 mm při tl nánosu do 50% DN	M	32,000	32,000	0,000	481,28	15 400,96	0,00	0,00	15 400,96	0,00	0,00%
		Čištění propustků s odstraněním travnatého porostu nebo nánosu, s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m ručně tloušťky nánosu přes 25 do 50% průměru propustku přes 500 do 1000 mm											
		SoD *8 propust v km 12,068 - větší délka než 8 m musí být v příplatku - dle pol. 938902499=8,000 [A]* *8 propust v km 11,917 - větší délka než 8 m musí být v příplatku - dle pol. 938902499=8,000 [B]* *2*8 čištění přípojek v km 11,612 8 11,262 u výměny UV=16,000 [C]* *Celkem: 8+8+16=32,000 [D]*											
108	938902499	Příplatek k čištění propustků delších než 8 m za každý další 1 m délky	M	16,000	16,000	0,000	96,26	1 540,16	0,00	0,00	1 540,16	0,00	0,00%
		Čištění propustků s odstraněním travnatého porostu nebo nánosu, s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m Příplatek k cenám za délku propustku přes 8 m za každý další 1 m											
		SoD *(19-8)+(13-8) =16,000 [A]*											

Změnový soupis prací SO 102 po změně 18 pro ZBV 44

Evidenční číslo a název stavby: II/102 hr. hl. města Prahy-Štěchovice, rekonstrukce. ETAPA II
Číslo a název SO/PS: SO 102 - Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice
Číslo a název rozpočtu: SO 102 - Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)
102
Celkem

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
109	938902500R	Čištění stávajících uličních vpustí	KUS	43,000	43,000	0,000	2 562,99	110 208,57	0,00	0,00	110 208,57	0,00	0,00%
		SoD *7*2 7 kusů dvojitých horských vpustí dle situace=14,000 [A]* *29 UV dle situace=29,000 [B]* *Celkem: 14+29=43,000 [C]*											
110	938909331	Čištění vozovek metením ručně podkladu nebo krytu betonového nebo živičného	M2	29 671,000	29 731,300	60,300	3,65	108 299,15	0,00	220,09	108 519,24	220,09	0,20%
		Čištění vozovek metením bláta, prachu nebo hlinitého nánosu s odklizením na hromady na vzdálenost do 20 m nebo naložením na dopravní prostředek ručně povrchu podkladu nebo krytu betonového nebo živičného											
		SoD *13995+(5501+8015)+2160 po frézování asf. krytu 29671 CB konstrukce=29 671,000 [A]* *ZBV ZBV č. 10* *60,3 dle zaměření =60,300 [A]*											
111	938909612	Odstranění nánosu na krajnicích tl do 200 mm	M2	4 580,000	4 580,000	0,000	376,22	1 723 087,60	0,00	0,00	1 723 087,60	0,00	0,00%
		Čištění krajnic odstraněním nánosu (ulehlého, popř. zaježděného) naneseného vlivem silničního provozu, s přemístěním na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ale bez složení průměrné tloušťky přes 100 do 200 mm											
		SoD *4580*0.5*2=4 580,000 [A]*											
112	966005311	Rozebrání a odstranění silničního svodidla s jednou pásnicí	M	2 444,000	4 393,000	1 949,000	291,03	711 277,32	0,00	567 217,47	1 278 494,79	567 217,47	79,75%
		Rozebrání a odstranění silničního zábradlí a ocelových svodidel s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 10 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásypem jam po odstraněných sloupcích a s jeho zhutněním svodidla včetně sloupků, s jednou pásnicí silničního											
		SoD *2374 VLEVO=2 374,000 [A]* *70 vpravo v km 14,3 u benzinky=70,000 [B]* *Celkem: 2374+70=2 444,000 [C]* *ZBV č. 15* *dle geodetického protokolu č. Š II 3/2022* *km 13,196-13,596 400=400,000 [A]* *ZBV. Č. 43* *geodetický protokol Š II 35/2023* *vlevo celkem 3233=3 233,000 [A]* *vpravo celkem 760=760,000 [B]* *odpočet původního množství -2444=-2 444,000 [C]* *A+B+C=1 549,000 [D]*											
113	966006132	Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami	KUS	10,000	0,000	-10,000	1 727,08	17 270,80	-17 270,80	0,00	0,00	-17 270,80	-100,00%
		Odstranění dopravních nebo orientačních značek se sloupkem s uložením hmot na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásypem jam a jeho zhutněním s betonovou patkou											
		SoD *2 dle situace vč. sloupků=2,000 [A]* *6+2 odstranění stáv. značek s ponecháním na místě - nově zabudovat do římsy dle SO 253=8,000 [B]* *Celkem: 2+8=10,000 [C]* *ZBV č. 44* *odpočet množství skutečnost* *-10=-10*											
114	966006211	Odstranění svislých dopravních značek ze sloupů, sloupků nebo konzol	KUS	2,000	0,000	-2,000	103,62	207,24	-207,24	0,00	0,00	-207,24	-100,00%
		Odstranění (demontáž) svislých dopravních značek s odklizením materiálu na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ze sloupů, sloupků nebo konzol											
		ZBV č. 44 *odpočet množství skutečnost* *-2=-2*											
115	966008113	Bourání trubního propustku do DN 800	M	13,000	13,000	0,000	1 135,27	14 758,51	0,00	0,00	14 758,51	0,00	0,00%
		Bourání trubního propustku s odklizením a uložením vybouraného materiálu na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z trub DN přes 500 do 800 mm											
		13 v km 13,890 výměna trubního propustku DN 600=13,000 [A]											
116	966008116R	Bourání trubního propustku do DN 1200	M	15,000	15,000	0,000	1 892,11	28 381,65	0,00	0,00	28 381,65	0,00	0,00%
		Bourání trubního propustku s odklizením a uložením vybouraného materiálu na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z trub DN přes 800 do 1200 mm											
		15 km 12,925 vpravo - bourání kamenného propustku se ŽB deskou vč.zemních prací, bude nahrazen trubním prop. DN 1000 se šikmými čely=15,000 [A]											

Změnový soupis prací SO 102 po změně 18 pro ZBV 44

Evidenční číslo a název stavby: II/102 hr. hl. města Prahy-Štěchovice, rekonstrukce. ETAPA II
Číslo a název SO/PS: SO 102 - Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice
Číslo a název rozpočtu: SO 102 - Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)
102
Celkem

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
117	977141132	Vrty pro kotvy do betonu průměru 32 mm hloubky 220 mm s vyplněním epoxidovým tmelem	KUS	7,000	7,000	0,000	287,85	2 014,95	0,00	0,00	2 014,95	0,00	0,00%
		Vrty pro kotvy do betonu s vyplněním epoxidovým tmelem, průměru 32 mm, hloubky 220 mm											
118	979071121	Očištění dlažebních kostek drobných s původním spárováním kamenivem těženým	M2	10,000	110,900	100,900	84,40	844,00	0,00	8 515,96	9 359,96	8 515,96	1009,00%
		Očištění vybouraných dlažebních kostek od spojovacího materiálu, s uložením očištěných kostek na skládku, s odklizením odpadových hmot na hromady a s odklizením vybouraných kostek na vzdálenost do 3 m drobných, s původním vyplněním spár kamenivem těženým											
		SoD *10 dlažba z chodníku na ZÚ=10,000 [A]* *ZBV č. 15* *dle geodetického protokolu č. Š II 3/2022* *km 13,2-13,7 100,9=100,900 [A]*											
	997	**Přesun sutě**											
119	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	T	3 197,830	4 039,152	841,322	13,82	44 194,01	0,00	11 627,07	55 821,08	11 627,07	26,31%
		Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km											
		SoD *3197.83=3 197,830 [A]* *ZBV ZBV č. 27* *geodetický protokol Š II 51/2022 92,2 m2=92,200 [A]* *geodetický protokol Š II 58/2022 183,8 m2 =183,800 [B]* *dle pol. č. 153 výměna podloží 60% z celkového množství 276 m2, tl. 20-30 cm* *(276*0,6)*0,25*2=82,8 [C]* *(A+B)*0,22*2,0+82,8=204,24 [D]* *ZBV č. 38* *dle pol. č. 113107223 a 132151101* *325,5*(0,25+0,3)/2*1,9+0,9*1,9=171,784* *ZBV č. 41* *(574,1*0,04+327,1*0,05+2818,2*0,1-675,1*0,2)*2,5=465,298 [A]*											
120	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	T	2 494,356	2 494,356	0,000	13,82	34 472,00	0,00	0,00	34 472,00	0,00	0,00%
		Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km											
		SoD *741.96+4.128+0.688+593.42+1154.16=2 494,356 [A]*											

Změnový soupis prací SO 102 po změně 18 pro ZBV 44

Evidenční číslo a název stavby: II/102 hr. hl. města Prahy-Štěchovice, rekonstrukce. ETAPA II
Číslo a název SO/PS: SO 102 - Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice
Číslo a název rozpočtu: SO 102 - Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)
102
Celkem

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
121	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	T	79 690,604	91 469,112	11 778,508	7,03	560 224,95	0,00	82 802,91	643 027,86	82 802,91	14,78%
		Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km											
		SoD *(3197.83+2494.356)*14 celková vzdálenost odvozu 15 km =79 690,604 [A]* *ZBV ZBV č. 27* *dle pol. č. 997221551* *204,24*14=2859,36 [A]* *ZBV č. 38* *dle pol. č. 997221551* *171,784*14=2404,976* *ZBV č. 41* *dle pol .č. 997221551* *465,298*14=6 514,172 [A]*											
122	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	T	11 138,845	11 239,165	100,320	27,06	301 417,15	0,00	2 714,66	304 131,81	2 714,66	0,90%
		Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km											
		SoD *2646.48+1441.485+1411.456+5639.424=11 138,845 [A]* *ZBV č. 38* *svodidlo (36+48+48)*0,76=100,32*											
123	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	T	155 943,830	156 837,590	893,760	0,58	90 447,42	0,00	518,38	90 965,80	518,38	0,57%
		Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km											
		SoD *11138.845*14 celkem vzdálenost skládky 15 km - odhad=155 943,830 [A]* *ZBV č. 38* *dle pol. č. 997221561* *63,84*14=893,76*											
124	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	T	310,867	6 931,006	6 620,139	51,81	16 106,02	0,00	342 989,40	359 095,42	342 989,40	2129,57%
		Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km											
		11.75+15.6+18.04+21.072+170.268+0.172+26.715+45.9 +1.35=310,867 [A] *ZBV č. 13* *dle pol. 114203103 297,85*2,6=774,410 [A]* *ZBV č. 15* *žlab 69,4*0,134=9,300 [A]* *podkla. beton (69,4+100,9)*0,24=40,872 [B]* *svodidlo 400*0,042=16,800 [C]* *A+B+C=66,972 [D]* *ZBV ZBV č. 27* *geodetický protokol Š II 51/2022 92,2 m2=92,200 [A]* *geodetický protokol Š II 58/2022 183,8 m2 =183,800 [B]* *(A+B)*0,15*2,3=95,220 [C]* *ZBV č. 39* *dle pol. 114203102 1562,26*2,6=4061,876 [A]* *ZBV č. 41* *(8843,28*0,04 8296,4*0,05+14097,1*0,1)*2,3=1 608,549[A]*											

Změnový soupis prací SO 102 po změně 18 pro ZBV 44

Evidenční číslo a název stavby: II/102 hr. hl. města Prahy-Štěchovice, rekonstrukce. ETAPA II
Číslo a název SO/PS: SO 102 - Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice
Číslo a název rozpočtu: SO 102 - Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)
102
Celkem

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		ZBV č. 42 *odbourání původní zdi propustku* *geodetický protokol Š II 18/2023* *vpravo 3,26=3,260 [A]* *vlevo 2,70=2,700 [B]* *(A+B)*2,2=13,112 [C]*											
125	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	T	4 352,138	97 033,776	92 681,638	5,76	25 068,31	0,00	533 846,23	558 914,54	533 846,23	2129,57%
		Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km											
		SoD *310.867*14 celkem vzdálenost skládky 15 km - odhad=4 352,138 [A]* *ZBV č. 13* *do vzdálenosti 15 km* *dle pol. 114203103 297,85*2,6*14=10 841,740 [A]* *ZBV č. 15* *do vzdálenosti 15 km* *dle pol č. 997221571* *66,972*14=937,608 [A]* *ZBV ZBV č. 27* *dle pol. č. 997221571* *95,22*14=1 333,080 [A]* *ZBV č. 39* *dlle pol. č. 997221571* *4061,876*14=56866,264 [A]* *ZBV č. 41* *dle pol. č. 997221571* *1608,527*14=22 519,378 [A]*											
		ZBV č. 42 *dle pol. č. 997221571* *13,112*14=183,568 [A]*											
126	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	T	10 352,419	10 574,763	222,344	34,54	357 572,55	0,00	7 679,76	365 252,31	7 679,76	2,15%
		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) betonového											
		SoD *310.867-170.268 dle pol. 997221571 - odečet ocelového svodidla dle pol. 966005311=140,599 [A]* *10211.82 dle pol. 997221561=10 211,820 [B]* *Celkem: 140.599+10211.82=10 352,419 [C]* *ZBV č. 15* *dle pol č. 997221571* *50,172=50,172 [A]* *ZBV ZBV č. 27* *dle pol. č. 9777221571* *95,22=95,220 [A]* *ZBV č. 38* *svodidlo (36+48)*0,76=63,84* *ZBV č. 42* *dle pol. č. 997221571* *13,112=13,112 [A]*											

Změnový soupis prací SO 102 po změně 18 pro ZBV 44

Evidenční číslo a název stavby: II/102 hr. hl. města Prahy-Štěchovice, rekonstrukce. ETAPA II
Číslo a název SO/PS: SO 102 - Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice
Číslo a název rozpočtu: SO 102 - Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)
102
Celkem

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
127	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	T	3 197,830	4 348,264	1 150,43	34,54	110 453,05	0,00	39 735,99	150 189,04	39 735,99	100,00%
		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z kameniva											
		SoD *3197.83 dle pol. 997221551=3 197,830 [A]* *ZBV č. 13* *dle pol. 114203103 297,85*2,6=774,410 [A]* *ZBV ZBV č. 27* *dle pol. č. 997221551* *204,24=204,24 [A]* *ZBV č. 38* *dle pol. č. 997111551* *171,784=171,784*											
	998	**Přesun hmot**											
128	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	T	5 047,476	5 824,017	776,54	147,76	745 815,05	0,00	114 741,70	860 556,75	114 741,70	100,00%
		Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu											
		ZBV č. 13 *dle pol. 594511111 851,2*0,614=522,637 [A]* *ZBV č. 15* *dle geodetického protokolu č. Š II 3/2022* *km 13,2-13,7* *žlaby 69,4*0,134=9,300 [A]* *ZBV č. 38* *svodidlo160*0,76=121,6* *dlažba 15*0,101=1,515* *palisáda 75*0,6702=50,265* *celkem 121,60+1,515+50,265=173,38* *ZBV č. 42* *dle pol. 594511111 25,10*0,614=15,411 [A]* *ZBV č. 43* *dle pol. 594511111 90,90*0,614=55,813 [A]*											
129	998225194	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živičným, betonovým do 5000 m	T	5 047,476	5 824,017	776,54	29,55	149 152,92	0,00	22 946,79	172 099,71	22 946,79	100,00%
		Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 5000 m											
		ZBV č. 13 dle pol. 998225111 851,2*0,614=522,637 [A] ZBV č. 15 dle geodetického protokolu č. Š II 3/2022 km 13,2-13,7 žlaby 69,4*0,134=9,300 [A] ZBV č. 38 dle pol. č. 998225111 173,38=173,38 ZBV č. 42 dle pol. 594511111 25,10*0,614=15,411 [A] ZBV č. 43 dle pol. 594511111 90,90*0,614=55,813 [A]											

Změnový soupis prací SO 102 po změně 18 pro ZBV 44

Evidenční číslo a název stavby: II/102 hr. hl. města Prahy-Štěchovice, rekonstrukce. ETAPA II
Číslo a název SO/PS: SO 102 - Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice
Číslo a název rozpočtu: SO 102 - Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)
102
Celkem

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		NOVÉ POLOŽKY											
130	12002000	Geodetické práce - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ	KČ	0,000	79 895,82	79 895,817	1,00	0,00	0,00	79 895,82	79 895,82	79 895,82	100,00%
		Cena položky dle kompletní položky z SO 000, tj. 0,5 % z hodnoty prací											
		"ZBV ZBV č. 10 217,26=217,260 [A] ZBV ZBV č. 13 19214,04=19 214,040 [A]" ZBV č. 15 3566,36=3566,36 ZBV č. 20 1048,17=1048,17 ZBV č. 27 2188,111=2188,111 ZBV č. 38 7717,175=7717,175 ZBV č. 39 26 386,609=26 386,609 ZBV č. 42 15 309,005=15 309,005 ZBV č. 43											
131	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm	M	0,000	34,000	34,00	81,10	0,00	0,00	2 757,40	2 757,40	2 757,40	100,00%
		Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm											
		ZBV ZBV č. 10 *33,0 + 2*0,5 dle zaměření km 10,250 - 10,283 =34,000 [A]*											
132	111301111	SEJMUTÍ DRNU	M2	0,000	5 400,600	5 400,600	44,17	0,00	0,00	238 544,50	238 544,50	238 544,50	100,00%
		Cena položky dle SoD SO 901 pol. 11											
		ZBV č. 13 Nánosy na stávajícícm svahu, dle zaměření 937 m2=937,000 [A] ZBV č. 39 geodetické protokoly Š II 33/2021 km 13,150-13,190 vlevo 89,90=89,900 [A] Š II 10/2022 km 10,140-10,250 vlevo 191,10=191,100 [B] Š II 12/2022 km 10,001-10,101 vlevo 112,90=112,900 [C] Š II 16/2022 km 10,103-10,140 vlevo 63,0+55,20-77=41,200 [D] Š II 27/2022 km 11,430-11,520 vlevo 191,60=191,600 [E] Š II 35/2022 km 11,220-11,430 vlevo 67,90+268,30=336,200 [F] Š II 43/2022 km 11,520-11663 vlevo 303,20=303,200 [G] Š II 45/2022 km 11,140-11,220 vlevo 187,80=187,800 [H] Š II 47/2022 km 11,671-11,780 vlevo 215,0=215,000 [I] Š II 53/2022 km 14,462-14,580 vlevo 249,30=249,300 [J] Š II 62/2022 km 11,056-11,140 vlevo 214,20=214,200 [K] Š II 65/2022 km 11,340-11,400 vlevo 47,0+160,30=207,300 [L] Š II 1/2023 km 10,840-10947 vlevo 188,7 =188,7 [V] Š II 4/2023 km 10,947-11,031 vlevo 165,60=165,600 [M] Š II 7/2023 km 11,976-12,440 vlevo 805,30=805,300 [N] Š II 8/2023 km 11,780-11,971 vlevo 231,10+1,70=232,800 [O] Š II 11/2023 km 14,410-14,460 vlevo 75,40+21,50=96,900 [P] Š II 13/2023 km 14,425 vlevo 22,40=22,400 [Q] Š II 16/2023 km 11,928-12,060 vpravo 279,50=279,500 [R] Š II 27/2023 km 11,733-11,832 vpravo 332,70=332,700 [S] celkem A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q+R+S+V=4463,60 [T]											

Změnový soupis prací SO 102 po změně 18 pro ZBV 44

Evidenční číslo a název stavby: II/102 hr. hl. města Prahy-Štěchovice, rekonstrukce. ETAPA II
Číslo a název SO/PS: SO 102 - Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice
Číslo a název rozpočtu: SO 102 - Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)
102
Celkem

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
133	114203102	Rozebrání dlažeb z lomového kamene nebo betonových tvárnic nasucho se zalitými spárami cementovou maltou	M3	0,000	1 860,110	1 860,110	763,00	0,00	0,00	1 419 263,94	1 419 263,94	1 419 263,94	100,00%
		Cena položky dle ÚRS 2021 02											
		ZBV č. 13 851*0,35=297,850 [A]											
		ZBV č. 39 geodetické protokoly Š II 33/2021 km 13,150-13,190 vlevo 89,90=89,900 [A] Š II 10/2022 km 10,140-10,250 vlevo 191,10=191,100 [B] Š II 12/2022 km 10,001-10,101 vlevo 112,90=112,900 [C] Š II 16/2022 km 10,103-10,140 vlevo 63,0+55,20-77=41,200 [D] Š II 27/2022 km 11,430-11,520 vlevo 191,60=191,600 [E] Š II 35/2022 km 11,220-11,430 vlevo 67,90+268,30=336,200 [F] Š II 43/2022 km 11,520-11663 vlevo 303,20=303,200 [G] Š II 45/2022 km 11,140-11,220 vlevo 187,80=187,800 [H] Š II 47/2022 km 11,671-11,780 vlevo 215,0=215,000 [I] Š II 53/2022 km 14,462-14,580 vlevo 249,30=249,300 [J] Š II 62/2022 km 11,056-11,140 vlevo 214,20=214,200 [K] Š II 65/2022 km 11,340-11,400 vlevo 47,0+160,30=207,300 [L] Š II 1/2023 km 10,840-10947 vlevo 188,7 =188,7 [V] Š II 4/2023 km 10,947-11,031 vlevo 165,60=165,600 [M] Š II 7/2023 km 11,976-12,440 vlevo 805,30=805,300 [N] Š II 8/2023 km 11,780-11,971 vlevo 231,10+1,70=232,800 [O] Š II 11/2023 km 14,410-14,460 vlevo 75,40+21,50=96,900 [P] Š II 13/2023 km 14,425 vlevo 22,40=22,400 [Q] Š II 16/2023 km 11,928-12,060 vpravo 279,50=279,500 [R] Š II 27/2023 km 11,733-11,832 vpravo 332,70=332,700 [S] celkem A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q+R+S+V=4463,60 [T] 4463,60*0,35=1 562,26[W]											
134	153311212	Zřízení armování svahů, násypů a opěrných stěn vrstvou z geomříže tuhé sklonu přes 1:2 do 1:1	M2	0,000	936,000	936,000	74,90	0,00	0,00	70 106,40	70 106,40	70 106,40	100,00%
		Cena položky dle ÚRS 2021 02											
		ZBV č. 13 Požadavek Povodí Vltavy z 6.4.2021 vyztužení svahu v km 10,381 - 10,420 vlevo vyztužení svahu 6 vrstvami geomříže prům. šířky 3,5 m + 0,5 přesah na zajištění v úseku svahu délky 39 m 6*(3,5+0,5)*39=936,000 [A]											
135	271922211	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z recyklátu betonového	M3	0,000	637,000	637,000	964,00	0,00	0,00	614 068,00	614 068,00	614 068,00	100,00%
		Cena položky dle ÚRS 2020 01											
		položka zahrnuje dodávku betonového recyklátu, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak											
		ZBV č. 13 dle geodetického zaměření km 10,360 - 10,380 24 m3=24,000 [A] km 10,380 - 10,420 190,7 m3 - úprava s geomříží =190,700 [B] km 10,420 - 10,465 45 m3=45,000 [C] km 10,465 - 10,475 11,9 m3=11,900 [D] km 10,476 - 10,485 9,2 m3=9,200 [E] km 10,485 - 10,575 126,3 m3=126,300 [F] km 10,575 - 10,650 68,2 m3=68,200 [G] km 10,706 - 10,840 161,7 m3=161,700 [H] A+B+C+D+E+F+G+H=637,000 [I]											
136	452313141R	ZÁKLADY Z PROST BETONU C 16/20 včetně bednění	M3	0,000	91,875	91,875	3 200,00	0,00	0,00	294 000,00	294 000,00	294 000,00	100,00%
		Cena položky převzata z SOD SO 341 pol. 6											
		ZBV č. 13 Betonové patky v patě svahu km 10,360 - 10,381 21*0,5*0,5/2 m3=2,625 [A] km 10,381 - 10,420 39*1,5*1,5/2 m3=43,875 [B] km 10,420 - 10,475 55*0,5*0,5/2 m3 =6,875 [C] km 10,476 - 10,650 174*0,5*0,5/2 m3=21,750 [D] km 10,706 - 10,840 134*0,5*0,5/2 m2=16,750 [F] A+B+C+D+F=91,875 [G]											

Změnový soupis prací SO 102 po změně 18 pro ZBV 44

Evidenční číslo a název stavby: II/102 hr. hl. města Prahy-Štěchovice, rekonstrukce. ETAPA II
Číslo a název SO/PS: SO 102 - Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice
Číslo a název rozpočtu: SO 102 - Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)
102
Celkem

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
137	636195111R	Vyplnění spár cementovou maltou dosavadní dlažby z lomového kamene melioračních kanálů	M2	0,000	5 405,700	5 405,700	357,00	0,00	0,00	1 929 834,90	1 929 834,90	1 929 834,90	100,00%
		Cena položky dle ÚRS 2021 02											
		ZBV č. 13 Požadavek Povodí Vltavy na vyplnění spár odláždění cementovou maltou dle geodetického zaměření km 10,360 - 10,422 111,9 m2=111,900 [A] km 10,422 - 10,454 48,7 m2=48,700 [B] km 10,455 - 10,476 44,9 m2 =44,900 [C] km 10,480 - 10,654 369,6 m2=369,600 [D] km 10,706 - 10,730 41,4 m2=41,400 [E] km 10,730 - 10,840 234,7 m2=234,700 [F] A+B+C+D+E+F=851,200 [G]											
		ZBV č. 39 geodetické protokoly Š II 33/2021 km 13,150-13,190 vlevo 89,90=89,900 [A] Š II 10/2022 km 10,140-10,250 vlevo 191,10=191,100 [B] Š II 12/2022 km 10,001-10,101 vlevo 112,90=112,900 [C] Š II 16/2022 km 10,103-10,140 vlevo 63,0+55,20-77=41,200 [D] Š II 27/2022 km 11,430-11,520 vlevo 191,60=191,600 [E] Š II 35/2022 km 11,220-11,430 vlevo 67,90+268,30=336,200 [F] Š II 43/2022 km 11,520-11663 vlevo 303,20=303,200 [G] Š II 45/2022 km 11,140-11,220 vlevo 187,80=187,800 [H] Š II 47/2022 km 11,671-11,780 vlevo 215,0=215,000 [I] Š II 53/2022 km 14,462-14,580 vlevo 249,30=249,300 [J] Š II 62/2022 km 11,056-11,140 vlevo 214,20=214,200 [K] Š II 65/2022 km 11,340-11,400 vlevo 47,0+160,30=207,300 [L] Š II 1/2023 km 10,840-10947 vlevo 188,7 =188,700 [T] Š II 4/2023 km 10,947-11,031 vlevo 165,6=165,600 [M]] Š II 7/2023 km 11,976-12,440 vlevo 805,3=805,300 [N]] Š II 8/2023 km 11,780-11,971 vlevo 231,10+1,7=232,800 [O]] Š II 11/2023 km 14,410-14,460 vlevo 75,40+21,5=96,900 [P]] Š II 13/2023 km 14,425 vlevo 22,4=22,400 [Q]] Š II 16/2023 km 11,928-12,060 vpravo 279,5=279,500 [R]] Š II 27/2023 km 11,733-11,832 vpravo 332,7=332,700 [S]] celkem A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q+R+S+T=4 463,600 [U] ZBV č. 43 dle pol. č.594511111 90,9=90,900 [A]											
138	69321023	Geomříž jednoosá HDPE s tahovou pevností 90kN/m	M2	0,000	1 076,400	1 076,400	144,00	0,00	0,00	155 001,60	155 001,60	155 001,60	100,00%
		Cena položky dle ÚRS 2021 02											
		ZBV č. 13 Požadavek Povodí Vltavy z 6.4.2021 a vyjádření AD č. 28 vyztužení svahu v km 10,381 - 10,420 vlevo 6 vrstev prům. šířky 3,5 m + přesah do čela svahu 0,5 m , ztratné 15% 6*(3,5+0,5)*39*1,15=1 076,400 [A]											
139	113107170	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2do 200 m2 z betonu prostého tl. 100mm	M2	0,000	170,300	170,300	149,00	0,00	0,00	25 374,70	25 374,70	25 374,70	100,00%
		Cena položky dle ÚRS 2021 02											
		ZBV č. 15 dle geodetického protokolu č. Š II 3/2022 km 13,2-13,7 žlaby 69,4=69,400 [A] žulové kostky 100,9=100,900 [B] A+B=170,300 [C]											

Změnový soupis prací SO 102 po změně 18 pro ZBV 44

Evidenční číslo a název stavby: II/102 hr. hl. města Prahy-Štěchovice, rekonstrukce. ETAPA II
Číslo a název SO/PS: SO 102 - Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice
Číslo a název rozpočtu: SO 102 - Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)
102
Celkem

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
140	451319777	Podklad nebo lože pod dlažbu příplatek k cenám za každých dalších i započatých 100 mm podkladu nebo lože z betonu prostého	M2	0,000	115,900	115,900	30,40	0,00	0,00	3 523,36	3 523,36	3 523,36	100,00%
		Cena položky dle ÚRS 2021 02											
		ZBV č. 15 dle geodetického protokolu č. Š II 3/2022 km 13,2-13,7 žulové kostky 100,9=100,900 [A] ZBV č. 38 okolo HV 7,5*2=15											
141	591141111	Kladení dlažby z kostek velkých z kamene, do lože z cementové malty s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici	M2	0,000	115,900	115,900	608,00	0,00	0,00	70 467,20	70 467,20	70 467,20	100,00%
		Cena položky dle ÚRS 2021 02											
		ZBV č. 15 dle geodetického protokolu č. Š II 3/2022 krajnice ze žulových kostek km 13,2-13,7 100,9=100,900 [A] ZBV č. 38 okolo HV 7,5*2=15											
142	59227029	Žlabovka příkopová betonová 500x680x60	M	0,000	76,340	76,340	415,00	0,00	0,00	31 681,10	31 681,10	31 681,10	100,00%
		Cena položky dle ÚRS 2021 02											
		položka zahrnuje dodávku betonového recyklátu, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak											
		ZBV č. 15 dle geodetického protokolu č. Š II 3/2022 km 13,2-13,7 64,9 m+ 10% ztratné žlaby 69,4*1,1=76,340 [A]											
143	911331123	Silniční svodidlo s osazením sloupků zaberaněním ocelové úroveň zádržnosti N2 vzdálenosti sloupků přes 2 do 4 m jednostranné	M	0,000	400,000	400,000	1 450,00	0,00	0,00	580 000,00	580 000,00	580 000,00	100,00%
		Cena položky dle ÚRS 2021 02											
		ZBV č. 15 dle geodetického protokolu č. Š II 3/2022 km 13,196-13,596 400=400,000 [A]											
144	935112211	Osazení betonového příkopového žlabu z betonových příkopových tvárnic šířky přes 500 do800 mm do lože z betonu tl. 100 mm	M	0,000	69,400	69,400	271,00	0,00	0,00	18 807,40	18 807,40	18 807,40	100,00%
		Cena položky dle ÚRS 2021 02											
		ZBV č. 15 dle geodetického protokolu č. Š II 3/2022 km 13,2-13,7 žlaby 69,4=69,400 [A]											
145	966008212	Bourání odvodňovacího žlabu z betonových příkopových tvátnic šířky přes 500 do 800 mm	M	0,000	69,400	69,400	73,90	0,00	0,00	5 128,66	5 128,66	5 128,66	100,00%
		Cena položky dle ÚRS 2021 02											
		ZBV č. 15 dle geodetického protokolu č. Š II 3/2022 km 13,2-13,7 žlaby 69,4=69,400 [A]											
146	275351111	Bednění základových konstrukcí bloků tradiční oboustranné	M2	0,000	250,500	250,500	580,00	0,00	0,00	145 290,00	145 290,00	145 290,00	100,00%
		Cena položky dle ÚRS 2021 02											
		ZBV č. 13 Betonové patky v patě svahu km 10,360 - 10,381 21*0,5=10,50 [A] km 10,381 - 10,420 39*1,5*=58,50 [B]											

Změnový soupis prací SO 102 po změně 18 pro ZBV 44

Evidenční číslo a název stavby: II/102 hr. hl. města Prahy-Štěchovice, rekonstrukce. ETAPA II
Číslo a název SO/PS: SO 102 - Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice
Číslo a název rozpočtu: SO 102 - Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)
102
Celkem

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
147	567123114	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 5/6 (KSC II) tl 150 mm	M2	0,000	102,000	102,000	340,00	0,00	0,00	34 680,00	34 680,00	34 680,00	100,00%
		Cena položky dle ÚRS 2021 02											
		ZBV č. 20 *podklad ze směsi SC 5/6 v rozšíření vozovky t. 150 mm* *1,7*60,0=102,000 [A]*											
148	567133111	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 5/6 (KSC II) tl 160 mm	M2	0,000	300,000	300,000	361,00	0,00	0,00	108 300,00	108 300,00	108 300,00	100,00%
		Cena položky dle ÚRS 2021 02											
		ZBV č. 20 *podklad ze směsi SC 5/6 doplnění konstrukce s šíří 4,99m tl. 120-200 mm* *průměrná tl. 160 mm* *5,0*52,0=300,00 [A]*											
149	565125111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 40 mm š do 3 m	M2	0,000	2 259,400	2 259,40	244,00	0,00	0,00	551 293,60	551 293,60	551 293,60	100,00%
		Cena převzata z ÚRS 2021/02											
		ZBV č. 21 protokol Š II 71/2021 km 10,360 - 10,840 vlevo ACP 16 prům tl. 89,9 mm (nadspotřeba 40 mm) 2259,4=2 259,400 [A]											
150	577135132	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 40 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu	M2	0,000	1 342,000	1 342,00	270,00	0,00	0,00	362 340,00	362 340,00	362 340,00	100,00%
		Cena převzata z ÚRS 2021/01											
		ZBV č. 21 protokol D 13/2020 km 12,440 - 12,850 vpravo ACL 16 modif. prům tl. 30,7 mm (vrstva navíc) 1342=1 342,000 [A]											
151	577145132	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 50 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu	M2	0,000	4 510,000	4 510,00	349,00	0,00	0,00	1 573 990,00	1 573 990,00	1 573 990,00	100,00%
		Cena převzata z ÚRS 2021/02											
		ZBV č. 21 protokol Š II 89/21 13,199 - 13,696 vlevo ACL 16 modif. tl. 100 mm tloušťka 2x50 2255*2=4 510,000 [A]											
152	567123114a	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 5/6 (KSC II) tl 150 mm	M2	0,000	19 283,200	19 283,20	256,33	0,00	0,00	4 942 862,66	4 942 862,66	4 942 862,66	100,00%
		cena dle kalkulace z SoD (záměna recyklované směsi za SC 5/6)											
		ZBV č. 23 nahrazuje pol. č. 38 19007,2=19 007,200 [A] ZBV ZBV č. 27 geodetický protokol Š II 51/2022 92,2 m2=92,200 [A] geodetický protokol Š II 58/2022 183,8 m2 =183,800 [B] A+B=276,000 [C]											
153	113107323	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 do 300 mm strojně pl do 50 m2	M2	0,000	441,600	441,600	110,00	0,00	0,00	48 576,00	48 576,00	48 576,00	100,00%
		Cena položky dle ÚRS 2022 02											
		ZBV ZBV č. 27 *geodetický protokol Š II 51/2022 92,2 m2=92,200 [A]* *geodetický protokol Š II 58/2022 183,8 m2 =183,800 [B]* *(183,8+92,2)*0,6=165,600 [C]* *A+B+C=441,600 [C]*											
154	113107331	Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 100 do 150 mm strojně pl do 50 m2	M2	0,000	276,000	276,000	256,00	0,00	0,00	70 656,00	70 656,00	70 656,00	100,00%
		Cena položky dle ÚRS 2022 02											
		ZBV ZBV č. 27 *geodetický protokol Š II 51/2022 92,2 m2=92,200 [A]* *geodetický protokol Š II 58/2022 183,8 m2 =183,800 [B]* *A+B=276,000 [C]*											
155	564970315	Podklad z betonového recyklátu plochy do 100 m2 tl 250 mm	M2	0,000	165,600	165,600	240,00	0,00	0,00	39 744,00	39 744,00	39 744,00	100,00%
		Cena položky dle ÚRS 2022 02											
		ZBV ZBV č. 27 *výměna podloží 60% z celkového množství 276 m2, tl. 20-30 cm* *276*0,6=165,600 [A]*											

Změnový soupis prací SO 102 po změně 18 pro ZBV 44

Evidenční číslo a název stavby: II/102 hr. hl. města Prahy-Štěchovice, rekonstrukce. ETAPA II
Číslo a název SO/PS: SO 102 - Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice
Číslo a název rozpočtu: SO 102 - Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)
102
Celkem

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
156	919735123	Řezání stávajícího betonového krytu hl přes 100 do 150 mm	M	0,000	318,585	318,585	293,00	0,00	0,00	93 345,40	93 345,40	93 345,40	100,00%
		Cena položky dle ÚRS 2022 02											
		ZBV ZBV č. 27 *318,585=318,585*											
157	275313711	Základové patky z betonu tř. C 20/25	M3	0,000	2,250	2,250	4 160,00	0,00	0,00	9 360,00	9 360,00	9 360,00	100,00%
		Cena položky dle ÚRS 2023 02											
		ZBV č. 37 *zábradlí propustek* *0,5*0,5*0,75*12*											
158	91111111	Montáž zábradlí ocelového zabetonovaného	M	0,000	20,000	20,000	192,00	0,00	0,00	3 840,00	3 840,00	3 840,00	100,00%
		Cena položky dle ÚRS 2023 02											
		ZBV č. 37 *zábradlí propustek 6+4+6+4=20*											
225	74910606	zábradlí městské obloukové bezpečnostní lakovaný povrch 2000x1000mm	KUS	0,000	10,000	10,000	6 110,00	0,00	0,00	61 100,00	61 100,00	61 100,00	
		Cena položky dle ÚRS 2023 02											
		ZBV č. 37 *zábradlí propustek 6+4+6+4=20m*											
159	113107223	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 do 300 mm strojně pl přes 200 m2	M2	0,000	315,000	315,000	64,80	0,00	0,00	20 412,00	20 412,00	20 412,00	100,00%
		cena dle URS 2023/1											
		ZBV č. 38 krajnice pod svodidla km 13,7647-13,8887 km 13,8963-139803 210*1,5m=315,00 tl. 250-300mm											
160	132151101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 20 m3 strojně	M3	0,000	0,900	0,900	585,00	0,00	0,00	526,50	526,50	526,50	100,00%
		cena dle URS 2023/1											
		ZBV č. 38 1,0*0,25*0,15*24=0,9											
161	339921112	Osazování betonových palisád do betonového základu jednotlivě výšky prvku přes 0,5 do 1m	KUS	0,000	75,000	75,000	216,00	0,00	0,00	16 200,00	16 200,00	16 200,00	100,00%
		cena dle URS 2023/1											
		ZBV č. 38 u HV 7,5/0,11*1,1=75											
162	273313911	Základové desky z betonu tř. C 30/37	M3	0,000	47,250	47,250	4 180,00	0,00	0,00	197 505,00	197 505,00	197 505,00	100,00%
		cena dle URS 2023/1											
		ZBV č. 38 betonový práh pod nová svodidla km 13,7647-13,8887 km 13,8963-13,9803 210*1,5*0,15=47,25											
163	273351121	Zřízení bednění základových desek	M2	0,000	63,900	63,900	560,00	0,00	0,00	35 784,00	35 784,00	35 784,00	100,00%
		cena dle URS 2023/1											
		ZBV č. 38 km 13,7647-13,8887 km 13,8963-13,9803 210*2*0,15+1,5*0,15*4=63,90											
164	273351122	Odstranění bednění základových desek	M2	0,000	63,900	63,900	138,00	0,00	0,00	8 818,20	8 818,20	8 818,20	100,00%
		cena dle URS 2023/1											
		ZBV č. 38 viz pol. č. 274354111											
165	564841112	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 130 mm	M2	0,000	315,000	315,000	167,00	0,00	0,00	52 605,00	52 605,00	52 605,00	100,00%
		cena dle URS 2023/1											
		ZBV č. 38 pod nová svodidla 210*1,5=315,00											
166	59228408	palisáda betonová tyčová hranatá přírodní 110x110x600mm	KUS	0,000	75,000	75,000	181,00	0,00	0,00	13 575,00	13 575,00	13 575,00	100,00%
		Cena položky dle ÚRS 2023 01											
		ZBV č. 38 7,5/0,11*1,1=75											

Změnový soupis prací SO 102 po změně 18 pro ZBV 44

Evidenční číslo a název stavby: II/102 hr. hl. města Prahy-Štěchovice, rekonstrukce. ETAPA II
Číslo a název SO/PS: SO 102 - Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice
Číslo a název rozpočtu: SO 102 - Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)
102
Celkem

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
170	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 150 mm	M2	0,000	48,000	48,000	139,52	0,00	0,00	6 696,96	6 696,96	6 696,96	100,00%
		Cena položky dle SoD SO 103 pol.č. 16											
		ZBV č. 38 pod stávající svodidlo 48*1,0=48,000 [A]											
167	911381124a	Silniční svodidlo betonové jednostranné průběžné délky 4 m výšky 1,2 m montáž s přesunem (bez dodávky)	M	0,000	48,000	48,000	1 381,67	0,00	0,00	66 320,16	66 320,16	66 320,16	100,00%
		položka převzata z SoD SO 901pol. č. 911EC3											
		dle geodetického protokolu Š II 36/2023 km 14,351-14,399 vpravo 48 m											
168	911381824	Odstranění silničního betonového svodidla délky 4 m výšky 1,2 m	M	0,000	132,000	132,000	939,00	0,00	0,00	123 948,00	123 948,00	123 948,00	100,00%
		URS 2023/1											
		ZBV č. 38 geodetický protokol Š II 36/2023 km 13,763-13,799 vpravo 36m km 13,843-13,891 vpravo 48m km 14,351-14,399 vpravo 48m 36+48+48=132											
171	58381008	Kostka štípaná dlažební žula velká 15/17	M2	0,000	16,500	16,500	1 610,00	0,00	0,00	26 565,00	26 565,00	26 565,00	100,00%
		Cena dle URS 2023/1											
		ZBV č. 38 okolo HV 7,5*2*1,1=16,5											
172	919735111	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm	M	0,000	208,000	208,00	77,60	0,00	0,00	16 140,80	16 140,80	16 140,80	100,00%
		Cena dle URS 2023/1											
		ZBV č. 38 nové betonové svodidlo 208=208											
169	113154122	Frézování živičného krytu tl 40 mm pruh š přes 0,5 do 1 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	M2	0,000	574,100	574,100	108,00	0,00	0,00	62 002,80	62 002,80	62 002,80	1,75%
		Cena dle URS 2022/2											
		ZBV č. 41 geodetický protokol Š II17/2022 km 10,020-10,246 vpravo prům. tl. 40 mm 18,10=18,100 [A] Š II 33/2022 km 14,580-14,608 vlevo prům. tl. 41 mm 39,1=39,100 [B] nájezd k MOL km 14,130-14429 vpravo prům. tl. 42 mm - bez odpočtu plochy 37,9=37,900 [C] výjezd od MOL km 14,130-14429 vpravo prům. tl. 42 mm - bez odpočtu plochy 49,0=49,000 [D] Š II 33/2022 km 14,580-14,609 vlevo prům. tl. 220 mm 130,50=130,500 [E] Š II 37/2022 km 11,519-11,630 vlevo prům. tl. 224 mm 299,50=299,500 [F] A+B+C+D+E+F=574,100 [G]											
226	113154123	Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š přes 0,5 do 1 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	M2	0,000	327,100	327,100	119,00	0,00	0,00	38 924,90	38 924,90	38 924,90	1,75%
		Cena dle URS 2022/2											
		ZBV č. 41 geodetický protokol Š II 23/2022 km 10,222 -10,246 vpravo prům. tl. 50 mm 70,10=70,100 [A] kaslíky km 14,226-14,273 vpravo prům. tl. 51 mm - bez odpočtu plochy 92,40=92,400 [B] km 14,302-14,343 vpravo prům. tl. 53 mm - bez odpočtu plochy 86,80=86,800 [C] km 14,354-14,393 vpravo prům. tl. 51 mm - bez odpočtu plochy 77,80=77,800 [D] A+B+C+D=327,100 [E]											
173	171152501	Zhutnění podloží z hornin soudržných nebo nesoudržných pod násypy (SAT)	M2	0,000	629,900	629,900	8,19	0,00	0,00	5 158,88	5 158,88	5 158,88	100,00%
		Cena dle URS 2023/1											
		ZBV č. 42 geodetický protokol Š II 14/2023 - rozšíření vozovky km 11,780-11,868 94,20=94,200 [A] km 11,881-11,909 23,50=23,500 [B] km 11,923-12,435 512,20=512,200 [C] A+B+C=629,900 [D]											
174	273311128	Základové desky z betonu prostého C 30/37	M3	0,000	3,500	3,500	4 980,00	0,00	0,00	17 430,00	17 430,00	17 430,00	100,00%
		Cena dle URS 2023/1											
		ZBV č. 42 geodetický protokol Š II 41/2023 3,5=3,500 [A]											

Změnový soupis prací SO 102 po změně 18 pro ZBV 44

Evidenční číslo a název stavby: II/102 hr. hl. města Prahy-Štěchovice, rekonstrukce. ETAPA II
Číslo a název SO/PS: SO 102 - Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice
Číslo a název rozpočtu: SO 102 - Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)
102
Celkem

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
175	273311191	Příplatek k základovým deskám za betonáž malého rozsahu do 25 m3	M3	0,000	3,500	3,500	618,00	0,00	0,00	2 163,00	2 163,00	2 163,00	100,00%
		Cena dle URS 2023/1											
		ZBV č. 42 dle pol. č. 273311191 3,5=3,500 [A]											
176	317321118	Mostní římsy ze ŽB C 30/37	M3	0,000	32,750	32,750	6 520,00	0,00	0,00	213 530,00	213 530,00	213 530,00	100,00%
		Cena dle URS 2023/1											
		ZBV č. 42 geodetický protokol Š II 41/2023 římsa pravá 9,25=9,250 [A] levá 23,50=23,500 [B] A+B=32,750 [C]											
177	317353121	Bednění mostních říms všech tvarů - zřízení	M2	0,000	69,123	69,123	2 340,00	0,00	0,00	161 747,82	161 747,82	161 747,82	100,00%
		Cena dle URS 2023/1											
		ZBV č. 42 levá (0,295+1,2+0,847+0,15)*14=34,888 [A] 2*1,6*((1,2+0,847+0,15)/2)=3,515 [B] pravá (0,245+1,05+0,15+0,511)*14=27,384 [C] 2*1,95*((1,05+0,15+0,511)/2)=3,336 [D] A+B+C+D=69,123 [E]											
178	317353221	Bednění mostních říms všech tvarů - odstranění	M2	0,000	69,123	69,123	182,00	0,00	0,00	12 580,39	12 580,39	12 580,39	100,00%
		Cena dle URS 2023/1											
		ZBV č. 42											
179	317361116	Výztuž mostních říms z betonářské oceli 10 505	T	0,000	2,623	2,623	62 900,00	0,00	0,00	164 986,70	164 986,70	164 986,70	100,00%
		Cena dle URS 2023/1											
		ZBV č. 42 viz. výkres výztuže (2113,2+509,5)/1000=2,623 [A]											
180	317171126	Kotvení monolitického betonu římsy do mostovky kotvou do vývrtu	KUS	0,000	24,000	24,000	868,00	0,00	0,00	20 832,00	20 832,00	20 832,00	100,00%
		Cena dle URS 2023/1											
		ZBV č. 42											
181	464531112	Pohoz z hrubého drceného kameniva zrno 63 až 125 mm z terénu	M3	0,000	55,900	55,900	1 290,00	0,00	0,00	72 111,00	72 111,00	72 111,00	100,00%
		Cena dle URS 2023/1											
		ZBV č. 42 geodetický protokol Š II 16/2023 km 11928-12,060 279,5*0,2=55,900 [A]											
182	55342284R	ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ LANKOVÉ - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	0,000	27,200	27,200	4 605,55	0,00	0,00	125 270,96	125 270,96	125 270,96	100,00%
		Cena srovnatelná s cenou z SoD SO 207 pol. č. 9111C1											
		ZBV č. 42 geodetický protokol Š II 40/2023 vpravo 13,60=13,600 [A] vlevo 13,60=13,600 [B] A+B=27,200 [C]											
183	567511121	Recyklace za studena tl. 150mm	M2	0,000	2 959,200	2 959,20	119,00	0,00	0,00	352 144,80	352 144,80	352 144,80	100,00%
		Cena dle URS 2023/1											
		ZBV č. 42 Geodetický protokol Š II 17/2023 km 11,771-12,436 vpravo 2959,20=2 959,200 [A]											

Změnový soupis prací SO 102 po změně 18 pro ZBV 44

Evidenční číslo a název stavby: II/102 hr. hl. města Prahy-Štěchovice, rekonstrukce. ETAPA II
Číslo a název SO/PS: SO 102 - Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice
Číslo a název rozpočtu: SO 102 - Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)
102
Celkem

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
184	58522150	cement	T	0,000	34,623	34,623	3 770,00	0,00	0,00	130 528,71	130 528,71	130 528,71	100,00%
		Cena dle URS 2023/1											
		ZBV č. 42 6% cementu (1300*0,06/1000)*2959,2*0,15=34,623											
185	11162540	emulze asfaltová obalovací pro použití za studena	T	0,000	7,546	7,546	37 000,00	0,00	0,00	279 202,00	279 202,00	279 202,00	100,00%
		Cena dle URS 2023/1											
		ZBV č. 42 1% asfaltu (1700*0,01/1000)*2959,2*0,15=7,546											
186	911334111	Svodidlo ocelové zábradelní zádržnosti H2 kotvené do římsy bez výplně	M	0,000	38,000	38,000	8 289,99	0,00	0,00	315 019,62	315 019,62	315 019,62	100,00%
		cena srovnatelná s cenou z SoD SO 204,205,206 pol. č. 9117C1											
		ZBV č 42 geodetický protokol Š II 40/2023 vpravo 19=19,000 [A] vlevo 19=19,000 [B] A+B=38,000 [C]											
187	963051111	Bourání mostní nosné konstrukce z ŽB Odboudání původní zdi propustu ŽB geodetický protokol Š II km 11,917 3,26+2,70	M3	0,000	5,960	5,960	9 390,00	0,00	0,00	55 964,40	55 964,40	55 964,40	100,00%
		Cena dle URS 2023/1											
		ZBV č. 42 Odboudání původní zdi propustu ŽB geodetický protokol Š II 18/2023 km 11,917 3,26+2,70=5,960 [A]											
189	914111100R	Svislé dopravní značení	SOUB	0,000	1,000	1,000	107 888,40	0,00	0,00	107 888,40	107 888,40	107 888,40	100,00%
		cena dle nabídky subdodavatele 93 816,- Kč+ režie a zisk (15%)											
		ZBV č. 44 1=1											
190	915211100R	Vodorovné dopravní značení	SOUB	0,000	1,000	1,000	262 878,50	0,00	0,00	262 878,50	262 878,50	262 878,50	100,00%
		cena dle nabídky subdodavatele 228 590,- Kč+ režie a zisk (15%)											
		ZBV č. 44 1=1											
191	912521111	Montáž dopravního knoflíku zapuštěného do komunikace	KUS	0,000	167,000	167,000	272,00	0,00	0,00	45 424,00	45 424,00	45 424,00	100,00%
		Cena dle URS 2023/1											
		ZBV č. 44 176=176											
192	56288005	Knoflík trvalý zafrézovaný pro dopravní značení	KUS	0,000	167,000	167,000	950,00	0,00	0,00	158 650,00	158 650,00	158 650,00	100,00%
		Cena dle URS 2023/1											
		ZBV č. 44 176=176											
		Celkem						113 362 946,56	- 14 482 870,38	32 669 367,15	131 549 443,33	18 186 496,77	16,04%

MESTYS DAVLE

DAVLE, Na Náměstí 63, PSČ 25206, e-mail; slarosta@obccdavle.cz, leleron: 257 770 257, fax: 257 770 144

adresát -

V Davli 14. 12. 2021
Č.j.: 1757/2021/UMD

Vážená paní hejtmanlío Pecková, vážený pane náměstku hejtmanky Kupko,
rádi bychom vás s naléhavostí a prosbou požádali o schůzku týkající se největší investice Středočeského kraje „Rekonstrukce silnice 11/102 v úsek Davle - Štěchovice“. Konkrétně se nám jedná o konstrukční řešení v ulici Kiliánská v Davli, kde dostala absolutní přednost automobilová doprava před bezpečností v obci spočívající v nemožnosti bezpečného pohybu pěších při silnici (zúžení krajnic vozovky, vytváření bariér z obrubníků na okrajích asfaltového povrchu, nesmyslná šířka dopravních pruhů v obci). Tyto nově vytvářené bariéry zcela znemožňují v úseku cca 400metrů (po ukončení stavby až v délce l,5km) pohyb maminek s kočárky, chodců (i cyklistů), zhoršily se odtokové poměry z přilehlých nemovitostí a výjezd z pozemků na komunikaci (obdobně jako jste již řešili ve Štěchovicích).
Veškerá naše jednání byla dosud neúspěšná, včetně slibů na zlepšení stavu.
Tímto vás jménem celého zastupitelstva a občanů Davle prosím o schůzku či návštěvu, abyste se jako investoři mohli seznámit s aktuálním stavem a bylo možné přijmout nějaké řešení, které by do budoucna umožnilo bezpečný pohyb občanů z části městyse Kilián do centra Davle před tím, než se celá akce uskuteční a bude ostudou našeho kraje i městečka, které usiluje o zápis do „Seznamu národních nehmotných statků“ UNESCO (spolek Vltavan Davle).

S pozdravem Mgr. Jiří Prokůpek, starosta

tel.: 602 231 128

Adresát:
- Mgr. Petra Pecková - hejtmanka Středočeského kraje
- Mgr. Mariin Kupka - statutární náměstek hejtmanky pro oblast silniční dopravy

Krajský úřad, Zborovská 11, 150 21 Praha 5
Datová schránka: **keebjyf**

Organizace; Krajský úřad Středočeský kraj
Adresa: Krajský úřad Středočeský kraj, Zborovská 11, 150 21 Praha 5

Doručený dokument

N lili lili II mm INU
kuskes14eee63

Základní

UID_____	*kuskes14eee63*	Založeno	*14.12.2021*
Číslo jednací	***155415/2021/KUSK***	Změněno	*14.12.2021*
Spisová značka		Ukončeno	
Štáv	*Zpracování*	Zpracovatel	*N_DOPS_ASI_01 (Dana Kocmanová)*
Forma	*E - Elektronická*	Schvalovatel	*N_DOPS_01(Mgr. Martin Kupka)*
Věc	***Dopis - žádost o schůzku***		
Popis			
Reprez. subjekt	*Městys Davle, 10:00241156, DS: aeybpnS, Na náměstí 63, 252 06 Davle - Davle, Czech Republic*		
Klíčová slova			
Značka		Bezp. kategorie	*veřejné*

Tnddní

Typ	
Věc. skup.	
Skart režim	

Kvantitativní údaje (H/ př / li-sv.př. / druh příloh)

Pří vzniku	*0/1/0/-*
Odes. / vyříz.	*0/1/0/-*
Ukládané	*0/1/0/-*

Ostatní

Termín vyříz,		I Právní moc j	
Agendové č.			
Poznámka			
Fyzické uložení			
Attri		fAttrZ	

Komponenty (el. píííQhy)

Komponenta č. 1

Název	*20211214103953604.pdf*		
Popis			
Druh	*application/pdf*		
Původ	*digitální*	Typ vazby	*Tělo*
ID přílohy	*kuskesxYRTHEC*	Finální verze	*Ano*

Doručeni

Subjekt	*Městys Davle, 10:00241156, DS: aeybpnS, Na náměstí 63, 252 06 Davle - Davle, Czech Republic*		
ID zásilky	/fUskesS 7 7556445	ID dat. zprávy	*977803073*
Způsob	dařová *schránka*	Doručeno	*14.12.2021*
Zacházeni	*obyčejná*	CJ odesílatele	*1757/2021/UMD*
Druh	*obyčejné psaní*	Stav	

Alice Pavlíkova

Od:	Jiří Prokůpek
Odesláno:	čtvrtek 20. ledna 2022 13:38
Komu:	Jiří Ctibor; Petr Macek
Kopie:	
Předmět:	RE: 11/102 - návrh na úpravu DZ pro zlepšení prostoru pro pěší na území Davle - v02
Důležitost:	Vysoká

Dobrý den,

díky za rj^chlost zpracování. Určitě je to z pohledu bezpečnosti opravdu mnohem lepší. S tím pruhem pro chodce s piktogramy je to asi teď nejlepší možné řešení. V této části u nás jednoznačně souhlas.
Možná zvážit, jestli by se nenastříkali v obou směrech od začátku Davle cca po 100-200 m na silnici červené značky 50km nebo alespoň na začátku.

Zastávky směr Štěchovice - Davle: Ta u Portusu tam řešena není - nevím jestli s ní alespoň nějak nepočítat do budoucna, aby se mohla případně realizovat i v době udržitelnosti akce.
Ta u Kostela - pevná svodidla u komunikace zůstala, cílově by to chtělo alespoň výklenky kvůli bezpečnosti. Je tam teda alespoň betonovej citybloc, ale trochu se bojíme, že je jen otázkou času, kdy to do něj někdo napere, když bude vyčnívat trochu
do silnice. Uvidíme co tomu řekne Policie.

S Ing. Neřádem (Policie) jsem mluvil. Máte mu zaslat dopředu podkladové materiály, aby se na to podíval. Do naší oblasti pojede pravděpodobně ve středu, ale to si s ním domluvte přímo vy. Schůzka na obecním úřadu v Davli je možná.

Pěkný den a s pozdravem Jiří Prokůpek

měsŤys Ďavle

Mgr. Jiří Prokůpek
Starosta městyse Davle
Na náměstí 63
250 06 Davle
e lefo
Mobil:
E-mail: starosta@obecdavle.cz
Web: www.obecdavle.cz

From: Jiří Ctibor.
Sent: Monday, January 17, 2022 3:03 PM
To: Jiří Prokůpeí
Subject: 11/102 - návrh na úpravu DZ pro zlepšení prostoru pro pěší na území Davle - v02

Vážený pane starosto,
v příloze posílám návrh změny DZ ještě jednou, doplnil jsem popis opatření a také ještě jednu vodící čáru (patřící ke stezce).
J. Ctibor

Ing. Jiří Ctibor
projektant silničních staveb

Atelier PROMIKA s.r.o.
Muchova 9
160 00 Praha 6
Mobil: 608 96 94 93
Email: ctibor@promika.cz
Web: http://www.promika.cz
Společnost je držitelem certifikátu ČSN EN ISO 9001:2001

Dobrý den pane starosto,
dle naší dohody zasílám návrh na úpravu dopravního značení na území Davle.
Pakliže s tím takto budete souhlasit, situace vytisknu a proberu to s Ing. Neřádem. Možná bychom se mohli sejít všichni společně u Vás. Jen mi pak prosím dejte vědět, jestli mám schůzku s ing. Neřádem iniciovat já, nebo vy.
Přehled změn:

- zúžení jízdních pruhů v obci na 3,0 m
- zúžení levé zpevněné krajnice v obci na 0,5 m
- doplněna stezka pro chodce šířky 1,5 m vč. bezp. odstupu 0,5 m. Stezka bude označena SDZ v km 10,130 a poté piktogramy „chodci" (šířkové uspořádání je patrné ze vzorového příčného řezu - druhý zleva)
- některá místa na stezce budou zvýrazněna červenou barvou a balisety zelené barvy
- podél pravé vodící čáry, která odděluje stezku od jízdního pruhu budou pro zdůraznění této čáry doplněny dopravní knoflíky bílé barvy v odstupu cca 9 m
- v km 11,3 vlevo vytvořen prostor pro chodce, čekající na zastávce autobusu (vč. ochranného bet. svodidla CITYBLOC dl. 2,0 m v černo-žlutém nátěru)
- na vjezdu do obce doplněna opticko-psychologická brzda
- km cca 10,5 vpravo - nová obruba bude provedena jako zapuštěná
- v místech kolem zastávek nahrazeny „přerušované" dělící čáry čárami plnými (někde jen v jednom směru - VDZč. V3)

Čekám na Vaši zprávu.
Děkuji Ctibor

Ing. Jiří Ctibor
projektant silničních staveb

Atelier PROMIKA s.r.o.
Muchova 9
160 00 Praha 6
Mobil: 608 96 94 93
Email: ctibor@promika.cz
Web: http://www.promika.cz
Společnost je držitelem certifikátu ČSN EN ISO 9001:2001

MESTYS DAVLE

Městys Davle, Na náměstí 63, 252 06 Davle, e-mail: starosta@obecdavle.cz, Telefon: 257 770 257

V Davli dne 25.2.2022

Č.j.: 296/2022/UMD

Aleliér PROMIKA s.r.o.

Muchova 9

160 00 Praha 6

Věc: Vyjádření k úpravě dopravního značení

Vážení,

nemáme námitek s úpravou projektu dopravního značení pro zlepšení bezpečnosti pěších na území obce Davle v rámci akce „11/102 Hr. hl. města Prahy - Štěchovice, rekonstrukce etapa č. II" od Ing. Jiřího Ctibora ze dne 01/2022.

S pozdravem

Mgr. Jiří Prokůpek

starosta

Alice Pavlíkova

Od: milan.nerad@pcr.cz
Odesláno: čtvrtek 27. ledna 2022 8:01
Komu: Jiří Ctibor
Předmět: RE; II/102 HR. HL. M. PRAHY - ŠTĚCHOVICE, REKONSTRUKCE, ETAPA II - úprava DZ v Davli

Dobrý den,
byl jsem se tam podívat. Dohoda je taková, že se zúží průjezdný profil komunikace, na V4 se dají balisety. Osobně bych tam nedělal stezky pro chodce včetně značení. Narovinu řeknu, ideální stav. Podél komunikace 11/102 realizovat obrubníky a udělat přípravu na chodníky, které se tam vejdou.
S pozdravem Nerad

Sent: Tuesday, January 25, 2022 10:02 AM
To: NERAD Milan
Subject: RE: 11/102 HR. HL. M. PRAHY - ŠTĚCHOVICE, REKONSTRUKCE, ETAPA II - úprava DZ v Davli
Děkuji za zprávu,
v kolik hodin bychom se mohli zítra sejít u pana starosty v Davli?
Následně ověřím, jestli by na nás měl v tu dobu pan starosta čas.
Děkuji Ctibor
Ing. Jiří Ctibor
projektant silničních staveb

Atelier PROMIKA s.r.o.
Muchova 9
160 00 Praha 6
Fax: 233 081 263
Mobil: 608 96 94 93
Email: ctibor(S)promika.cz
Web: http://www.promika.cz
Společnost je držitelem certifikátu ČSN EN ISO 9001:2001

From:
Sent: Tuesday, January 25, 2022 9:36 AM
To: Jiří Ctiboři
Subject: RE: 11/102 HR. HL. M. PRAHY - ŠTĚCHOVICE, REKONSTRUKCE, ETAPA II - úprava DZ v Davli
Dobrý den,
zítra bych měl být v Měchenicích. Kdy by se Vám to hodilo.
S pozdravem Nerad

From: Jiří Ctibo
Sent: Tuesday, January 25, 2022 9:02 AM
NERAD MilanHH^^^^^^H
Subject: II/102 HCT^WRAH^TTTCH ICE, REKONSTRUKCE, ETAPA II - úprava DZ v Davli
Dobrý den.
v rámci probíhající stavby akce „11/102 HR. HL. M. PRAHY - ŠTĚCHOVICE, REKONSTRUKCE, ETAPA H“, pro kterou jsme zpracovávali RDS, jsme na základě požadavku Městyse Davle připravili návrh úpravy dopravního značení na území městyse s cílem zvýšení bezpečnosti pěších. Toho jsem dosáhli zúžením šířky jízdních pruhů na 3,0 m a zřízením stezky pro pěší podél pravé hrany zpevnění. Navrhované změny jsou obsaženy v přiložených situacích DZ a stručně popsány v textové zprávě. Šířkové uspořádání je patrné ze vzorových příčných řezů.
Rádi bychom se s Vámi sešli osobně a navrhované úpravy prodiskutovali. Pan starosta Davle, Mgr. Prokůpek nabízí, že bychom se mohli setkat u něho v kanceláři na MÚ v Davli. Eventuálně se dá rovnou zajít na místo.
Prosím o návrh termínu schůzky, vytiskl bych sebou situace, abychom se měli nad čím bavit. Mohu tento týden kdykoliv, příští týden jsem na dovolené.

Děkuji Ctibor
Ing. Jiří Ctibor
projektant silničních staveb

Atelier PROMIKA s.r.o.
Muchova 9
160 00 Praha 6
Fax: 233 081 263
Mob" " ‘
Emai
Web . _____
Společnost je držitelem certifikátu ČSN EN ISO 9001:2001

Vaše značka:
Naše značka: 0619/22
Vyřizuje: Ing. Janovský / tel.
Datum: 15. 2. 2022

Atelier PROMIKA s.r.o.
Ing. Eva Benešová
Muchova 9
160 00 Praha 6

DS: teynx2v

Stanovisko k projektové dokumentaci: Změna dopravního značení v Davli

Dobrý den, paní Benešová,

k předložené projektové dokumentaci na změnu dopravního značení v Davli máme jedinou připomínku a tou je velikost vodorovného dopravního značení V11a v autobusové **zastávce Davle, u Kiliána ve směru na Štěchovice**. Toto značení prosíme **prodloužit z navrhovaných 12 metrů do maximální možné délky** - jak dovolí místní podmínky, protože na linkách PID v této oblasti jsou nasazeny i kloubové autobusy **o délce 19 metrů.** Proto bychom chtěli zamezit nežádoucímu parkování osobních automobilů v prostoru zastávky, zejména v její přední části, kde je napojena místní komunikace k bývalé faře a kostelu sv. Kiliána.

Naši představu, jak by dopravní značení mělo vypadat ve své minimální délce, posíláme v příloze.

Děkuji za spolupráci a zůstávám
s přátelským pozdravem

Mgr. Luděk Kudláček
Vedoucí oddělení infrastruktury a inovací

Příloha: Navrhovaná úprava vodorovného dopravního značení v zastávce Davle, u Kiliána (vizualizace)

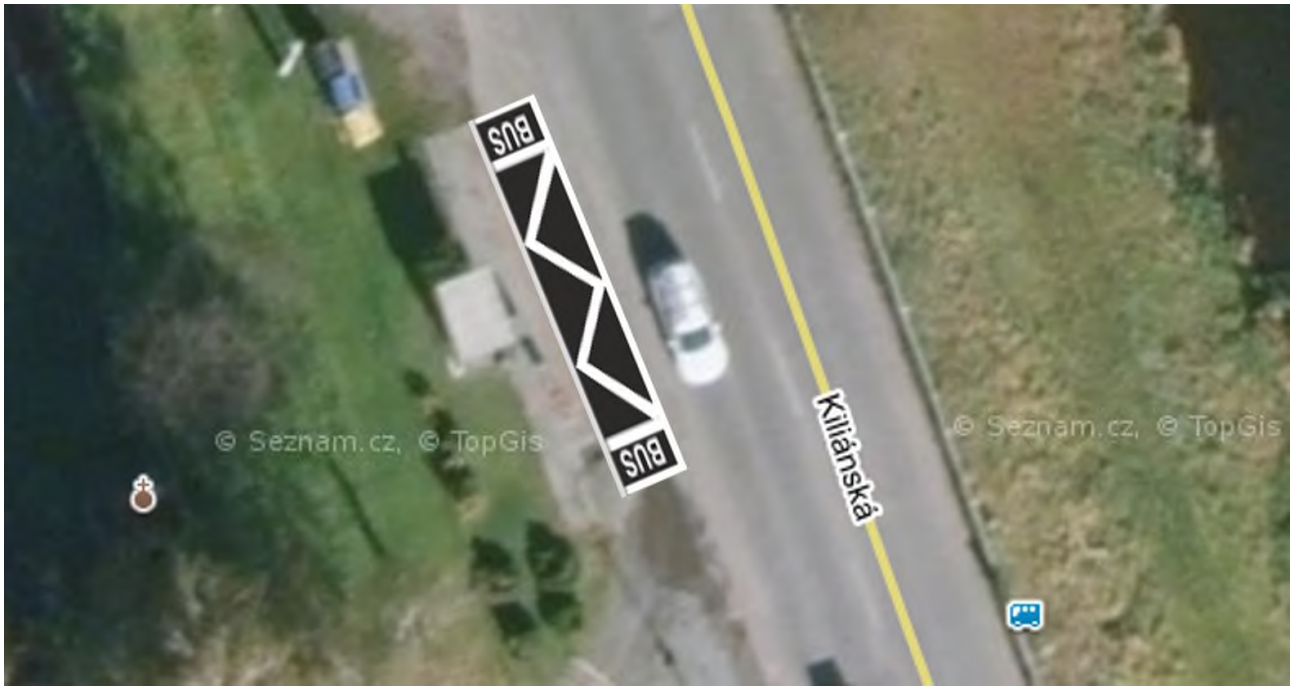

a	úprava dopravního značení pro zlepšení bezpečnosti pěších na území obce – požadavek městyse Davle	01/2022	Ing. Jiří Ctibor
b			
c			
č. změny	text změny – odůvodnění	datum	podpis

II/102 HR. HL. MĚSTA PRAHY - ŠTĚCHOVICE, REKONSTRUKCE, ETAPA II

SO 102-AB

OBJEDNATEL STAVBY

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p.o.
Zborovská 11
150 21 Praha 5
IČ 00066001

SCHVÁLIL-RAZÍTKO,DATUM,PODPIS:

TECHNICKÝ DOZOR

PRAGOPROJEKT, a.s.
K Ryšánce 1668/16
147 54 Praha 4
IČ 45272387

SCHVÁLIL-RAZÍTKO,DATUM,PODPIS:

AUTORSKÝ DOZOR

Pontex, spol. s r.o.
Bezová 1658/1
147 00 Praha 4 - Braník
IČ 40763439

SCHVÁLIL-RAZÍTKO,DATUM,PODPIS:

ZHOTOVITEL STAVBY

STRABAG, a.s.
Kačírkova 982/4
158 00 Praha 5
IČ 60838744

SCHVÁLIL-RAZÍTKO,DATUM,PODPIS:

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM S-JTSK VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bpv

ZPRACOVATEL RDS

atelierpromika
projektová činnost v dopravě

Atelier PROMIKA s.r.o.
Muchova 9/223
160 00 Praha 6
IČ 26080273

SCHVÁLIL–RAZÍTKO,DATUM,PODPIS:

VYPRACOVAL	Ing. Jří Ctibor	HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU	Ing. Jří Ctibor
ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	Ing. Jří Ctibor	TECHNICKÁ KONTROLA	Ing. Petr Macek

AKCE
II/102 HR. HL. MĚSTA PRAHY - ŠTĚCHOVICE, REKONSTRUKCE, ETAPA II

STAVEBNÍ OBJEKT
SO 102-A,B REKONSTRUKCE VOZOVKY, DAVLE - ŠTĚCHOVICE - ÚSEK A,B

PŘÍLOHA
TECHNICKÁ ZPRÁVA - ZMĚNA DZ

Č. PŘÍLOHY: 1.2

Č. PARÉ:

STUPEŇ	RDS	DATUM	01/2022	MĚŘÍTKO	-	FORMÁT	A4

© návrh řešení obsažený ve výkresové a textové části je předmětem ochrany dle autorského zákona

1.2 TECHNICKÁ ZPRÁVA – ZMĚNA DZ

1. Identifikační údaje

Název stavby:	II/102 hr. Hl. m. Prahy – Štěchovice, rekonstrukce, etapa II
Místo stavby:	Středočeský kraj Okres Praha - západ k.ú. Davle
Charakter stavby:	úpravy pozemní komunikace
Část:	SO 102A Rekonstrukce vozovky, Davle – Štěchovice – - Úsek A **(změna dopravního značení)** SO 102B Rekonstrukce vozovky, Davle – Štěchovice – - Úsek B **(změna dopravního značení)**
Projektový stupeň:	Realizační dokumentace stavby
Objednatel stavby:	Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p.o. Zborovská 11, 150 21 Praha 5 - Smíchov IČ: 00066001
Zhotovitel stavby:	Strabag, a.s. Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 IČ: 60838744
Zpracovatel RDS:	Atelier PROMIKA s.r.o. Muchova 9/223, 160 00 Praha 6 IČ: 26080273
Vypracoval:	Ing. Jiří Ctibor *autorizovaný inženýr v oboru dopravní stavby,* *ČKAIT – 0012627*
Datum zpracování:	01/2022

1. Stručný technický popis se zdůvodněním stavby

Jedná se o opravu silnice II/102 v úseku za Davlí (v navázání na plánovanou rekonstrukci průtahu Davlí před křižovatkou se silnicí II/104) směrem na Štěchovice. Začátek úpravy je stanoven vlastním lokálním staničením v **km 10,000**, rozhraní objektů SO 102-A a 102-B je v km **10,500**, celková délka úseku je 500 m. V rámci SO 102-A se navrhuje se oprava a zesílení asfaltového krytu vozovky včetně úpravy příčného sklonu a lokálních sanací vrchní podkladní vrstvy. Lokálně je upravena také šířka vozovky na jednotnou návrhovou kategorii, v celém úseku obnova nezpevněné krajnice, oprava stávajících sjezdů, doplnění a úprava stávajících silničních svodidel, výměna směrových sloupků, **obnova a revize stálého dopravního značení**.

Cílem akce je celková oprava konstrukce vozovky včetně nezpevněných krajnic s odstraněním závad vznikajících nefunkčním systémem odvodnění vozovky. Navrhuje se zesílení konstrukce vozovky průměrně o 1 cm. Provedenou opravou dojde k odstranění jednotlivých bodových závad na komunikaci a tím zvýšení bezpečnosti provozu pro všechny účastníky silničního provozu.

Úpravy zemního tělesa včetně silničních příkopů jsou součástí tohoto stavebního objektu. Součástí této části PD nejsou přeložky stávajících ani návrh nových vedení inženýrských sítí.

2. Použité podklady

- Smlouva na zpracování projektové dokumentace,
- PDPS, Pontex, spol. s r.o., 9/2017, včetně průzkumů
- vlastní průzkum a fotodokumentace projektanta,
- závěry konzultací a připomínek z uskutečněných jednání v průběhu zpracování dokumentace.

3. Předmět změny a rozsah

Předmětem změny je úprava vodorovného a doplnění svislého dopravního značení v intravilánu městyse Davle.

Změna DZ bude provedena dle situací a vzorového příčného řezu. Rozsah změny je dán provozním staničením km 10,0 až 11,960, tedy cca v délce 1 960 m. Změna DZ zasahuje i za hranici Davle, danou SDZ č. IS 12a (b).

4. Zdůvodnění změny

Změna byla vyvolána požadavkem městyse Davle na zlepšení podmínek pro chodce podél sil. II/102 v intravilánu městyse Davle. Tato dokumentace změny DZ slouží po stanovení místní úpravy provozu u příslušného Silničního správního úřadu.

5. Přehled a technické řešení změn dopravního značení

Smyslem navrhovaných změn dopravního značení je zlepšení podmínek pro chodce v intravilánu městyse Davle na sil. II/102, která je předmětem probíhající rekonstrukce. Silnice II/102 je v intravilánu městyse průjezdním úsekem silnice II. třídy. V řešeném úseku je bez chodníků, vyjma krátkého úseku v ZÚ, kde je pravostranný chodník v dl. cca 63 m.

V intravilánu bude provedeno zúžení jízdních pruhů a levé zpevněné krajnice,

čímž vznikne prostor pro chodce vpravo (širší pravá zpevněná krajnice).

Změny dopravního značení jsou následující:
Vodorovné dopravní značení:

Intravilán

- zúžení šířky jízdních pruhů na 3,0 m (původně 3,5 m)
- zúžení levé zpevněné krajnice na 0,5 m (původně 0,75 m)
- plná dělící čára č. V 1a
- na pravé zpevněné krajnici budou vyznačeny piktogramy chodců bílé bary (obdoba cyklo-piktogramu) na červeném podkladě ROCBINDA po vzdálenosti dle situace
- doplnění V 12e před autobusovou zastávku Davle – U Kiliána ve směru Praha
- prodloužení vodorovného dopravního značení č. V 11a na autobusové zastávce Davle - U Kiliána směr Štěchovice na dl. 17 m

Extravilán

- na vjezdu do Davle od Štěchovic nevržena opticko-psychologická brzda č. V 18 **bez akustického efektu** (blízká zástavba)
- před plnou čárou č. V 1a bude dělící čára V 2b 3/1,5/0,125, včetně předběžných šipek č. V 9b

Vodorovné dopravní značení bude provedeno jako dvoufézové, barva/plast. Znační bude nehlučné. VDZ viz zásady pro vodorovné dopravní značení na PK – TP 133.

Svislé dopravní značení:

- pro zamezení parkování na pravé zpevněné krajnici bude osazeno SDZ č. V 29 – viz grafická příloha, vč. dodatkové tabulky E 13, která upřesňuje rozsah zákazu stání v příčném směru

Doplněné svislé dopravní značení bude provedeno v základní velkosti. Činná plocha SDZ č. B 29 bude provedena z retroreflexní fólie třídy RA1. Umístění v souladu s TP 65.

Dopravní knoflíky bílé barvy:

Pro zdůraznění pravé vodící čáry jsou navrženy bílé dopravní knoflíky č. Z 10 v pravidelném vzájemném odstupu cca 9 m. Knoflíky budou osazeny ve vzdálenosti 50 mm od vodící čáry směrem do jízdního pruhu (budou umístěny v jízdním pruhu).

Veškeré použité dopravní knoflíky musí být zapuštěné (i na mostech), tělo knoflíku nesmí být vyrobeno ze slitin na bázi hliníku. Detaily osazení dopravních knoflíků stanovují „Výkresy opakovaných řešení“ ŘSD tzv. R-plány. Dopravní knoflíky budou provedeny dle PPK-VZ. (Jedná se o předpisy ŘSD, KSÚS nemá pro toto svoje předpisy).

Balisety zelené barvy:

Pro oddělení prostoru pro chodce od vozovky jsou navrženy plastové balisety zelené barvy č. Z 11h ve vzájemném odstupu dle situace DZ cca 20-25 m (v ojedinělých případech až 40 m). V místech vjezdů bude jejich poloha i rozestup

přizpůsoben místním podmínkám. Zásady pro používání viz TP 58.

6. Projednání navrhovaných změn

Tato změna DZ, která je předmětem této změnové dokumentace byla projednána s městysem Davle, Dopravní policí a IDSK. Jejich stanoviska jsou přílohou této technické zprávy.
Tato změna DZ je koordinována se změnou stavby před dokončením, která byla vydána pro „zvýšený odrazný proužek“ Davle – U Kiliána směr Praha.

7. Splnění požadavků DOSS, DI-PČR, IDSK

Požadavek IDSK č. 0619/22 ze dne 15.2.2022 byl zapracován.

V Praze dne 18.2.2022, aktualizace 14.2.2023
Ing. Ctibor

Přílohy:

- stanovisko IDSK (integrovaná doprava Středočeského kraje)
- stanovisko dopravní police
- stanovisko městyse Davle

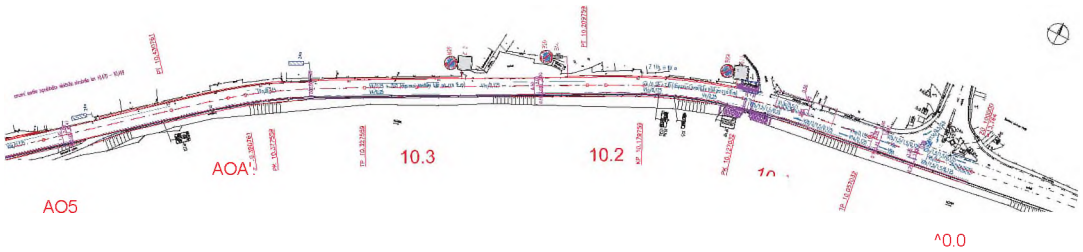

r


2I
1
!
10.8
"0.7
-10.9
/
/
r
^o
S


12.1
12.0
11.9
11.8
11.7
11.6
11.5
11.4
11.3
11.2
11.1
11.0

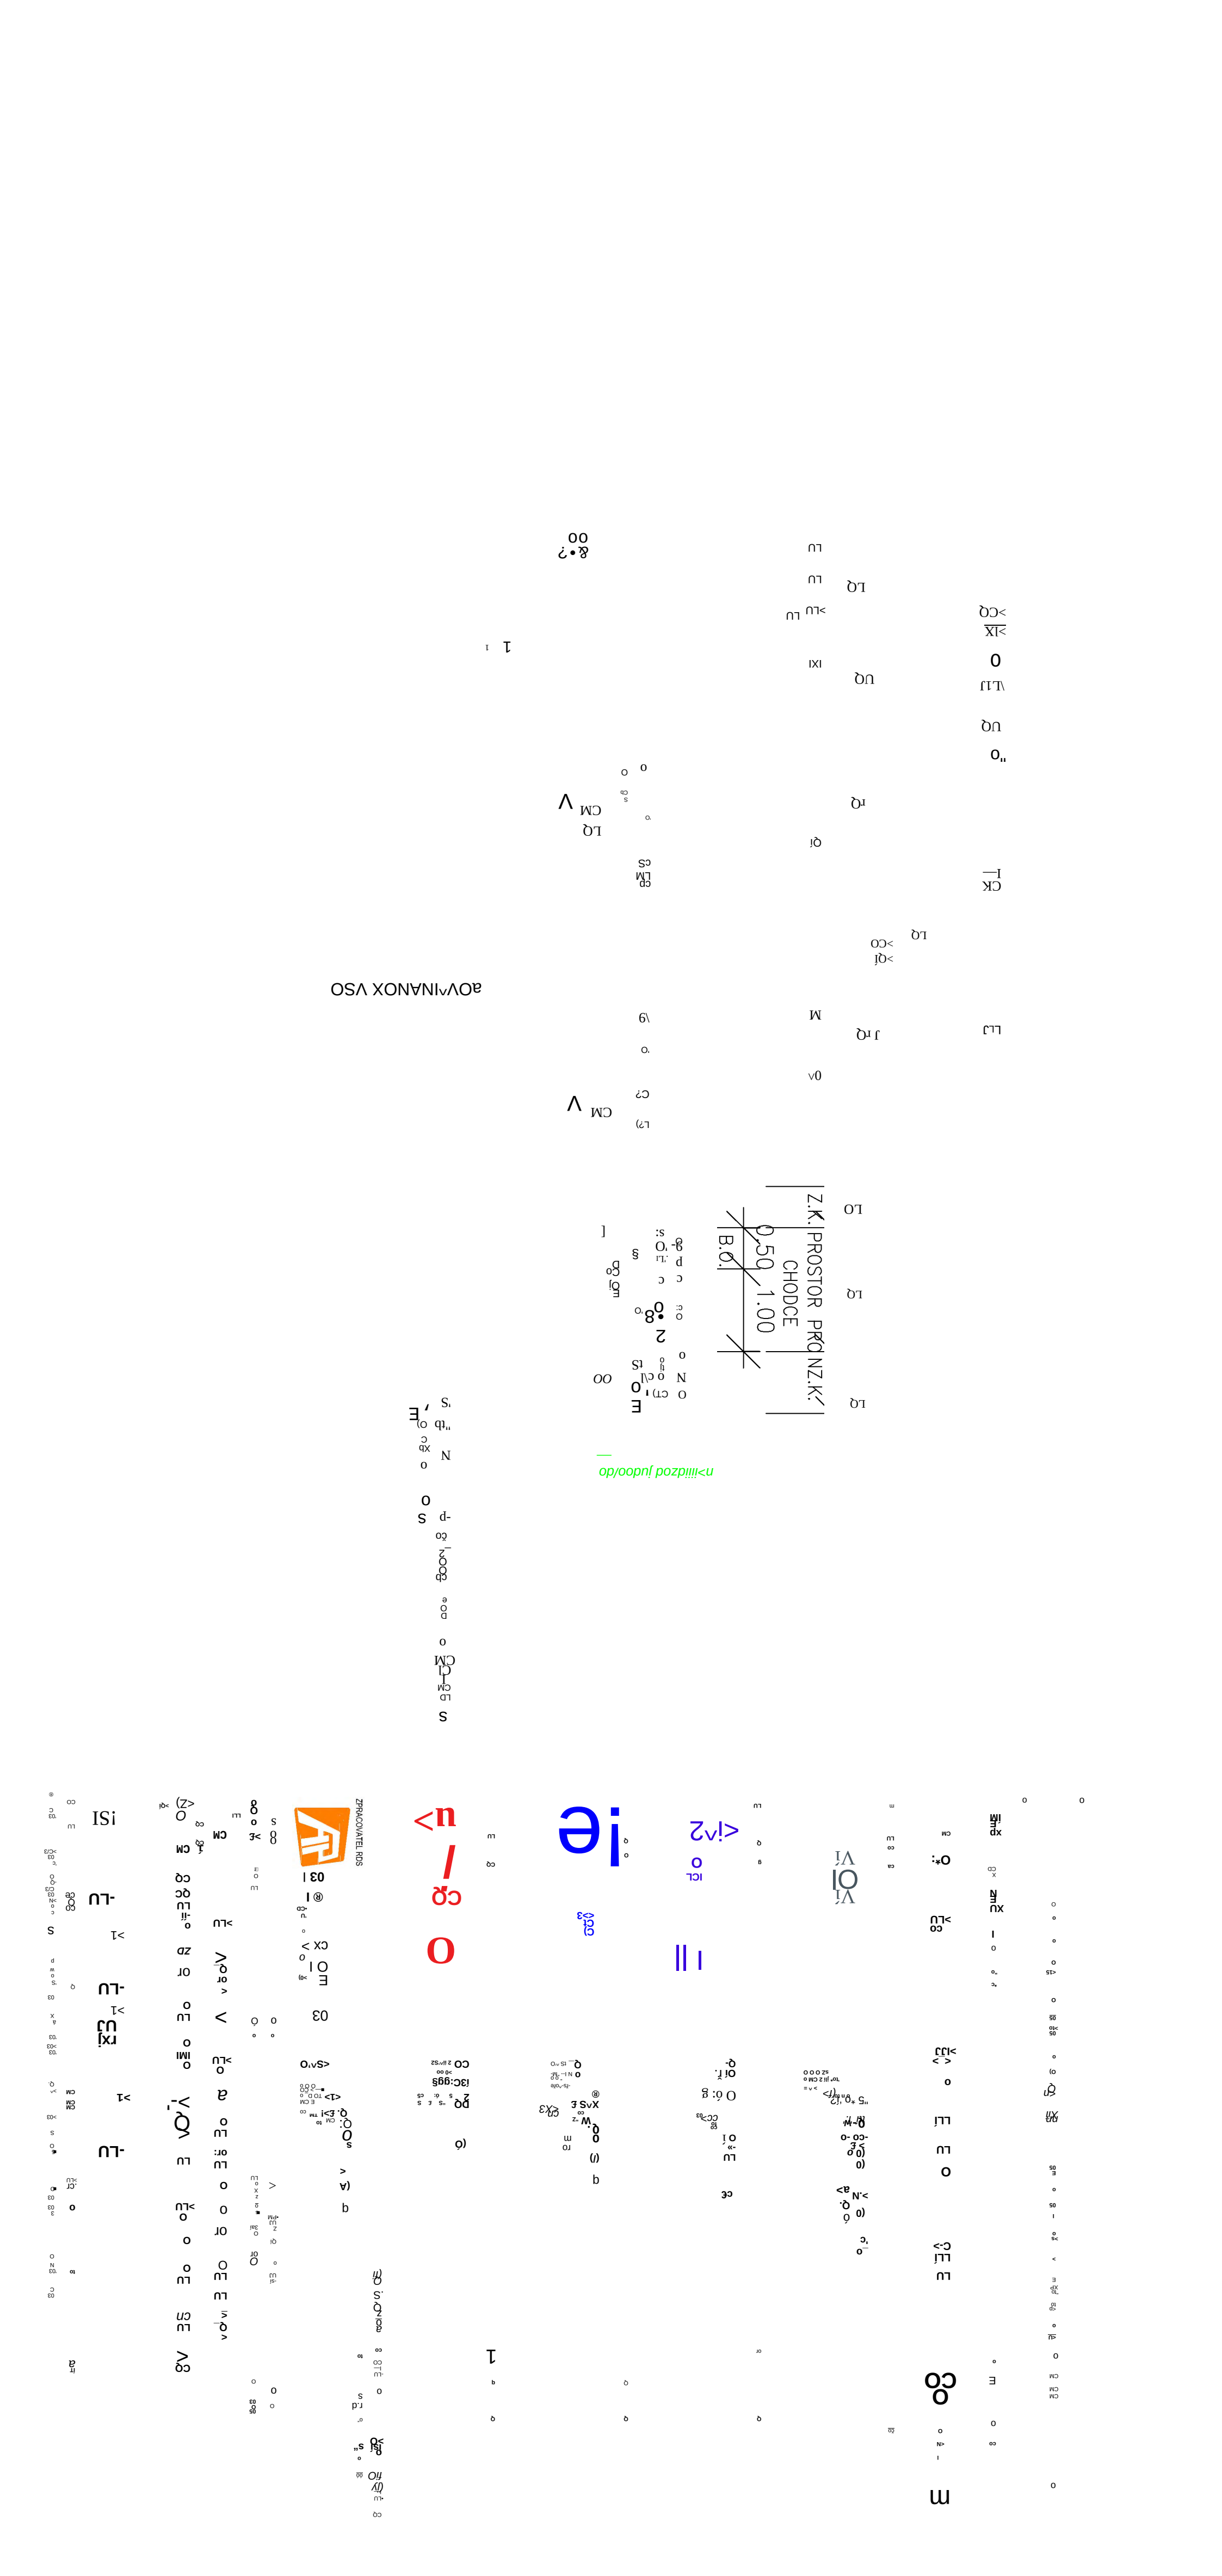

STRABAG a.s.
Odštěpný závod Praha
Kačírkova 982/4
158 00 Praha5

Vynzuje:
Ina.Karel Šimek

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje
Ing. Milan Peška
Zborovská 11
15021 Praha 5

Naše značka:
KSÚS_/44

Předmět: Oznámení o nové skutečnosti

Název stavby: 11/102 hr. hl. města Prahy-Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA II.

V souladu se smlouvou o dílo č. **S-468/00066001/2020** Vás informujeme o následujících nově zjištěných skutečnostech
Na požadavek městyse Davle z důvodu zlepšení podmínek bezpečnosti chodců v rámci silničního provozu pohybujících se podél silnice 11/102 v intravilánu Davle byla provedena změna dopravního značení vodorovného a svislého, zlepšující podmínky pro chodce jako účastníky silničního provozu..
Rozsah změny se týká úseku v provozním staničení km 10,0-11,960, tedy těsně za hranice městyse.
Byla projednána s IDSK, policií ČR a městysem Davle a objednatelem. Zahrnuje šířkovou úpravu jízdních pruhů-zúžení, vytvoření koridoru pro pěší ohraničeném VDZ a SDZ doplněném o balisety, dopravní knoflíky u pravé vodící čáry rekonstruované silnice a piktogramy na asfaltobetonové vozovce.
Žádáme tímto (zapsáno v příslušném stavebním deníku) o písemný pokyn k provedení prací nad rámec smlouvy.

S přátelským pozdravem

STRABAG a.s.
Ústřední 423/62
102 00 Praha 10/Česká republika

Tel. +420 272 701-667
Fax +420 272 701-701

československá obchodní banka, a.s.
IBAN: CZ02 0300 0000 0001 1207 1233
BIC/SWIFI: CEKOCŽPPXXX

Sídlo společnosti: Kačírkova 982/4,158 00 Praha 5 - Jinonice. Zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, sp. zn. B 7634.
IČO 60838744, DIČ CZ60838744

lí sús

Krajsíiáspráva a iiilríhaAÍ/IIÍC Slřeilaěeského kraje, /myitévkavá tirgaiiizace, /(' <)0066íI)III. 151) 21 PKA/Í.Í 5. /.harov.iká II

STRABAG a.s
Kačírkova 982/4.
158 00 Praha 5

Věc: Souhlasné stanovisko k ZBV

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace v návaznosti na projednání s TDS a zhotovitelem v rámci akce ..11/102 hr. hl, města Prahy-Štěchovice. rekonstrukce, **ETAPA 11“ souhlasí** s navrženou a projednanou změnou. Jmenovitě souhlasí se změnou vodorovného i svislého dopravního značení na základě požadavku města Davle v intravilánu městyse v km 10,000 - 11,960.

Další práce požadujeme provést v koordinaci v souladu s pokyny AD a TDS a v souladu s uzavřenou SOD.

S pozdravem

Ing. Tím^Peška
technicko - provozní náměstek

K 0111166111)1
DIČ CZOIIOóóOOl

e-iíjaií
íefeíon

typ čáry	délka čáry	původní plocha čáry dle typu z PDPS	plocha nové čáry	změna v RDS (nárůst původní ploškы* o)	
změna V 2b 3/1,5/0,125 na V1 a/0,125	480	40	60	20	
změna V 2b 3/6/0,125 na V1 a/0,125	838	35	104,75	70	
V9b		0	3,9	3,9	
V18		0	15	15	
V11a/0,125/2,5/22 (v levém JP)		0	8	8	
nápis BUS v zasástávce BUS		0	1,5	1,5	
celkem VDZ navíc		75	193	118	m2

VDZ B20a				1	ks

položka	-	-	-	změna v RDS (nárůst původní ploškы* o)	
Z11h - baliseta zelená				49	ks
SDZ B29 vč. sloupku				4	ks
dodatková SDZ E8 (bez sloupku)				2	ks
piktogram na vozovce chodci (červený podklad)				28	ks
dopravní knoflíky bílé trvala zapuštěné				176	ks

* v případě, že taková položka v PDPS nebyla, bude se jednat o novou položku

.A,

Držitel certifikátu ČSN EN ISO 9001:2016,
ČSN EN ISO 14001 ;2016 a ČSN ISO 45001:2018

Strana; 1/2

SOUPIS PRACÍ

Doklad č.: 613 230551

Zhotovitel: SAFEROAD Czech Republic s.r.o.

Plzeňská 666
330 21 Líně

IČ : 25229761
DIČ : CZ25229761

Objednatel: STRABAGa^.

Kačírkova 982/4
158 00 Praha 5, Jinonice

IČ : 60838744
DIČ : CZ60838744

Číslo SoD *I* objednávky: návrh dodaticu SOD

Místo unčenZ .'STRABAG a.s.
odštěpný závod Praha
Lidická 802
266 01 Beroun

Zakázka : 20221029a

Datum dodání :26.06.2023

Obchodní zástupce : Vejvodová Andrea
+420730551816

Odpovědný stavbyvedoucí ;Vacek Ladislav

Název stavby : 11/102 Praha - Štěchovice, II. etapa - změna - SDZ

Popis provedených prací;

řádek	Označení	Popis dodávky	JC bez DPH	Množství MJ	Sleva %	Cena bez DPH celkem	Cena bez DPH po slevě
1	11200013	Sloupek pozink průměr 60 4x3m	275,00	12,00 m		3 300,00	3 300,00 CZK
2	11200015	Víčko na sloupek průměr 60	14,00	4,00 ks		56,00	56,00 CZK
3	11200017	patka Al komplet	489,00	4,00 ks		1 956,00	1 956,00 CZK
4	11200024	Upínka Al pr. 60 - komplet vč. šroubů	37,00	16,00 ks		592,00	592,00 CZK
5	12100150	Ballseta zelená vč. kotevních šroub	58,00	49,00 ks		61 642,00	61 642,00 CZK
6	12800038	Montáž.SDZákl.vel.	169,00	8,00 ks		1 352,00	1 352,00 CZK
7	12800042	montáž ballsety	270,00	49,00 ks		13 230,00	13 230,00 CZK
8	41100129	E13 l.tř. 500x500 mm dodatková tabug	85,00	2,00 ks		1 170,00	1 170,00 CZK
9	41100651	B29 l.tř. 700 mm	924,00	4,00 k&		3 696,00	3 696,00 CZK
10	41100891	E8 c l.tř. 150x500mm	231,00	2,00 ks		462,00	462,00 CZK
11	99400007	doprava - servis, montáž	30,00	212,00 km		6 360,00	6360,00 CZK

bude fakturováno na základě skutečnosti
1 X nájezd montáž .

93 816,00 CZK

Zjištěné závady a nedodělky:

Termín odstranění:

SOUPIS PRACf

Doklad č.; 613 230551

Za zhotovitele /

Předal *rí/\.* **n ’•**

Podplí

Za objednatele

Převzal'jméno:

Podpis:

Dne: ŽCí ó. Pc

One:

Zpracováno systémem LCS Hellos IQ

a **SAFE** company

Držitel certifikátu ČSN EN ISO 9001:2016,
ČSN EN ISO 14001:2016 a ČSN ISO 450012018

SOUPIS PRACÍ

Doklad č,: 613 230552

Zhotovitel: SAFEROAD Czech Republic s.r.o.

Plzeňská 666
330 21 Líně
IČ : 25229761
DIČ : CZ25229761

Objednatel: STMBhOaje.

Kačírkova 982/4
158 00 Praha 5, Jinonice
1Č : 60838744
DIČ : CZ60838744

ČÉBlo SoD / objednávky; SDPZZ6AC/841/TC/GI/2021/014Z *ydfsto* ui«enZ.*STRABA6 a.6.

Zakázka ; 20221Q29b

Datum dodání :28.06.2023

odštěpný závod Praha
Lidická 802
266 01 Beroun

Obchodní zástupce

Odpovědný stavbyvedoucí :Šnibař Michal

Název stavby : 11/102 Praha • Šťechevlce, 11. etapa - změna • VOZ

Popis provedených prací; .

řádek	Označení	Popis dodávky	JC bez DPH	Množství MJ	Sleva %	Cena bez DPH celkem	Cena bez DPH po slevě
1	20100044	• začerněnf původního značení 150,00 čára 0,25 - 173m2: čára 0.125 - 74m2		247,00 m2		37 050,00	37 050,00 CZK
2—20100070	VDZ barva bílé - str^níčsto /18O,OO	y^OO		752,00 m2e		135 360,00	135 360,00 CZK
----------	Ó.125 - 150m2;-ČŽra 0,25 ♦602rfÍ2: (včetně nálealu + předznačeni)						
3	20200013	VDZ plast bílý-plechy	333,00	15,00 m2-»^ / 4995,00			4995,00 CZK
4	20200017	VOZ plast bílý . Šipka jednoduchá	394,00	8,00 ks <.		3 152,00	3 152,00 CZK
5	20200019	VDZ plast žlutý ■plochy červený	450^	40,50 m2		18 225,00	18 225,00 CZK
6	20200033	VDZ plast bílý - symbol malý piktogram na vozovce cůiodci	480.00	; 27X10 ks t/		12 960,00	12 960,00 CZK
7	20400060	VDZ - Celková realizace (2)	1 053,00	16.00 hod <		16848,00	16 848,00 CZK
							228 590,00 CZK

Zjištěné závady a nedodělky;

Termín odstranění:

Zpracováno systémem LCS Helios IQ

a **SAFE** company

SOUPIS PRACÍ

Doklad č.: 613 230551

Za zhotovitele

Předal - jméno: Vévodové Andrea

Podpis:

Dne:

Za objednatele

Převzat - Jméno:

Podpis:

Dne:

SAFEROAD Czech Republic s.r.o. I Plzeňské 666.330 21 Líně I tel. 377 2^ 226 I Dlzeniai8aferoad.cz

IČO : 262297611 DIČ: CZ252297611 Zapsáno v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni oddíl C. vložka 10825 I www.saferoad.cz

11/102 Štěchovice II etapa - změna - SDZ

poř. č.	popis	m.j.	množství	cena	cena celkem
1	Sloupek pozink průměr 60 4x3 m	m	12,00	316,00	3 792,00
2	Víčko na sloupek průměr 60	ks	4,00	17,00	68,00
3	patka Al komplet	ks	4,00	520,00	2 080,00
4	Upinka Al pr. 60-komplet vč^ šroubů	ks	16,00	45,00	720,00
5	Ballseta zelená vč. kotevních šroubů	ks	49,00	1 272,00	62 328,00
6	Montáž - SDZ zákl. vel.	ks	8,00	186,00'	1 488,00
7	Montáž balisety	ks	49,00	298,00'	14 602,00
8	E13 l.tř. 500x500 mm dodatková tabulka	ks	2,00	624,00	1 248,00
9	B29 i. Tř. 700 mm	ks	4,00	112,00	448,00
10	E8 c I. Tř. 150x500 mm	ks	2,00	255,00	510,00
11	doprava - servis, montáž	ks	212,00	42,00	8 904,00
	celkem				**96 188,00**

11/102 Štěchovice II etapa - změna - VDZ

poř. č,	popis	m.j.	množství	cena	cena celkem
1	VDZ - začernění původního značeni čára 0,25 - 173m2, čára 0,125 - 74 m2	m2	247,00	170,00	41 990,00
2	VDZ barva bílá - stroj město čára 0,125-150 m2, čára 0,25 - 602m2 (včetně nájezdu a předznačení	m2	752,00	192,00	144 384,00
3	VDZ plast bílý - plochy	m2	15,00	345,00	5 175,00
4	VDZ palast bílý - šipka jednoduchá	ks	8,00	405,00	3 240,00
5	VDZ plast žlutý - plochy červený	m2	40,50	473,00	19156,50
6	VDZ plaast bílý - symbol malý (piktogram na vozovce chodci)	ks	27,00	496,00	13 392,00'
7	VDZ - celková realizace (2)	hod	16,00	1 200,00	19 200,00
	celkem				**246 537,50**

změna SDZ - komunikace 11/102 Štěchovice II etapa

p. č.	popis	množství	m.j.	cena	cena celkem
1	Sloupek pozink průměr 60 4x3 m	12,00	m	350,00	4 200,00
2	Víčko na sloupek průměr 60	4,00	ks	15,00	60,00
3	patka AI komplet	4,00	ks	520,00	2 080,00
4	Upínka AI pr. 60-komplet vč. šroubů	16,00	ks	55,00	880,00
5	Baliseta zelená vč. kotevních šroubů	49,00	ks	1 500,00	73 500,00
6	Montáž - SDZ zákl. vel.	8,00	ks	250,00	2 000,00
7	Montáž balisety	49,00	ks	350,00	17 150,00
8	El 3 l.tf. 500x500 mm dodatková tabulka	2,00	ks	650,00	1 300,00
9	B29 i. Tř. 700 mm	4,00	ks	930,00	3 720,00
10	E8 c I. Tř. 150x500 mm	2,00	ks	300,00	600,00
11	doprava - servis, montáž	212,00	ks	60,00	12 720,00
	bude fakturováno na základě skutečnosti 1 X nájezd montáž				
	cena celkem				118 210,00

změna VDZ -11/102 Štěchovice II etapa

p. č.	popis	množství	m.j.	cena	cena celkem
1	VDZ - začernění původního značení	247,00	m2	165,00	40 755,00
	čára 0,25 - 173m2, čára 0,125 - 74 m2				
2	VDZ barva bílá - stroj město	752,00	m2	220,00	165 440,00
	čára 0,125 - 150 m2, čára 0,25 - 602m2 (včetně nájezdu a předznačeni)				
3	VDZ plast bílý - plochy	15,00	m2	350,00	5 250,00
4	VDZ plast bílý - šipka jednoduchá	8,00	ks	425,00	3 400,00
5	VDZ plast žlutý - plochy	40,50	*m2*	470,00	19 035,00
	červený				
6	VDZ plast bílý - symbol malý	27,00	ks	530,00	14 310,00
	piktogram na vozovce chodci				
7	VDZ - celková realizace (2)	16,00	hod	1 150,00	18 400,00
	cena celkem				266 590,00

B 7634/RD683/MSPH
Fj 479008/2022/MSPH

USNESENÍ

Městský soud v Praze rozhodl vyšší soudní úřednicí Marií Šiškovou v právní věci

navrhovatele: **STRABAG a.s.**, IČO 608 38 744
sídlem Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5

o návrhu na zápis změny do obchodního rejstříku

takto:

V obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze v oddílu B, vložce číslo 7634

se vymazává

Statutární orgán
člen představenstva
Ing. JARMILA POVAŽANOVÁ, dat. nar. 19. října 1962, r.č. 626019/6514
82101 Bratislava, Drieňova 16175/1B, Slovenská republika
Den vzniku členství: 3. června 2019

Prokura
Ing. RENATA HAMRSKÁ, dat. nar. 19. března 1961, r.č. 615319/0153
Hvozdíková 837, Liberec XXV-Vesec, 463 12 Liberec

Ing. TOMÁŠ HOZA, dat. nar. 8. května 1969, r.č. 690508/4406
Purkyňova 749/10, 767 01 Kroměříž

Ing. JIŘÍ JAROŠ, dat. nar. 31. ledna 1962, r.č. 620131/0643
Plachého 272/25, České Budějovice 1, 370 01 České Budějovice

se zapisuje

Statutární orgán
U vymazávané osoby: Ing. JARMILA POVAŽANOVÁ, dat. nar.19. října 1962, r.č.626019/6514
Den zániku členství: 7. prosince 2022

člen představenstva
Ing. TOMÁŠ HOZA, dat. nar. 8. května 1969, r.č. 690508/4406
Purkyňova 749/10, 767 01 Kroměříž
Den vzniku členství: 8. prosince 2022

Prokura
Ing. KAREL KLOFÁČ, dat. nar. 18. června 1973, r.č. 730618/2972
U Rybníčku 4041, 580 01 Havlíčkův Brod

Shodu s prvopisem potvrzuje Ilona Žďárská

Den zápisu změny: Dnem nabytí právní moci

Poučení:

Proti tomuto usnesení lze podat odvolání do patnácti dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím nadepsaného soudu.

Praha 19. prosince 2022

Marie Šišková v. r.
vyšší soudní úřednice

Shodu s prvopisem potvrzuje Ilona Žďárská

Výpis

z obchodního rejstříku, vedeného
Městským soudem v Praze
oddíl B, vložka 7634

Datum vzniku a zápisu:
1. března 1994

Spisová značka:
B 7634 vedená u Městského soudu v Praze

Obchodní firma:
STRABAG a.s.

Sídlo:
Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5

Identifikační číslo:
608 38 744

Právní forma:
Akciová společnost

Předmět podnikání:
Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

projektová činnost ve výstavbě

výroba betonu a obalovaných živičných směsí

opravy silničních vozidel

hornická činnost a činnost prováděná hornickým způsobem v rozsahu: (otvírka, příprava a dobývání výhradních ložisek s omezením pro povrchové dobývání; zřizování, zajišťování a likvidace důlních děl; úprava a zušlechťování nerostů prováděné v souvislosti s jejich dobýváním; zřizování a provozování odvalů, výsypek a odkališť; dobývání ložisek nevyhrazených nerostů, vyhledávání a průzkum ložisek nevyhrazených nerostů; podzemní sanační práce; zemní práce prováděné za použití strojů a výbušnin; podzemní práce spočívající v hloubení důlních jam a studní, v ražení štol a tunelů)

silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny, - vnitrostátní příležitostná osobní, - mezinárodní příležitostná osobní

výkon zeměměřických činností

provádění trhacích a ohňostrojných prací

výzkum, vývoj, výroba, ničení, zneškodňování, zpracování, nákup a prodej výbušnin

zámečnictví, nástrojářství

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení

poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

distribuce pohonných hmot

Statutární orgán:

předseda představenstva:

Dipl. Ing. MORITZ FREYBORN, dat. nar. 1. září 1975
1180 Vídeň, Haizingergasse 1-3/32, Rakouská republika
Den vzniku funkce: 1. listopadu 2022
Den vzniku členství: 1. listopadu 2022

člen představenstva:

Ing. PAVEL BRYCHCÍN, dat. nar. 25. května 1972
Zakšínská 607/11, Střížkov, 190 00 Praha 9

Den vzniku členství: 1. července 2020

člen představenstva:

Ing. TOMÁŠ HOZA, dat. nar. 8. května 1969
Purkyňova 749/10, 767 01 Kroměříž
Den vzniku členství: 8. prosince 2022

Počet členů:

3

Způsob jednání:

Statutárním orgánem je představenstvo. Jménem společnosti jedná vůči třetím osobám, před soudy, správními a samosprávnými orgány ve všech záležitostech představenstvo a to vždy předseda představenstva s dalším členem představenstva nebo dva členové představenstva. Podepisování se děje tím způsobem, že k napsané firmě společnosti nebo otisku razítka připojí svůj podpis předseda představenstva s dalším členem představenstva nebo dva členové představenstva s označením své funkce.

Prokura:

Ing. RADEK HRADIL, dat. nar. 2. února 1964
Okružní 660, Mařatice, 686 05 Uherské Hradiště

Ing. ROSTISLAV KRONES, dat. nar. 8. května 1968
č.p. 46, 592 03 Kadov

Ing. JIŘÍ HORÁLEK, dat. nar. 16. listopadu 1964
Ludvíka Podéště 777/16, Stránice, 602 00 Brno

Ing. JAN HÝZL, dat. nar. 6. ledna 1976
Profesora Fuky 1276/4, Nová Ulice, 779 00 Olomouc

Ing. JAN CHROMÝ, dat. nar. 30. června 1974
Litvínovice - Mokré 119, PSČ 37001

Ing. PAVEL KLAS, dat. nar. 22. listopadu 1964
č.p. 5, 386 01 Radošovice

Ing. RADIM AULICKÝ, dat. nar. 22. června 1974
Oldřicha Nového 833, 252 64 Velké Přílepy

Ing. ALEXEJ KOROTKOV, dat. nar. 1. dubna 1978
Lechowiczova 2827/11, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava

Ing. LUKÁŠ PŘIBYL, dat. nar. 21. prosince 1982
Slunečná 333, 373 71 Adamov

Ing. RICHARD FISCHER, dat. nar. 7. října 1975
V Podhradí 33, 250 73 Jenštejn

Ing. Mag. MICHAL PRISTAŠ, dat. nar. 14. dubna 1981
2460 Bruckneudorf, Marc Aurel Strasse 2f, Rakouská republika
Ing. Mag. Michal Pristaš je oprávněn zastupovat Společnost spolu s dalším prokuristou. Toto zmocnění zahrnuje i oprávnění nabýt, zcizit nebo zatížit nemovitou věc.

MICHAL VANĚČEK, dat. nar. 27. března 1978
Pod Nouzovem 1007/25, Kbely, 197 00 Praha 9

Ing. MICHAL KOPPER, dat. nar. 15. května 1979
82104 Bratislava - Ružinov, Doležalova 3424/15F, Slovenská republika
Ing. Michal Kopper je oprávněn zastupovat Společnost spolu s dalším prokuristou. Toto zmocnění zahrnuje i oprávnění nabýt, zcizit nebo zatížit nemovitou věc.

Ing. TOMÁŠ RYS, dat. nar. 17. listopadu 1981
U sanatoria 737/20, Radotín, 153 00 Praha 5

PETR KAFKA, dat. nar. 21. února 1962
Sadová 246, Nemošice, 530 03 Pardubice

Ing. arch. JAN HAVELKA, dat. nar. 9. srpna 1988
č.p. 228, 373 32 Jílovice

Ing. JIŘÍ SVOBODA, Ph.D., dat. nar. 27. září 1984

U Hřiště 456, Mladcová, 760 01 Zlín

Ing. KAREL KLOFÁČ, dat. nar. 18. června 1973
U Rybníčku 4041, 580 01 Havlíčkův Brod

Ing. MARTIN BAŠÁR, dat. nar. 3. září 1979
Dělnická 443, 252 41 Dolní Břežany

K zastupování a podepisování za společnost jsou oprávněni vždy dva prokuristé. Prokuristé podepisují tím způsobem, že k firmě společnosti připojí svůj podpis s dodatkem označujícím prokuru.

Dozorčí rada:

předseda dozorčí rady:

Dipl. Ing. (FH) ALFRED WATZL, dat. nar. 13. září 1970
05-080 Izabelin C, Krasinskiego 37, Polská republika
Den vzniku funkce: 13. června 2022
Den vzniku členství: 13. června 2022

člen dozorčí rady:

Mgr. KARIN BÍLKOVÁ, dat. nar. 18. dubna 1975
Bezručova 603, 250 91 Zeleneč
Den vzniku členství: 4. prosince 2018

člen dozorčí rady:

Mag. HERIBERT HERZOG, dat. nar. 15. září 1964
7423 Grafenschachen, Grafenschachen 22, Rakouská republika
Den vzniku členství: 12. ledna 2023

Počet členů:

3

Jediný akcionář:

Bau Holding Beteiligungs GmbH
9800 Spittal an der Drau, Ortenburgerstraße 27, Rakouská republika
Registrační číslo: FN 117476 i
Právní forma: společnost s ručeným omezeným

Akcie:

1 000 ks kmenové akcie na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 10 000,- Kč

11 096 ks kmenové akcie na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 100 000,- Kč

Základní kapitál:

1 119 600 000,- Kč
Splaceno: 1 119 600 000,- Kč

Ostatní skutečnosti:

Akciová společnost byla založena notářským zápisem osvědčenou zakladatelskou listinou tří zakladatelů, fyzických osob, ze dne 23.2.1994, rozdělením současně zrušené společnosti s ručením omezeným SAREMO, se sídlem České Budějovice, ul.Plachého 27, na dvě nově vzniklé společnosti SAREMO a.s. a HYDROLINE s.r.o., se sídlem České Budějovice, Lidická 1131.
Zakladatelé současně schválili stanovy a.s. a zvolili členy orgánů společnosti.
Notářský zápis, zakladatelská smlouva a stanovy a.s. byly přiloženy.

Základní jmění je splaceno v plném rozsahu.

Valná hromada společnosti rozhodla dne 30.6.1999 o sloučení se společností STRABAG ČR a.s.

Na společnost STRABAG a.s. se sídlem Praha 5, Na Bělidle 198/21, PSČ 150 00, IČ 608 38 744, jako nástupnickou společnost, přešlo na základě smlouvy o fúzi sloučením ze dne 20. 11. 2006 s rozhodným dnem sloučení 1. 10. 2006 jmění společnosti ILBAU Plzeň a.s. se sídlem České Budějovice , Vrbenská 31,

IČ 648 34 352, jako zanikající společnosti.
Společnost STRABAG a.s. se sídlem Praha 5, Na Bělidle 198/21, PSČ 150 00 , IČ 608 38 744 je právním nástupcem bez likvidace zrušené a zaniklé společnosti ILBAU Plzeň a.s. se sídlem České Budějovice, Vrbenská 31, IČ 648 34 352, dosud zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích oddílu B vložce 1148.

Na společnost STRABAG a.s. se sídlem Praha 5, Na Bělidle 198/21, PSČ 150 00, IČ 608 38 744, jako nástupnickou společnost, přešlo na základě smlouvy o fúzi sloučením ze dne 20.11.2006 s rozhodným dnem sloučení 1.10.2006 jmění společnosti Stavební technologie, spol. s r.o. se sídlem Humpolec, Nádražní 729, okres Pelhřimov, PSČ 396 01, IČ 251 83 133, jajo zanikající společnosti.
Společnost STRABAG a.s. se sídlem Praha 5, Na Bělidle 198/21, PSČ 150 00, IČ 608 38 744 je právním nástupcem bez likvidace zrušené a zaniklé společnosti Stavební technologie, spol. s r.o. se sídlem Humpolec, Nádražní 729, okres Pelhřimov, PSČ 396 01, IČ 251 83 133, dosud zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích C 8266.

Obchodní společnost STRABAG a.s. jako společnost nástupnická převzala v důsledku vnitrostátní fúze sloučením jmění zanikající společnosti STRABAG konstrukce s.r.o., IČ 252 63 579, se sídlem Chrudim, Tovární 209.

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.

Na společnost STRABAG a.s., jako na společnost nástupnickou, přešlo v důsledku fúze sloučením jmění zanikajících společností JHP spol. s r.o., se sídlem Ústřední 423/62, Štěrboholy, 102 00 Praha 10, identifikační číslo 45798290 a MiTTaG spol. s r.o. pozemní a průmyslové stavitelství, se sídlem Na bělidle 198/21, Smíchov, 150 00 Praha 5, identifikační číslo 00547514. Rozhodným dnem fúze byl 1. leden 2016.

Na základě projektu vnitrostátní fúze sloučením ze dne 11.8.2017 došlo ke sloučení společnosti Dálniční stavby Praha, a.s., se sídlem Praha 5, Na Bělidle 198/21, PSČ 15000, identifikační číslo 40614948, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu B, vložce 744, jako zanikající společnosti, do společnosti STRABAG a.s., jako nástupnické společnosti, přičemž na nástupnickou společnost STRABAG a.s. přešlo jmění zanikající společnosti Dálniční stavby Praha, a.s.

Odštěpné závody:

Odštěpný závod:

Označení odštěpného závodu:

STRABAG a.s. odštěpný závod Praha

Sídlo nebo umístění:

Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5

Předmět podnikání:

montáž, opravy údržba revize vyhrazených el. zařízení

výroba betonu a obalovaných živičných směsí

výkon zeměměřických činností

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

zámečnictví, nástrojářství

opravy silničních vozidel

provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Vedoucí odštěpného závodu:

Ing. MARTIN BAŠÁR, dat. nar. 3. září 1979
Dělnická 443, 252 41 Dolní Břežany

Odštěpný závod:

Označení odštěpného závodu:

STRABAG a.s. odštěpný závod České Budějovice

Sídlo nebo umístění:

České Budějovice, Vrbenská 31, PSČ 37006

Předmět podnikání:

výkon zeměměřičských činností

projektová činnost ve výstavbě

výroba betonu a obalovaných živičných směsí

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

zámečnictví, nástrojářství

opravy silničních vozidel

provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Vedoucí odštěpného závodu:

Ing. PAVEL KLAS, dat. nar. 22. listopadu 1964
č.p. 5, 386 01 Radošovice

Odštěpný závod:

Označení odštěpného závodu:

STRABAG a.s. odštěpný závod Morava

Sídlo nebo umístění:

Holická 1004/29, Hodolany, 779 00 Olomouc

Předmět podnikání:

výroba betonu a obalovaných živičných směsí

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

opravy silničních vozidel

provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Vedoucí odštěpného závodu:

Ing. JAN HÝZL, dat. nar. 6. ledna 1976
Profesora Fuky 1276/4, Nová Ulice, 779 00 Olomouc

Odštěpný závod:

Označení odštěpného závodu:

STRABAG a.s. odštěpný závod pozemní a inženýrské stavitelství Praha

Sídlo nebo umístění:

Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5

Předmět podnikání:

výroba betonu a obalovaných živičných směsí

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny, - vnitrostátní příležitostná osobní, - mezinárodní příležitostná osobní

provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Vedoucí odštěpného závodu:

PETR KAFKA, dat. nar. 21. února 1962
Sadová 246, Nemošice, 530 03 Pardubice

Odštěpný závod:

Označení odštěpného závodu:

STRABAG a.s. odštěpný závod pozemní a inženýrské stavitelství České Budějovice

Sídlo nebo umístění:

České Budějovice, Vrbenská /31, PSČ 37006

Předmět podnikání:

- Provádění staveb, jejich změn a odstraňování
- projektová činnost ve výstavbě
- výkon zeměměřických činností
- zámečnictví, nástrojářství
- silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, -

nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny, - vnitrostátní příležitostná osobní, - mezinárodní příležitostná osobní
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
- montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení

Vedoucí odštěpného závodu:

Ing. JAN CHROMÝ, dat. nar. 30. června 1974
Mokré 119, 370 01 Litvínovice

Odštěpný závod:

Označení odštěpného závodu:

STRABAG a.s. odštěpný závod STRABAG Real Estate

Sídlo nebo umístění:

Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5

Předmět podnikání:

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor

Vedoucí odštěpného závodu:

Dipl. Ing. SONJA WERTITSCH, dat. nar. 29. září 1976
1210 Vídeň, Kugelfanggasse 79a, Rakouská republika

Tento výpis je neprodejný a byl pořízen na Internetu (http://www.justice.cz).
Dne: 7.9.2023 10:56
Údaje platné ke dni 7.9.2023 03:54

Naše značka: TD/304/19-120/VM/23
Vaše značka:

Vyřizuje:
Tel. +420 724 370 591

e-mail:
Datum: 9. 11. 2023

KSÚS Středočeského kraje

Ing. Milan PEŠKA
Technicko-provozní náměstek

Zborovská 11
150 21 Praha 5

Stavba: II/102 hr. hl. m Prahy – Štěchovice, rekonstrukce, etapa II.

Věc: Stanovisko TDS k návrhu ZBV č. 44 SO 102 Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice (Změna DZ).

Zhotovitel stavby dne 23. 8. 2023 předložil a po připomínkách TDS z 9. 10. doplnil 11.10. 2023 návrh ZBV č. 44 SO 102 (102/18) Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice (Změna DZ).

Návrh změny řeší požadavek městyse Davle na zvýšení bezpečnosti chodců v úseku 10,000 – 11,960.

Změna měla vliv na položky č. 70, 71, 77, 78, 79, 81, 82, 83, 85, 87, 90, 113, 114 a nové položky č. 130, 189, 190, 191, 192.

TDS potvrzuje skutečnosti uvedené v návrhu ZBV č. 44 SO 102 (102/18) Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice (Změna DZ).

M. Valenta
Technický dozor investora

Na vědomí: Ing. Karel Šimek

Krycí list ZBV

Název a evidenční číslo Stavby:	Číslo SO/PS /	Číslo ZBV:
II/102 hr. hl. města Prahy-Štěchovice, rekonstrukce. ETAPA II, Z2019-014610 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): **SO 102 - Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice**	/ číslo Změny SO/PS: **102/19**	**45**

Objednatel: Krajská správa a údržba Středočeského kraje, příspěvková organizace
Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5, Smíchov
IČ: 00066001 DIČ: CZ00066001

Zhotovitel: STRABAG a. s.
Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5
IČ: 60838744 DIČ: CZ60838744

Rekapitulace ZBV č. 45 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
45.1	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
45.2	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
45.3	0,00	1 134 682,17	1 134 682,17

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
45.4	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
45.5	0,00	0,00	0,00

Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
45	**0,00**	**1 134 682,17**	**1 134 682,17**

Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.
Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy
a pro Rozpis ocenění změn položek.

ZBV - krycí list	Číslo paré:

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby:	Číslo SO/PS /	Číslo ZBV:
II/102 hr. hl. města Prahy-Štěchovice, rekonstrukce. ETAPA II, Z2019-014610	/ číslo Změny SO/PS:	
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):	**102/19**	**45**
SO 102 - Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice		

Strany smlouvy o dílo č. S-468/00066001/2020 na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 3.3.2020 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Krajská správa a údržba Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5, Smíchov

Zhotovitel: STRABAG a. s., Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5

Přílohy Změnového listu:

1. Krycí list	1	počet listů
2. Změnový list	1	počet listů
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	1	počet listů
4. Rozpis ocenění Změn položek	1	počet listů
5. Přehled zařazení změn do skupin	2	počet listů
6. Přehled dalších dokladů	1	počet listů
Další doklady dle přehledu dokladů	92	počet listů

Paré č.	Příjemce
1, 2	Objednatel
3, 4	Zhotovitel
5	Projektant (AD)
6	Stavební dozor
7	Supervize

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis a zdůvodnění Změny:

Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice / Zastávka u Kiliána, ŠŽ ve stávajících zastávkách

V PDPS nebylo uvažováno na stávajících autobusových zálivech v km 11,687-11,720 vpravo a v km 11,220-11,258 vpravo s jiným odvodněním než odvedením vody výsledným sklonem nové asfaltobetonové vozovky. U autobusové zastávky u Kiliány (též v Davli) bylo uvažováno mimo tuto PD s mostní konstrukcí pro přístup k autobusové zastávce. Při projektování realizační dokumentace a na základě podrobného výškového prověření odtokových poměrů ve stávajících autobusových zálivech (téměř nulový podélný sklon vozovky), bylo navrženo a odsouhlaseno objednatelem odvodnění těchto přilehlých částí pomocí štěrbinového žlabu s proměnným dnem a vyvedením vody do vsakovací jímky mimo vozovku. Zastávka u Kiliána byla řešena z podnětu městyse Davle (příl. č. 8) a policie DI-ČR (příl č. jako změna stavby před dokončením, a to zřízením odrazného zvýšeného proužku podél silnice II/102 v místech stávající autobusové zastávky. Odvodnění této stavební úpravy včetně bezpečnostního zábradlí z vnější strany je uvažováno zase štěrbinovým žlabem s vnitřním spádem s vyvedením odvedené vody do skluzu zpevněného svahu. Změna st týká položek číslo 6, 8, 9,11, 16, 18, 19, 21, 22, 31, 41, 50, 51, 55, 56, 92, 93, 94, 105, 119, 121, 124, 125, 126, 128, 129 a nových položek číslo 130, 160, 170, 187 a 193-209.

Jedná se o Změnu nepodstatnou, nepředvídanou, která je tak podle § 5, odst. 1, písm.c), resp. podle § 10 Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 01.01.2022) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zařazena do Skupiny 3 (změny z nepředvídaných důvodů). Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky.
Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. Změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst. 6 se jedná o změnu, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a to z důvodu nepředvídaných fyzických podmínek vzniklých na stavbě v průběhu realizace a hodnota těchto dodatečných stavebních prací nepřekračuje 50 % původní hodnoty závazku.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných
0,00	**1 134 682,17**	**1 134 682,17**	**1 134 682,17**

Technická pomoc Objednatele	jméno	Ing. Lubomír Smetana	datum	podpis

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Zhotovitel (stavbyvedoucí): STRABAG a.s.	jméno	Ing. Karel Šimek	datum	podpis
Projektant (autorský dozor): Pontex, spol. s.r.o.	jméno	Ing. David Dvořáček	datum	podpis
Stavební dozor: Pragoprojekt, a. s.	jméno	Miroslav Valenta	datum	podpis

Supervize (Regionální dotační kancelář)	jméno		datum	podpis
Zástupce Objednatele: KSÚS SK	jméno	Ing. Milan Peška	datum	podpis
Zástupce Objednatele odpovědný za cenové projednání Změny	jméno	Ing. Jaroslava Jurková	datum	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele)	jméno	Ing. Jan Fidler, DiS.	datum	podpis
Zhotovitel	jméno	Ing. Martin Bašár Ing. Karel Klofáč	datum	podpis

	Číslo paré:

Příloha č. 3

ZÁPIS

o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS) pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 45

Název Stavby: **II/102 hr. hl. města Prahy-Štěchovice, rekonstrukce. ETAPA II**
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: 102/19
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 102 - Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
113 362 946,56

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	-14 482 870,38	32 669 367,15	131 549 443,33	18 186 496,77

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	0,00	1 134 682,17	33 804 049,32	29,82%

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1
stavební/montážní práce	-14 482 870,38	132 684 125,50	19 321 178,94	17,04%

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo 45													
Evidenční číslo a název stavby: Z2019-014610, II/102 hr. hl. města Prahy-Štěchovice, rekonstrukce. ETAPA II								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
Číslo a název SO/PS: SO 102 - Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice								102					
Číslo a název rozpočtu: SO 102 - Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice								Skupina změn 3					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11	122101103	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 1 a 2 objem do 5000 m3	M3	4 322,500	4 333,300	10,800	122,97	531 537,83	0,00	1 328,08	532 865,91	1 328,08	0,25%
15	131203101	Hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3	M3	0,315	1,355	1,040	4 417,49	1 391,51	0,00	4 594,19	5 985,70	4 594,19	330,16%
16	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	M3	15 023,840	15 072,520	48,680	504,88	7 585 236,34	0,00	24 577,56	7 609 813,90	24 577,56	0,32%
18	171201201	Uložení sypaniny na skládky	M3	10 725,990	10 774,670	48,680	16,70	179 124,03	0,00	812,96	179 936,99	812,96	0,45%
19	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	T	22 695,246	22 787,738	92,492	138,17	3 135 802,14	0,00	12 779,62	3 148 581,76	12 779,62	0,41%
21	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	M3	182,700	188,090	5,390	254,57	46 509,94	0,00	1 372,13	47 882,07	1 372,13	2,95%
22	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	M2	11 027,000	11 072,000	45,000	33,80	372 712,60	0,00	1 521,00	374 233,60	1 521,00	0,41%
41	569851111	Zpevnění krajnic štěrkodrtí (recyklát) tl 150 mm	M2	3 435,000	3 558,000	123,000	402,88	1 383 892,80	0,00	49 554,24	1 433 447,04	49 554,24	3,58%
31	451317777	Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu 1:5 z betonu prostého tl do 100 mm	M2	5 223,400	5 229,080	5,680	581,54	3 037 616,04	0,00	3 303,15	3 040 919,19	3 303,15	0,11%
49	594511111	Dlažba z lomového kamene s provedením lože z betonu	M2	5 226,400	5 232,400	6,000	2 927,76	15 301 644,86	0,00	17 566,56	15 319 211,42	17 566,56	0,11%
50	596811221	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva vel do 0,25 m2 plochy do 100 m2	M2	60,000	105,000	45,000	396,53	23 791,80	0,00	17 843,85	41 635,65	17 843,85	75,00%
51	59245212	dlažba zámková profilová základní 19,6x16,1x6 cm přírodní	M2	12,000	61,500	49,500	237,30	2 847,60	0,00	11 746,35	14 593,95	11 746,35	412,50%
55	592238230	*vpusť betonová uliční TBV-Q 500/626 D /dno/ 62,6 x 49,5 x 5 cm*	KUS	2,000	5,000	3,000	1 041,47	2 082,94	0,00	3 124,41	5 207,35	3 124,41	150,00%
56	592238200	*vpusť betonová uliční TBV-Q 500/290 K /skruž/ 29x50x5 cm*	KUS	2,000	5,000	3,000	609,76	1 219,52	0,00	1 829,28	3 048,80	1 829,28	150,00%
92	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	M	46,000	109,000	63,000	518,95	23 871,70	0,00	32 693,85	56 565,55	32 693,85	136,96%
93	59217031	*obrubník betonový silniční 100 x 15 x 25 cm*	M	46,000	80,100	34,100	135,29	6 223,34	0,00	4 613,39	10 836,73	4 613,39	74,13%
94	919122122	Těsnění spár zálivkou za tepla pro komůrky š 15 mm hl 30 mm s těsnicím profilem	M	696,000	894,000	198,000	116,82	81 306,72	0,00	23 130,36	104 437,08	23 130,36	28,45%
105	919735113	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 150 mm	M	5 585,200	5 783,200	198,000	130,38	728 198,38	0,00	25 815,24	754 013,62	25 815,24	3,55%
119	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	T	3 197,830	3 339,355	141,525	13,82	44 194,01	0,00	1 955,88	46 149,89	1 955,88	4,43%
121	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	T	79 690,604	81 671,954	1 981,350	7,03	560 224,95	0,00	13 928,89	574 153,84	13 928,89	2,49%
124	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	T	310,867	316,147	5,280	51,81	16 106,02	0,00	273,56	16 379,58	273,56	1,70%
125	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	T	4 352,138	4 426,058	73,920	5,76	25 068,31	0,00	425,78	25 494,09	425,78	1,70%
126	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	T	10 352,419	10 441,849	89,430	34,54	357 572,55	0,00	3 088,91	360 661,46	3 088,91	0,86%
128	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	T	5 047,476	5 066,097	18,621	147,76	745 815,05	0,00	2 751,44	748 566,49	2 751,44	0,37%
129	998225194	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živičným, betonovým do 5000 m	T	5 047,476	5 066,097	18,621	29,55	149 152,92	0,00	550,25	149 703,17	550,25	0,37%
		NOVÉ POLOŽKY											
130	02910.	OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ	KPL	0,000	5 694,210	5 694,210	1,00	0,00	0,00	5 694,21	5 694,21	5 694,21	100,00%
137	636195111R	Vyplnění spár cementovou maltou dosavadní dlažby z lomového kamene	M2	0,000	6,000	6,000	357,00	0,00	0,00	2 142,00	2 142,00	2 142,00	100,00%
157	275313711	Základové patky z betonu tř. C 20/25	M3	0,000	1,040	1,040	4 160,00	0,00	0,00	4 326,39	4 326,39	4 326,39	100,00%
194	131151100	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem	M3	0,000	18,000	18,000	377,00	0,00	0,00	6 786,00	6 786,00	6 786,00	100,00%
160	132151101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I	M3	0,000	19,880	19,880	585,00	0,00	0,00	11 629,80	11 629,80	11 629,80	100,00%
193	113107172	Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 150 do 300 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	M2	0,000	56,800	56,800	334,00	0,00	0,00	18 971,20	18 971,20	18 971,20	100,00%
195	182351023	Rozprostření ornice pl do 100 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 200 mm strojně	M2	0,000	12,000	12,000	114,00	0,00	0,00	1 368,00	1 368,00	1 368,00	100,00%
196	28611176	*trubka kanalizační PVC DN 200x1000mm SN10*	M	0,000	12,000	12,000	906,00	0,00	0,00	10 872,00	10 872,00	10 872,00	100,00%
197	464531111	Pohoz z hrubého drceného kamenivo zrno 32 až 63 mm z terénu	M3	0,000	16,200	16,200	1 250,00	0,00	0,00	20 250,00	20 250,00	20 250,00	100,00%
170	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 150 mm	M2	0,000	45,000	45,000	139,52	0,00	0,00	6 278,40	6 278,40	6 278,40	100,00%
198	569903311	Zřízení zemních krajnic se zhutněním	M3	0,000	30,750	30,750	366,00	0,00	0,00	11 254,50	11 254,50	11 254,50	100,00%
210	59217011	*obrubník betonový zahradní 500x50x200mm*	M	0,000	33,000	33,000	116,00	0,00	0,00	3 828,00	3 828,00	3 828,00	100,00%
199	59217052	*obrubník betonový pro kruhový objezd vnější R0,5 200x270x300mm*	M	0,000	2,200	2,200	896,00	0,00	0,00	1 971,20	1 971,20	1 971,20	100,00%
200	59228436	*žlab štěrbinový betonový čistící 400x500x1000mm*	KUS	0,000	6,000	6,000	10 200,00	0,00	0,00	61 200,00	61 200,00	61 200,00	100,00%
201	871350310	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 10 z polypropylenu DN 200	M	0,000	12,000	12,000	161,00	0,00	0,00	1 932,00	1 932,00	1 932,00	100,00%
202	895941301	Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců dno s výtokem	KUS	0,000	3,000	3,000	1 120,00	0,00	0,00	3 360,00	3 360,00	3 360,00	100,00%

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo 45													
Evidenční číslo a název stavby: Z2019-014610, II/102 hr. hl. města Prahy-Štěchovice, rekonstrukce. ETAPA II									ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)				
Číslo a název SO/PS: SO 102 - Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice									102				
Číslo a název rozpočtu: SO 102 - Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice									Skupina změn 3				
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
203	895941322	Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců skruž středová 295 mm	KUS	0,000	3,000	3,000	654,00	0,00	0,00	1 962,00	1 962,00	1 962,00	100,00%
204	911111111	Zábradlí ocelové zabetonované - montáž a dodávka	M	0,000	25,800	25,800	5 561,99	0,00	0,00	143 499,34	143 499,34	143 499,34	100,00%
205	919735125	Řezání stávajícího betonového krytu hl přes 200 do 250 mm	M	0,000	320,000	320,000	517,00	0,00	0,00	165 440,00	165 440,00	165 440,00	100,00%
206	935114122	*Štěrbinový odvodňovací betonový žlab 450x500 mm se spádem 0,5% se*	M	0,000	92,000	92,000	3 720,00	0,00	0,00	342 240,00	342 240,00	342 240,00	100,00%
207	28376414	deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch 300kPA tl 20mm	M2	0,000	99,500	99,500	93,60	0,00	0,00	9 313,20	9 313,20	9 313,20	100,00%
208	113105113	Rozebrání dlažeb z lomového kamene kladených na MC vyspárované MC	M2	0,000	6,000	6,000	436,00	0,00	0,00	2 616,00	2 616,00	2 616,00	100,00%
209	113107232	Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 150 do 300 mm strojně pl přes 200 m2	M2	0,000	153,000	153,000	239,00	0,00	0,00	36 567,00	36 567,00	36 567,00	100,00%
		Celkem						34 343 143,90	0,00	1 134 682,17	35 477 826,07	1 134 682,17	3,30%

Odpovědný zástupce Objednatele i odpovědný zástupce Zhotovitele odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu.
Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny.

‹, (vedoucí projektu)

Datum:

Podpis:

Za Objednatele: Miroslav Valenta, (TDI)

Datum:

Podpis:

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN

Název a evidenční číslo Stavby: **II/102 hr. hl. města Prahy-Štěchovice, rekonstrukce. ETAPA II**

1	**Přijatá smluvní částka bez rezervy a DPH**	**377 812 002,59**
2=1+19+20	**Aktuální smluvní částka (cena stavby)**	401 069 557,15
	Aktuální smluvní částka (cena stavby) včetně DPH	**485 294 164,15**
3=(2/1)*100	**Procento změny Přijaté smluvní částky**	**106,16%**
4=(25/1)*100	**Sledování vyhrazených změn (Skupina 1)**	**0,00%**
5=(28/1)*100	**Sledování záměny položek (Skupina 2)**	**0,00%**
40=(19/1)*100	**Sledování limitu 15 % pro podstatnou změnu pro Změny záporné dle § 14, odst. (5), písm. b)**	**-7,31%**

6=32+36	**Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a Skupiny 4**	**24 019 821,91**
7=(6/1)*100	**Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4**	**6,36%**
8=1*0,3	**Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4**	**113 343 600,78**

9=(32A/1)*100	**Sledování limitu 50 % Skupina 3**	**18,48%**
10=(36A/1)*100	**Sledování limitu 50 % Skupina 4**	**1,24%**
10A=32A+36A	**Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných pro Skupinu 3 a Skupinu 4**	**74 487 584,03**
11=1*0,5	**Zákonný limit 50 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4**	**188 906 001,30**

12=(37/1)*100	**Sledování limitu (15%)**	**56 671 800,39**
13=37	**Sledování limitu 140 448 000 Kč**	**399839261,00%**
14=140448000-37		**136 449 607,39**

					- 1 -			- 2 -			- 3 -				- 4 -				- 5 -	
					Vyhrazené změny (Doměrky) (dle §100 zákona č. 134/2016 Sb.)			Záměna položek (dle §222 odst. (7) zákona č. 134/2016 Sb.)			Změny nepředvídané (dle §222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb.)				Změny nezbytné (dle §222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb.)				Změny de minimis	
SO	**ZBV č.**	**Název SO/PS / předmět Změny**	**Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus)**	**Změny kladné**	**Hodnota ZBV**	**Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus)**	**Změny kladné**	**Suma Změn záporných a Změn kladných**	**Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus)**	**Změny kladné**	**Suma Změn záporných a Změn kladných**	**Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus)**	**Změny kladné**	**Suma Změn záporných a Změn kladných**	**Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných**	**Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus)**	**Změny kladné**	**Suma Změn záporných a Změn kladných**	**Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných**	**Změny de minimus (15% nebo limit 140 448 000,- Kč**	**limit 15 %**
16	**17**	**18**	**19=23+26+29+33**	**20=24+27+30+34 +37+39**	**21=19+20**	**23**	**24**	**25=23+24**	**26**	**27**	**28=26+27**	**29**	**30**	**32=29+30**	**32A=ABS(29)+30**	**33**	**34**	**36=33+34**	**36A=ABS(33)+34**	**37**	**38=(37/1)*100**
		II/102 hr. hl. města Prahy-Štěchovice, rekonstrukce. ETAPA II	**- 27 614 211,04**	**50 871 765,60**	**23 257 554,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**- 25 171 327,38**	**44 639 625,29**	**19 468 297,91**	**69 810 952,67**	**- 62 553,68**	**4 614 077,68**	**4 551 524,00**	**4 676 631,36**	**3 998 392,61**	**0,01**
103	1	Rekonstrukce vozovky - Průtah Štěchovicemi / úprava poklopů a vodoznaků	0,00	124 942,66	124 942,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 942,66	124 942,66	124 942,66	0,00	0,00%
103/2	2	Rekonstrukce vozovky - Průtah Štěchovicemi / přeložka vodovodní přípojky km 14,815-14,895, kolize s kabelem CETIN	0,00	158 202,22	158 202,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 202,22	158 202,22	158 202,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
103/3	3	Rekonstrukce vozovky - Průtah Štěchovicemi / odstranění žulových kostek	- 147 928,60	470 739,23	322 810,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 147 928,60	470 739,23	322 810,63	618 667,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
103/4	4	Rekonstrukce vozovky - Průtah Štěchovicemi / oprava objízdné trasy Masečín	0,00	514 671,37	514 671,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514 671,37	514 671,37	514 671,37	0,00	0,00%
103/5	5	Rekonstrukce vozovky - Průtah Štěchovicemi / kolize kabelů s kanalizací a novým profilem vozovky	0,00	1 072 447,19	1 072 447,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 072 447,19	1 072 447,19	1 072 447,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
102	6	Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice / zvýšené množství odstraňování křovin	- 62 553,68	2 301 662,61	2 239 108,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 62 553,68	2 301 662,61	2 239 108,93	2 364 216,29	0,00	0,00%
901	7	Provizorní most přes Kočábu / změna založení mostního provizoria	- 535 759,98	1 068 988,13	533 228,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 604 748,11	0,42%
207	8	Most ev.č.102-017 / Zajištění skalního svahu	0,00	728 985,00	728 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	728 985,00	728 985,00	728 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
207/2	9	Most ev.č.102-017 / odstranění vrstvy žulových kostek + podkladní vrstva pod OP1	0,00	75 186,27	75 186,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 186,27	75 186,27	75 186,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
102/2	10	Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice/ frézování a doplnění konstrukčních vrstev vozovky	0,00	43 669,94	43 669,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 669,94	43 669,94	43 669,94	0,00	0,00%
103/6	11	Rekonstrukce vozovky - průtah Štěchovicemi / předláždění chodníků, obruby, úprava plotové zídky u křižovatky Hlavní a Školní	0,00	671 285,54	671 285,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	671 285,54	671 285,54	671 285,54	0,00	0,00%
102/3	12	Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice / odvodňovací proužek	- 1 844 570,00	549 074,50	- 1 295 495,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 393 644,50	0,63%
102/4	13	Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice / Úprava svahu dlažbou z lomového kamene km 10,360-10,840 L.S.	0,00	5 693 724,53	5 693 724,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 693 724,53	5 693 724,53	5 693 724,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
253	14	Opěrné zdi - Davle - Štěchovice - vlevo / sanace základové spáry v založení SO 253, zeď č. 61 vlevo	0,00	277 190,48	277 190,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277 190,48	277 190,48	277 190,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
102/5	15	Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice / Km 13,200-13,700 svodidlo, krajnice, žulové kostky	0,00	881 187,01	881 187,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	881 187,01	881 187,01	881 187,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
334	16	Kanalizace ve Štěchovicích / zaslepení nefunkční dešťové kanalizace	0,00	587 837,86	587 837,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	587 837,86	587 837,86	587 837,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
102/6	17	Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice /Změna množství odfrézovaných vrstev AB	- 784 390,50	1 450 696,44	666 305,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 784 390,50	1 450 696,44	666 305,94	2 235 086,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
334/2	18	Kanalizace ve Štěchovicích / Kolize s kabelem ČEZ	0,00	39 769,75	39 769,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 769,75	39 769,75	39 769,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
204	19	Most ev.č. 102-012 / Změna spodní stavby, dobetonávky k původním opěrám	- 13 158,52	158 423,56	145 265,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 13 158,52	158 423,56	145 265,04	171 582,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
102/7	20	Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice / Úprava v kraji vozovky km 13,15-13,202 vlevo	0,00	210 681,35	210 681,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 681,35	210 681,35	210 681,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
102/8	21	Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice / Změna tlouštěk AB vrstev	- 685 017,85	2 326 749,68	1 641 731,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 685 017,85	2 326 749,68	1 641 731,83	3 011 767,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
334/3	22	Kanalizace ve Štěchovicích / Štěrbinové žlaby, vpusti, žlaby	- 848 332,68	893 335,27	45 002,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 848 332,68	893 335,27	45 002,59	1 741 667,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102/9	23	Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice / Změna podkladní vrstvy	- 3 315 045,75	4 872 115,58	1 557 069,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 3 315 045,75	4 872 115,58	1 557 069,83	8 187 161,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103/7	24	Rekonstrukce vozovky - Průtah Štěchovicemi / Ochrana proti ostřiku	0,00	386 957,63	386 957,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386 957,63	386 957,63	386 957,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
253/2	25	Opěrné zdi - Davle - Štěchovice - vlevo / změna zatřídění hornin	- 11 482 675,35	4 065 440,24	- 7 417 235,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 11 482 675,35	4 065 440,24	-7 417 235,11	15 548 115,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102/10	26	Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice / zvýšené množství odstraňování křovin	0,00	893 825,06	893 825,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	893 825,06	893 825,06	893 825,06	0,00	0,00
102/11	27	Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice / lokální opravy CB desek	0,00	439 876,30	439 876,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439 876,30	439 876,30	439 876,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103/8	28	Rekonstrukce vozovky - Průtah Štěchovicemi / úpravy v km 14,915, 14,950 a 15,070	0,00	337 421,30	337 421,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337 421,30	337 421,30	337 421,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000/1	29	Vedlejší a ostatní náklady/ RDS vypracování změn	0,00	1 879 064,84	1 879 064,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 879 064,84	1 879 064,84	1 879 064,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
331/1	30	Přeložka kanalizace u mostu 102-012/ doplnění šoupátek	0,00	41 604,72	41 604,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 604,72	41 604,72	41 604,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

332/1	31	Přeložka kanalizace u mostu 102-013 / doplnění šoupátek	0,00	41 604,72	41 604,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 604,72	41 604,72	41 604,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333/1	32	Přeložka kanalizace u mostu 102-014 / doplnění šoupátek	0,00	41 604,72	41 604,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 604,72	41 604,72	41 604,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341/1	33	Přeložka vodovodu u mostu 102-012 / doplnění šoupátek	- 13 643,95	26 030,02	12 386,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 13 643,95	26 030,02	12 386,07	39 673,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342/1	34	Přeložka vodovodu u mostu 102-013 / doplnění šoupátek	- 13 643,95	26 030,02	12 386,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 13 643,95	26 030,02	12 386,07	39 673,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343/1	35	Přeložka vodovodu u mostu 102-014 / doplnění šoupátek	- 13 643,95	26 030,02	12 386,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 13 643,95	26 030,02	12 386,07	39 673,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
181.2/1	36	Přechodné dopravní značení / posunutí semaforu	0,00	64 020,50	64 020,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 020,50	64 020,50	64 020,50	0,00	0,00
102/12	37	Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice / lokální opravy CB desek SAL, zábradlí propustek	- 86 929,80	1 684 180,84	1 597 251,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 86 929,80	1 684 180,84	1 597 251,04	1 771 110,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102/13	38	Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice / betonová svodidla	0,00	1 530 172,61	1 530 172,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 530 172,61	1 530 172,61	1 530 172,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102/14	39	Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice / úprava svahu z lomového	- 6 111 253,89	5 276 219,41	- 835 034,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 6 111 253,89	5 276 219,41	-835 034,48	11 387 473,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
253/3	40	Opěrné zdi - Davle - Štěchovice - vlevo / úprava římsy u OZ č. 71	0,00	272 560,35	272 560,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272 560,35	272 560,35	272 560,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102/15	41	Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice / frézování AB a CS vrstev	- 1 513 978,75	2 868 019,53	1 354 040,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 1 513 978,75	2 868 019,53	1 354 040,78	4 381 998,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102/16	42	Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice /úprava v km 11,780-12,440 vpravo	0,00	3 235 947,09	3 235 947,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 235 947,09	3 235 947,09	3 235 947,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102/17	43	Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice /Ocelové svodidlo,dlažba v Davli	0,00	854 066,44	854 066,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	854 066,44	854 066,44	854 066,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102/18	44	Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice / Změna DZ	- 141 683,84	574 840,90	433 157,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 141 683,84	574 840,90	433 157,06	716 524,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102/19	45	Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice / Zastávka u Kiliána, ŠŽ ve stávajících zastávkách	0,00	1 134 682,17	1 134 682,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 134 682,17	1 134 682,17	1 134 682,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Přehled dalších dokladů

Číslo ZBV:	**45**
Název a evidenční číslo stavby:	**II/102 hr. hl. města Prahy-Štěchovice, rekonstrukce. ETAPA II, Z2019-014610**
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	SO 102 - Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	102/19

Doklad	**Součást dokumentace ZBV**	
	ANO (počet listů)	**NE - Uloženo**
07 Změnový soupis prací SO 102 po změně 19 pro ZBV 45	39	
08 Vyjádření Městyse Štěchovice	1	
09 Vyjádření AD č. 66	2	
10 Oznámení zhotovitele o nové skutečnosti	1	
11 Stanovisko KSÚSSK a pokyn ke zpracování ZBV	1	
12 Výňatek z TZ	3	
13 Výkaz výměr - zastávka u Kiliána	1	
14 Situace	1	
15 Fotodokumentace	6	
16 Listy SD	16	
17 Obj. - zábradlí zast. U Kiliána CN	1	
18 VTD Štěchovice - zastávka u Kiliána	6	
19 Cenová nabídka 1	4	
20 Cenová nabídka 2	1	
21 Zápis Ing. Klofáče do obch. Rejstříku	2	
22 Výpis z obch rejstříku - Ing. Bašár	6	
23 Stanovisko TDS	1	
Počet listů celkem	92	

Změnový soupis prací SO 102 po změně 19 pro ZBV 45													
Evidenční číslo a název stavby: II/102 hr. hl. města Prahy-Štěchovice, rekonstrukce. ETAPA II Číslo a název SO/PS: SO 102 - Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice Číslo a název rozpočtu: SO 102 - Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS) 102 Celkem					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		1 Zemní práce											
1	113106122	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z kamenných dlaždic	M2	50,000	150,900	100,900	91,95	4 597,50	0,00	9 277,76	13 875,26	9 277,76	201,80%
		Rozebrání dlažeb a dílců komunikací pro pěší, vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek komunikací pro pěší s ložem z kameniva nebo živice a s výplní spár z kamenných dlaždic nebo desek											
		SoD *100*0.5 stáv. odvodňov. proužek na ZÚ vpravo, odhad šířky 50 cm - vč. odstranění lože=50,000 [A]* *ZBV č. 15* *dle geodetického protokolu č. Š II 3/2022* *km 13,2-13,7 100,9=100,900 [A]*											
2	113106123	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší ze zámkových dlaždic	M2	60,000	60,000	0,000	91,95	5 517,00	0,00	0,00	5 517,00	0,00	0,00%
		Rozebrání dlažeb a dílců komunikací pro pěší, vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek komunikací pro pěší s ložem z kameniva nebo živice a s výplní spár ze zámkové dlažby											
		SoD *(20*0.5)+(100*0.5) chodník na KÚ 60 dlažba před KÚ vpravo - šířka cca 0,5 m z důvodu bourání vozovky 60 příp. rektifikace obrubníku, vč. lože=60,000 [A]*											
3	113107222	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 200 mm	M2	11 027,000	11 027,000	0,000	26,23	289 238,21	0,00	0,00	289 238,21	0,00	0,00%
		Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm											
		SoD *11027 bourání celk. konstrukce stáv. vozovky - štěrk s příměsí jemnozrnné zeminy - tl. 160 mm=11 027,000 [A]*											
4	113107230	Odstranění podkladu pl nad 200 m2 z betonu prostého tl 100 mm	M2	11 027,000	11 027,000	0,000	102,45	1 129 716,15	0,00	0,00	1 129 716,15	0,00	0,00%
		Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 z betonu prostého, o tl. vrstvy do 100 mm											
		SoD *11027 bourání celkové konstrukce stáv. vozovky - stabilizace cementem tl. 60 mm - odhad dle situace 11027 řezů=11 027,000 [A]*											
5	113154334	Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š 2 m pl do 10000 m2 bez překážek v trase	M2	27 731,600	13 881,100	-13 850,500	59,90	1 661 122,84	-835 778,71	6 133,76	831 477,89	-829 644,95	-49,94%

Změnový soupis prací SO 102 po změně 19 pro ZBV 45														
Evidenční číslo a název stavby: II/102 hr. hl. města Prahy-Štěchovice, rekonstrukce. ETAPA II Číslo a název SO/PS: SO 102 - Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice Číslo a název rozpočtu: SO 102 - Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS) 102 Celkem						
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
		Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 1 000 do 10 000 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 100 mm												
		SoD *13995 asf. beton v tl. 60 mm - odhad dle situace 13995 řezů=13 995,000 [A]* *2160 asf. beton tl. 100 mm - dle situace 13995 řezů v km 13,2 - 13,7 vlevo, vč. reprofilace příčného sklonu=2 160,000 [B]* *11027 asf.beton tl.60mm - bourání celkové konstrukce vozovky - dle situace 13995 řezů=11 027,000 [C]* *549.6 odfrézování nájezdových klínů=549,600 [D]* *Celkem: 13995+2160+11027+549.6=27 731,600 [E]* *ZBV ZBV č. 10* *dle zaměření tl. 40 mm 60,3=60,300 [A]* *dle zaměření tl. 60 mm 42,1=42,100 [B]* *A+B=102,400 [C]*												
		ZBV č. 17 dle geodetických protokolů *km 12,822 - 12,846 vpravo protokol Š II 51/2021 prům. tl. 46 mm - bez odpočtu plochy 105,6 m2* *km 12,846 - 13,201 vpravo protokol Š II 51/2021 prům. tl. 162 mm - odpočet plochy -1530,8 m2=-1 530,800 [A]* *km 10,360 - 10,840 vpravo protokol Š II 63/2021 prům. tl. 128 mm - odpočet plochy -2374,1 m2=-2 374,100 [B]* *km 13,199 - 13,696 vlevo protokol Š II 88/2021 prům. tl. 133 mm - odpočet plochy -2272,6 m2=-2 272,600 [C]* *km 10,550 - 10,680 vlevo protokol Š II 32/2021 prům. tl. 129 mm - odpočet plochy -595,5 m2=- 595,500 [D]* *km 10,680 - 10,840 vlevo protokol Š II 32/2021 prům. tl. 99 mm - bez odpočtu plochy 790,4 m2* *km 10,360 - 10,550 vlevo protokol Š II 26/2021 prům. tl. 135 mm - odpočet plochy -851,1 m2=- 851,100 [E]* *km 12,820 - 13,200 vlevo protokol Š II 23/2021 prům. tl. 207 mm - odpočet plochy -1411,0 m2=-1 411,000 [F]* *km 12,820 - 13,200 vlevo protokol Š II 23/2021 prům. tl. 103 mm - odpočet plochy -190 m2=- 190,000 [G]* *km 12,820 - 13,200 vlevo protokol Š II 23/2021 prům. tl. 40 mm -bez odpočtu plochy 17 m2* *km 13,199 - 13,696 vpravo protokol Š II 101/2021 prům. tl. 89 mm - bez odpočtu plochy 2042,5 m2* *km 13,396 - 13,427 vpravo protokol Š II 101/2021 dodatečné dofrézování prům. tl. 62 mm - přípočet plochy 125,6 m2=125,600 [H]* *km 12,440 - 12,850 vlevo protokol D 8/2020 prům. tl. 186 mm - odpočet plochy -1654 m2=-1 654,000 [I]* *km 10,250 - 10,360 vpravo protokol D 6/2020 prům. tl. 40 mm - odpočet plochy -580,5 m2=- 580,500 [J]* *km 10,250 - 10,360 vlevo protokol D 3/2020 prům. tl. 100 mm - bez odpočtu plochy 595 m2* *km 12,440 - 12,720 vpravo protokol Š II 5/2022 prům. tl.140 mm - odpočet plochy -1302 m2=-1 302,000 [K]* *km 12,720 - 12,848 vpravo protokol Š II 5/2022 prům. tl.181 mm - odpočet plochy -459 m2=- 459,000 [L]* *A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L =-13 095,000 [M]*												
		ZBV č. 41 *geodetický protokol* *Š II 7/2022 km 9,999-10,117 vlevo prům. tl. 90 mm 765,5=765,500 [A]* *km 10,130-10,246 vlevo prům. tl. 90 mm 600,30=600,300 [B]* *prům. tl. 100 mm 577,10=577,100 [C]* *prům. tl. 100 mm 562,0=562,000 [D]* *Š II 37/2022 km 11,298-11,356 vlevo prům. tl. 98 mm 273,10=273,100 [E]* *Š II 2/2023 km 11,773-12,438 vlevo prům. tl. 178 mm 2*3012,30=6 024,600 [F]* *Š II 20/2023 km13,694-14,114 vpravo prům. tl. 63 mm 1463,80=1 463,800 [G]* *Š II 26/2023 km 14,130-14,429 vpravo prům. tl. 64 mm 1429,50=1 429,500 [H]* *Š II 36/2022 km 14,480-14,522 vlevo prům. tl. 104 mm 198,30=198,300 [I]* *Š II 37/2022 km 11,385-11,780 vlevo prům. tl. 102 mm 1637,8=1 637,800 [J]* *Š II 59/2022 km 14,424-14,580 vpravo prům. tl. 106 mm 137,00=137,000 [K]* *km 14,424-14,580 vpravo prům. tl. 103 mm 43,40=43,400 [L]* *12/2020 Masečím 317,50=317,500 [M]* *Š II 101/2021 -2*125,6=- 251,200 [N]* *odpočet původního množství a ZBV č. 17 množsttví -(27731,6-13095)=-14 636,600 [O]* *A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O=- 857,900 [Q]*												

Změnový soupis prací SO 102 po změně 19 pro ZBV 45													
Evidenční číslo a název stavby: II/102 hr. hl. města Prahy-Štěchovice, rekonstrukce. ETAPA II Číslo a název SO/PS: SO 102 - Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice Číslo a název rozpočtu: SO 102 - Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS) 102 Celkem					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6	113154335	Frézování živičného krytu tl 200 mm pruh š 2 m pl do 10000 m2 bez překážek v trase	M2	13 516,000	26 061,500	12 545,500	109,73	1 483 110,68	-74 078,72	1 450 696,47	2 859 728,43	1 376 617,75	92,82%
		Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 1 000 do 10 000 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 200 mm											
		SoD *5501+8015 asf. beton tl. 150 mm - bourání v místě změny příčného sklonu - odhad dle situace 13516 řezů=13 516,000 [A]* *ZBV č. 17 dle geodetických protokolů* *km 12,846 - 13,201 vpravo protokol Š II 51/2021 prům. tl. 162 mm 1530,8 m2=1 530,800 [A]* *km 10,360 - 10,840 vpravo protokol Š II 63/2021 prum. tl. 128 mm 2374,1 m2=2 374,100 [B]* *km 13,199 - 13,696 vlevo protokol Š II 88/2021 prum. tl. 133 mm 2272,6 m2=2 272,600 [C]* *km 10,550 - 10,680 vlevo protokol Š II 32/2021 prum. tl. 129 mm 595,5 m2=595,500 [D]* *km 10,360 - 10,550 vlevo protokol Š II 26/2021 prum. tl. 135 mm 851,1 m2=851,100 [E]* *km 12,820 - 13,200 vlevo protokol Š II 23/2021 prum. tl. 103 mm 190 m2=190,000 [F]* *km 12,440 - 12,850 vlevo protokol D 8/2020 prum. tl. 186 mm 1654 m2=1 654,000 [G]* *km 10,250 - 10,360 vpravo protokol D 6/2020 prum. tl. 140 mm 580,5 m2=580,500 [H]* *km 12,440 - 12,720 vpravo protokol Š II 5/2022 prum. tl.140 mm 1302 m2=1 302,000 [I]* *km 12,720 - 12,848 vpravo protokol Š II 5/2022 prum. tl.181 mm 459 m2=459,000 [J]* *km 12,820 - 13,200 vlevo protokol Š II 23/2021 prum. tl. 207 mm 1411,0 m2=1 411,000 [K]* *A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K=13 220,600 [L]*											
		ZBV č. 41 *geodetický protokol* *D 8/2020 km 12,440-12,850 vlevo prům. tl. 200 mm 128,90=128,900 [A]* *Š 101/2021 km 13,199 - 13,696 vpravo tl. 151mm 125,60=125,600 [B]* *Š II 33/2022 km 14,220-14,580 vlevo prům. tl. 155 mm 1618,00=1 618,000 [C]* *Š II 52/2022 km11,278-11,357 vpravo prům. tl. 148 mm 281,10=281,100 [D]* *km11,357-11,381 vpravo prům. tl. 166 mm 137,60 =137,600 [E]* *km11,381-11,780 vpravo prům. tl. 189 mm 1958,90=1 958,900 [F]* *km 14,424-14,580 vpravo prům. tl. 174 mm 506,90=506,900 [G]* *Š II 19/2023 km 11,780-12,437 vpravo prům. tl. 182 mm 2501,20=2 501,200 [H]* *Š II 20/2023 km 13,788-13,934 vpravo prům. tl. 118 mm 299,40=299,400 [I]* *Š II 21/2023 km 13,788-13,934 vpravo prům. tl. 168 mm 2408,90 =2 408,900 [J]* *Š II 6/2022 km 13,695-14,224 vlevo prům. tl, 204 mm 2444,40=2 444,400 [K]* *Š II 33/2022 km 14,580-14,609 vlevo prům. tl. 220 mm 130,50=130,500 [L]* *Š II 37/2022 km 11,519-11,630 vlevo prům. tl. 224 mm 299,50=299,500 [M]* *A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M=12 840,900 [N]* *odpočet původního množství -13516=-13 516,000 [O]* *N+O=- 675,100 [P]*											

Změnový soupis prací SO 102 po změně 19 pro ZBV 45

Evidenční číslo a název stavby: II/102 hr. hl. města Prahy-Štěchovice, rekonstrukce. ETAPA II
Číslo a název SO/PS: SO 102 - Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice
Číslo a název rozpočtu: SO 102 - Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)
102
Celkem

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7	113155332	Frézování betonového krytu tl 40 mm pruh š 2 m pl do 10000 m2 bez překážek v trase	M2	13 995,000	5 151,720	-8 843,280	74,99	1 049 485,05	-663 157,57	0,00	386 327,48	-663 157,57	-63,19%
		Frézování betonového podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 1 000 do 10 000 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 40 mm											
		SoD *13995 odfrézování na požadovanou niveletu 13995 srovnání do příčného sklonu v místech jen frézování na tl. 60 mm=13 995,000 [A]*											
		ZBV č. 41 *geodetický protokol* *Š II26/2021 km 10,518-10548 vlevo prům. tl. 131 mm 77,10=77,100 [A]* *Š II 63/2021 km 10,580-10663 vpravo prům. tl. 39 mm 433,60=433,600 [B]* *Š II 7/2022 km 10,001-10,117 vlevo prům. tl. 220 mm 751,90=751,900 [C]* *km 10,190-10,234 vlevo prům. tl. 20 mm 158,80=158,800 [D]* *Š II 17/2022 km 10,130-10,192 vpravo prům. tl. 320 mm 307,00=307,000 [E]* *Š II 33/2022 km 14,220-14,480 vlevo prům. tl. 225 mm 1145,00=1 145,000 [F]* *km 14,522-14,570 vlevo prům. tl. 221 mm 225,60=225,600 [G]* *Š II 37/2022 km 11,519-11,630 vlevo prům. tl. 215 mm 299,5=299,500 [H]* *Š II 52/2022 km 11,357-11,381 vpravo prům. tl.40 mm 137,60=137,600 [I]* *Š II 59/2022 km 14,424-14,580 vpravo prům. tl. 224 mm 506,90=506,900 [J]* *Š II 21/2023 km 10,881-11,060 vlevo prům tl. 24 mm 862,50=862,500 [K]* *km 10,060-11,881vlevo prům tl. 25 mm 81,92=81,920 [L]* *Š II 87/2021 km10,520-10,587 vpravo prům. tl. 114 mm 97,90=97,900 [M]* *km 10,741-10,780 vpravo prům. tl. 224 mm 55,10=55,100 [N]* *km 10,748-10,754 vpravo prům. tl. 216 mm 11,30=11,300 [O]* *odpočet původního množství -13995,00=-13 995,000 [P]* *A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P=-8 843,280 [Q]*											
8	113155333	Frézování betonového krytu tl 50 mm pruh š 2 m pl do 10000 m2 bez překážek v trase	M2	11 027,000	2 730,600	-8 296,400	87,43	964 090,61	-725 354,25	0,00	238 736,36	-725 354,25	-75,24%

Změnový soupis prací SO 102 po změně 19 pro ZBV 45

Evidenční číslo a název stavby: II/102 hr. hl. města Prahy-Štěchovice, rekonstrukce. ETAPA II
Číslo a název SO/PS: SO 102 - Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice
Číslo a název rozpočtu: SO 102 - Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)
102
Celkem

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Frézování betonového podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 1 000 do 10 000 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 50 mm											
		SoD *11027 bourání celkové konstrukce stáv. vozovky - CB konstrukce fréza v tl. 50 mm - odhad dle situace 11027* *řezů=11 027,000 [A]*											
		ZBV č. 41 *geodetivký protokol* *D 3/2020 km 10,250-10,360 vlevo prům. tl. 250 mm 595=595,000 [A]* *D 8/2020 km 12,440-12,850 vlevo prům. tl. 250 mm 1654+228,70=1 882,700 [B]* *Š II 7/2022 km 10,190-10,324 vlevo prům. tl. 50 mm 252,90=252,900 [C]* *odpočet původního množství -11027,00=-11 027,000 [D]* *A+B+C+D=-8 296,400 [E]*											
9	113155334	Frézování betonového krytu tl 100 mm pruh š 2 m pl do 10000 m2 bez překážek v trase	M2	22 029,000	42 028,500	19 999,500	166,82	3 674 877,78	0,00	3 336 316,59	7 011 194,37	3 336 316,59	90,79%
		Frézování betonového podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 1 000 do 10 000 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 100 mm											
		SoD *5501*2 bourání voz. v místě změny příčného sklonu - tl. CB konstrukce tl.200 mm - odhad dle situace 11002* *řezů=11 002,000 [A]* *11027 bourání celkové konstrukce stáv. vozovky - tl. CB konstrukce 150 mm - fréza v tl. 100 mm - odhad dle situace 11002 řezů=11 027,000 [B]* *Celkem: 11002+11027=22 029,000 [C]*											
		ZBV č. 41 *geodetický protokol* *D 3/2020 km 10,250-10,360 vlevo prům. tl. 250 mm 2*595=1 190,000 [A]* *D 6/202 km 10,250-10,360 vpravo prům. tl. 100 mm 505,0=505,000 [B]* *D 8/2020 km 12,440-12,850 vlevo prům. tl. 250 mm 2*(1654,0+228,70)=3 765,400 [C]* *Š II23/2021 km12,820-13,200 vlevo prům. tl. 181 mm 2*1382,0=2 764,000 [D]* *Š II 26/2021 km 13,60-10,420 vlevo prům. tl. 292 mm 3*268,80=806,400 [E]* *Š II26/2021 km 10,518-10,548 vlevo prům. tl. 131 mm 77,10=77,100 [F]* *Š II 32/2021 km 10,360-10,680 vlevo prům. tl. 287 mm 3*1194,50=3 583,500 [G]* *km 10,780-10,840 vlevo prům. tl. 289 mm 3*299,60=898,800 [H]* *Š II 51/2021 km 12,917-12,930 vpravo prům. tl. 289 mm 3*57,50=172,500 [I]* *Š II 63/2021 km 10,663-10,680 vpravo prům. tl. 205 mm 2*80,10=160,200 [J]* *km 10,700-10,780 vpravo prům. tl. 88 mm 391=391,000 [K]* *Š II 6/2022 km 13,695-14,224 vpravo prům. tl. 298 mm 3*2418,50=7 255,500 [L]* *Š II 7/2022 km 10,001-10,117 vlevo prům. tl.220 mm 2* 751,90=1 503,800 [M]* *km 10,130-10,190 vlevo prům. tl. 300 mm 3*292,60=877,800 [N]* *km 10,190-10,234 vlevo prům. tl. 300 mm 3*107,00=321,000 [O]* *Š II 17/2022 km 10,020-10,117 vpravo prům. tl. 260 mm 3*537,90=1 613,700 [P]* *km 10,130-10,192 vpravo prům. tl. 320 mm 3*307,00=921,000 [Q]* *Š II 23/2022 km 10,192-10,246 vpravo prům. tl. 270 mm 3*252,90=758,700 [R]* *Š II 33/2022 km 14,220-14,480 vlevo prům. tl. 225 mm 2*1145,00=2 290,000 [S]* *km 14,522-14,570 vlevo prům. tl. 221 mm 2*225,60=451,200 [T]* *Š II 36/2022 km 14,480-14,522 vlevo prům. tl. 205 mm 2*198,40=396,800 [U]* *Š II 37/2022 km 11,519-11,630 vlevo prům. tl. 215 mm 2*299,5=599,000 [V]* *Š II 59/2022 km 14,424-14,580 vpravo prům. tl. 224 mm 2*506,90=1 013,800 [W]* *Š II 5/2023 km 11,779-11,970 vlevo prům. tl. 193 mm 2*396,10=792,200 [X]* *km 11,779-11,970 vlevo prům. tl. 195 mm 2*915,80=1 831,600 [Y]* *Š II 21/2023 km 10,840-10,881 vlevo prům tl. 196 mm 2* 203,60=407,200 [Z]* *km 10,881-11,060 vlevo prům tl. 195 mm 2*67,30=134,600 [AA]* *km 10,060-11,182 vlevo prům tl.194 mm 2*653,20 =1 306,400 [AB]*											

Změnový soupis prací SO 102 po změně 19 pro ZBV 45

Evidenční číslo a název stavby: II/102 hr. hl. města Prahy-Štěchovice, rekonstrukce. ETAPA II
Číslo a název SO/PS: SO 102 - Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice
Číslo a název rozpočtu: SO 102 - Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)
102
Celkem

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Š II 87/2021 km10,520-10,587 vpravo prům. tl. 114 mm 97,90=97,900 [AC] *km 10,741-10,780 vpravo prům. tl. 224 mm 2* 55,10=110,200 [AD]* *km 10,748-10,754 vpravo prům. tl. 216 mm 2*11,30=22,600 [AE]* *odpočet fakturovaného množství -22021,8=-22 021,800 [AF]* *A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q+R+S+T+U+V+W+X+Y+Z+AA+AB+AC+AD+AE+AF=14 997,100*											
		ZBV č. 42 *dle geodetického protokolu Š II 14/2023* *km 11,780-12,437 tl. 170 mm 2* 2501,20=5 002,400 [A]*											
10	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	M	88,000	88,000	0,000	91,95	8 091,60	0,00	0,00	8 091,60	0,00	0,00%
		Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých											
		SoD *48+20+20=88,000 [A]*											
11	122101103	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 1 a 2 objem do 5000 m3	M3	4 322,500	6 326,760	2 004,260	122,97	531 537,83	0,00	246 463,85	778 001,68	246 463,85	46,37%
		Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v horninách tř. 1 a 2 přes 1 000 do 5 000 m3											
		SoD *910*4.75 odkop poslední vrstvy vozovky 4322.5 podloží pod vozovkou pro úpravu typu B2 - délka dle sit. x plocha ze vzor.řezu=4 322,500 [A]* *ZBV č. 13* *Odkop svahu se svahovými stupni* *km 10,360 - 10,380 24 m3=24,000 [A]* *km 10,380 - 10,420 190,7 m3 - úprava s geomříží =190,700 [B]* *km 10,420 - 10,465 45 m3=45,000 [C]* *km 10,465 - 10,475 11,9 m3=11,900 [D]* *km 10,476 - 10,485 9,2 m3=9,200 [E]* *km 10,485 - 10,575 126,3 m3=126,300 [F]* *km 10,575 - 10,650 68,2 m3=68,200 [G]* *km 10,706 - 10,840 161,7 m3=161,700 [H]* *A+B+C+D+E+F+G+H=637,000 [I]* *ZBV č. 20* *odkop pro rozšíření vozovky km 13,150-13,210* *1,9*0,37*60,0=42,180 [A]*											
		ZBV č. 39 *geodetické protokoly* *Š II 33/2021 km 13,150-13,190 vlevo 89,90=89,900 [A]* *Š II 10/2022 km 10,140-10,250 vlevo 191,10=191,100 [B]* *Š II 12/2022 km 10,001-10,101 vlevo 112,90=112,900 [C]* *Š II 16/2022 km 10,103-10,140 vlevo 63,0+55,20-77=41,200 [D]* *Š II 27/2022 km 11,430-11,520 vlevo 191,60=191,600 [E]* *Š II 35/2022 km 11,220-11,430 vlevo 67,90+268,30=336,200 [F]* *Š II 43/2022 km 11,520-11663 vlevo 303,20=303,200 [G]* *Š II 45/2022 km 11,140-11,220 vlevo 187,80=187,800 [H]* *Š II 47/2022 km 11,671-11,780 vlevo 215,0=215,000 [I]* *Š II 53/2022 km 14,462-14,580 vlevo 249,30=249,300 [J]* *Š II 62/2022 km 11,056-11,140 vlevo 214,20=214,200 [K]* *Š II 65/2022 km 11,340-11,400 vlevo 47,0+160,30=207,300 [L]* *Š II 1/2023 km 10,840-10947 vlevo 188,7 =188,7 [V]* *Š II 4/2023 km 10,947-11,031 vlevo 165,60=165,600 [M]* *Š II 7/2023 km 11,976-12,440 vlevo 805,30=805,300 [N]* *Š II 8/2023 km 11,780-11,971 vlevo 231,10+1,70=232,800 [O]* *Š II 11/2023 km 14,410-14,460 vlevo 75,40+21,50=96,900 [P]* *Š II 13/2023 km 14,425 vlevo 22,40=22,400 [Q]* *Š II 16/2023 km 11,928-12,060 vpravo 279,50=279,500 [R]* *Š II 27/2023 km 11,733-11,832 vpravo 332,70=332,700 [S]* *(A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q+R+S+V)*0,25=1115,9 [T]*											

Změnový soupis prací SO 102 po změně 19 pro ZBV 45													
Evidenční číslo a název stavby: II/102 hr. hl. města Prahy-Štěchovice, rekonstrukce. ETAPA II								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
Číslo a název SO/PS: SO 102 - Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice								102					
Číslo a název rozpočtu: SO 102 - Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice								Celkem					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		ZBV č. 42 *geodetický protokol Š II 14/2023* *km 11,780-11,868 94,20=94,200 [A]* *km 11,881-11,909 23,50=23,500 [B]* *km 11,923-12,435 512,20=512,200 [C]* *(A+B+C)*0,25=157,475 [D]* *ZBV č. 43* *geodetický protokol Š II 37/2023 dlažba pro obec Davle* *(6,1+9,0+17,2+9,0+10,2+6,0+23,10+10,3)*0,45=40,905 [A]* *ZBV č. 45* *U Kiliána 10,8=10,800 [A]*												
12	122101403	Vykopávky v zemníku na suchu v hornině tř. 1 a 2 objem do 5000 m3	M3	1 701,750	1 701,750	0,000	84,05	143 032,09	0,00	0,00	143 032,09	0,00	0,00%
		Vykopávky v zemnících na suchu s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v horninách tř. 1 a 2 přes 1 000 do 5 000 m3											
		SoD *11345*0.15 potřeba ornice na ohumusování dle pol. 182301132 x tl. 15 cm=1 701,750 [A]*											
13	122201103	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 5000 m3	M3	4 077,490	4 077,490	0,000	122,97	501 408,95	0,00	0,00	501 408,95	0,00	0,00%
		Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 přes 1 000 do 5 000 m3											
		SoD *5501*0.2 Písek hlinitý v místě změny příčného sklonu - odtěžení na požadovanou niveletu, srovnání do příčného sklonu 1100.2 přehutnění=1 100,200 [A]* *11027*0.27 Štěrk hlinitý tl. 270 mm - bourání vozovky komplet=2 977,290 [B]* *Celkem: 1100.2+2977.29=4 077,490 [C]*											
14	122201403	Vykopávky v zemníku na suchu v hornině tř. 3 objem do 5000 m3	M3	3 694,800	3 694,800	0,000	84,05	310 547,94	0,00	0,00	310 547,94	0,00	0,00%

Změnový soupis prací SO 102 po změně 19 pro ZBV 45

Evidenční číslo a název stavby: II/102 hr. hl. města Prahy-Štěchovice, rekonstrukce. ETAPA II
Číslo a název SO/PS: SO 102 - Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice
Číslo a název rozpočtu: SO 102 - Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)
102
Celkem

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Vykopávky v zemnících na suchu s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 přes 1 000 do 5 000 m3											
		SoD *910*2.31 délka x plocha v řezu - dle pol. 564581111 - úprava typu B2=2 102,100 [A]* *1410 dle pol. 182201101 x hloubka 60 cm - vhodná zemina pro svahové stupně=1 410,000 [B]* *182.7 dle pol. 174101101 - obsyp propustku v km 12,925=182,700 [C]* *Celkem: 2102.1+1410+182.7=3 694,800 [D]*											
15	131203101	Hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3	M3	0,315	3,905	3,590	4 417,49	1 391,51	0,00	15 858,79	17 250,30	15 858,79	1139,68%
		Hloubení zapažených i nezapažených jam ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 soudržných											
		SoD *5*(0.3*0.3*0.7) počet sloupků pro svislé DZ x odhad rozměrů jámy =0,315 [A]* *ZBV č. 37* *zábradlí propustek* *0,5*0,5*0,85*12=2,55* *ZBV č. 45* *zábradlí u Kiliána (autobusová zastávka)* *0,4*0,4*0,5*13=1,04*											
16	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	M3	15 023,840	17 738,070	2 714,230	504,88	7 585 236,34	0,00	1 370 360,44	8 955 596,78	1 370 360,44	18,07%
		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m											
		SoD *1701.75 dovoz ornice na ohumusování dle pol. 122101403=1 701,750 [A]* *4322.5 odvoz odkopané zeminy dle pol. 122101103=4 322,500 [B]* *2102.1 dovoz podsypu dle pol. 122201403 pro úpravu svahu typu B2=2 102,100 [C]* *4077.490 odvoz odkopaného hlinitého písku dle pol. 122201103=4 077,490 [D]* *2350*0.6*2 odvoz vykopané zeminy ze svahových stupňů dle pol. 182201101 x odhad hloubky 60cm - 1701.75 dovoz vhodné zeminy pro zpětný zásyp stupňů=2 820,000 [E]* *Celkem: 1701.75+4322.5+2102.1+4077.49+2820=15 023,840 [F]* *ZBV č. 13* *dle pol. 122101103 637=637,000 [A]* *ZBV č. 20* *odvoz odkopané zeminydle pol. č. 122101103* *42,18=42,18 [A]* *ZBV č. 37* *zábradlí propustek* *0,5*0,5*0,85*12=2,55*											

Změnový soupis prací SO 102 po změně 19 pro ZBV 45

Evidenční číslo a název stavby: II/102 hr. hl. města Prahy-Štěchovice, rekonstrukce. ETAPA II
Číslo a název SO/PS: SO 102 - Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice
Číslo a název rozpočtu: SO 102 - Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)
102

								Celkem					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		ZBV č. 39 *dle pol. č. 122101103 1115,9=1115,9 [A]* *111301111 4463,60*0,15=669,54 [B]* *A+B=1 785,44 [C]* *ZBV č. 42* *dle pol. č. 122101103* *157,475=157,475 [A]* *ZBV č. 43* *dle pol. č. 122101103 40,905=40,905 [A]* *ZBV č. 45* *U Kiliána 10,8=10,800 [A]* *km 11,687-11,720 (0,8*0,35*34)+(3,0*2,0*1,5)=18,520 [B]* *km 11,2228-11,2584 (0,8*0,35*37)+(3,0*2,0*1,5)=19,360 [C]* *A+B+C=48,68 [E]*											

Změnový soupis prací SO 102 po změně 19 pro ZBV 45

Evidenční číslo a název stavby: II/102 hr. hl. města Prahy-Štěchovice, rekonstrukce. ETAPA II
Číslo a název SO/PS: SO 102 - Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice
Číslo a název rozpočtu: SO 102 - Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)
102
Celkem

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17	171151222	Strmý svah vyztužením zeminy ocelovou sítí s kamenivem pohled svah přes 2 m do 4 m	M2	2 275,000	0,000	-2 275,000	1 323,12	3 010 098,00	-3 010 098,00	0,00	0,00	-3 010 098,00	-100,00%
		Strmý svah ze zemin vyztužených geosyntetiky s pohledovou plochou upraveného svahu ocelovou sítí vyplněnou kamenivem [RockWall], výšky přes 2 m do 4 m											
		SoD *910*2.5 délka x odhadnutá výška svahu - úprava typ B2=2 275,000 [A]*											
		ZBV č. 39 *odpočet neprováděl se* *-2275,000=-2275,00*											
18	171201201	Uložení sypaniny na skládky	M3	10 725,990	13 440,220	2 714,230	16,70	179 124,03	0,00	45 327,64	224 451,67	45 327,64	25,31%

Změnový soupis prací SO 102 po změně 19 pro ZBV 45

Evidenční číslo a název stavby: II/102 hr. hl. města Prahy-Štěchovice, rekonstrukce. ETAPA II
Číslo a název SO/PS: SO 102 - Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice
Číslo a název rozpočtu: SO 102 - Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)
102
Celkem

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Uložení sypaniny na skládky											
		SoD *4322.500 dle pol. 122101103=4 322,500 [A]* *4580*0.2 plocha krajnic x tl. - dle pol. 938909612=916,000 [B]* *4077.490 hlinitý písek - dle pol. 122201103=4 077,490 [C]* *2350*0.6 odvoz vykopané zeminy ze svahových stupňů dle pol. 182201101 x odhad hloubky 60cm=1 410,000 [D]* *Celkem: 4322.5+916+4077.49+1410=10 725,990 [E]* *ZBV č. 13* *dle pol. 122101103 637=637,000 [A]* *ZBV č. 20* *vykopaná zemina 42,18=42,18 [A]* *ZBV č. 37* *zábradlí propustek* *0,5*0,5*0,85*12=2,55* *ZBV č. 39* *dle pol. č. 1622701105 1785,44=1785,44 [A]* *ZBV č. 42* *dle pol. č. 162701105* *157,475=157,475 [A]* *ZBV č. 43* *dle pol. č. 162701105* *40,905=40,905 [A]*											
		ZBV č. 45 *U Kiliána 10,8=10,800 [A]* *km 11,687-11,720 (0,8*0,35*34)+(3,0*2,0*1,5)=18,520 [B]* *km 11,2228-11,2584 (0,8*0,35*37)+(3,0*2,0*1,5)=19,360 [C]* *A+B+C=48,68 [D]*											
19	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	T	22 695,246	27 856,374	5 161,128	138,17	3 135 802,14	0,00	713 113,06	3 848 915,20	713 113,06	22,74%

Změnový soupis prací SO 102 po změně 19 pro ZBV 45

Evidenční číslo a název stavby: II/102 hr. hl. města Prahy-Štěchovice, rekonstrukce. ETAPA II
Číslo a název SO/PS: SO 102 - Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice
Číslo a název rozpočtu: SO 102 - Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)
102
Celkem

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)											
		SoD *4322.5*1.9 výkop dle pol. 171201201 x koef. přepočtu na tuny=8 212,750 [A]* *2494.356 z čištění příkopů, vpustí 8212.75 propustků dle pol. 997221551a=2 494,356 [B]* *1154.16 ze sejmutí nánosů na krajnicích dle pol. 938909612=1 154,160 [C]* *4077.49*2.0 dle pol. 122201103 x koef. přepočtu na tuny=8 154,980 [D]* *1410*1.9 odvoz vykopané zeminy ze svahových stupňů dle pol. 171201201 x koef. přepočtu na tuny=2 679,000 [E]* *Celkem: 8212.75+2494.356+1154.16+8154.98+2679=22 695,246 [F]* *ZBV č. 13* *dle pol. 122101103 637*1,9=1 210,300 [A]* *ZBV č. 20* *odkopaná zemina 42,18*1,9=80,142 [A]* *ZBV č. 37* *zábradlí propustek* *0,5*0,5*0,85*12*1,9=4,845* *ZBV č. 39* *dle pol. č. 171201201 1785,44*1,9=3 392,336 [A]* *ZBV č. 42* *dle pol. č. 171201201* *157,475*1,9=299,203 [A]* *ZBV č. 43* *dle pol. č. 171201201* *40,905*1,9=81,81 [A]*											
		ZBV č. 45 *U Kiliána 10,8=10,800 [A]* *km 11,687-11,720 (0,8*0,35*34)+(3,0*2,0*1,5)=18,520 [B]* *km 11,2228-11,2584 (0,8*0,35*37)+(3,0*2,0*1,5)=19,360 [C]* *(A+B+C)*1,9=92,492 [D]*											
20	171201211a	Poplatek za zemník	T	10 481,925	10 481,925	0,000	23,03	241 398,73	0,00	0,00	241 398,73	0,00	0,00%
		Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)											
		SoD *1701.75*1.9 dle pol. 122101402 x koef. 1,9 pro přepočet na tuny=3 233,325 [A]* *2102.1*2.0 dle pol. 122201403 x koef.2,0 pro přepočet na tuny=4 204,200 [B]* *1410*1.9 dle pol. 182201101 x hloubka 60 cm - vhodná zemina pro svahové stupně=2 679,000 [C]* *182.7*2.0 dle pol. 174101101 - obsyp propustku v km 12,925=365,400 [D]* *Celkem: 3233.325+4204.2+2679+365.4=10 481,925 [E]*											
21	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	M3	182,700	188,090	5,390	254,57	46 509,94	0,00	1 372,13	47 882,07	1 372,13	2,95%

Změnový soupis prací SO 102 po změně 19 pro ZBV 45

Evidenční číslo a název stavby: II/102 hr. hl. města Prahy-Štěchovice, rekonstrukce. ETAPA II
Číslo a název SO/PS: SO 102 - Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice
Číslo a název rozpočtu: SO 102 - Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)
102
Celkem

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách											
		SoD *14.5*(5.3*2+2.0) délka x plocha v řezu - obsyp propustku v km 12,925=182,700 [A]* *ZBV č. 45* *km 11,687-11,720 (34*0,8-33*0,6)*0,35=2,590 [A]* *km 11,2228-11,2584 (37*0,8-36*0,6)*0,35=2,800 [B]* *A+B=5,390 [C]*											
22	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	M2	11 027,000	12 262,200	1 235,200	33,80	372 712,60	0,00	41 749,76	414 462,36	41 749,76	2,25%
		Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním											
		ZBV č. 15 *dle geodetického protokolu č. Š II 3/2022* *km 13,2-13,7* *žlaby 69,4=69,400 [A]* *žulové kostky 100,9=100,900 [B]* *A+B=170,300 [C]* *ZBV č. 20* *1,9*60=114,00 [A]* *ZBV ZBV č. 27* *geodetický protokol Š II 51/2022 92,2 m2=92,200 [A]* *geodetický protokol Š II 58/2022 183,8 m2 =183,800 [B]* *A+B=276,000 [C]*											
		ZBV č. 42 *geodetický protokol Š II 14/2023* *km 11,780-11,868 94,20=94,200 [A]* *km 11,881-11,909 23,50=23,500 [B]* *km 11,923-12,435 512,20=512,200 [C]* *A+B+C=629,900 [D]* *ZBV č. 45* *U Kiliána 45=45,000 [A]*											
23	182201101	Svahování násypů	M2	2 350,000	7 944,300	5 594,300	43,01	101 073,50	0,00	240 610,84	341 684,34	240 610,84	36,22%
		Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním výkopku při svahování násypů v jakékoliv hornině											

Změnový soupis prací SO 102 po změně 19 pro ZBV 45

Evidenční číslo a název stavby: II/102 hr. hl. města Prahy-Štěchovice, rekonstrukce. ETAPA II
Číslo a název SO/PS: SO 102 - Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice
Číslo a název rozpočtu: SO 102 - Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)
102
Celkem

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		SoD *(420+50)*5 zřízení svahových stupňů v km 11,720 - 12,140 2350 v km 12,030 - 12,080 - délka x odhad prům.šířky ve svahu=2 350,000 [A]* *ZBV č. 13* *dle geodetického zaměření* *km 10,360 - 10,422 111,9 m2=111,900 [A]* *km 10,422 - 10,454 48,7 m2=48,700 [B]* *km 10,455 - 10,476 44,9 m2 =44,900 [C]* *km 10,480 - 10,654 369,6 m2=369,600 [D]* *km 10,706 - 10,730 41,4 m2=41,400 [E]* *km 10,730 - 10,840 234,7 m2=234,700 [F]* *A+B+C+D+E+F=851,200 [G]*												
		ZBV č. 39 *geodetické protokoly* *Š II 33/2021 km 13,150-13,190 vlevo 89,90=89,900 [A]* *Š II 10/2022 km 10,140-10,250 vlevo 191,10=191,100 [B]* *Š II 12/2022 km 10,001-10,101 vlevo 112,90=112,900 [C]* *Š II 16/2022 km 10,103-10,140 vlevo 63,0+55,20-77=41,200 [D]* *Š II 27/2022 km 11,430-11,520 vlevo 191,60=191,600 [E]* *Š II 35/2022 km 11,220-11,430 vlevo 67,90+268,30=336,200 [F]* *Š II 43/2022 km 11,520-11663 vlevo 303,20=303,200 [G]* *Š II 45/2022 km 11,140-11,220 vlevo 187,80=187,800 [H]* *Š II 47/2022 km 11,671-11,780 vlevo 215,0=215,000 [I]* *Š II 53/2022 km 14,462-14,580 vlevo 249,30=249,300 [J]* *Š II 62/2022 km 11,056-11,140 vlevo 214,20=214,200 [K]* *Š II 65/2022 km 11,340-11,400 vlevo 47,0+160,30=207,300 [L]* *Š II 1/2023 km 10,840-10947 vlevo 188,7 =188,7 [V]* *Š II 4/2023 km 10,947-11,031 vlevo 165,60=165,600 [M]* *Š II 7/2023 km 11,976-12,440 vlevo 805,30=805,300 [N]* *Š II 8/2023 km 11,780-11,971 vlevo 231,10+1,70=232,800 [O]* *Š II 11/2023 km 14,410-14,460 vlevo 75,40+21,50=96,900 [P]* *Š II 13/2023 km 14,425 vlevo 22,40=22,400 [Q]* *Š II 16/2023 km 11,928-12,060 vpravo 279,50=279,500 [R]* *Š II 27/2023 km 11,733-11,832 vpravo 332,70=332,700 [S]* *celkem A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q+R+S+V=4463,60 [U]*												
		ZBV č. 42 *geodetický protokol Š II 16/2023* *km 11,928-12,060 279,50=279,500 [A]*												
24	182301132	Rozprostření ornice pl přes 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 150 mm	M2	11 345,000	80,110	-11 264,890	36,89	418 517,05	-415 561,78	0,00	2 955,27	-415 561,78	-99,29%
		Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy přes 100 do 150 mm											

Změnový soupis prací SO 102 po změně 19 pro ZBV 45

Evidenční číslo a název stavby: II/102 hr. hl. města Prahy-Štěchovice, rekonstrukce. ETAPA II
Číslo a název SO/PS: SO 102 - Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice
Číslo a název rozpočtu: SO 102 - Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)
102
Celkem

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		SoD *490*5.0 délka dle situace x odhad šířky - úprava svahu typu 2450=2 450,000 [A]* *910*3.0*2 délka dle situace x odhad šířky x na obou stranách - úprava svahu typu B2=5 460,000 [B]* *4580*1.5*0.5 délka trasy x odhadnutá šířka ohumusování x odhad 50 %=3 435,000 [C]* *Celkem: 2450+5460+3435=11 345,000 [D* *ZBV č. 39* *odpočet, neprováděl se* *-11264,89=-11 264,890 [A]*											
25	183405211	Výsev trávníku hydroosevem na ornici	M2	11 345,000	11 345,000	0,000	20,49	232 459,05	0,00	0,00	232 459,05	0,00	0,00%
26	005724740	osivo směs travní krajinná - svahová	KG	283,625	283,625	0,000	155,44	44 086,67	0,00	0,00	44 086,67	0,00	0,00%
27	184802631	Chemické odplevelení po založení kultury postřikem na široko ve svahu do 1:1	M2	11 345,000	11 345,000	0,000	4,26	48 329,70	0,00	0,00	48 329,70	0,00	0,00%
		Chemické odplevelení po založení kultury na svahu přes 1:2 do 1:1 postřikem na široko											
28	185803113	Ošetření trávníku shrabáním ve svahu do 1:1	M2	11 345,000	11 345,000	0,000	4,61	52 300,45	0,00	0,00	52 300,45	0,00	0,00%
		Ošetření trávníku jednorázové na svahu přes 1:2 do 1:1											
29	185804312	Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2	M3	340,350	340,350	0,000	556,12	189 275,44	0,00	0,00	189 275,44	0,00	0,00%
		Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2											
		SoD *11345.000*0.01*3=340,350 [A]*											
	2	**Zakládání**											
30	213221111	Ochranná vrstva na základové spáře z bet. prost. se zvýš. nároky na prostředí C 25/30 tl do 150 mm	M3	16,530	16,530	0,000	3 321,98	54 912,33	0,00	0,00	54 912,33	0,00	0,00%
		Ochranná vrstva na základové spáře z prostého betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30 tl. do 150 mm											
		SoD *1.7*3.0*0.30 Betonové lože C25/30-XF3 pod stupně z lomového kamene u propustku v km 12,925=1,530 [A]* *2.5*20.0*0.3 betonové lože C25/30-XF3 pod propustkem=15,000 [B]* *Celkem: 1.53+15=16,530 [C]*											
	4	**Vodorovné konstrukce**											
31	451317777	Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu 1:5 z betonu prostého tl do 100 mm	M2	5 223,400	5 436,480	213,080	581,54	3 037 616,04	-441 854,09	565 768,64	3 161 530,58	123 914,54	4,08%
		Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5, tloušťky od 50 do 100 mm z betonu prostého											

Změnový soupis prací SO 102 po změně 19 pro ZBV 45														
Evidenční číslo a název stavby: II/102 hr. hl. města Prahy-Štěchovice, rekonstrukce. ETAPA II Číslo a název SO/PS: SO 102 - Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice Číslo a název rozpočtu: SO 102 - Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS) 102 Celkem						
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
		ZBV č. 13 dle geoetického zaměření Š II 37/2021 km 10,360 - 10,422 111,9 m2=111,900 [A] Š II 30/2021 km 10,422 - 10,454 48,7 m2=48,700 [B] Š II 34/2021 km 10,455 - 10,476 44,9 m2 =44,900 [C] Š II 30/2021 km 10,480 - 10,654 369,6 m2=369,600 [D] Š II 30/2021 km 10,706 - 10,730 41,4 m2=41,400 [E] Š II 38/2021 km 10,730 - 10,840 234,7 m2=234,700 [F] A+B+C+D+E+F=851,200 [G]													
		ZBV č. 39 geodetické protokoly Š II 33/2021 km 13,150-13,190 vlevo 89,90=89,900 [A] Š II 10/2022 km 10,140-10,250 vlevo 191,10=191,100 [B] Š II 12/2022 km 10,001-10,101 vlevo 112,90=112,900 [C] Š II 16/2022 km 10,103-10,140 vlevo 63,0+55,20-77=41,200 [D] Š II 27/2022 km 11,430-11,520 vlevo 191,60=191,600 [E] Š II 35/2022 km 11,220-11,430 vlevo 67,90+268,30=336,200 [F] Š II 43/2022 km 11,520-11663 vlevo 303,20=303,200 [G] Š II 45/2022 km 11,140-11,220 vlevo 187,80=187,800 [H] Š II 47/2022 km 11,671-11,780 vlevo 215,0=215,000 [I] Š II 53/2022 km 14,462-14,580 vlevo 249,30=249,300 [J] Š II 62/2022 km 11,056-11,140 vlevo 214,20=214,200 [K] Š II 65/2022 km 11,340-11,400 vlevo 47,0+160,30=207,300 [L] Š II 1/2023 km 10,840-10947 vlevo 188,7=188,700 [M] Š II 4/2023 km 10,947-11,031 vlevo 165,60=165,600 [N] Š II 7/2023 km 11,976-12,440 vlevo 805,30=805,300 [O] Š II 8/2023 km 11,780-11,971 vlevo 231,10+1,70=232,800 [P] Š II 11/2023 km 14,410-14,460 vlevo 75,40+21,50=96,900 [Q] Š II 13/2023 km 14,425 vlevo 22,40=22,400 [R] Š II 16/2023 km 11,928-12,060 vpravo 279,5=279,500 [S] Š II 27/2023 km 11,733-11,832 vpravo 332,70=332,700 [T] celkem A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q+R+S+T=4 463,600 [U] odpočet původního množství -5223,4=-5 223,400 [V] celkem U+V=- 759,800 [W]													

Změnový soupis prací SO 102 po změně 19 pro ZBV 45

Evidenční číslo a název stavby: II/102 hr. hl. města Prahy-Štěchovice, rekonstrukce. ETAPA II
Číslo a název SO/PS: SO 102 - Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice
Číslo a název rozpočtu: SO 102 - Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)
102
Celkem

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		ZBV č. 42 geodetický protokol Š II 34/2023 km 11,904-11,930 25,10=25,100 [A]											
		ZBV č. 43 geodetický protokol Š II 37/2023 dlažba pro obec Davle km 10,474 vlevo 6,1=6,100 [A] km 10,590 vpravo 9,0=9,000 [B] km 10,675-10,690 vpravo17,2 =17,200 [C] km 11,049 vlevo 9,0=9,000 [D] km 11,082 vpravo 10,2=10,200 [E] km 11,166 vlevo 6,0=6,000 [F] km 11,255-11,286 vlevo 23,10=23,100 [G] km 11,666-11,673 vlevo 10,3=10,300 [H] A+B+C+D+E+F+G+H=90,900 [I] ZBV č. 45 km 11,687-11,720 0,8*0,1*34=2,720 [A] km 11,2228-11,2584 0,8*0,1*37=2,960 [B] A+B=5,680 [C]											
32	452318510	Zajišťovací práh z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí	M3	9,950	9,950	0,000	8 203,04	81 620,25	0,00	0,00	81 620,25	0,00	0,00%
		Zajišťovací práh z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí na dně a ve svahu melioračních kanálů s patkami nebo bez patek											
		SoD *(0.5*0.8*2.5)*2+(0.3*0.8*2.5)*2+(0.5*1.8*2.5)*3 =9,950 [A]*											
33	464511111	Pohoz z lomového kamene neupraveného tříděného z terénu	M3	3,000	0,000	-3,000	3 481,56	10 444,68	-10 444,68	0,00	0,00	-10 444,68	-100,00%
		Pohoz dna nebo svahů jakékoliv tloušťky z lomového kamene neupraveného tříděného z terénu											
		SoD *5.0*3.0*0.2 Zpevnění dna toku pohozeným lomovým kamenem =3,000 [A]*											
		ZBV č. 39 *odpočet neprovádělo se* *-3,00=-3,00*											
	5	**Komunikace pozemní**											
34	564251111	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 150 mm	M2	63,750	63,750	0,000	152,90	9 747,38	0,00	0,00	9 747,38	0,00	0,00%
		Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP s rozprostřením, vlhčením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm											
		SoD *(0.5*2.5)*5+(0.3*2.5)*2 podsyp pod betonové prahy=7,750 [A]* *20.0*2.8 ŠP podsyp od propustkem=56,000 [B]* *Celkem: 7.75+56=63,750 [C]*											
35	564581111	Zřízení podsypu nebo podkladu ze sypaniny tl 300 mm	M2	6 552,000	6 552,000	0,000	154,21	1 010 383,92	0,00	0,00	1 010 383,92	0,00	0,00%
		Zřízení podsypu nebo podkladu ze sypaniny s rozprostřením, vlhčením, a zhutněním, po zhutnění tl. 300 mm											
		SoD *(910*3.6)*2 délka x šířka x dvakrát do tl. 600mm - úprava typu B2=6 552,000 [A]*											
36	564861113	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 220 mm	M2	17 520,100	17 910,100	390,000	215,26	3 771 376,73	0,00	83 951,40	3 855 328,13	83 951,40	2,23%

Změnový soupis prací SO 102 po změně 19 pro ZBV 45													
Evidenční číslo a název stavby: II/102 hr. hl. města Prahy-Štěchovice, rekonstrukce. ETAPA II								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
Číslo a název SO/PS: SO 102 - Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice								102					
Číslo a název rozpočtu: SO 102 - Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice								Celkem					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 220 mm											
		SoD *11027*1.3 výměna celé konstrukce vozovky=14 335,100 [A]* *910*3.5 délka x šířka - úprava svahu typu B2=3 185,000 [B]* *Celkem: 14335.1+3185=17 520,100 [C]* *ZBV č. 20* *podklad ze ŠD v rozšíření* *1,9*60=114,00 [A]* *ZBV ZBV č. 27* *geodetický protokol Š II 51/2022 92,2 m2=92,200 [A]* *geodetický protokol Š II 58/2022 183,8 m2 =183,800 [B]* *A+B=276,000 [C]*											
37	564871111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm	M2	3 731,000	4 360,900	629,900	298,95	1 115 382,45	0,00	188 308,61	1 303 691,06	188 308,61	16,88%
		Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 250 mm											
		SoD *910*4.1 délka x šířka - polštář ze ŠD v min.tl.0,25m - úprava typu B2=3 731,000 [A]* *ZBV č. 42* *geodetický protokol Š II 14/2023 - rozšíření vozovky* *km 11,780-11,868 94,20=94,200 [A]* *km 11,881-11,909 23,50=23,500 [B]* *km 11,923-12,435 512,20=512,200 [C]* *A+B+C=629,900 [D]*											
38	564951413R	Recyklovaná směs (v mísícím centru) RS 0/32 C3/4 CA (TP 208), tl. 150 mm	M2	19 007,200	0,000	-19 007,200	174,41	3 315 045,75	-3 315 045,75	0,00	0,00	-3 315 045,75	-100,00%
		Podklad nebo podsyp z asfaltového recyklátu s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm											
		SoD *11027*1.15 výměna celé konstrukce vozovky=12 681,050 [A]* *5501*1.15 změna příčného sklonu=6 326,150 [B]* *Celkem: 12681.05+6326.15=19 007,200 [C]*											
		ZBV č. 23 *odpočet původního množství -19 007,20* *nahrazeno novou položkou č. 151*											
39	565125000R	Asfaltová vrstva se zvýšenou odolností proti šíření trhlin SAL tl. 30 mm	M2	13 995,000	20 155,500	6 160,500	246,93	3 455 785,35	0,00	1 521 212,27	4 976 997,62	1 521 212,27	44,02%

Změnový soupis prací SO 102 po změně 19 pro ZBV 45

Evidenční číslo a název stavby: II/102 hr. hl. města Prahy-Štěchovice, rekonstrukce. ETAPA II
Číslo a název SO/PS: SO 102 - Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice
Číslo a název rozpočtu: SO 102 - Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)
102
Celkem

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Asfaltová vrstva se zvýšenou odolností proti šíření trhlin SAL tl. 30 mm											
		SoD *13995 frézování v tl. 60mm=13 995,000 [A]* *ZBV č. 37* *vrstva SAL* *Geodetický protokol* *D 6/2020 505,00=505,000 [A]* *D 13/2020 1873,00=1 873,000 [B]* *Š II 60/2021 450,00=450,000 [C]* *Š II 78/2021 1562,30=1 562,300 [D]* *Š II 100/2021 2203,30=2 203,300 [E]* *Š II 15/2022 251,90=251,900 [F]* *Š II 49/2022 2175,00=2 175,000 [G]* *Š II 63/2022 143,30=143,300 [H]* *Š II 66/2022 1957,40=1 957,400 [I]* *Š II 10/2023 2982,70=2 982,700 [J]* *Š II 22/2023 827,40+467,80=1 295,200 [K]* *Š II 23/2023 1859,90=1 859,900 [L]* *Š II 25/2023 1414,50=1 414,500 [M]* *Š II 30/2023 1482,00=1 482,000 [N]* *odpočet původního množství -13995,00=-13 995,000 [O]* *Celkem A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O=6 160,500 [P]*											
40	565135111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š do 3 m	M2	18 180,800	18 882,900	702,100	235,41	4 279 942,13	0,00	165 281,36	4 445 223,49	165 281,36	3,86%
		Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm											
		SoD *11027*1.1 výměna celé konstrukce vozovky=12 129,700 [A]* *5501*1.1 frézování v tl. 150 mm - změna příčného sklonu=6 051,100 [B]* *Celkem: 12129.7+6051.1=18 180,800 [C]* *ZBV ZBV č. 12* *náhrada odvodňovacího proužku v místě nové opěrné zdi1300*0,5=650,000 [A]* *ZBV č. 21* *protokol Š II 100/2021 km 10,360-10,841 vpravo* *vrstva navíc 52,1=52,100 [A]*											
41	569851111	Zpevnění krajnic štěrkodrtí (recyklát) tl 150 mm	M2	3 435,000	3 558,000	123,000	402,88	1 383 892,80	0,00	49 554,24	1 433 447,04	49 554,24	3,58%
		Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění štěrkodrtí tl. 150 mm											
		SoD *4580*0.5*2*0.75 délka x šířka x obě strany - odhad 75%=3 435,000 [A]* *ZBV č. 45* *U Kiliána 123=123,000 [A]*											
130	572241112	Vyspravení výtluků asfaltovým betonem ACO (AB) tl do 60 mm při vyspravované ploše do 10% na 1 km	M2	2 034,900	2 034,900	0,000	362,06	736 755,89	0,00	0,00	736 755,89	0,00	0,00%
		Vyspravení výtluků materiálem na bázi asfaltu s řezáním, vysekáním, očištěním, zaplněním směsí a zhutněním asfaltovým betonem ACO (AB) při vyspravované ploše na 1 km komunikace do 10 % tl. přes 40 do 60 mm											
		SoD *(11027+13995+2160+5501+8015)*0.05 5% z plochy obrusné vrstvy=2 034,900 [A]*											
42	572531131	Oprava trhlin asfaltovou sanační hmotou š do 40 mm	M	6 674,400	6 674,400	0,000	128,96	860 730,62	0,00	0,00	860 730,62	0,00	0,00%
		Vyspravení trhlin dosavadního krytu asfaltovou sanační hmotou oprava trhlin šířky přes 30 do 40 mm											
		SoD *21600*1.03*0.3=6 674,400 [A]*											
43	573191111	Nátěr infiltrační kationaktivní v množství emulzí 1 kg/m2	M2	38 153,750	38 803,750	650,000	28,06	1 070 594,23	0,00	18 239,00	1 088 833,23	18 239,00	1,70%
		Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1,00 kg/m2											

Změnový soupis prací SO 102 po změně 19 pro ZBV 45

Evidenční číslo a název stavby: II/102 hr. hl. města Prahy-Štěchovice, rekonstrukce. ETAPA II

Číslo a název SO/PS: SO 102 - Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice

Číslo a název rozpočtu: SO 102 - Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

102

Celkem

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		SoD *11027*1.25 výměna celé konstrukce vozovky=13 783,750 [A]* *13995*1.25 frézování v tl. 60mm=17 493,750 [B]* *5501*1.25 frézování v tl. 150 mm při změně příčného sklonu=6 876,250 [C]* *Celkem: 13783.75+17493.75+6876.25=38 153,750 [D]* *ZBV ZBV č. 12* *náhrada odvodňovacího proužku v místě nové opěrné zdi1300*0,5=650,000 [A]*											
44	573231106	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze modif v množství 0,30 kg/m2	M2	40 367,809	47 238,609	6 870,800	12,24	494 101,98	0,00	84 098,59	578 200,57	84 098,59	17,02%

Změnový soupis prací SO 102 po změně 19 pro ZBV 45

Evidenční číslo a název stavby: II/102 hr. hl. města Prahy-Štěchovice, rekonstrukce. ETAPA II
Číslo a název SO/PS: SO 102 - Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice
Číslo a název rozpočtu: SO 102 - Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)
102
Celkem

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,30 kg/m2											
		ZBV ZBV č. 10 *60,3 dle zaměření =60,300 [A]* *ZBV ZBV č. 12* *náhrada odvodňovacího proužku v místě nové opěrné zdi1300*0,5=650,000 [A]*											
		ZBV č. 37 *vrstva SAL* *dle pol. č. 565125000R* *6160,50 m2*											
45	573231113R	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze modif v množství 1,20 kg/m2	M2	41 348,000	41 554,400	206,400	30,47	1 259 873,56	0,00	6 289,01	1 266 162,57	6 289,01	0,50%
		Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,80 kg/m2											
		SoD *11027 výměna celé konstrukce vozovky=11 027,000 [A]* *1300*0.5 v odvodňovacím proužku v místě nové opěrné zdi=650,000 [B]* *13995 frézování v tl. 60mm=13 995,000 [C]* *2160 frézování tl. 100 mm=2 160,000 [D]* *5501+8015 frézování v tl. 150 mm=13 516,000 [E]* *Celkem: 11027+650+13995+2160+13516=41 348,000 [F]* *ZBV ZBV č. 10* *42,1 dle zaměření =42,100 [A]* *ZBV č. 21* *protokol Š II 100/21 km 10,360 -10,841 vpravo* *ACL 16 vyrovnávka tl. 60 mm.....164,3 m2 - přípočet (vrstva navíc)* *164,30=164,300 [A]*											

Změnový soupis prací SO 102 po změně 19 pro ZBV 45													
Evidenční číslo a název stavby: II/102 hr. hl. města Prahy-Štěchovice, rekonstrukce. ETAPA II Číslo a název SO/PS: SO 102 - Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice Číslo a název rozpočtu: SO 102 - Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS) 102 Celkem					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
46	577134131	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu	M2	40 698,000	41 408,300	710,300	241,37	9 823 276,26	0,00	171 445,11	9 994 721,37	171 445,11	1,75%
		Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 40 mm											
		SoD *11027 výměna celé konstrukce vozovky=11 027,000 [A]* *13995 frézování v tl. 60mm=13 995,000 [B]* *2160 frézování tl. 100 mm=2 160,000 [C]* *5501+8015 frézování v tl. 150 mm 11027 při změně příčného sklonu=13 516,000 [D]* *Celkem: 11027+13995+2160+13516=40 698,000 [E]* *ZBV ZBV č. 10* *60,3 dle zaměření =60,300 [A]* *ZBV ZBV č. 12* *náhrada odvodňovacího proužku v místě nové opěrné zdi1300*0,5=650,000 [A]*											
47	577155132	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu	M2	44 402,580	43 003,980	-1 398,600	327,65	14 548 505,34	-685 017,86	226 766,57	14 090 254,05	-458 251,29	-3,15%
		Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 60 mm											
		SoD *11027*1.01 výměna celé konstrukce vozovky=11 137,270 [A]* *13995*1.01 frézování v tl. 60mm=14 134,950 [B]* *2160*1.01 frézování tl. 100 mm=2 181,600 [C]* *(5501+8015)*1.01 frézování v tl. 150 mm 11137.27 při změně příčného sklonu=13 651,160 [D]* *(4580*0.40)*1.5 vyrovnávací vrstva - odhad 40 % délky x šířka=2 748,000 [E]* *183.2*3 délka příčné spáry x délka klínu=549,600 [F]* *Celkem: 11137.27+14134.95+2181.6+13651.16+2748+549.6=44 402,580 [G]* *ZBV ZBV č. 10* *42,1 dle zaměření =42,100 [A]* *ZBV ZBV č. 12* *náhrada odvodňovacího proužku v místě nové opěrné zdi1300*0,5=650,000 [A]* *ZBV č. 21* *protokol Š II 89/21 km 13,199 - 13,696 vlevo* *ACL 16 modif. prům tl. 84,1 mm -2255=-2 255,000 [A]* *protokol Š II 100/2021 km 10,360 -10,841 vpravo* *ACL 16 vyrovnávka tl. 60 mm (vrstva navíc) 164,3=164,300 [B]* *A+B=-2 090,700 [C]*											
48	578133131	Litý asfalt MA 11 IV tl 30 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu	M2	3 250,000	0,000	-3 250,000	518,12	1 683 890,00	-1 683 890,00	0,00	0,00	-1 683 890,00	-100,00%
		Litý asfalt MA 11 (LAS) s rozprostřením z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tl. 30 mm											
		SoD *1300*0.5*5 v odvodňovacím proužku v místě nové opěrné zdi x počet vrstev pro dosažení tl. 60+90=150mm=3 250,000 [A]* *ZBV ZBV č. 12* *odpočet dle SOD - proužek nahrazen konstrukčními vrstvami přilehlé vozovky - 3 250*											

Změnový soupis prací SO 102 po změně 19 pro ZBV 45													
Evidenční číslo a název stavby: II/102 hr. hl. města Prahy-Štěchovice, rekonstrukce. ETAPA II Číslo a název SO/PS: SO 102 - Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice Číslo a název rozpočtu: SO 102 - Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS) 102 Celkem					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
49	594511111	Dlažba z lomového kamene s provedením lože z betonu	M2	5 226,400	5 436,800	210,400	2 927,76	15 301 644,86	-2 233 295,33	2 849 296,03	15 917 645,56	616 000,70	4,03%
		Dlažba nebo přídlažba z lomového kamene lomařsky upraveného rigolového v ploše vodorovné nebo ve sklonu tl. do 250 mm, bez vyplnění spár, s provedením lože tl. 50 mm z betonu											
		SoD *(2*4.5)+(4*3)+(4*1.7*3.0) odlážděnı́ šikmých čel u propustku v km 12,925 41.4 zpevnění stupňů u propustku =41,400 [A]* *970*3.0 odlážděnı́ svahu - úprava typu B1 - odhad prům.šířky=2 910,000 [B]* *910*2.5 obložení povrchu svahu s obalovanými čely - úprava typu B2 - odhad prům.šířky=2 275,000 [C]* *Celkem: 41.4+2910+2275=5 226,400 [D]* *ZBV č. 13* *dle geoetického zaměření* *Š II 37/2021 km 10,360 - 10,422 111,9 m2=111,900 [A]* *Š II 30/2021 km 10,422 - 10,454 48,7 m2=48,700 [B]* *Š II 34/2021 km 10,455 - 10,476 44,9 m2 =44,900 [C]* *Š II 30/2021 km 10,480 - 10,654 369,6 m2=369,600 [D]* *Š II 30/2021 km 10,706 - 10,730 41,4 m2=41,400 [E]* *Š II 38/2021 km 10,730 - 10,840 234,7 m2=234,700 [F]* *A+B+C+D+E+F=851,200 [G]*											
		ZBV č. 39 geodetické protokoly Š II 33/2021 km 13,150-13,190 vlevo 89,90=89,900 [A] Š II 10/2022 km 10,140-10,250 vlevo 191,10=191,100 [B] Š II 12/2022 km 10,001-10,101 vlevo 112,90=112,900 [C] Š II 16/2022 km 10,103-10,140 vlevo 63,0+55,20-77=41,200 [D] Š II 27/2022 km 11,430-11,520 vlevo 191,60=191,600 [E] Š II 35/2022 km 11,220-11,430 vlevo 67,90+268,30=336,200 [F] Š II 43/2022 km 11,520-11663 vlevo 303,20=303,200 [G] Š II 45/2022 km 11,140-11,220 vlevo 187,80=187,800 [H] Š II 47/2022 km 11,671-11,780 vlevo 215,0=215,000 [I] Š II 53/2022 km 14,462-14,580 vlevo 249,30=249,300 [J] Š II 62/2022 km 11,056-11,140 vlevo 214,20=214,200 [K] Š II 65/2022 km 11,340-11,400 vlevo 47,0+160,30=207,300 [L] Š II 1/2023 km 10,840-10947 vlevo 188,7=188,700 [M] Š II 4/2023 km 10,947-11,031 vlevo 165,60=165,600 [N] Š II 7/2023 km 11,976-12,440 vlevo 805,30=805,300 [O] Š II 8/2023 km 11,780-11,971 vlevo 231,10+1,70=232,800 [P] Š II 11/2023 km 14,410-14,460 vlevo 75,40+21,50=96,900 [Q] Š II 13/2023 km 14,425 vlevo 22,40=22,400 [R] Š II 16/2023 km 11,928-12,060 vpravo 279,5=279,500 [S] Š II 27/2023 km 11,733-11,832 vpravo 332,70=332,700 [T] celkem A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q+R+S+T=4 463,600 [U] odpočet původního množství -5226,4=-5 226,400 [V] celkem U+V=- 762,800 [W]											
		ZBV č. 42 geodetický protokol Š II 34/2023 km 11,904-11,930 25,10=25,100 [A] ZBV č. 43 dle pol. č. 451317777 90,90=90,90 ZBV č. 45 6m2											
50	596811221	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva vel do 0,25 m2 plochy do 100 m2	M2	60,000	105,000	45,000	396,53	23 791,80	0,00	17 843,85	41 635,65	17 843,85	75,00%
		Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikací pro pěší s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m s ložem z kameniva těženého tl. do 30 mm velikosti dlaždic přes 0,09 m2 do 0,25 m2, pro plochy přes 50 do 100 m2											
		ZBV č. 45 U Kiliána 45=45,000 [A]											

Změnový soupis prací SO 102 po změně 19 pro ZBV 45

Evidenční číslo a název stavby: II/102 hr. hl. města Prahy-Štěchovice, rekonstrukce. ETAPA II
Číslo a název SO/PS: SO 102 - Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice
Číslo a název rozpočtu: SO 102 - Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)
102
Celkem

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
51	59245212	dlažba zámková profilová základní 19,6x16,1x6 cm přírodní	M2	12,000	61,500	49,500	237,30	2 847,60	0,00	11 746,35	14 593,95	11 746,35	412,50%
		dlažba zámková profilová základní 19,6x16,1x6 cm přírodní											
		SoD *60*0.20 cca 20 % nové dlažby při obnově chodníků, předpokládá se především využití stávající=12,000 [A]* *ZBV č. 45* *U Kiliána 45*1,1=49,500 [A]*											
	8	**Trubní vedení**											
56	592238200	vpusť betonová uliční TBV-Q 500/290 K /skruž/ 29x50x5 cm	KUS	2,000	5,000	3,000	609,76	1 219,52	0,00	1 829,28	3 048,80	1 829,28	150,00%
		vpusť betonová uliční /skruž/ 29x50x5 cm											
		ZBV č. 45 *U Kiliána 1=1,000 [A]* *km 11,687-11,720 1=1,000 [B]* *km 11,2228-11,2584 1=1,000 [C]* *A+B+C=3,000 [D]*											
57	592238210	vpusť betonová uliční TBV-Q 660/180 /prstenec/ 18x66x10 cm	KUS	2,000	2,000	0,000	676,46	1 352,92	0,00	0,00	1 352,92	0,00	0,00%
		vpusť betonová uliční prstenec 18x66x10 cm											
55	592238230	vpusť betonová uliční TBV-Q 500/626 D /dno/ 62,6 x 49,5 x 5 cm	KUS	2,000	5,000	3,000	1 041,47	2 082,94	0,00	3 124,41	5 207,35	3 124,41	150,00%
		vpusť betonová uliční dno 62,6 x 49,5 x 5 cm											
		ZBV č. 45 *U Kiliána 1=1,000 [A]* *km 11,687-11,720 1=1,000 [B]* *km 11,2228-11,2584 1=1,000 [C]* *A+B+C=3,000 [E]*											
52	871315241	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC vícevrstvé tuhost třídy SN12 DN 150	M	20,000	20,000	0,000	1 295,34	25 906,80	0,00	0,00	25 906,80	0,00	0,00%
		Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného vícevrstvého, tuhost třídy SN 12 DN 150											
		*2*10 přípojky k novým UV - odhad=20,000 [A]*											
53	895931111	Vpusti kanalizačních horské z betonu prostého C12/15 velikosti 1200/600 mm	KUS	1,000	1,000	0,000	35 858,74	35 858,74	0,00	0,00	35 858,74	0,00	0,00%
		Vpusti kanalizační horské z betonu prostého tř. C 12/15 velikosti 1200/600 mm											
54	895941111	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální	KUS	2,000	2,000	0,000	6 416,78	12 833,56	0,00	0,00	12 833,56	0,00	0,00%
		Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální											
58	898121129	Sanace potrubí DN 600 polyuretanový nástřik tl.2,4 mm	M	32,000	32,000	0,000	5 181,24	165 799,68	0,00	0,00	165 799,68	0,00	0,00%
		Sanace vodovodního potrubí litinového, ocelového nebo betonového polyuretanový nástřik sanační tloušťka 2,4 mm DN 600											
		SoD *13+19 sanace propustků 32 vtok. objektů přespárováním v km 11,917 32 12,086=32,000 [A]*											
59	898161134	Sanace potrubí vložkování skelným rukávcem DN 1000 tl.8,0 mm	M	32,000	32,000	0,000	22 912,62	733 203,84	0,00	0,00	733 203,84	0,00	0,00%
		Sanace vodovodního potrubí litinového, ocelového nebo betonového vložkování stávajícího potrubí skelným rukávcem [UV-Liner] sanační tloušťky 8 mm DN 1000											
		SoD *13+19 sanace vyvložkováním propustků, příp.vtok.objektů, v km 11,917 32 12,086=32,000 [A]*											
60	899131115R	Bourání uličních vpustí kompletních	KUS	3,000	3,000	0,000	1 344,82	4 034,46	0,00	0,00	4 034,46	0,00	0,00%
		Výměna šachtového rámu [technologií Hermes] tř. D 400 včetně poklopu s osazením a dodáním nového rámu z litiny a betonu [typ BEGU]											
		SoD *2+1 vč. odvozu 3 uložení na skládku=3,000 [A]*											
	9	**Ostatní konstrukce a práce, bourání**											
67	40445158	sloupek silniční směrový plastový 1200mm	KUS	66,168	66,168	0,000	363,84	24 074,57	0,00	0,00	24 074,57	0,00	0,00%
69	40445175	odrazka na svodidla V.1.B	KUS	54,800	54,800	0,000	716,16	39 245,57	0,00	0,00	39 245,57	0,00	0,00%
		odrazka na svodidla V.1.B											
71	40445175a	odrazka na svodidla M.1.B	KUS	4,000	3,000	-1,000	941,84	3 767,36	-941,84	0,00	2 825,52	-941,84	-25,00%

Změnový soupis prací SO 102 po změně 19 pro ZBV 45

Evidenční číslo a název stavby: II/102 hr. hl. města Prahy-Štěchovice, rekonstrukce. ETAPA II

Číslo a název SO/PS: SO 102 - Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice

Číslo a název rozpočtu: SO 102 - Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

102

Celkem

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		ZBV č. 44 *odpočet množství skutečnost* *-1=-1,000 [A]*											
73	404454040	značka dopravní svislá nereflexní FeZn prolis, 500 x 700 mm	KUS	1,000	1,000	0,000	1 306,83	1 306,83	0,00	0,00	1 306,83	0,00	0,00%

Změnový soupis prací SO 102 po změně 19 pro ZBV 45

Evidenční číslo a název stavby: II/102 hr. hl. města Prahy-Štěchovice, rekonstrukce. ETAPA II
Číslo a název SO/PS: SO 102 - Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice
Číslo a název rozpočtu: SO 102 - Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)
102
Celkem

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
74	404454070	značka dopravní svislá nereflexní FeZn prolis, 1100 x 330 mm	KUS	2,000	2,000	0,000	1 862,95	3 725,90	0,00	0,00	3 725,90	0,00	0,00%
75	404454320	značka dopravní svislá nereflexní FeZn-Al rám., D 700 mm	KUS	2,000	2,000	0,000	1 377,06	2 754,12	0,00	0,00	2 754,12	0,00	0,00%
62	55391534	zábradelní systém Pz s výplní ze svislých ocelových tyčí ZSNH4/H2	M	10,000	0,000	-10,000	7 829,44	78 294,40	-78 294,40	0,00	0,00	-78 294,40	-100,00%
		ZBV č. 37 *neprovádělo se*											
93	59217031	obrubník betonový silniční 100 x 15 x 25 cm	M	46,000	104,100	58,100	135,29	6 223,34	0,00	7 860,35	14 083,69	7 860,35	126,30%
		ZBV č. 38 *podklad pod svodidla* *12*2=24* *ZBV č. 45* *U Kiliána 31*1,1=34,100 [A]*											
97	59222001	trouba hrdlová přímá železobetonová s integrovaným těsněním 60 x 250 x 10 cm	M	13,000	13,000	0,000	1 784,45	23 197,85	0,00	0,00	23 197,85	0,00	0,00%
99	59222003	trouba hrdlová přímá železobetonová s integrovaným těsněním 100 x 250 x 13 cm	M	20,000	20,000	0,000	6 372,85	127 457,00	0,00	0,00	127 457,00	0,00	0,00%
61	911121111	Montáž zábradlí ocelového přichyceného vruty do betonového podkladu	M	10,000	0,000	-10,000	863,54	8 635,40	-8 635,40	0,00	0,00	-8 635,40	-100,00%
		ZBV č. 37 *neprovádělo se*											
63	911331135	Svodidlo ocelové jednostranné zádržnosti H1 typ KB1 RH1 V se zaberaněním sloupků v rozmezí do 4 m	M	2 740,000	2 749,000	9,000	1 093,82	2 997 066,80	0,00	9 844,38	3 006 911,18	9 844,38	0,33%
		Silniční svodidlo s osazením sloupků zaberaněním ocelové úroveň zádržnosti H1 vzdálenosti sloupků přes 2 do 4 m jednostranné [KB1 RH1 V]											
		SoD *150+120+26+70 vpravo - dle situace + u benzinky=366,000 [A]* *2374 vlevo - výměna stávajícího svodidla=2 374,000 [B]* *Celkem: 366+2374=2 740,000 [C]* *ZBV č. 38* *geodetický protokol Š II 39/2023* *km 13,887-13,896 v pravo* *9=9*											
64	911381124	Silniční svodidlo betonové jednostranné průběžné délky 4 m výšky 1,2 m	M	48,000	208,000	160,000	5 181,24	248 699,52	0,00	828 998,40	1 077 697,92	828 998,40	333,33%
		SoD *24+24=48,000 [A]* *ZBV č. 38* *geodetický protokol Š II 39/2023* *km 13,764-13,888 vpravo 124 m* *km 13,895-13,979 vpravo 84 m* *124+84=208* *odpočet původního množství -48* *208-48=160,00*											

Změnový soupis prací SO 102 po změně 19 pro ZBV 45													
Evidenční číslo a název stavby: II/102 hr. hl. města Prahy-Štěchovice, rekonstrukce. ETAPA II								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
Číslo a název SO/PS: SO 102 - Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice								102					
Číslo a název rozpočtu: SO 102 - Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice								Celkem					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
65	911381813	Odstranění silničního betonového svodidla délky 2 m výšky 1,0 m	M	24,000	24,000	0,000	2 302,78	55 266,72	0,00	0,00	55 266,72	0,00	0,00%
		Odstranění silničního betonového svodidla s naložením na dopravní prostředek délky 2 m, výšky 1,0 m											
		SoD *24 dle situace - bude nahrazeno novým beton. svodidlem=24,000 [A]*											
66	912211111	Montáž směrového sloupku silničního plastového prosté uložení bez betonového základu	KUS	66,240	66,240	0,000	276,33	18 304,10	0,00	0,00	18 304,10	0,00	0,00%
		Montáž směrového sloupku plastového s odrazkou prostým uložením bez betonového základu silničního											
		SoD *(2880/50)*1.15 km 11,700 - 14,580=66,240 [A]*											
68	912311111	Montáž odrazky na ocelové svodidlo	KUS	54,800	54,800	0,000	217,61	11 925,03	0,00	0,00	11 925,03	0,00	0,00%
		SoD *2740/50 délka svodidla dle pol. 911331135/odrazky po 50-ti metrech - jen na jedné straně silnice, na druhé straně budou směrové sloupky=54,800 [A]*											
70	912321111	Montáž odrazky na betonové svodidlo	KUS	4,000	0,000	-4,000	316,63	1 266,52	-1 266,52	0,00	0,00	-1 266,52	-100,00%
		ZBV č. 44 *odpočet množství skutečnost* *-4=-4,000 [A]*											
72	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	KUS	5,000	5,000	0,000	609,08	3 045,40	0,00	0,00	3 045,40	0,00	0,00%
		Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly											
		SoD *2+1+2 2 x Z4a 5 1 x IJ4c + B21a 5 B21b=5,000 [A]*											
76	914511111	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem	KUS	5,000	5,000	0,000	995,95	4 979,75	0,00	0,00	4 979,75	0,00	0,00%
		Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do betonového základu											
77	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou	KUS	7,000	6,000	-1,000	995,95	6 971,65	-995,95	0,00	5 975,70	-995,95	-14,29%
		ZBV č. 44 *odpočet množství skutečnost* *-1=-1,000 [A]*											
78	915111111	Vodorovné dopravní značení dělící čáry souvislé š 125 mm základní bílá barva	M	2 450,000	1 281,000	-1 169,000	13,24	32 438,00	-15 477,56	0,00	16 960,44	-15 477,56	-47,71%
		Vodorovné dopravní značení stříkané barvou dělící čára šířky 125 mm souvislá bílá základní											
		SoD *2450 V1a - dle situace=2 450,000 [A]*											
		ZBV č. 44 *odpočet množství skutečnost* *-1169=-1 169,000 [A]*											
79	915111115	Vodorovné dopravní značení dělící čáry souvislé š 125 mm základní žlutá barva	M	137,000	0,000	-137,000	19,57	2 681,09	-2 681,09	0,00	0,00	-2 681,09	-100,00%
		Vodorovné dopravní značení stříkané barvou dělící čára šířky 125 mm souvislá žlutá základní											
		SoD *35+38+64 V11a (0,125) - dle situace=137,000 [A]* *ZBV č. 44* *odpočet množství skutečnost* *-137,0=-137,00 [A]*											
80	915111121	Vodorovné dopravní značení dělící čáry přerušované š 125 mm základní bílá barva	M	1 050,000	1 050,000	0,000	11,51	12 085,50	0,00	0,00	12 085,50	0,00	0,00%
		Vodorovné dopravní značení stříkané barvou dělící čára šířky 125 mm přerušovaná bílá základní											
		SoD *550 V2a (3/6/0,125) - dle situace=550,000 [A]* *450 V2b (3/1,5/0,125) - dle situace=450,000 [B]* *50 V2b (1,5/1,5/0,12) - dle situace=50,000 [C]* *Celkem: 550+450+50=1 050,000 [D]*											

Změnový soupis prací SO 102 po změně 19 pro ZBV 45													
Evidenční číslo a název stavby: II/102 hr. hl. města Prahy-Štěchovice, rekonstrukce. ETAPA II								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
Číslo a název SO/PS: SO 102 - Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice								102					
Číslo a název rozpočtu: SO 102 - Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice								Celkem					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
81	915121111	Vodorovné dopravní značení vodící čáry souvislé š 250 mm základní bíllá barva	M	9 466,000	6 642,000	-2 824,000	23,03	218 001,98	-65 036,72	0,00	152 965,26	-65 036,72	-29,83%
		Vodorovné dopravní značení stříkané barvou vodící čára bílá šířky 250 mm souvislá základní											
		SoD *9466 V4 (0,25) - dle situace=9 466,000 [A]*											
		ZBV č. 44 *odpočet množství skutečnost* *-2824=-2824*											
82	915131111	Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly základní bílá barva	M2	116,750	109,750	-7,000	110,53	12 904,38	-773,71	0,00	12 130,67	-773,71	-6,00%
		Vodorovné dopravní značení stříkané barvou přechody pro chodce, šipky, symboly bílé základní											
		SoD *100 V13a - dle situace=100,000 [A]* *10*1.5 V9a - dle situace - 10 ks x plocha jedné šipky=15,000 [B]* *3.5*0.5 V5(0,5) - dle situace - STOP čára=1,750 [C]* *Celkem: 100+15+1.75=116,750 [D]* *ZBV č. 44* *odpočet množství skutečnost* *-7=-7*											
83	915131115	Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly základní žlutá barva	M2	18,000	0,000	-18,000	234,88	4 227,84	-4 227,84	0,00	0,00	-4 227,84	-100,00%
		Vodorovné dopravní značení stříkané barvou přechody pro chodce, šipky, symboly žluté základní											
		SoD *(3.0*1.0)*6 nápisy BUS - rozměry dle TZ x 6 kusů=18,000 [A]* *ZBV č. 44* *odpočet množství skutečnost* *-18=-18*											
84	915211112	Vodorovné dopravní značení dělící čáry souvislé š 125 mm retroreflexní bílý plast	M	2 450,000	2 450,000	0,000	39,15	95 917,50	0,00	0,00	95 917,50	0,00	0,00%
		Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem dělící čára šířky 125 mm souvislá bílá retroreflexní											
		SoD *2450 V1a - dle situace=2 450,000 [A]*											
85	915211116	Vodorovné dopravní značení dělící čáry souvislé š 125 mm retroreflexní žlutý plast	M	137,000	0,000	-137,000	55,27	7 571,99	-7 571,99	0,00	0,00	-7 571,99	-100,00%
		Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem dělící čára šířky 125 mm souvislá žlutá retroreflexní											
		SoD *35+38+64 V11a (0,125) - dle situace=137,000 [A]* *ZBV č. 44* *odpočet množství skutečnost* *-137=-137*											

Změnový soupis prací SO 102 po změně 19 pro ZBV 45

Evidenční číslo a název stavby: II/102 hr. hl. města Prahy-Štěchovice, rekonstrukce. ETAPA II
Číslo a název SO/PS: SO 102 - Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice
Číslo a název rozpočtu: SO 102 - Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)
102
Celkem

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
86	915211122	Vodorovné dopravní značení dělící čáry přerušované š 125 mm retroreflexní bílý plast	M	1 050,000	1 050,000	0,000	39,15	41 107,50	0,00	0,00	41 107,50	0,00	0,00%
		Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem dělící čára šířky 125 mm přerušovaná bílá retroreflexní											
		SoD *550 V2a (3/6/0,125) - dle situace=550,000 [A]* *450 V2b (3/1,5/0,125) - dle situace=450,000 [B]* *50 V2b (1,5/1,5/0,12) - dle situace=50,000 [C]* *Celkem: 550+450+50=1 050,000 [D]*											
87	915221112	Vodorovné dopravní značení vodící čáry souvislé š 250 mm retroreflexní bílý plast	M	9 466,000	9 160,000	-306,000	78,29	741 093,14	-23 956,74	0,00	717 136,40	-23 956,74	-3,23%
		Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem vodící čára bílá šířky 250 mm souvislá retroreflexní											
		SoD *9466 V4 (0,25) - dle situace=9 466,000 [A]* *ZBV č. 44* *odpočet množství skutečnost* *-306=-306*											
88	915231112	Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly retroreflexní bílý plast	M2	116,750	116,750	0,000	385,71	45 031,64	0,00	0,00	45 031,64	0,00	0,00%
		Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem přechody pro chodce, šipky, symboly nápisy bílé retroreflexní											
		SoD *100 V13a - dle situace=100,000 [A]* *10*1.5 V9a - dle situace - 10 ks x plocha jedné šipky=15,000 [B]* *3.5*0.5 V5(0,5) - dle situace - STOP čára=1,750 [C]* *Celkem: 100+15+1.75=116,750 [D]*											
89	915231116	Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly retroreflexní žlutý plast	M2	18,000	18,000	0,000	690,83	12 434,94	0,00	0,00	12 434,94	0,00	0,00%
		Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem přechody pro chodce, šipky, symboly nápisy žluté retroreflexní											
		SoD *(3.0*1.0)*6 nápisy BUS - rozměry dle TZ x 6 kusů=18,000 [A]*											
90	915611111	Předznačení vodorovného liniového značení	M	13 103,000	12 660,000	-443,000	2,88	37 736,64	-1 275,84	0,00	36 460,80	-1 275,84	-3,38%
		Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot liniové dělicí čáry, vodicí proužky											
		SoD *2450+137+1050+9466 dle pol. 915111111, 915111115, 915111121 13103 915121111=13 103,000 [A]* *ZBV č. 44* *odpočet množství skutečnost* *-443=-443*											

Změnový soupis prací SO 102 po změně 19 pro ZBV 45													
Evidenční číslo a název stavby: II/102 hr. hl. města Prahy-Štěchovice, rekonstrukce. ETAPA II Číslo a název SO/PS: SO 102 - Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice Číslo a název rozpočtu: SO 102 - Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS) 102 Celkem					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
91	915621111	Předznačení vodorovného plošného značení	M2	134,750	134,750	0,000	6,91	931,12	0,00	0,00	931,12	0,00	0,00%
		Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot plošné šipky, symboly, nápisy											
		SoD *116.75+18 dle pol. 915131111 134.75 915131115=134,750 [A]*											
92	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	M	46,000	109,000	63,000	518,95	23 871,70	0,00	32 693,85	56 565,55	32 693,85	136,96%
		Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z betonu prostého téže značky											
		SoD *29+17 dle situace=46,000 [A]* *ZBV č. 45* *U Kiliána 31+2+30=63,000 [A]*											
94	919122122	Těsnění spár zálivkou za tepla pro komůrky š 15 mm hl 30 mm s těsnicím profilem	M	696,000	244,000	-452,000	116,82	81 306,72	-75 933,00	23 130,36	28 504,08	-52 802,64	-64,94%
		Utěsnění dilatačních spár zálivkou za tepla v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezního nátěru s těsnicím profilem pod zálivkou, pro komůrky šířky 15 mm, hloubky 30 mm											
		SoD *1300*0.5 v odvodňovacím proužku v místě nové opěrné zdi=650,000 [A]* *46 podél obrubníku=46,000 [B]* *Celkem: 650+46=696,000 [C]* *ZBV ZBV č. 12* *odpočet dle SOD - proužek nahrazen konstrukčními vrstvami přilehlé vozovkyč. 12 odpočet -650* *ZBV č. 45* *U Kilána 58=58,000 [A]* *km 11,687-11,720 2,0*(33+0,5)=67,000 [C]* *km 11,2228-11,2584 2,0*(36,0+0,5)=73,000 [B]* *A+B+C=198,000 [D]*											
95	919131210R	Kotvení na povrchu z betonářské výztuže dl. do 3m	KUS	227,500	227,500	0,000	4 029,86	916 793,15	0,00	0,00	916 793,15	0,00	0,00%
		Vyztužení dilatačních spár v cementobetonovém krytu kotvami průměru 16 mm, délky 1 200 mm											
		SoD *910/1.0/4 kotvy po jednom metru, potřebná délka cca 600mm, tzn. jedna výztuž dl.3,0m rozdělená na čtvrtiny=227,500 [A]*											
96	919521140	Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo ŽB DN 600	M	13,000	13,000	0,000	3 333,04	43 329,52	0,00	0,00	43 329,52	0,00	0,00%
		Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo železobetonových DN 600 mm											
		SoD *13 v km 13,89=13,000 [A]*											
98	919521180	Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo ŽB DN 1000	M	20,000	20,000	0,000	5 724,70	114 494,00	0,00	0,00	114 494,00	0,00	0,00%
		Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo železobetonových DN 1000 mm											
		SoD *20 v km 12,925=20,000 [A]*											
100	919535558	Obetonování trubního propustku betonem prostým tř. C 20/25	M3	29,680	29,680	0,000	4 081,06	121 125,86	0,00	0,00	121 125,86	0,00	0,00%
		Obetonování trubního propustku betonem prostým bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25											
		SoD *(13*0.50)+(19*1.22) délka x plocha obetonování v řezu =29,680 [A]*											
101	919716111	Výztuž cementobetonového krytu ze svařovaných sítí KARI hmotnosti do 7,5 kg/m2	T	0,077	0,077	0,000	32 954,10	2 537,47	0,00	0,00	2 537,47	0,00	0,00%
		Ocelová výztuž cementobetonového krytu ze svařovaných sítí KARI hmotnosti do 7,5 kg/m2											
		SoD *((1.7*3.0)*7.5*2)*0.001 vyztužení betonového lože dle v.č. 5=0,077 [A]*											

Změnový soupis prací SO 102 po změně 19 pro ZBV 45													
Evidenční číslo a název stavby: II/102 hr. hl. města Prahy-Štěchovice, rekonstrukce. ETAPA II								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
Číslo a název SO/PS: SO 102 - Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice								102					
Číslo a název rozpočtu: SO 102 - Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice								Celkem					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
102	919721101	Geomříž pro stabilizaci podkladu tkaná z PP podélná pevnost v tahu do 50 kN/m	M2	3 185,000	3 185,000	0,000	176,12	560 942,20	0,00	0,00	560 942,20	0,00	0,00%
		Geomříž pro stabilizaci podkladu tkaná z polyesteru, podélná pevnost v tahu do 50 kN/m											
		SoD *910*3.5 délka x šířka - úprava svahu typu B2=3 185,000 [A]*											
103	919721202	Geomříž pro vyztužení asfaltového povrchu z PP s geotextilií	M2	40 698,000	40 698,000	0,000	102,22	4 160 149,56	0,00	0,00	4 160 149,56	0,00	0,00%
		Geomříž pro vyztužení asfaltového povrchu z polypropylénu s geotextilií											
		SoD *11027 bouraná vozovka v celé tloušťce =11 027,000 [A]* *13995+5501+8015+2160 frézování v různých tloušťkách=29 671,000 [B]* *Celkem: 11027+29671=40 698,000 [C]*											

Změnový soupis prací SO 102 po změně 19 pro ZBV 45

Evidenční číslo a název stavby: II/102 hr. hl. města Prahy-Štěchovice, rekonstrukce. ETAPA II
Číslo a název SO/PS: SO 102 - Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice
Číslo a název rozpočtu: SO 102 - Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)
102
Celkem

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
104	919732221	Styčná spára napojení nového živičného povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm bez prořezání	M	4 826,200	5 068,200	242,000	116,82	563 796,68	0,00	28 270,44	592 067,12	28 270,44	5,01%
		Styčná pracovní spára při napojení nového živičného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm bez prořezání spáry											
		SoD *(55+8) řezání v napojeních na vedl.ulice + na ZÚ 63 na KÚ - při napojování vrstev=63,000 [A]* *4580 podélná spára=4 580,000 [B]* *(4580/200)*8.0 příčné spáry - předpoklad stavebních úseků po 200 m=183,200 [C]* *Celkem: 63+4580+183.2=4 826,200 [D]* *ZBV ZBV č. 10* *33,0 + 2*0,5 dle zaměření km 10,250 - 10,283 =34,000 [A]* *ZBV č. 38* *nové betonové svodidlo 208*											
105	919735113	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 150 mm	M	5 585,200	5 133,200	-452,000	130,38	728 198,38	-84 747,00	25 815,24	669 266,62	-58 931,76	-8,09%
		Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm											
		SoD *(55+8)*2 řezání v napojeních na vedl.ulice + na ZÚ 126 na KÚ - při frézování 126 při napojování vrstev=126,000 [A]* *46 podél obrubníku=46,000 [B]* *4580 podélná spára=4 580,000 [C]* *(4580/200)*8.0 příčné spáry - předpoklad stavebních úseků po 200 m=183,200 [D]* *650 v odvodňovacím proužku v místě nové opěrné zdi=650,000 [E]* *Celkem: 126+46+4580+183.2+650=5 585,200 [F]* *ZBV č. 12* *odpočet -650* *ZBV č. 45* *U Kiliána 58=58,000 [A]* *km 11,687-11,720 (33+0,5)*2=67,000 [B]* *km 11,2228-11,2584 (36+0,5)*2=73,000 [C]* *A+B+C=198,000 [D]*											
106	938902113	Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosu do 0,5 m3/m	M	2 290,000	2 290,000	0,000	95,49	218 672,10	0,00	0,00	218 672,10	0,00	0,00%
		Profilace a čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem s odstraněním travnatého porostu nebo nánosu, s úpravou dna a svahů do předepsaného profilu a s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m nezpevněných nebo zpevněných objemu nánosu přes 0,30 do 0,50 m3/m											
		SoD *4580/2 odhad půlka trasy=2 290,000 [A]*											
107	938902462	Čištění propustků ručně D do 1000 mm při tl nánosu do 50% DN	M	32,000	32,000	0,000	481,28	15 400,96	0,00	0,00	15 400,96	0,00	0,00%
		Čištění propustků s odstraněním travnatého porostu nebo nánosu, s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m ručně tloušťky nánosu přes 25 do 50% průměru propustku přes 500 do 1000 mm											
		SoD *8 propust v km 12,068 - větší délka než 8 m musí být v příplatku - dle pol. 938902499=8,000 [A]* *8 propust v km 11,917 - větší délka než 8 m musí být v příplatku - dle pol. 938902499=8,000 [B]* *2*8 čištění přípojek v km 11,612 8 11,262 u výměny UV=16,000 [C]* *Celkem: 8+8+16=32,000 [D]*											
108	938902499	Příplatek k čištění propustků delších než 8 m za každý další 1 m délky	M	16,000	16,000	0,000	96,26	1 540,16	0,00	0,00	1 540,16	0,00	0,00%
		Čištění propustků s odstraněním travnatého porostu nebo nánosu, s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m Příplatek k cenám za délku propustku přes 8 m za každý další 1 m											
		SoD *(19-8)+(13-8) =16,000 [A]*											
109	938902500R	Čištění stávajících uličních vpustí	KUS	43,000	43,000	0,000	2 562,99	110 208,57	0,00	0,00	110 208,57	0,00	0,00%

Změnový soupis prací SO 102 po změně 19 pro ZBV 45													
Evidenční číslo a název stavby: II/102 hr. hl. města Prahy-Štěchovice, rekonstrukce. ETAPA II Číslo a název SO/PS: SO 102 - Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice Číslo a název rozpočtu: SO 102 - Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS) 102 Celkem					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		SoD *7*2 7 kusů dvojitých horských vpustí dle situace=14,000 [A]* *29 UV dle situace=29,000 [B]* *Celkem: 14+29=43,000 [C]*											

Změnový soupis prací SO 102 po změně 19 pro ZBV 45

Evidenční číslo a název stavby: II/102 hr. hl. města Prahy-Štěchovice, rekonstrukce. ETAPA II
Číslo a název SO/PS: SO 102 - Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice
Číslo a název rozpočtu: SO 102 - Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)
102
Celkem

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
110	938909331	Čištění vozovek metením ručně podkladu nebo krytu betonového nebo živičného	M2	29 671,000	29 731,300	60,300	3,65	108 299,15	0,00	220,09	108 519,24	220,09	0,20%
		Čištění vozovek metením bláta, prachu nebo hlinitého nánosu s odklizením na hromady na vzdálenost do 20 m nebo naložením na dopravní prostředek ručně povrchu podkladu nebo krytu betonového nebo živičného											
		SoD *13995+(5501+8015)+2160 po frézování asf. krytu 29671 CB konstrukce=29 671,000 [A]* *ZBV ZBV č. 10* *60,3 dle zaměření =60,300 [A]*											
111	938909612	Odstranění nánosu na krajnicích tl do 200 mm	M2	4 580,000	4 580,000	0,000	376,22	1 723 087,60	0,00	0,00	1 723 087,60	0,00	0,00%
		Čištění krajnic odstraněním nánosu (ulehlého, popř. zajetděného) naneseného vlivem silničního provozu, s přemístěním na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ale bez složení průměrné tloušťky přes 100 do 200 mm											
		SoD *4580*0.5*2=4 580,000 [A]*											
112	966005311	Rozebrání a odstranění silničního svodidla s jednou pásnicí	M	2 444,000	4 393,000	1 949,000	291,03	711 277,32	0,00	567 217,47	1 278 494,79	567 217,47	79,75%
		Rozebrání a odstranění silničního zábradlí a ocelových svodidel s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 10 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásypem jam po odstraněných sloupcích a s jeho zhutněním svodidla včetně sloupků, s jednou pásnicí silničního											
		SoD *2374 VLEVO=2 374,000 [A]* *70 vpravo v km 14,3 u benzinky=70,000 [B]* *Celkem: 2374+70=2 444,000 [C]* *ZBV č. 15* *dle geodetického protokolu č. Š II 3/2022* *km 13,196-13,596 400=400,000 [A]* *ZBV. Č. 43* *geodetický protokol Š II 35/2023* *vlevo celkem 3233=3 233,000 [A]* *vpravo celkem 760=760,000 [B]* *odpočet původního množství -2444=-2 444,000 [C]* *A+B+C=1 549,000 [D]*											
113	966006132	Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami	KUS	10,000	0,000	-10,000	1 727,08	17 270,80	-17 270,80	0,00	0,00	-17 270,80	-100,00%
		Odstranění dopravních nebo orientačních značek se sloupkem s uložením hmot na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásypem jam a jeho zhutněním s betonovou patkou											
		SoD *2 dle situace vč. sloupků=2,000 [A]* *6+2 odstranění stáv. značek s ponecháním na místě - nově zabudovat do římsy dle SO 253=8,000 [B]* *Celkem: 2+8=10,000 [C]* *ZBV č. 44* *odpočet množství skutečnost* *-10=-10*											
114	966006211	Odstranění svislých dopravních značek ze sloupů, sloupků nebo konzol	KUS	2,000	0,000	-2,000	103,62	207,24	-207,24	0,00	0,00	-207,24	-100,00%
		Odstranění (demontáž) svislých dopravních značek s odklizením materiálu na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ze sloupů, sloupků nebo konzol											
		ZBV č. 44 *odpočet množství skutečnost* *-2=-2*											
115	966008113	Bourání trubního propustku do DN 800	M	13,000	13,000	0,000	1 135,27	14 758,51	0,00	0,00	14 758,51	0,00	0,00%
		Bourání trubního propustku s odklizením a uložením vybouraného materiálu na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z trub DN přes 500 do 800 mm											
		13 v km 13,890 výměna trubního propustku DN 600=13,000 [A]											

Změnový soupis prací SO 102 po změně 19 pro ZBV 45

Evidenční číslo a název stavby: II/102 hr. hl. města Prahy-Štěchovice, rekonstrukce. ETAPA II
Číslo a název SO/PS: SO 102 - Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice
Číslo a název rozpočtu: SO 102 - Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)
102
Celkem

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
116	966008116R	Bourání trubního propustku do DN 1200	M	15,000	15,000	0,000	1 892,11	28 381,65	0,00	0,00	28 381,65	0,00	0,00%
		Bourání trubního propustku s odklizením a uložením vybouraného materiálu na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z trub DN přes 800 do 1200 mm											
		15 km 12,925 vpravo - bourání kamenného propustku se ŽB deskou vč.zemních prací, bude nahrazen trubním prop. DN 1000 se šikmými čely=15,000 [A]											
117	977141132	Vrty pro kotvy do betonu průměru 32 mm hloubky 220 mm s vyplněním epoxidovým tmelem	KUS	7,000	7,000	0,000	287,85	2 014,95	0,00	0,00	2 014,95	0,00	0,00%
		Vrty pro kotvy do betonu s vyplněním epoxidovým tmelem, průměru 32 mm, hloubky 220 mm											
118	979071121	Očištění dlažebních kostek drobných s původním spárováním kamenivem těženým	M2	10,000	110,900	100,900	84,40	844,00	0,00	8 515,96	9 359,96	8 515,96	1009,00%
		Očištění vybouraných dlažebních kostek od spojovacího materiálu, s uložením očištěných kostek na skládku, s odklizením odpadových hmot na hromady a s odklizením vybouraných kostek na vzdálenost do 3 m drobných, s původním vyplněním spár kamenivem těženým											
		SoD *10 dlažba z chodníku na ZÚ=10,000 [A]* *ZBV č. 15* *dle geodetického protokolu č. Š II 3/2022* *km 13,2-13,7 100,9=100,900 [A]*											
	997	**Přesun sutě**											

Změnový soupis prací SO 102 po změně 19 pro ZBV 45

Evidenční číslo a název stavby: II/102 hr. hl. města Prahy-Štěchovice, rekonstrukce. ETAPA II
Číslo a název SO/PS: SO 102 - Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice
Číslo a název rozpočtu: SO 102 - Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)
102
Celkem

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
119	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	T	3 197,830	4 180,677	982,847	13,82	44 194,01	0,00	13 582,95	57 776,96	13 582,95	30,73%
		Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km											
		SoD *3197.83=3 197,830 [A]* *ZBV ZBV č. 27* *geodetický protokol Š II 51/2022 92,2 m2=92,200 [A]* *geodetický protokol Š II 58/2022 183,8 m2 =183,800 [B]* *dle pol. č. 153 výměna podloží 60% z celkového množství 276 m2, tl. 20-30 cm* *(276*0,6)*0,25*2=82,8 [C]* *(A+B)*0,22*2,0+82,8=204,24 [D]* *ZBV č. 38* *dle pol. č. 113107223 a 132151101* *325,5*(0,25+0,3)/2*1,9+0,9*1,9=171,784* *ZBV č. 41* *(574,1*0,04+327,1*0,05+2818,2*0,1-675,1*0,2)*2,5=465,298 [A]* *ZBV č. 45* *U Kiliána* *153*0,15*2,5=57,375 [A]* *153*0,25*2,2=84,150 [B]* *A+B=141,525 [D]*											
120	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	T	2 494,356	2 494,356	0,000	13,82	34 472,00	0,00	0,00	34 472,00	0,00	0,00%
		Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km											
		SoD *741.96+4.128+0.688+593.42+1154.16=2 494,356 [A]*											
121	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	T	79 690,604	93 450,462	13 759,858	7,03	560 224,95	0,00	96 731,80	656 956,75	96 731,80	17,27%
		Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km											
		SoD *(3197.83+2494.356)*14 celková vzdálenost odvozu 15 km =79 690,604 [A]* *ZBV ZBV č. 27* *dle pol. č. 997221551* *204,24*14=2859,36 [A]* *ZBV č. 38* *dle pol. č. 997221551* *171,784*14=2404,976* *ZBV č. 41* *dle pol .č. 997221551* *465,298*14=6 514,172 [A]* *ZBV č. 45* *U Kiliána dle pol. č. 997221551 141,525*14=1 981,350 [A]*											

Změnový soupis prací SO 102 po změně 19 pro ZBV 45

Evidenční číslo a název stavby: II/102 hr. hl. města Prahy-Štěchovice, rekonstrukce. ETAPA II
Číslo a název SO/PS: SO 102 - Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice
Číslo a název rozpočtu: SO 102 - Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)
102
Celkem

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
122	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	T	11 138,845	11 239,165	100,320	27,06	301 417,15	0,00	2 714,66	304 131,81	2 714,66	0,90%
		Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km											
		SoD *2646.48+1441.485+1411.456+5639.424=11 138,845 [A]* *ZBV č. 38* *svodidlo (36+48+48)*0,76=100,32*											
123	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	T	155 943,830	156 837,590	893,760	0,58	90 447,42	0,00	518,38	90 965,80	518,38	0,57%
		Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km											
		SoD *11138.845*14 celkem vzdálenost skládky 15 km - odhad=155 943,830 [A]* *ZBV č. 38* *dle pol. č. 997221561* *63,84*14=893,76*											
124	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	T	310,867	6 936,286	6 625,419	51,81	16 106,02	0,00	343 262,96	359 368,98	343 262,96	2131,27%
		Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km											
		11.75+15.6+18.04+21.072+170.268+0.172+26.715+45.9 +1.35=310,867 [A] *ZBV č. 13* *dle pol. 114203103 297,85*2,6=774,410 [A]* *ZBV č. 15* *žlab 69,4*0,134=9,300 [A]* *podkla. beton (69,4+100,9)*0,24=40,872 [B]* *svodidlo 400*0,042=16,800 [C]* *A+B+C=66,972 [D]* *ZBV ZBV č. 27* *geodetický protokol Š II 51/2022 92,2 m2=92,200 [A]* *geodetický protokol Š II 58/2022 183,8 m2 =183,800 [B]* *(A+B)*0,15*2,3=95,220 [C]* *ZBV č. 39* *dle pol. 114203102 1562,26*2,6=4061,876 [A]* *ZBV č. 41* *(.9843.28*0.04.8296.4*0.05+14997.1*0.1)*2.2=1.608.540[A]*											
		ZBV č. 42 *odbourání původní zdi propustku* *geodetický protokol Š II 18/2023* *vpravo 3,26=3,260 [A]* *vlevo 2,70=2,700 [B]* *(A+B)*2,2=13,112 [C]*											
		ZBV č. 45 *km 11,687-11,720 2,0*3,0*0,2=1,200 [A]* *km 11,2228-11,2584 2,0*3,0*0,2=1,200 [B]* *(A+B)*2,2=5,280 [C]*											

Změnový soupis prací SO 102 po změně 19 pro ZBV 45

Evidenční číslo a název stavby: II/102 hr. hl. města Prahy-Štěchovice, rekonstrukce. ETAPA II

Číslo a název SO/PS: SO 102 - Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice

Číslo a název rozpočtu: SO 102 - Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

102

Celkem

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
125	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	T	4 352,138	97 107,696	92 755,558	5,76	25 068,31	0,00	534 272,01	559 340,32	534 272,01	2131,26%
		Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km											
		SoD *310.867*14 celkem vzdálenost skládky 15 km - odhad=4 352,138 [A]* *ZBV č. 13* *do vzdálenosti 15 km* *dle pol. 114203103 297,85*2,6*14=10 841,740 [A]* *ZBV č. 15* *do vzdálenosti 15 km* *dle pol č. 997221571* *66,972*14=937,608 [A]* *ZBV ZBV č. 27* *dle pol. č. 997221571* *95,22*14=1 333,080 [A]* *ZBV č. 39* *dlle pol. č. 997221571* *4061,876*14=56866,264 [A]* *ZBV č. 41* *dle pol. č. 997221571* *1608,527*14=22 519,378 [A]*											

Změnový soupis prací SO 102 po změně 19 pro ZBV 45													
Evidenční číslo a název stavby: II/102 hr. hl. města Prahy-Štěchovice, rekonstrukce. ETAPA II Číslo a název SO/PS: SO 102 - Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice Číslo a název rozpočtu: SO 102 - Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS) 102 Celkem					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		ZBV č. 42 *dle pol. č. 997221571* *13,112*14=183,568 [A]* *ZBV č. 45* *dle pol. č. 99722157 5,28*14=73,920 [A]*											
126	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	T	10 352,419	10 664,193	311,774	34,54	357 572,55	0,00	10 768,67	368 341,22	10 768,67	3,01%
		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) betonového											
		SoD *310.867-170.268 dle pol. 997221571 - odečet ocelového svodidla dle pol. 966005311=140,599 [A]* *10211.82 dle pol. 997221561=10 211,820 [B]* *Celkem: 140.599+10211.82=10 352,419 [C]* *ZBV č. 15* *dle pol č. 997221571* *50,172=50,172 [A]* *ZBV ZBV č. 27* *dle pol. č. 9777221571* *95,22=95,220 [A]* *ZBV č. 38* *svodidlo (36+48)*0,76=63,84* *ZBV č. 42* *dle pol. č. 997221571* *13,112=13,112 [A]* *ZBV č. 45* *U Kiliána 153*0,25*2,2=84,150 [A]* *dle pol. č. 99722157 5,28=5,280 [B]* *A+B=89,43 [D]*											
127	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	T	3 197,830	4 348,264	1 150,43	34,54	110 453,05	0,00	39 735,99	150 189,04	39 735,99	100,00%
		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z kameniva											
		SoD *3197.83 dle pol. 997221551=3 197,830 [A]* *ZBV č. 13* *dle pol. 114203103 297,85*2,6=774,410 [A]* *ZBV ZBV č. 27* *dle pol. č. 997221551* *204,24=204,24 [A]* *ZBV č. 38* *dle pol. č. 997111551* *171,784=171,784*											

Změnový soupis prací SO 102 po změně 19 pro ZBV 45

Evidenční číslo a název stavby: II/102 hr. hl. města Prahy-Štěchovice, rekonstrukce. ETAPA II
Číslo a název SO/PS: SO 102 - Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice
Číslo a název rozpočtu: SO 102 - Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)
102
Celkem

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	998	**Přesun hmot**											
128	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	T	5 047,476	5 842,638	795,16	147,76	745 815,05	0,00	117 493,14	863 308,19	117 493,14	100,00%
		Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu											
		ZBV č. 13 *dle pol. 594511111 851,2*0,614=522,637 [A]* *ZBV č. 15* *dle geodetického protokolu č. Š II 3/2022* *km 13,2-13,7* *žlaby 69,4*0,134=9,300 [A]* *ZBV č. 38* *svodidlo160*0,76=121,6* *dlažba 15*0,101=1,515* *palisáda 75*0,6702=50,265* *celkem 121,60+1,515+50,265=173,38* *ZBV č. 42* *dle pol. 594511111 25,10*0,614=15,411 [A]* *ZBV č. 43* *dle pol. 594511111 90,90*0,614=55,813 [A]* *ZBV č. 45* *45*0,161+33*0,102+30*0,011+(29+33+36)*0,0735+3*0,101+3*0,058=18,621 [A]*											
129	998225194	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živičným, betonovým do 5000 m	T	5 047,476	5 842,638	795,16	29,55	149 152,92	0,00	23 497,04	172 649,96	23 497,04	100,00%
		Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 5000 m											
		ZBV č. 13 dle pol. 998225111 851,2*0,614=522,637 [A] ZBV č. 15 dle geodetického protokolu č. Š II 3/2022 km 13,2-13,7 žlaby 69,4*0,134=9,300 [A] ZBV č. 38 dle pol. č. 998225111 173,38=173,38 ZBV č. 42 dle pol. 594511111 25,10*0,614=15,411 [A] ZBV č. 43 dle pol. 594511111 90,90*0,614=55,813 [A] ZBV č.45 dle pol. č. 998225111 18,621=18,621											

Změnový soupis prací SO 102 po změně 19 pro ZBV 45

Evidenční číslo a název stavby: II/102 hr. hl. města Prahy-Štěchovice, rekonstrukce. ETAPA II
Číslo a název SO/PS: SO 102 - Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice
Číslo a název rozpočtu: SO 102 - Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)
102
Celkem

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		NOVÉ POLOŽKY											
130	12002000	Geodetické práce - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ	KČ	0,000	85 590,03	85 590,027	1,00	0,00	0,00	85 590,03	85 590,03	85 590,03	100,00%
		Cena položky dle kompletní položky z SO 000, tj. 0,5 % z hodnoty prací											
		"ZBV ZBV č. 10 217,26=217,260 [A] ZBV ZBV č. 13 19214,04=19 214,040 [A]" ZBV č. 15 3566,36=3566,36 ZBV č. 20 1048,17=1048,17 ZBV č. 27 2188,111=2188,111 ZBV č. 38 7717,175=7717,175 ZBV č. 39 26 386,609=26 386,609 ZBV č. 42 15 309,005=15 309,005 ZBV č. 43 4249,087=4249,087 ZBV č. 45 5694,21=5694,21											
131	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm	M	0,000	34,000	34,00	81,10	0,00	0,00	2 757,40	2 757,40	2 757,40	100,00%
		Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm											

Změnový soupis prací SO 102 po změně 19 pro ZBV 45													
Evidenční číslo a název stavby: II/102 hr. hl. města Prahy-Štěchovice, rekonstrukce. ETAPA II								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
Číslo a název SO/PS: SO 102 - Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice								102					
Číslo a název rozpočtu: SO 102 - Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice								Celkem					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		ZBV ZBV č. 10 *33,0 + 2*0,5 dle zaměření km 10,250 - 10,283 =34,000 [A]*											
132	111301111	SEJMUTÍ DRNU	M2	0,000	5 400,600	5 400,600	44,17	0,00	0,00	238 544,50	238 544,50	238 544,50	100,00%
		Cena položky dle SoD SO 901 pol. 11											
		ZBV č. 13 Nánosy na stávajícícm svahu, dle zaměření 937 m2=937,000 [A] ZBV č. 39 geodetické protokoly Š II 33/2021 km 13,150-13,190 vlevo 89,90=89,900 [A] Š II 10/2022 km 10,140-10,250 vlevo 191,10=191,100 [B] Š II 12/2022 km 10,001-10,101 vlevo 112,90=112,900 [C] Š II 16/2022 km 10,103-10,140 vlevo 63,0+55,20-77=41,200 [D] Š II 27/2022 km 11,430-11,520 vlevo 191,60=191,600 [E] Š II 35/2022 km 11,220-11,430 vlevo 67,90+268,30=336,200 [F] Š II 43/2022 km 11,520-11663 vlevo 303,20=303,200 [G] Š II 45/2022 km 11,140-11,220 vlevo 187,80=187,800 [H] Š II 47/2022 km 11,671-11,780 vlevo 215,0=215,000 [I] Š II 53/2022 km 14,462-14,580 vlevo 249,30=249,300 [J] Š II 62/2022 km 11,056-11,140 vlevo 214,20=214,200 [K] Š II 65/2022 km 11,340-11,400 vlevo 47,0+160,30=207,300 [L] Š II 1/2023 km 10,840-10947 vlevo 188,7 =188,7 [V] Š II 4/2023 km 10,947-11,031 vlevo 165,60=165,600 [M] Š II 7/2023 km 11,976-12,440 vlevo 805,30=805,300 [N] Š II 8/2023 km 11,780-11,971 vlevo 231,10+1,70=232,800 [O] Š II 11/2023 km 14,410-14,460 vlevo 75,40+21,50=96,900 [P] Š II 13/2023 km 14,425 vlevo 22,40=22,400 [Q] Š II 16/2023 km 11,928-12,060 vpravo 279,50=279,500 [R] Š II 27/2023 km 11,733-11,832 vpravo 332,70=332,700 [S] celkem A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q+R+S+V=4463,60 [T]											
133	114203102	Rozebrání dlažeb z lomového kamene nebo betonových tvárnic nasucho se zalitými spárami cementovou maltou	M3	0,000	1 860,110	1 860,110	763,00	0,00	0,00	1 419 263,94	1 419 263,94	1 419 263,94	100,00%
		Cena položky dle ÚRS 2021 02											
		ZBV č. 13 851*0,35=297,850 [A]											
		ZBV č. 39 geodetické protokoly Š II 33/2021 km 13,150-13,190 vlevo 89,90=89,900 [A] Š II 10/2022 km 10,140-10,250 vlevo 191,10=191,100 [B] Š II 12/2022 km 10,001-10,101 vlevo 112,90=112,900 [C] Š II 16/2022 km 10,103-10,140 vlevo 63,0+55,20-77=41,200 [D] Š II 27/2022 km 11,430-11,520 vlevo 191,60=191,600 [E] Š II 35/2022 km 11,220-11,430 vlevo 67,90+268,30=336,200 [F] Š II 43/2022 km 11,520-11663 vlevo 303,20=303,200 [G] Š II 45/2022 km 11,140-11,220 vlevo 187,80=187,800 [H] Š II 47/2022 km 11,671-11,780 vlevo 215,0=215,000 [I] Š II 53/2022 km 14,462-14,580 vlevo 249,30=249,300 [J] Š II 62/2022 km 11,056-11,140 vlevo 214,20=214,200 [K] Š II 65/2022 km 11,340-11,400 vlevo 47,0+160,30=207,300 [L] Š II 1/2023 km 10,840-10947 vlevo 188,7 =188,7 [V] Š II 4/2023 km 10,947-11,031 vlevo 165,60=165,600 [M] Š II 7/2023 km 11,976-12,440 vlevo 805,30=805,300 [N] Š II 8/2023 km 11,780-11,971 vlevo 231,10+1,70=232,800 [O] Š II 11/2023 km 14,410-14,460 vlevo 75,40+21,50=96,900 [P] Š II 13/2023 km 14,425 vlevo 22,40=22,400 [Q] Š II 16/2023 km 11,928-12,060 vpravo 279,50=279,500 [R] Š II 27/2023 km 11,733-11,832 vpravo 332,70=332,700 [S] celkem A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q+R+S+V=4463,60 [T] 4463,60*0,35=1 562,26[W]											

Změnový soupis prací SO 102 po změně 19 pro ZBV 45

Evidenční číslo a název stavby: II/102 hr. hl. města Prahy-Štěchovice, rekonstrukce. ETAPA II
Číslo a název SO/PS: SO 102 - Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice
Číslo a název rozpočtu: SO 102 - Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)
102
Celkem

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
134	153311212	Zřízení armování svahů, násypů a opěrných stěn vrstvou z geomříže tuhé sklonu přes 1:2 do 1:1	M2	0,000	936,000	936,000	74,90	0,00	0,00	70 106,40	70 106,40	70 106,40	100,00%
		Cena položky dle ÚRS 2021 02											
		ZBV č. 13 Požadavek Povodí Vltavy z 6.4.2021 vyztužení svahu v km 10,381 - 10,420 vlevo vyztužení svahu 6 vrstvami geomříže prům. šířky 3,5 m + 0,5 přesah na zajištění v úseku svahu délky 39 m 6*(3,5+0,5)*39=936,000 [A]											
135	271922211	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z recyklátu betonového	M3	0,000	637,000	637,000	964,00	0,00	0,00	614 068,00	614 068,00	614 068,00	100,00%
		Cena položky dle ÚRS 2020 01											
		položka zahrnuje dodávku betonového recyklátu, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak											
		ZBV č. 13 dle geodetického zaměření km 10,360 - 10,380 24 m3=24,000 [A] km 10,380 - 10,420 190,7 m3 - úprava s geomříží =190,700 [B] km 10,420 - 10,465 45 m3=45,000 [C] km 10,465 - 10,475 11,9 m3=11,900 [D] km 10,476 - 10,485 9,2 m3=9,200 [E] km 10,485 - 10,575 126,3 m3=126,300 [F] km 10,575 - 10,650 68,2 m3=68,200 [G] km 10,706 - 10,840 161,7 m3=161,700 [H] A+B+C+D+E+F+G+H=637,000 [I]											

Změnový soupis prací SO 102 po změně 19 pro ZBV 45													
Evidenční číslo a název stavby: II/102 hr. hl. města Prahy-Štěchovice, rekonstrukce. ETAPA II Číslo a název SO/PS: SO 102 - Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice Číslo a název rozpočtu: SO 102 - Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS) 102 Celkem					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
136	452313141R	ZÁKLADY Z PROST BETONU C 16/20 včetně bednění	M3	0,000	91,875	91,875	3 200,00	0,00	0,00	294 000,00	294 000,00	294 000,00	100,00%
		Cena položky převzata z SOD SO 341 pol. 6											
		ZBV č. 13 Betonové patky v patě svahu km 10,360 - 10,381 21*0,5*0,5/2 m3=2,625 [A] km 10,381 - 10,420 39*1,5*1,5/2 m3=43,875 [B] km 10,420 - 10,475 55*0,5*0,5/2 m3 =6,875 [C] km 10,476 - 10,650 174*0,5*0,5/2 m3=21,750 [D] km 10,706 - 10,840 134*0,5*0,5/2 m2=16,750 [F] A+B+C+D+F=91,875 [G]											
137	636195111R	Vyplnění spár cementovou maltou dosavadní dlažby z lomového kamene melioračních kanálů	M2	0,000	5 411,700	5 411,700	357,00	0,00	0,00	1 931 976,90	1 931 976,90	1 931 976,90	100,00%
		Cena položky dle ÚRS 2021 02											
		ZBV č. 13 Požadavek Povodí Vltavy na vyplnění spár odláždění cementovou maltou dle geodetického zaměření km 10,360 - 10,422 111,9 m2=111,900 [A] km 10,422 - 10,454 48,7 m2=48,700 [B] km 10,455 - 10,476 44,9 m2 =44,900 [C] km 10,480 - 10,654 369,6 m2=369,600 [D] km 10,706 - 10,730 41,4 m2=41,400 [E] km 10,730 - 10,840 234,7 m2=234,700 [F] A+B+C+D+E+F=851,200 [G]											
		ZBV č. 39 geodetické protokoly Š II 33/2021 km 13,150-13,190 vlevo 89,90=89,900 [A] Š II 10/2022 km 10,140-10,250 vlevo 191,10=191,100 [B] Š II 12/2022 km 10,001-10,101 vlevo 112,90=112,900 [C] Š II 16/2022 km 10,103-10,140 vlevo 63,0+55,20-77=41,200 [D] Š II 27/2022 km 11,430-11,520 vlevo 191,60=191,600 [E] Š II 35/2022 km 11,220-11,430 vlevo 67,90+268,30=336,200 [F] Š II 43/2022 km 11,520-11663 vlevo 303,20=303,200 [G] Š II 45/2022 km 11,140-11,220 vlevo 187,80=187,800 [H] Š II 47/2022 km 11,671-11,780 vlevo 215,0=215,000 [I] Š II 53/2022 km 14,462-14,580 vlevo 249,30=249,300 [J] Š II 62/2022 km 11,056-11,140 vlevo 214,20=214,200 [K] Š II 65/2022 km 11,340-11,400 vlevo 47,0+160,30=207,300 [L] Š II 1/2023 km 10,840-10947 vlevo 188,7 =188,700 [T] Š II 4/2023 km 10,947-11,031 vlevo 165,6=165,600 [M]] Š II 7/2023 km 11,976-12,440 vlevo 805,3=805,300 [N]] Š II 8/2023 km 11,780-11,971 vlevo 231,10+1,7=232,800 [O]] Š II 11/2023 km 14,410-14,460 vlevo 75,40+21,5=96,900 [P]] Š II 13/2023 km 14,425 vlevo 22,4=22,400 [Q]] Š II 16/2023 km 11,928-12,060 vpravo 279,5=279,500 [R]] Š II 27/2023 km 11,733-11,832 vpravo 332,7=332,700 [S]] celkem A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q+R+S+T=4 463,600 [U] ZBV č. 43 dle pol. č.594511111 90,9=90,900 [A] ZBV č. 45 6m2											
138	69321023	Geomříž jednoosá HDPE s tahovou pevností 90kN/m	M2	0,000	1 076,400	1 076,400	144,00	0,00	0,00	155 001,60	155 001,60	155 001,60	100,00%
		Cena položky dle ÚRS 2021 02											
		ZBV č. 13 Požadavek Povodí Vltavy z 6.4.2021 a vyjádření AD č. 28 vyztužení svahu v km 10,381 - 10,420 vlevo 6 vrstev prům. šířky 3,5 m + přesah do čela svahu 0,5 m , ztratné 15% 6*(3,5+0,5)*39*1,15=1 076,400 [A]											

Změnový soupis prací SO 102 po změně 19 pro ZBV 45

Evidenční číslo a název stavby: II/102 hr. hl. města Prahy-Štěchovice, rekonstrukce. ETAPA II
Číslo a název SO/PS: SO 102 - Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice
Číslo a název rozpočtu: SO 102 - Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)
102
Celkem

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
139	113107170	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2do 200 m2 z betonu prostého tl. 100mm	M2	0,000	170,300	170,300	149,00	0,00	0,00	25 374,70	25 374,70	25 374,70	100,00%
		Cena položky dle ÚRS 2021 02											
		ZBV č. 15 dle geodetického protokolu č. Š II 3/2022 km 13,2-13,7 žlaby 69,4=69,400 [A] žulové kostky 100,9=100,900 [B] A+B=170,300 [C]											
140	451319777	Podklad nebo lože pod dlažbu příplatek k cenám za každých dalších i započatých 100 mm podkladu nebo lože z betonu prostého	M2	0,000	115,900	115,900	30,40	0,00	0,00	3 523,36	3 523,36	3 523,36	100,00%
		Cena položky dle ÚRS 2021 02											
		ZBV č. 15 dle geodetického protokolu č. Š II 3/2022 km 13,2-13,7 žulové kostky 100,9=100,900 [A] ZBV č. 38 okolo HV 7,5*2=15											

Změnový soupis prací SO 102 po změně 19 pro ZBV 45

Evidenční číslo a název stavby: II/102 hr. hl. města Prahy-Štěchovice, rekonstrukce. ETAPA II
Číslo a název SO/PS: SO 102 - Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice
Číslo a název rozpočtu: SO 102 - Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)
102
Celkem

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
141	591141111	Kladení dlažby z kostek velkých z kamene, do lože z cementové malty s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici	M2	0,000	115,900	115,900	608,00	0,00	0,00	70 467,20	70 467,20	70 467,20	100,00%
		Cena položky dle ÚRS 2021 02											
		ZBV č. 15 dle geodetického protokolu č. Š II 3/2022 krajnice ze žulových kostek km 13,2-13,7 100,9=100,900 [A] ZBV č. 38 okolo HV 7,5*2=15											
142	59227029	Žlabovka příkopová betonová 500x680x60	M	0,000	76,340	76,340	415,00	0,00	0,00	31 681,10	31 681,10	31 681,10	100,00%
		Cena položky dle ÚRS 2021 02											
		položka zahrnuje dodávku betonového recyklátu, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak											
		ZBV č. 15 dle geodetického protokolu č. Š II 3/2022 km 13,2-13,7 64,9 m+ 10% ztratné žlaby 69,4*1,1=76,340 [A]											
143	911331123	Silniční svodidlo s osazením sloupků zaberaněním ocelové úroveň zádržnosti N2 vzdálenosti sloupků přes 2 do 4 m jednostranné	M	0,000	400,000	400,000	1 450,00	0,00	0,00	580 000,00	580 000,00	580 000,00	100,00%
		Cena položky dle ÚRS 2021 02											
		ZBV č. 15 dle geodetického protokolu č. Š II 3/2022 km 13,196-13,596 400=400,000 [A]											
144	935112211	Osazení betonového příkopového žlabu z betonových příkopových tvárnic šířky přes 500 do800 mm do lože z betonu tl. 100 mm	M	0,000	69,400	69,400	271,00	0,00	0,00	18 807,40	18 807,40	18 807,40	100,00%
		Cena položky dle ÚRS 2021 02											
		ZBV č. 15 dle geodetického protokolu č. Š II 3/2022 km 13,2-13,7 žlaby 69,4=69,400 [A]											
145	966008212	Bourání odvodňovacího žlabu z betonových příkopových tvátnic šířky přes 500 do 800 mm	M	0,000	69,400	69,400	73,90	0,00	0,00	5 128,66	5 128,66	5 128,66	100,00%
		Cena položky dle ÚRS 2021 02											
		ZBV č. 15 dle geodetického protokolu č. Š II 3/2022 km 13,2-13,7 žlaby 69,4=69,400 [A]											
146	275351111	Bednění základových konstrukcí bloků tradiční oboustranné	M2	0,000	250,500	250,500	580,00	0,00	0,00	145 290,00	145 290,00	145 290,00	100,00%
		Cena položky dle ÚRS 2021 02											

Změnový soupis prací SO 102 po změně 19 pro ZBV 45													
Evidenční číslo a název stavby: II/102 hr. hl. města Prahy-Štěchovice, rekonstrukce. ETAPA II								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
Číslo a název SO/PS: SO 102 - Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice								102					
Číslo a název rozpočtu: SO 102 - Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice								Celkem					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		ZBV č. 13 Betonové patky v patě svahu km 10,360 - 10,381 21*0,5=10,50 [A] km 10,381 - 10,420 39*1,5*=58,50 [B]											
147	567123114	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 5/6 (KSC II) tl 150 mm	M2	0,000	102,000	102,000	340,00	0,00	0,00	34 680,00	34 680,00	34 680,00	100,00%
		Cena položky dle ÚRS 2021 02											
		ZBV č. 20 *podklad ze směsi SC 5/6 v rozšíření vozovky t. 150 mm* *1,7*60,0=102,000 [A]*											
148	567133111	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 5/6 (KSC II) tl 160 mm	M2	0,000	300,000	300,000	361,00	0,00	0,00	108 300,00	108 300,00	108 300,00	100,00%
		Cena položky dle ÚRS 2021 02											
		ZBV č. 20 *podklad ze směsi SC 5/6 doplnění konstrukce s šíří 4,99m tl. 120-200 mm* *průměrná tl. 160 mm* *5,0*52,0=300,00 [A]*											
149	565125111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 40 mm š do 3 m	M2	0,000	2 259,400	2 259,40	244,00	0,00	0,00	551 293,60	551 293,60	551 293,60	100,00%
		Cena převzata z ÚRS 2021/02											
		ZBV č. 21 protokol Š II 71/2021 km 10,360 - 10,840 vlevo ACP 16 prům tl. 89,9 mm (nadspotřeba 40 mm) 2259,4=2 259,400 [A]											
150	577135132	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 40 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu	M2	0,000	1 342,000	1 342,00	270,00	0,00	0,00	362 340,00	362 340,00	362 340,00	100,00%
		Cena převzata z ÚRS 2021/01											
		ZBV č. 21 protokol D 13/2020 km 12,440 - 12,850 vpravo ACL 16 modif. prům tl. 30,7 mm (vrstva navíc) 1342=1 342,000 [A]											
151	577145132	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 50 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu	M2	0,000	4 510,000	4 510,00	349,00	0,00	0,00	1 573 990,00	1 573 990,00	1 573 990,00	100,00%
		Cena převzata z ÚRS 2021/02											
		ZBV č. 21 protokol Š II 89/21 13,199 - 13,696 vlevo ACL 16 modif. tl. 100 mm tloušťka 2x50 2255*2=4 510,000 [A]											
152	567123114a	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 5/6 (KSC II) tl 150 mm	M2	0,000	19 283,200	19 283,20	256,33	0,00	0,00	4 942 862,66	4 942 862,66	4 942 862,66	100,00%
		cena dle kalkulace z SoD (záměna recyklované směsi za SC 5/6)											
		ZBV č. 23 nahrazuje pol. č. 38 19007,2=19 007,200 [A] ZBV ZBV č. 27 geodetický protokol Š II 51/2022 92,2 m2=92,200 [A] geodetický protokol Š II 58/2022 183,8 m2 =183,800 [B] A+B=276,000 [C]											
153	113107323	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 do 300 mm strojně pl do 50 m2	M2	0,000	441,600	441,600	110,00	0,00	0,00	48 576,00	48 576,00	48 576,00	100,00%
		Cena položky dle ÚRS 2022 02											

Změnový soupis prací SO 102 po změně 19 pro ZBV 45

Evidenční číslo a název stavby: II/102 hr. hl. města Prahy-Štěchovice, rekonstrukce. ETAPA II
Číslo a název SO/PS: SO 102 - Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice
Číslo a název rozpočtu: SO 102 - Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)
102
Celkem

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		ZBV ZBV č. 27 *geodetický protokol Š II 51/2022 92,2 m2=92,200 [A]* *geodetický protokol Š II 58/2022 183,8 m2 =183,800 [B]* *(183,8+92,2)*0,6=165,600 [C]* *A+B+C=441,600 [C]*											
154	113107331	Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 100 do 150 mm strojně pl do 50 m2	M2	0,000	276,000	276,000	256,00	0,00	0,00	70 656,00	70 656,00	70 656,00	100,00%
		Cena položky dle ÚRS 2022 02											
		ZBV ZBV č. 27 *geodetický protokol Š II 51/2022 92,2 m2=92,200 [A]* *geodetický protokol Š II 58/2022 183,8 m2 =183,800 [B]* *A+B=276,000 [C]*											
155	564970315	Podklad z betonového recyklátu plochy do 100 m2 tl 250 mm	M2	0,000	165,600	165,600	240,00	0,00	0,00	39 744,00	39 744,00	39 744,00	100,00%
		Cena položky dle ÚRS 2022 02											
		ZBV ZBV č. 27 *výměna podloží 60% z celkového množství 276 m2, tl. 20-30 cm* *276*0,6=165,600 [A]*											
156	919735123	Řezání stávajícího betonového krytu hl přes 100 do 150 mm	M	0,000	318,585	318,585	293,00	0,00	0,00	93 345,40	93 345,40	93 345,40	100,00%
		Cena položky dle ÚRS 2022 02											
		ZBV ZBV č. 27 *318,585=318,585*											
157	275313711	Základové patky z betonu tř. C 20/25	M3	0,000	3,290	3,290	4 160,00	0,00	0,00	13 686,39	13 686,39	13 686,39	100,00%
		Cena položky dle ÚRS 2023 02											
		ZBV č. 37 *zábradlí propustek* *0,5*0,5*0,75*12=2,25* *ZBV č. 45* *zábradlí* *0,4*0,4*0,5*13=1,04*											
158	91111111	Montáž zábradlí ocelového zabetonovaného	M	0,000	20,000	20,000	192,00	0,00	0,00	3 840,00	3 840,00	3 840,00	100,00%
		Cena položky dle ÚRS 2023 02											
		ZBV č. 37 *zábradlí propustek 6+4+6+4=20*											
225	74910606	zábradlí městské obloukové bezpečnostní lakovaný povrch 2000x1000mm	KUS	0,000	10,000	10,000	6 110,00	0,00	0,00	61 100,00	61 100,00	61 100,00	
		Cena položky dle ÚRS 2023 02											
		ZBV č. 37 *zábradlí propustek 6+4+6+4=20m*											
159	113107223	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 do 300 mm strojně pl přes 200 m2	M2	0,000	315,000	315,000	64,80	0,00	0,00	20 412,00	20 412,00	20 412,00	100,00%
		cena dle URS 2023/1											
		ZBV č. 38 krajnice pod svodidla km 13,7647-13,8887 km 13,8963-139803 210*1,5m=315,00 tl. 250-300mm											
160	132151101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 20 m3 strojně	M3	0,000	20,780	20,780	585,00	0,00	0,00	12 156,30	12 156,30	12 156,30	100,00%
		cena dle URS 2023/1											

Změnový soupis prací SO 102 po změně 19 pro ZBV 45

Evidenční číslo a název stavby: II/102 hr. hl. města Prahy-Štěchovice, rekonstrukce. ETAPA II
Číslo a název SO/PS: SO 102 - Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice
Číslo a název rozpočtu: SO 102 - Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)
102
Celkem

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		ZBV č. 38 1,0*0,25*0,15*24=0,9 ZBV č. 45 km 11,687-11,720 0,8*0,35*34=9,520 [A] km 11,2228-11,2584 0,8*0,35*37=10,360 [B] A+B=19,880 [C]											
161	339921112	Osazování betonových palisád do betonového základu jednotlivě výšky prvku přes 0,5 do 1m	KUS	0,000	75,000	75,000	216,00	0,00	0,00	16 200,00	16 200,00	16 200,00	100,00%
		cena dle URS 2023/1											
		ZBV č. 38 u HV 7,5/0,11*1,1=75											
162	273313911	Základové desky z betonu tř. C 30/37	M3	0,000	47,250	47,250	4 180,00	0,00	0,00	197 505,00	197 505,00	197 505,00	100,00%
		cena dle URS 2023/1											
		ZBV č. 38 betonový práh pod nová svodidla km 13,7647-13,8887 km 13,8963-13,9803 210*1,5*0,15=47,25											
163	273351121	Zřízení bednění základových desek	M2	0,000	63,900	63,900	560,00	0,00	0,00	35 784,00	35 784,00	35 784,00	100,00%
		cena dle URS 2023/1											
		ZBV č. 38 km 13,7647-13,8887 km 13,8963-13,9803 210*2*0,15+1,5*0,15*4=63,90											
164	273351122	Odstranění bednění základových desek	M2	0,000	63,900	63,900	138,00	0,00	0,00	8 818,20	8 818,20	8 818,20	100,00%
		cena dle URS 2023/1											
		ZBV č. 38 viz pol. č. 274354111											
165	564841112	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 130 mm	M2	0,000	315,000	315,000	167,00	0,00	0,00	52 605,00	52 605,00	52 605,00	100,00%
		cena dle URS 2023/1											

Změnový soupis prací SO 102 po změně 19 pro ZBV 45

Evidenční číslo a název stavby: II/102 hr. hl. města Prahy-Štěchovice, rekonstrukce. ETAPA II
Číslo a název SO/PS: SO 102 - Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice
Číslo a název rozpočtu: SO 102 - Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)
102
Celkem

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		ZBV č. 38 pod nová svodidla 210*1,5=315,00											
166	59228408	palisáda betonová tyčová hranatá přírodní 110x110x600mm	KUS	0,000	75,000	75,000	181,00	0,00	0,00	13 575,00	13 575,00	13 575,00	100,00%
		Cena položky dle ÚRS 2023 01											
		ZBV č. 38 7,5/0,11*1,1=75											
170	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 150 mm	M2	0,000	93,000	93,000	139,52	0,00	0,00	12 975,36	12 975,36	12 975,36	100,00%
		Cena položky dle SoD SO 103 pol.č. 16											
		ZBV č. 38 pod stávající svodidlo 48*1,0=48,000 [A] ZBV č. 45 U Kiliána 45=45,000 [A]											
167	911381124a	Silniční svodidlo betonové jednostranné průběžné délky 4 m výšky 1,2 m montáž s přesunem (bez dodávky)	M	0,000	48,000	48,000	1 381,67	0,00	0,00	66 320,16	66 320,16	66 320,16	100,00%
		položka převzata z SoD SO 901pol. č. 911EC3											
		dle geodetického protokolu Š II 36/2023 km 14,351-14,399 vpravo 48 m											
168	911381824	Odstranění silničního betonového svodidla délky 4 m výšky 1,2 m	M	0,000	132,000	132,000	939,00	0,00	0,00	123 948,00	123 948,00	123 948,00	100,00%
		URS 2023/1											
		ZBV č. 38 geodetický protokol Š II 36/2023 km 13,763-13,799 vpravo 36m km 13,843-13,891 vpravo 48m km 14,351-14,399 vpravo 48m 36+48+48=132											
171	58381008	Kostka štípaná dlažební žula velká 15/17	M2	0,000	16,500	16,500	1 610,00	0,00	0,00	26 565,00	26 565,00	26 565,00	100,00%
		Cena dle URS 2023/1											
		ZBV č. 38 okolo HV 7,5*2*1,1=16,5											
172	919735111	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm	M	0,000	208,000	208,00	77,60	0,00	0,00	16 140,80	16 140,80	16 140,80	100,00%
		Cena dle URS 2023/1											
		ZBV č. 38 nové betonové svodidlo 208=208											
169	113154122	Frézování živičného krytu tl 40 mm pruh š přes 0,5 do 1 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	M2	0,000	574,100	574,100	108,00	0,00	0,00	62 002,80	62 002,80	62 002,80	1,75%

Změnový soupis prací SO 102 po změně 19 pro ZBV 45														
Evidenční číslo a název stavby: II/102 hr. hl. města Prahy-Štěchovice, rekonstrukce. ETAPA II								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)						
Číslo a název SO/PS: SO 102 - Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice								102						
Číslo a název rozpočtu: SO 102 - Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice								Celkem						
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
		Cena dle URS 2022/2												
		ZBV č. 41 geodetický protokol Š II17/2022 km 10,020-10,246 vpravo prům. tl. 40 mm 18,10=18,100 [A] Š II 33/2022 km 14,580-14,608 vlevo prům. tl. 41 mm 39,1=39,100 [B] nájezd k MOL km 14,130-14429 vpravo prům. tl. 42 mm - bez odpočtu plochy 37,9=37,900 [C] výjezd od MOL km 14,130-14429 vpravo prům. tl. 42 mm - bez odpočtu plochy 49,0=49,000 [D] Š II 33/2022 km 14,580-14,609 vlevo prům. tl. 220 mm 130,50=130,500 [E] Š II 37/2022 km 11,519-11,630 vlevo prům. tl. 224 mm 299,50=299,500 [F] A+B+C+D+E+F=574,100 [G]												
226	113154123	Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š přes 0,5 do 1 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	M2	0,000	327,100	327,100	119,00	0,00	0,00	38 924,90	38 924,90	38 924,90	1,75%	
		Cena dle URS 2022/2												
		ZBV č. 41 geodetický protokol Š II 23/2022 km 10,222 -10,246 vpravo prům. tl. 50 mm 70,10=70,100 [A] kaslíky km 14,226-14,273 vpravo prům. tl. 51 mm - bez odpočtu plochy 92,40=92,400 [B] km 14,302-14,343 vpravo prům. tl. 53 mm - bez odpočtu plochy 86,80=86,800 [C] km 14,354-14,393 vpravo prům. tl. 51 mm - bez odpočtu plochy 77,80=77,800 [D] A+B+C+D=327,100 [E]												
173	171152501	Zhutnění podloží z hornin soudržných nebo nesoudržných pod násypy (SAT)	M2	0,000	629,900	629,900	8,19	0,00	0,00	5 158,88	5 158,88	5 158,88	100,00%	
		Cena dle URS 2023/1												
		ZBV č. 42 geodetický protokol Š II 14/2023 - rozšíření vozovky km 11,780-11,868 94,20=94,200 [A] km 11,881-11,909 23,50=23,500 [B] km 11,923-12,435 512,20=512,200 [C] A+B+C=629,900 [D]												
174	273311128	Základové desky z betonu prostého C 30/37	M3	0,000	3,500	3,500	4 980,00	0,00	0,00	17 430,00	17 430,00	17 430,00	100,00%	
		Cena dle URS 2023/1												
		ZBV č. 42 geodetický protokol Š II 41/2023 3,5=3,500 [A]												
175	273311191	Příplatek k základovým deskám za betonáž malého rozsahu do 25 m3	M3	0,000	3,500	3,500	618,00	0,00	0,00	2 163,00	2 163,00	2 163,00	100,00%	
		Cena dle URS 2023/1												
		ZBV č. 42 dle pol. č. 273311191 3,5=3,500 [A]												
176	317321118	Mostní římsy ze ŽB C 30/37	M3	0,000	32,750	32,750	6 520,00	0,00	0,00	213 530,00	213 530,00	213 530,00	100,00%	
		Cena dle URS 2023/1												
		ZBV č. 42 geodetický protokol Š II 41/2023 římsa pravá 9,25=9,250 [A] levá 23,50=23,500 [B] A+B=32,750 [C]												
177	317353121	Bednění mostních říms všech tvarů - zřízení	M2	0,000	69,123	69,123	2 340,00	0,00	0,00	161 747,82	161 747,82	161 747,82	100,00%	
		Cena dle URS 2023/1												
		ZBV č. 42 levá (0,295+1,2+0,847+0,15)*14=34,888 [A] 2*1,6*((1,2+0,847+0,15)/2)=3,515 [B] pravá (0,245+1,05+0,15+0,511)*14=27,384 [C] 2*1,95*((1,05+0,15+0,511)/2)=3,336 [D] A+B+C+D=69,123 [E]												
178	317353221	Bednění mostních říms všech tvarů - odstranění	M2	0,000	69,123	69,123	182,00	0,00	0,00	12 580,39	12 580,39	12 580,39	100,00%	
		Cena dle URS 2023/1												
		ZBV č. 42												
179	317361116	Výztuž mostních říms z betonářské oceli 10 505	T	0,000	2,623	2,623	62 900,00	0,00	0,00	164 986,70	164 986,70	164 986,70	100,00%	

Změnový soupis prací SO 102 po změně 19 pro ZBV 45													
Evidenční číslo a název stavby: II/102 hr. hl. města Prahy-Štěchovice, rekonstrukce. ETAPA II								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
Číslo a název SO/PS: SO 102 - Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice								102					
Číslo a název rozpočtu: SO 102 - Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice								Celkem					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Cena dle URS 2023/1											
		ZBV č. 42 viz. výkres výztuže (2113,2+509,5)/1000=2,623 [A]											
180	317171126	Kotvení monolitického betonu římsy do mostovky kotvou do vývrtu	KUS	0,000	24,000	24,000	868,00	0,00	0,00	20 832,00	20 832,00	20 832,00	100,00%
		Cena dle URS 2023/1											
		ZBV č. 42											
181	464531112	Pohoz z hrubého drceného kameniva zrno 63 až 125 mm z terénu	M3	0,000	55,900	55,900	1 290,00	0,00	0,00	72 111,00	72 111,00	72 111,00	100,00%
		Cena dle URS 2023/1											
		ZBV č. 42 geodetický protokol Š II 16/2023 km 11928-12,060 279,5*0,2=55,900 [A]											
182	55342284R	ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ LANKOVÉ - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	0,000	27,200	27,200	4 605,55	0,00	0,00	125 270,96	125 270,96	125 270,96	100,00%
		Cena srovnatelná s cenou z SoD SO 207 pol. č. 9111C1											
		ZBV č. 42 geodetický protokol Š II 40/2023 vpravo 13,60=13,600 [A] vlevo 13,60=13,600 [B] A+B=27,200 [C]											
183	567511121	Recyklace za studena tl. 150mm	M2	0,000	2 959,200	2 959,20	119,00	0,00	0,00	352 144,80	352 144,80	352 144,80	100,00%
		Cena dle URS 2023/1											
		ZBV č. 42 Geodetický protokol Š II 17/2023 km 11,771-12,436 vpravo 2959,20=2 959,200 [A]											
184	58522150	cement	T	0,000	34,623	34,623	3 770,00	0,00	0,00	130 528,71	130 528,71	130 528,71	100,00%
		Cena dle URS 2023/1											
		ZBV č. 42 6% cementu (1300*0,06/1000)*2959,2*0,15=34,623											
185	11162540	emulze asfaltová obalovací pro použití za studena	T	0,000	7,546	7,546	37 000,00	0,00	0,00	279 202,00	279 202,00	279 202,00	100,00%
		Cena dle URS 2023/1											
		ZBV č. 42 1% asfaltu (1700*0,01/1000)*2959,2*0,15=7,546											
186	911334111	Svodidlo ocelové zábradelní zádržnosti H2 kotvené do římsy bez výplně	M	0,000	38,000	38,000	8 289,99	0,00	0,00	315 019,62	315 019,62	315 019,62	100,00%
		cena srovnatelná s cenou z SoD SO 204,205,206 pol. č. 9117C1											
		ZBV č 42 geodetický protokol Š II 40/2023 vpravo 19=19,000 [A] vlevo 19=19,000 [B] A+B=38,000 [C]											
187	963051111	Bourání mostní nosné konstrukce z ŽB Odboudání původní zdi propustu ŽB geodetický protokol Š II km 11,917 3,26+2,70	M3	0,000	5,960	5,960	9 390,00	0,00	0,00	55 964,40	55 964,40	55 964,40	100,00%
		Cena dle URS 2023/1											
		ZBV č. 42 Odboudání původní zdi propustu ŽB geodetický protokol Š II 18/2023 km 11,917 3,26+2,70=5,960 [A]											
189	914111100R	Svislé dopravní značení	SOUB	0,000	1,000	1,000	107 888,40	0,00	0,00	107 888,40	107 888,40	107 888,40	100,00%

Změnový soupis prací SO 102 po změně 19 pro ZBV 45

Evidenční číslo a název stavby: II/102 hr. hl. města Prahy-Štěchovice, rekonstrukce. ETAPA II
Číslo a název SO/PS: SO 102 - Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice
Číslo a název rozpočtu: SO 102 - Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)
102
Celkem

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		cena dle nabídky subdodavatele 93 816,- Kč+ režie a zisk (15%)											
		ZBV č. 44 1=1											
190	915211100R	Vodorovné dopravní značení	SOUB	0,000	1,000	1,000	262 878,50	0,00	0,00	262 878,50	262 878,50	262 878,50	100,00%
		cena dle nabídky subdodavatele 228 590,- Kč+ režie a zisk (15%)											
		ZBV č. 44 1=1											
191	912521111	Montáž dopravního knoflíku zapuštěného do komunikace	KUS	0,000	167,000	167,000	272,00	0,00	0,00	45 424,00	45 424,00	45 424,00	100,00%
		Cena dle URS 2023/1											
		ZBV č. 44 176=176											
192	56288005	Knoflík trvalý zafrézovaný pro dopravní značení	KUS	0,000	167,000	167,000	950,00	0,00	0,00	158 650,00	158 650,00	158 650,00	100,00%
		Cena dle URS 2023/1											
		ZBV č. 44 176=176											
193	113107172	Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 150 do 300 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	M2	0,000	56,800	56,800	334,00	0,00	0,00	18 971,20	18 971,20	18 971,20	100,00%
		Cena dle URS 2022/1											
		ZBV č. 45 km 11,687-11,720 34*0,8=27,200 [A] km 11,2228-11,2584 37*0,8=29,600 [B] A+B=56,800 [C]											
194	131151100	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 20 m3 strojně	M3	0,000	18,000	18,000	377,00	0,00	0,00	6 786,00	6 786,00	6 786,00	100,00%
		Cena dle URS 2022/1											
		ZBV č. 45 vsakovací jímka km 11,687-11,720 3,0*2,0*1,5=9,000 [A] km 11,2228-11,2584 3,0*2,0*1,5=9,000 [B] A+B=18,000 [C]											
195	182351023	Rozprostření ornice pl do 100 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 200 mm strojně	M2	0,000	12,000	12,000	114,00	0,00	0,00	1 368,00	1 368,00	1 368,00	100,00%
		Cena dle URS 2022/1											
		ZBV č. 45 vsakovací jímky 2*3,0*2,0=12,000 [A]											
196	28611176	*trubka kanalizační PVC DN 200x1000mm SN10*	M	0,000	12,000	12,000	906,00	0,00	0,00	10 872,00	10 872,00	10 872,00	100,00%
		Cena dle URS 2022/1											
		ZBV č. 45 U Kiliána 4=4,000 [A] km 11,687-11,720 4=4,000 [B] km 11,2228-11,2584 4=4,000 [C] A+B+C=12,000 [D]											
197	464531111	Pohoz z hrubého drceného kamenivo zrno 32 až 63 mm z terénu	M3	0,000	16,200	16,200	1 250,00	0,00	0,00	20 250,00	20 250,00	20 250,00	100,00%

Změnový soupis prací SO 102 po změně 19 pro ZBV 45

Evidenční číslo a název stavby: II/102 hr. hl. města Prahy-Štěchovice, rekonstrukce. ETAPA II
Číslo a název SO/PS: SO 102 - Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice
Číslo a název rozpočtu: SO 102 - Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)
102
Celkem

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Cena dle URS 2022/1											
		ZBV č. 45 vsakovací jímky km 11,687-11,720 2,0*3,0*1,35=8,100 [A] km 11,2228-11,2584 2,0*3,0*1,35=8,100 [B] A+B=16,200 [C]											
198	569903311	Zřízení zemních krajnic se zhutněním	M3	0,000	30,750	30,750	366,00	0,00	0,00	11 254,50	11 254,50	11 254,50	100,00%
		Cena dle URS 2022/1											
		ZBV č. 45 U Kiliána 30,75=30,750 [A]											
199	59217052	*obrubník betonový pro kruhový objezd vnější R0,5 200x270x300mm*	M	0,000	2,200	2,200	896,00	0,00	0,00	1 971,20	1 971,20	1 971,20	100,00%
		Cena dle URS 2022/1											
		ZBV č. 45 U Kiliána 2*1,1=2,200 [A]											
200	59228436	*žlab štěrbinový betonový čistící 400x500x1000mm*	KUS	0,000	6,000	6,000	10 200,00	0,00	0,00	61 200,00	61 200,00	61 200,00	100,00%
		Cena dle URS 2022/1											
		ZBV č. 45 U Kiliána 1+1=2,000 [A] km 11,687-11,720 1+1=2,000 [B] km 11,2228-11,2584 1+1=2,000 [C] A+B+C=6,000 [D]											
201	871350310	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 10 z polypropylenu DN 200	M	0,000	12,000	12,000	161,00	0,00	0,00	1 932,00	1 932,00	1 932,00	100,00%
		Cena dle URS 2022/1											
		ZBV č. 45 U Kiliána 4=4,000 [A] km 11,687-11,720 4=4,000 [B] km 11,2228-11,2584 4=4,000 [C] A+B+C=12,000 [D]											
202	895941301	Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců dno s výtokem	KUS	0,000	3,000	3,000	1 120,00	0,00	0,00	3 360,00	3 360,00	3 360,00	100,00%
		Cena dle URS 2022/1											
		ZBV č. 45 U Kiliána 1=1,000 [A] km 11,687-11,720 1=1,000 [B] km 11,2228-11,2584 1=1,000 [C] A+B+C=3,000 [D]											
203	895941322	Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců skruž středová 295 mm	KUS	0,000	3,000	3,000	654,00	0,00	0,00	1 962,00	1 962,00	1 962,00	100,00%

Změnový soupis prací SO 102 po změně 19 pro ZBV 45

Evidenční číslo a název stavby: II/102 hr. hl. města Prahy-Štěchovice, rekonstrukce. ETAPA II
Číslo a název SO/PS: SO 102 - Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice
Číslo a název rozpočtu: SO 102 - Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)
102
Celkem

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Cena dle URS 2022/1											
		ZBV č. 45 U Kiliána 1=1,000 [A] km 11,687-11,720 1=1,000 [B] km 11,2228-11,2584 1=1,000 [C] A+B+C=3,000 [D]											
204	911111111	Zábradlí ocelové zabetonované - montáž a dodávka	M	0,000	25,800	25,800	5 561,99	0,00	0,00	143 499,34	143 499,34	143 499,34	100,00%
		cena dle nabídky subdodavatele (8690,00+ režie a zisk (15%)) 124782,-+15%=143499,30Kč/25,8m = 5561,99Kč/bm											
		ZBV č. 45 U Kiliána 25,8=25,800 [A]											
205	919735125	Řezání stávajícího betonového krytu hl přes 200 do 250 mm	M	0,000	320,000	320,000	517,00	0,00	0,00	165 440,00	165 440,00	165 440,00	100,00%
		Cena dle URS 2022/1											
		ZBV č. 45 U Kiliána tl. 250mm 180=180 km 11,687-11,720 (33+0,5)*2=67,000 [B] km 11,2228-11,2584 (36+0,5)*2=73,000 [C] A+B+C=320,000 [D]											
206	935114122	Štěrbinový odvodňovací betonový žlab 450x500 mm se spádem 0,5% se základem	M	0,000	92,000	92,000	3 720,00	0,00	0,00	342 240,00	342 240,00	342 240,00	100,00%
		Cena dle URS 2022/1											

MĚSTYS DAVLE

Městys Davle, Na náměstí 63, 252 06 Davle, e-mail: starosta@obecdavle.cz, Telefon: 257 770 257

V Davli dne 19. dubna 2022

Krajská správa a údržba silnic,
příspěvková organizace
Zborovská 11
150 21 Praha 5

Věc: Žádost o vybudování bezpečnější autobusové zastávky

Vážení,

autobusová zastávka Davle, U Kiliána směr od Štěchovic do Prahy, je z hlediska bezpečnosti lidí jedna z nejhorších. Lidé stojí v komunikaci před svodidlem bez jakékoliv zábrany či ochrany. Komunikace II/102 je velmi vytížená, projíždí zde až 10.000 aut denně a denně na zastávce zastavuje 70 autobusů. Protože se v současné době realizuje akce „II/102 Davle – Štěchovice", požadujeme při této realizaci úpravu této zastávky zvýšenou obrubou, bezpečnostním zábradlím, odvodněním a úpravou jízdních pruhů.

Děkujeme za kladné vyřešení bezpečnosti na zastávce.

S pozdravem

Mgr. Jiří Prokůpek
starosta

Pontex, spol. s r. o., Bezová 1658/1, 147 00 Praha 4 - Braník

KSÚS Středočeského kraje
Ing. Milan Peška
Zborovská 81/11
150 00 Praha 5

Č. j.: Px 4359/2023/DDv
Datum: 17. 6. 2023
Vyřizuje: Ing. David Dvořáček, [redacted]

II/102 hr. hl. m. Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, II. etapa
Vyjádření autorského dozoru č. 66 - SO 102, autobusové zastávky v Davli

Byli jsme upozorněni, že po provedení doměření a upřesnění výškového řešení komunikace s přihlédnutím k napojení na přilehlé povrchy bylo zjištěno, že v oblasti autobusových zastávek na pravé straně komunikace v km cca 11.25 (Davle, U Kiliána, vpravo) a v km cca 11.70 (Davle, Portus, vpravo) vznikají na vozovce nepříznivé sklonové poměry s ohledem na odvedení vody (podélný sklon blízký nule). Hrozí riziko hromadění vody v oblasti zastávky s nepříznivými vlivy na bezpečnost a pohodlí cestujících využívajících zastávku. Projektant RDS navrhl doplnit záliv obou zastávek štěrbinovým žlabem délky cca 35 m s vnitřním skonem s vyústěním do vsakovací jímky mimo oblast vozovky.

Po prověření zjištění s navrženým řešením v oblasti zastávek vpravo za AD souhlasíme.

Dále jsme byli informováni o požadavku Městyse Davle a Dopravního inspektora na přeřešení zastávky vlevo v km ccca 11.72 (Davle, U Kiliána, vlevo). Jedná se především o doplnění nástupiště. Projektant RDS navrhl doplnit podél vozovky silnice II/102 bez vytvoření zálivu nástupiště délky cca 22 m. Nástupiště je od vozovky oddělené odraznou obrubou. Svodidlo podél silnice II/102 je v oblasti nástupště přerušené. Odvedení povrchových vod je řešeno štěrbinovým žlabem s vnitřním sklonem vyústěným na zemní těleso.

Za AD vnímáme, že dané řešení znamená výrazné zlepšení bezpečnosti a komfortu pro cestující. Upozorňujeme však, že s ohledem na návrhové předpisy se jedná o řešení kompromisní s odchylkami od požadavků předpisů. Přerušení silničního svodidla v oblasti zastávky nepovažujeme z hlediska konceptu rekonstrukce silnice II/102 za ideální. V návrhu v přípravné dokumentaci bylo uvažováno, že vodní plocha bude od silnice oddělena svodidlem přerušeným především pouze v oblasti sjezdů. S ohledem na polohu zastávky v intravilánu (s maximální povolenou rychlostí jízdy 50 km/h), přítomností odrazné obruby nástupiště a mírně zvětšeného odstupu vodní plochy od paty zemního tělesa komunikace však přerušení svodidla akceptujeme.

S ohledem na výše uvedené za AD požadujeme prověřit doplnění nástupiště provedením povolovacího řízení (změna stavby před dokončením). V případě souhlasu objednatele za AD souhlasíme s realizací nástupiště zastávky v km cca 11.72 dle návrhu projektanta RDS.

S pozdravem

Ing. David Dvořáček,
hlavní inženýr projektu

[redacted]

IČO: 40763439, DIČ: CZ40763439
Bankovní spojení: ČSOB, a.s., č. účtu: 474022543/0300
MONETA Money Bank, a.s., č. účtu: 82306504/0600
Sídlo: Bezová 1658/1, 147 00 Praha 4 - Braník, IDDS: nrpt3sn
Firma je zapsána v OR MS v Praze, oddíl C, vložka 2994 ze dne 17.7.1991

jednatelé: Ing. Václav Hvízdal tel.: +420-606 646 680
Ing. Petr Souček tel.: +420-602 214 618
Ing. Martin Havlík tel.: +420-602 619 782
sekretariát: tel.: +420-244 462 219 e-mail: pontex@pontex.cz

Na vědomí (zasláno pouze elektronicky):

1. Objednatel, KSÚS, Ing. Milan Peška,
2. Objednatel, KSÚS, Ing. Aleš Čermák
3. TDI, Pragoprojekt, a. s., Ing. Mirosla
4. Strabag, a. s., Karel Šimek,
5. Strabag, a. s., Martin Lísa,
6. Atelier PROMIKA, s. r. o.,

STRABAG a.s.
Odštěpný závod Praha
Kačírkova 982/4
158 00 Praha5

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje
Ing. Milan Peška
Zborovská 11
150 21 Praha 5

Vyřizuje:
Ing.Karel Šimek
[redacted]

Naše značka:
KSÚS_/45

Předmět: Oznámení o nové skutečnosti

Název stavby: II/102 hr. hl. města Prahy-Štěchovice, rekonstrukce. ETAPA II.

V souladu se smlouvou o dílo č. **S-468/00066001/2020** Vás informujeme o následujících nově zjištěných skutečnostech.
V PDPS nebylo uvažováno na stávajících autobusových zálivech v km 11,687-11,720 vpravo a 11,220-11,258 vpravo s jiným odvodněním než odvedením vody výsledným sklonem nové asfaltobetonové vozovky. U autobusové zastávky u Kiliány (též v Davli) bylo uvažováno mimo tuto PD s mostní konstrukcí pro přístup k autobusové zastávce. Při projektování realizační dokumentace a na základě podrobného výškového prověření odtokových poměrů ve stávajících autobusových zálivech (téměř nulový podélný sklon vozovky), bylo navrženo a odsouhlaseno objednatelem odvodnění těchto přilehlých částí pomocí štěrbinového žlabu s proměnným dnem a vyvedením vody do vsakovací jímky mimo vozovku. Zastávka u Kiliána je řešena z podnětu městyse Davle a policie DI-ČR jako změna stavby před dokončením, a to zřízením odrazného zvýšeného proužku podél silnice II/102 v místech stávající autobusové zastávky. Odvodnění této stavební úpravy včetně bezpečnostního zábradlí z vnější strany je uvažováno zase štěrbinovým žlabem s vnitřním spádem s vyvedením odvedené vody do skluzu zpevněného svahu.

Tato skutečnost má vliv na změnu soupisu prací. Žádáme tímto (zapsáno v příslušném stavebním deníku) o písemný pokyn k provedení prací nad rámec smlouvy.

S přátelským pozdravem

[redacted]

Ing. Karel Šimek

[redacted]

STRABAG a.s.
Ústřední 423/62
102 00 Praha 10/Česká republika

Tel. +420 272 701-667
Fax +420 272 701-701

Československá obchodní banka, a.s.
IBAN: CZ02 0300 0000 0001 1207 1233
BIC/SWIFT: CEKOCZPPXXX

Sídlo společnosti: Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 - Jinonice. Zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, sp. zn. B 7634.
IČO 60838744, DIČ CZ60838744

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, IČ 00066001,
150 21 PRAHA 5, Zborovská 11

STRABAG a.s
Kačírkova 982/4,
158 00 Praha 5

Věc: **Souhlasné stanovisko k ZBV**

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace v návaznosti na projednání s TDS a zhotovitelem v rámci akce „II/102 hr. hl. města Prahy-Štěchovice, rekonstrukce. ETAPA II" **souhlasí** s navrženou a projednanou změnou. Jmenovitě souhlasí se změnami odvodnění u autobusových zálivů v km 11,687 – 11,720 a v km 11,220 – 11,258 na základě zjištěných skutečností a se změnou zastávky U Kiliány na základě požadavku městyse Davle a Policie ČR.
Další práce požadujeme provést v koordinaci v souladu s pokyny AD a TDS a v souladu s uzavřenou SOD.

S pozdravem

Ing. Milan Peška
technicko – provozní náměstek

IČ 00066001
DIČ CZ00066001
e-mail milan.peska@ksus.cz
telefon: 601159692

a			
b			
c			
č. změny	text změny – odůvodnění	datum	podpis

II/102 HR. HL. MĚSTA PRAHY - ŠTĚCHOVICE, REKONSTRUKCE, ETAPA II	SO 102-B

OBJEDNATEL STAVBY

KSÚS

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p.o.
Zborovská 11
150 21 Praha 5
IČ 00066001

SCHVÁLIL-RAZÍTKO,DATUM,PODPIS:

TECHNICKÝ DOZOR

PRAGOPROJEKT

PRAGOPROJEKT, a.s.
K Ryšánce 1668/16
147 54 Praha 4
IČ 45272387

SCHVÁLIL-RAZÍTKO,DATUM,PODPIS:

AUTORSKÝ DOZOR

PONTEX SRO

Pontex, spol. s r.o.
Bezová 1658/1
147 00 Praha 4 - Braník
IČ 40763439

SCHVÁLIL-RAZÍTKO,DATUM,PODPIS:

ZHOTOVITEL STAVBY

STRABAG

STRABAG, a.s.
Kačírkova 982/4
158 00 Praha 5
IČ 60838744

SCHVÁLIL-RAZÍTKO,DATUM,PODPIS:

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM S-JTSK VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bpv

ZPRACOVATEL RDS

atelierpromika
projektová činnost v dopravě

Atelier PROMIKA s.r.o.
Muchova 9/...
...080213

SCHVÁLIL-RAZÍTKO,DATUM,PODPIS:

VYPRACOVAL	Ing. Tomáš Roztočil	HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU	Ing. Tomáš Roztočil
ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	Ing. Tomáš Roztočil	TECHNICKÁ KONTROLA	Ing. Petr Macek

AKCE
II/102 HR. HL. MĚSTA PRAHY - ŠTĚCHOVICE, REKONSTRUKCE, ETAPA II

STAVEBNÍ OBJEKT
SO 102-B REKONSTRUKCE VOZOVKY, DAVLE - ŠTĚCHOVICE - ÚSEK B

PŘÍLOHA	Č. PŘÍLOHY	Č. PARÉ
TECHNICKÁ ZPRÁVA	1.	

STUPEŇ	RDS	DATUM	05/2020	MĚŘÍTKO	-	FORMÁT	15xA4

KONCEPT

© *návrh řešení obsažený ve výkresové a textové části je předmětem ochrany dle autorského zákona*

11,381 – 11,520
13,150 – 13,200
Vpravo pak 11,730 – 11,830 a 11,932 – 11,970

- Úprava svahu typu B2

Ve sklonech zemního tělesa vyšších než 1:1,25 do rozdílu výšek 1,25 m bude svah násypového tělesa zpevněn obalovanými čely vyztuženými geokompozity Terra mesh. Výztuha čela svahu je ze svařované ohnuté sítě, tvar je zajištěn sponami. Povrch líce je obložen lomovým kamenem. Výztuha čela je kotvena spirálou z betonové výztuže k jednoosé geomříži z polypropylenu s pevností v tahu min. 50 kN. Materiál zásypu bude vhodně zvolen v závislosti na velikosti oka geomříže kvůli zajištění spolupůsobení. Úprava bude provedena v úsecích km (vše vlevo):

11,520 – 11,667
11,847 – 11,970
12,025 – 12,440

- Úprava svahu typu C

Ve sklonech zemního tělesa vyšších než 1:1,25 nad výšku vyšší než 1,25 m bude svah násypového tělesa zpevněn úhlovou opěrnou zdí. Vlastní technické a konstrukční řešení je popsáno v SO 253.

4.5. Odvodnění

Odvedení srážkových vod z vozovky silnice zachovává stávající systém odvodnění podélným a příčným spádováním do stávajících příkopů nebo do okolního terénu.

V rámci opravy systému odvodnění silnice se navrhuje především odtěžení drnu z nezpevněných krajnic, pročištění, příp. i prodloužení stávajících silničních příkopů a pročištění stávajících propustků či vpustí v trase silnice i pod sjezdy na okolní nemovitosti. U vpustí bude pročištěna a vyvložkována i odtoková trouba.

Pro zajištění řádného odvodnění vozovky v minimálních podélných sklonech v prostoru úžlabí zálivů autobusových zastávek budou doplněny betonové štěrbinové žlaby s neprůběžnou štěrbinou vyústěné do přilehlé zeleně:

- km 11,22285 – 11,25846 vpravo, dl. 36 m, vyústění v km 11,220 vpravo
- km 11,68713 – 11,72045 vpravo, dl. 33 m, vyústění v km 11,722 vpravo.

Kromě toho bude provedena úprava 3 propustků:

- km 11,917 vyčištění propustku od nánosů, očištění zdiva včetně přespárování porušených míst, na propustek budou nově osazeny betonová svodidla
- km 12,086 vyčištěné propustku délky 19 m DN 600 včetně prořezání náletových dřevin a sanace vtokového objektu
- km 12,925 vybourání kamenného propustku se železobetonovou deskou, nahrazení propustkem DN 1000 délky 20 m s šikmými čely odlážděnými lomovým kamenem do betonového lože. Vlastní materiálové charakteristiky jsou součástí přílohy č.6.

4.6. Vybavení pozemní komunikace

Součástí SO je také rekonstrukce silničního zádržného zařízení. Veškerá stávající svodidla budou odstraněna a nahrazena novým ocelovým svodidlem (vlevo s úrovní zadržení H1), dle požadavků ČSN na ochranu vozidla před nárazem do

v době od 8 do 17 hodin s přestávkou.

Vozidla vyjíždějící ze stavby musí být řádně očištěna, aby nedocházelo k zanášení zeminy na veřejné komunikace.

10. Změny oproti PDPS

RDS upřesňuje detaily technického řešení navrženého v projektové dokumentaci pro provádění stavby.

V rámci RDS SO 102-B došlo oproti PDPS k těmto změnám:

- km 10,540 – 10,600 – levá strana – po upřesnění výškového řešení prodloužen úsek s úplnou výměnou konstrukce vozovky - vícepráce
- km 10,600 – 10,670 – po upřesnění výškového řešení prodloužen úsek s úplnou výměnou konstrukce vozovky - vícepráce
- km 10,930 – 10,960 – po upřesnění výškového řešení je úsek pouze s opravou asfaltového souvrství vozovky - méněpráce
- km 11,520 – 10,530 – po upřesnění výškového řešení je úsek pouze s opravou asfaltového souvrství vozovky – méněpráce
- km 11,627 – 11,667 – po upřesnění výškového řešení je úsek pouze s opravou asfaltového souvrství vozovky - méněpráce
- km 13,150 – 13,200 – po upřesnění výškového řešení je úsek pouze s opravou asfaltového souvrství vozovky – méněpráce
- km 10,730 – 10,830 vlevo změna opevnění – původně typ B1, nově typ A
- km 10,850 – 10,930 vlevo změna opevnění – původně typ B1, nově typ A
- km 10,930 – 10,960 vlevo změna opevnění – původně typ B2, nově typ B1
- km 10,960 – 11,028 vlevo změna opevnění – původně typ B1, nově typ A
- km 11,690 – 11,847 vlevo změna opevnění – původně typ B1, nově typ A
- km 11,22285 – 11,25846 vpravo – doplnění betonového štěrbinového žlabu do úžlabí bus zálivu dl. 36 m vč. vyústění do zeleně
- km 11,68713 – 11,72045 vpravo - doplnění betonového štěrbinového žlabu do úžlabí bus zálivu dl. 33 m vč. vyústění do zeleně.

Výše uvedené změny mají vliv na soupis prací.

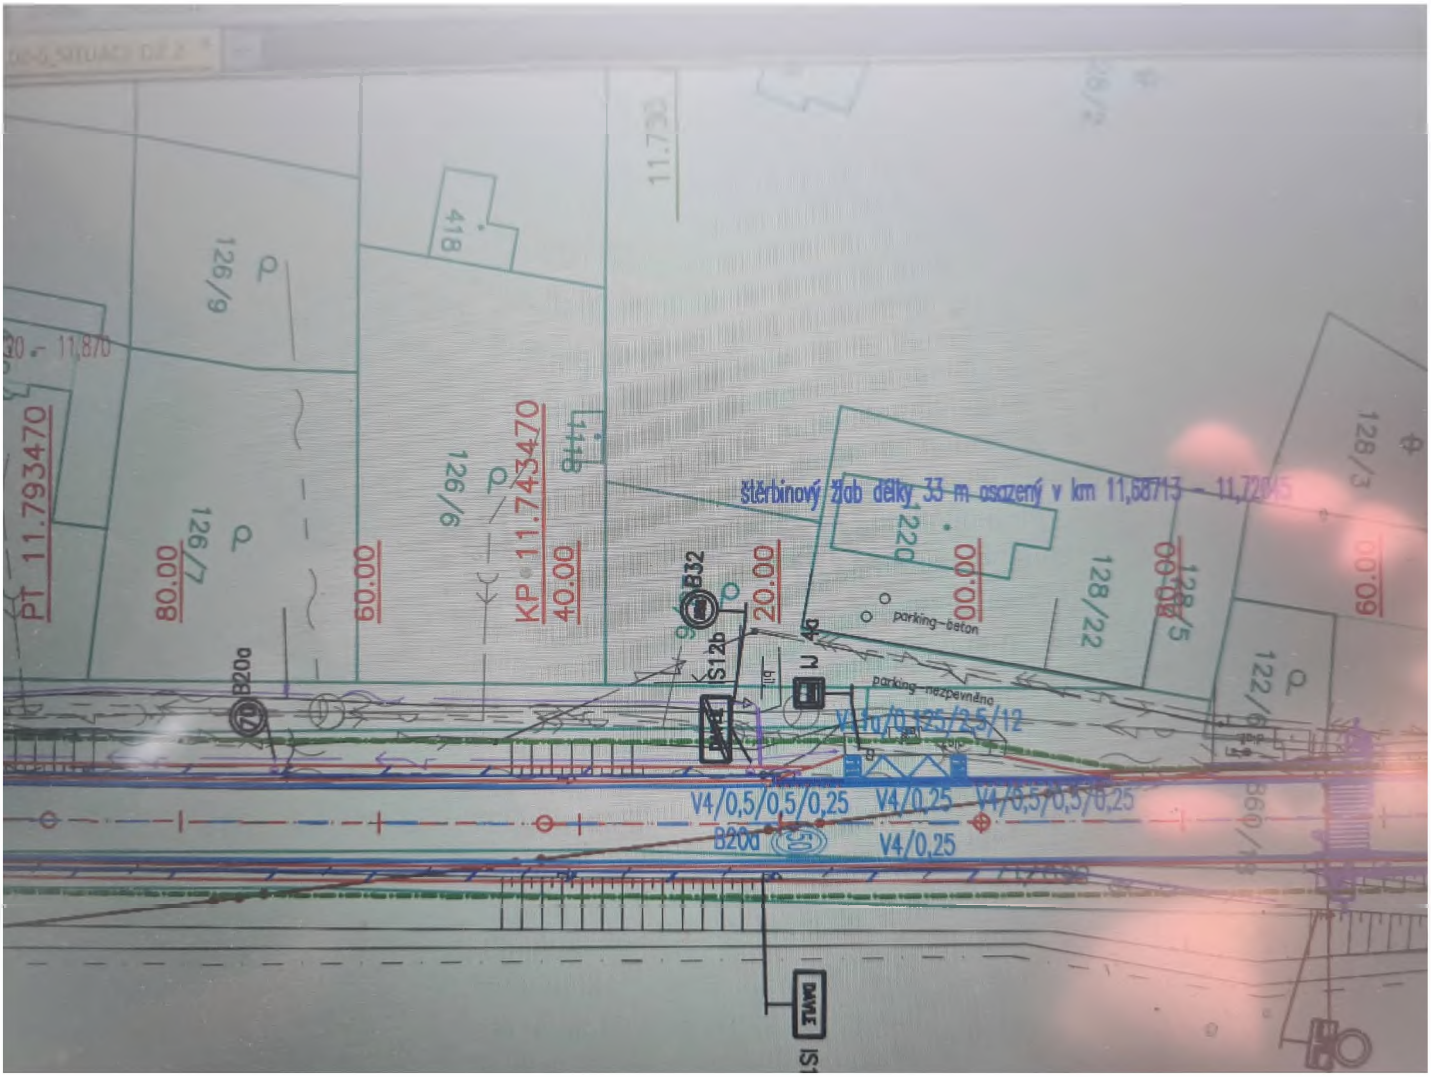
PT 11.793470
KP 11.743470
80.00
60.00
40.00
20.00
126/9
126/6
126/7
418
128/22
128/5
122/6
parking–beton
parking–nezpevněno
V11a/0,125/2,5/12
V4/0,5/0,5/0,25
V4/0,25
B20a
S12b
B32
IJ 4a

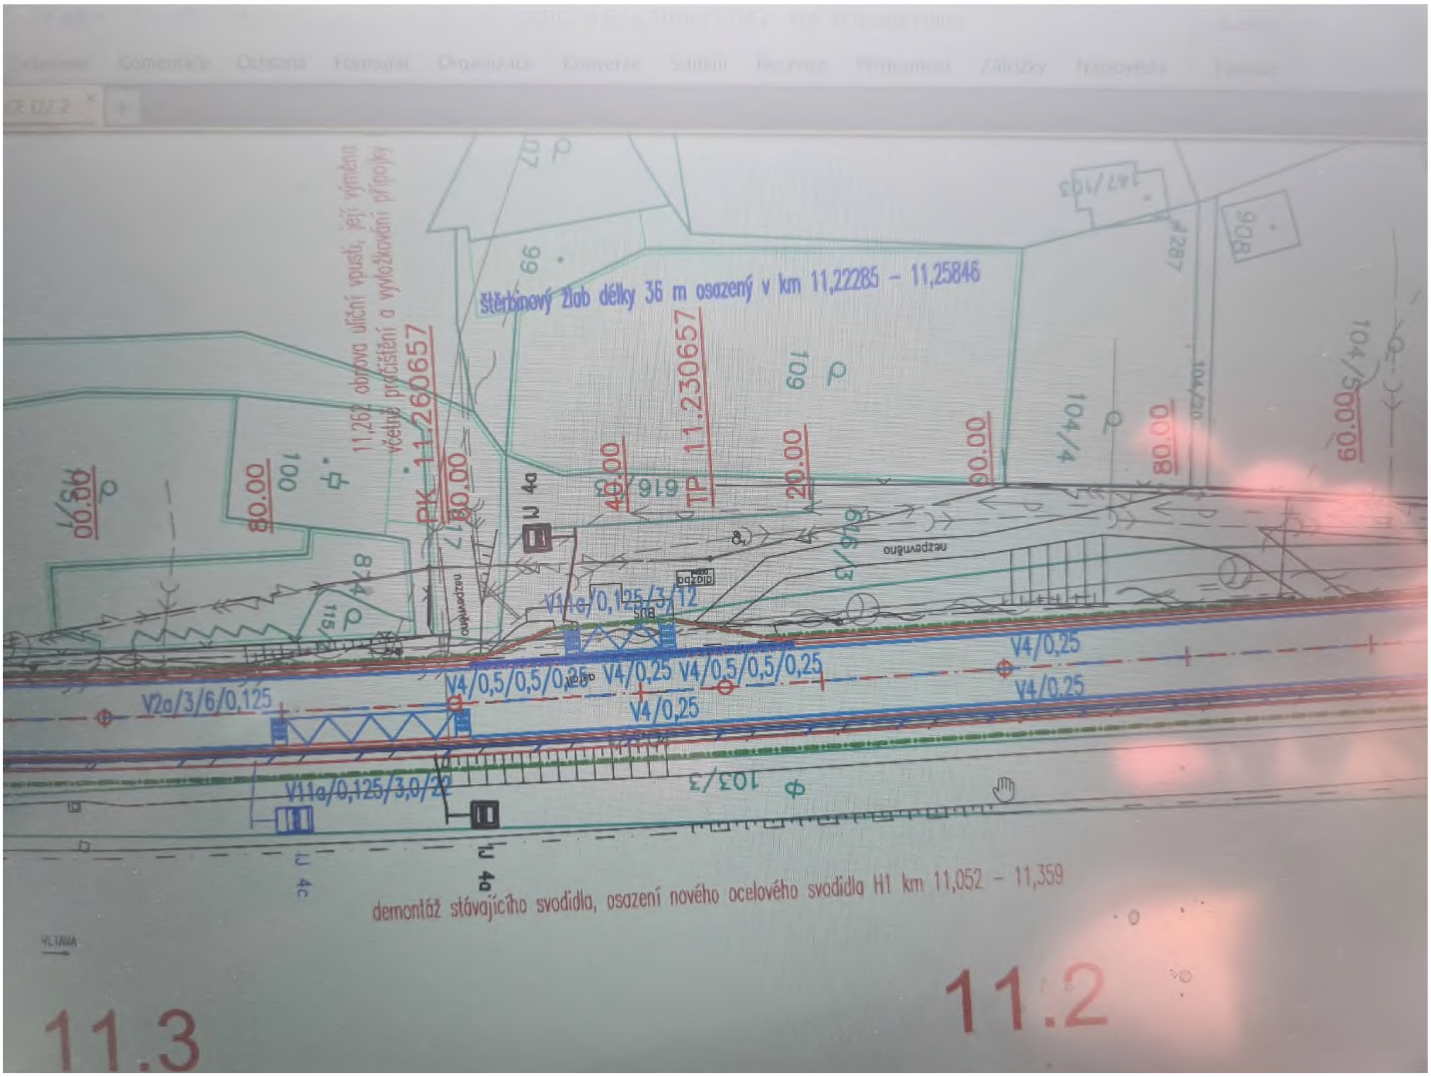
Štěrbinový žlab délky 36 m osazený v km 11,22285 – 11,25846
PK 11.260657
TP 11.230657
11,262 obrova uliční vpusti, její výměna včetně přečištění a vyložkování přípojky
80.00
40.00
20.00
60.00
616
V11a/0,125/3,12
V4/0,5/0,5/0,25
V4/0,25
V2a/3/6/0,125
V11a/0,125/3,0/12
IJ 4a
IJ 4c
demontáž stávajícího svodidla, osazení nového ocelového svodidla H1 km 11,052 – 11,359
11.3
11.2

Výkaz výměr - odrazný proužek (nástupiště U Kiliána) - stávající poloha

odpočty:	ocelové svodidlo H1	-22 m
přípočty:	odkop pro spodní stavbu silnic:	10,8 m3
	odstranění stávající vozovky - frézování AB tl. 150 mm	153 m2
	odstranění stávající vozovky - vybourání CB tl. 250 mm	153 m2
	zaříznutí stávající CB desky tl. 250 m	180 m
	zpevnění krajnice ŠD (R-mat) tl. 150 mm	123 m2
	dosypávka krajnice	30,75 m3
	zpevnění ploch:	
	zámková dlažba 60 mm + lože 30 mm	45 m2
	ŠDB 150	45 m2
	úprava pláně se zhutněním	45 m2
	obruby:	
	silniční obrubník betonový přímý	31 m
	silniční obrubník betonový vnější poloměr 0,5 m	2 ks
	záhonový obrubník	30 m
	asfaltová zálivka za horka typu N2	58 m
	odvodnění:	
	štěrbinový žlab	29 m
	odvodnění ŠŽ - plast	4 m
	výústní objekt odvodnění ŠŽ	1 ks
	skluz z kaskádovitých tvarovek do betonu	2 m
	bezpečnostní zařízení:	
	silniční zábradlí trubkové výšky 1,1 m	29 m

+12.0

STRABAG
LIEBHERR

LIEBHERR
912

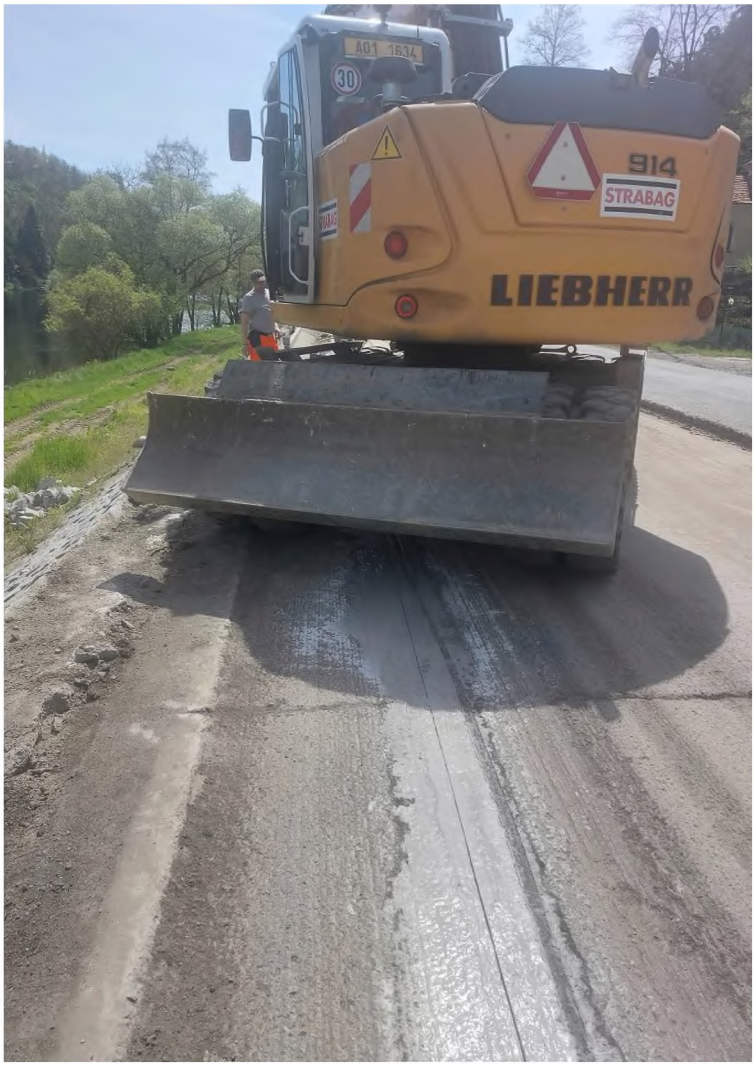
914
STRABAG
LIEBHERR

Baz der
10 Tonnen

BAG

List č.: 3521714

Datum: 16.12.2022 Den týdne: Pá

sko: STŘEDOČ Název akce: 11/702 MO. HL. ST. PRAHA, STŘEDOHOŘICE, CHODNÍKOVÉ ÚPRAVY II. ETAPA

ČAS, DENNÍ -2°C, POL. 1°C, ODPOL. 1°C

5:00 - 16:00 Pracovní přestávka: 11:00 - 11:30

a a příjmení): KAMIL BEITEN, FRANTIŠEK JEŘÁBEK, MICHAL DIVÍŠ, RADEK FENCL, JAN JEDLIČKA, JIŘÍ JEVEŠ, LUBOMÍR KOLÁŘSKÝ, MICHAL LYSÁNDER, KAREL MAUR, JAROSLAV ŠTÍPEK, IVAN ZAJÍČEK, ZDENĚK ZOUBEK

LIEBHERR 914, LIEBHERR 912, SMĚROVATELNÁ RYPADLOVÁ LOPATA, HRABLE ČELNÍ VIBRAČNÍ, 2x FORD TRANSIT

VOZOVKA DO 0/32mm, SJ KAMENIVO FR. 63/125, GEOTEXTÍLIE

ce (včetně dodavatelů a jejich činnosti): - PŘEMÍSTĚNÍ DEMOLIČNÍ SUTĚ DO KONTEJNERŮ

- PŘEKOPÁVÁNÍ, PLANÍROVÁNÍ VRCHOVÉ VRSTVY ZEMINY (ORNICE, DO STŘEDOMOŘSKÉHO STUPNĚ) V KM 11,320 PŘED PŘEJEZDEM NA STÁVCE PŘÍJEZDNÍ A KAMENIVA FR. 63/125 A PODKLADNÍ VRSTVY VOZOVKY Z KAMENIVA GEOTEXTÍLIE

- PODKLADNÍ ZHUTNĚNÍ ZEMNÍ PLÁNĚ V NEPROPUSTNÉM V KM 11,303 - 11,320 PŘED PŘEJEZDEM NA STÁVCE PŘÍJEZDNÍ A DO FR. 0/32mm

upce investo

STRABAG

List č.: 3521708

SO 102

Datum: 9. 12. 2022 Den týdne: PÁ

Nákladové středisko: 5H1866 Název akce: 11/102 HR. HL. N. PRAHY - STŘEDOVÝCHOD, REKONSTRUKCE II. ETAPA

Počasí: OBLAČNO, PRŮTRŽOVITÉ, RÁNO -1°C, POL. +5°C, ODPOL. +4°C

Pracovní doba: 6:00 - 16:30 Pracovní přestávka: 11:00 - 12:00

Pracovníci (jména a příjmení): FRANTIŠEK JEDLIČKA, MILOŠ DIVÍŠ, RADEK FENCL, JAN MIKULE, DANIEL DOUBRAVA, MILOŠ SMEKOST, VÁCLAV KUBÁ, VÁCLAV ZÍTKA, PETRUS LEMBÉLKA, OLEH BUNILO

Mechanismy: LIEBHERR 912, 5T MÁLOMOŽNÍ AUTO, 4x FORD TRANSIT, 2T KOTEL SE ŠÁLIVEM, ČERPACÍ VŮZ (BETONÁŽ)

Materiál:

Zkoušky:

Provedené práce (včetně dodavatelů a jejich činností): - PROVÁDĚNÍ ČÁSTKOU SPÁRY V KM 11,300 - 11,800 PRAVÁ STRANA VE SMĚRU STAVBĚNÍ ČÁSTEČNÝM VOREM (BETONÁŽ)

- PROVÁDĚNÍ ŠÁLINEK V ZÁTĚSECH PODÉLNÝCH A PŘÍČNÝCH SPÁR (BETONÁŽ) OD DILATACE V KM 11,300 - 11,800 PRAVÁ STRANA VE SMĚRU STAVBĚNÍ

- PROVÁDĚNÍ ASFALTU EXTRUDOVANÉHO POLYSTYRÉNU NA STYČNÉM OBLOUKU V KM 11,920 - 11,625 PRAVÁ STRANA VE SMĚRU STAVBĚNÍ + PROVÁDĚNÍ OBETONOVÁNÍ EXTRUDOVANÉHO OBLOUKU

- PROVÁDĚNÍ DISTANČNÍCH DOPRAVNÍHO OPATŘENÍ V KM 11,610 - 11,520 PRAVÁ STRANA VE SMĚRU STAVBĚNÍ

ŽÁDÁ DODAVATELE: DODÁVKA DODAVATELE (F. STRABAG a.s.) PROTĚN LITÉ ŠÁLY PŘEVÁŽENÍ ODBĚR) MATERIÁLU P. PROTOKOLU KALENTU O KONTROLU ŠÁLINEK V MÍSTECH PODÉLNÝCH A PŘÍČNÝCH SPÁR) STÁVAJÍCÍ OS DESKY A O POVOLENÍ PROVÁDĚNÍ ADHEZNÍHO INFILTRAČNÍHO PROSTŘEDKU 1,2 kg/m²

ZAPSÁNO DNE: PROVEDENA KONTROLA PROVEDENÍ ČÁSTKOVÉ. PROVEDENÉ V SOULADU S NAŘÍZENÍM MD (č. 57)

Podpis zástupce investo [redacted] Podpis stavbyve [redacted]

TRABAG

List č.: 3521706

SO 102

Datum: 7.2.2022 Den týdne: St.

ové středisko: (PJ/BRAX) Název akce: M/102 MÍST. KOM. 17 - ŠTĚRKOVEC, REKONSTRUKCE, II. ETAPA

ní doba: 7:00 - 16:30 Pracovní přestávka: 11:00 - 12:00

níci (jména a příjmení): ŠOSTÁNEK BOHUSLAV, HÁJEK ZDENĚK, MICHAL OLDŘICH, KOCH KLAUS, JAN VLČEK

anismy: DOPRAVNÍ, 9T, ŠKRÁBEL ALOIS, IVFORO TRAVIT, KONTROLA ČISTOTY KOLEJNIC

riál: BETONOVÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ ŽLABŮ, POKLÁDKA PRŮMYSLOVÉ DLAŽBY, MATERIÁL

šky:

vedené práce (včetně dodavatelů a jejich činností): - PROVÁDĚNÍ ÚPRAVY ŠTĚRKOVÉHO LOŽE V KM 11,683 - 11,940 (ASTOSKRUHOVÁ BARIÉRA PORTÁL) PRAVÁ STRANA VE SMĚRU STANIČENÍ + DOVOZ MATERIÁLU
- PROVÁDĚNÍ PŘÍČNÉHO ODSUNUTÍ ŠTĚRKOVÉHO LOŽE DO BETONOVÉHO LOŽE PŘÍSLUŠENSTVÍ PRŮMYSLOVÉ DLAŽBY

ZÁPIS ZHOTOVITELE: DO DOHODE S OVS PROVEDENÍ PRACÍ STAVBY, ÚD STAVBY A ZAJIŠTĚNÍ MÍSTNÍCH ZVLÁŠTNÍCH PODMÍNEK PROVÁDĚNÍ KONTROLY JÍZDY NA VÝŠKU ŠTĚRKOVÉHO ŽLABU (ASTOSKRUHOVÁ BARIÉRA PORTÁL) V KM 11,940 PRAVÁ STRANA VE SMĚRU STANIČENÍ.

ZÁPIS TDI: VZHLEDEM K TOMU, ŽE VE SEZNAMU O ZTÍŽENÍ PO POLADNÍ STANOVIŠTĚ MD - [redacted]

- PROVÁDĚNÍ ODTĚŽENÍ STÁVAJÍCÍHO ŠTĚRKU PRO KONTROLU JÍZDY (ASTOSKRUHOVÁ BARIÉRA PORTÁL) V KM 11,940 PRAVÁ STRANA VE SMĚRU STANIČENÍ + ODVOZ VYTĚŽENÉHO MATERIÁLU NA MEZIDEPONII
- ODVOZ VYTĚŽENÉHO MATERIÁLU Z MEZIDEPONIE NA POKLÁDKU HOLÝŠOVA

[redacted]

Podpis zástupce investora (

STRABAG

List č.: 3521705

SO 102

Datum: 6. 12. 2022 Den týdne: Út

Nákladové středisko: 9/1/8002 Název akce: 11/102 STŘEDOMOLICE, REKONSTRUKCE, II. ETAPA

Počasí: OBLAČNO, MÍRNÝ + 3°C, DÉŠŤ, +5°C, ODPOL. +6°C

Pracovní doba: 8:00 - 16:30 Pracovní přestávka: 11:00 - 12:00

Pracovníci (jména a příjmení): KOČÍ SEITEN, VIŠŇ LUKÁŠ, DOBEŠEK KONSTANTÝN, KOCI2 KLOD, MICHAL OMELKA, MICHAL DIVÍŠ, KAREL FENCL

Mechanismy: LIEBHERR 914, SAMOJEZDNÝ AUTO, KOLEJOVÉ ČELNÍ NAKLADAČ

Materiál: SD FR. 0/32 mm A, BETON C 30/25 - XF3, PROVZDUŠŇUJÍCÍ HMOTA + VODA, KAMENIVO FR. 4/8 mm

Zkoušky:

Provedené práce (včetně dodavatelů a jejich činnosti): - PROVÁDĚNÍ ODTĚŽENÍ BETONOVÉHO KRY V MÍSTECH NOVÉ BUDOVANÉHO STŘEDOVÉHO ŽLABU V km 11,687 - 11,820 PRAVÉ STRANA VE SMĚRU STAVENÍŠTĚ + ODVOZ BETONOVÉHO KRY DO MEZISKLADU

- PROVÁDĚNÍ ODTĚŽENÍ STÁVAJÍCÍCH KONSTRUKČNÍCH VRSTEV V MÍSTĚ NOVÉHO STŘEDOVÉHO ŽLABU (ASFALTOVÉ SOUVRSTVÍ VOZOVKY) + ODVOZ VÝKOPOVÉHO MATERIÁLU

- PROVEDENÍ KONSTRUKČNÍCH VRSTEV PRO STŘEDOVÝ ŽLAB, (OBALOVANÉ SOUVRSTVÍ PODKLADNÍ) Z SD FR. 0/32 mm A + BETONOVÉ PODLOŽKY Z BETONU C 20/25 XF3

- ODVOZ NEVHODNÉHO VÝKOPOVÉHO MATERIÁLU Z MEZISKLADU NA SKLÁDKU HOLÝ VRCH

- PROVÁDĚNÍ OBSYPU OBRUBNÍKU BETONEM DO BETONOVÉHO LOŽE SAMOZHUTNITELNÝ BETONOVOU HMOTOU PUMA

- PROVÁDĚNÍ VYLOMENÍ VYTVRZELÝCH KRY STÁVAJÍCÍ CS DRÁHY V km 11,300 - 11,800 PRAVÉ STRANA VE SMĚRU STAVENÍŠTĚ

Podpis zástupce invest

BAG

List č.: 3521704

SO 102

Datum: 5. 12. 2022 Den týdne: PO

sko: Stavba Název akce: II/102 MZ HL. M. PRAHA - STŘEMYSLICE, PŘEKONSTRUKCE, II. STUPEŇ

O: RÁNO +4°C, DOL. +2°C, VEČER +3°C

9^{00} - 16^{00} Pracovní přestávka: 11^{00} - 12^{00}

a a příjmení): PAVEL V, STANĚK, FRANTIŠEK JEDLIČKA, EDUARD ZOUBEK, PETR HLOD, MICHAL ŠMEHLÍK, JIŘÍ LUBEŠ, JAROSLAV ŠTÍPEK, OLEH RUCHKA, MICHAL DIVÍŠ, PAVEL PAVEL, JAN JURÍK

LIEBHERR 912, LIEBHERR 914, 3x NÁKLADNÍ AUTO, 2x FORD TRANSIT, MOTOROVÁ PŘÍSEČKA, TRAKTOR UZ, KRAMER ŠÉRA NÁKLADOČ.

SEGMENTOVÉ ZDIVO, SEKÁČ, KOMBINACE 4/8 mm

ce (včetně dodavatelů a jejich činností): - PROVÁDĚNÍ GEODETICKÉHO VYTYČENÍ PŘÍSTUPOVÉHO SLOUPU PODÉL AUTOBUSOVÉ ZASTÁVKY PORUCHY V KM 11,654 - 11,940 PRAVÉ PŘÍDRŽNÉ KŘ PŘÍKOPU STAVENIŠTĚ

- PROVÁDĚNÍ ZEMNÍCH PRACÍ PŘÍSLUŠNÝCH ČS DRUHŮ PRO PROVÁDĚNÍ NOVÉHO PŘÍSTUPOVÉHO SLOUPU V KM 11,685 - 11,920 PRAVÉ PŘÍDRŽNÉ KŘ PŘÍKOPU STAVENIŠTĚ + OBSLUHOVÁNÍ PŘÍSLUŠNÝCH ČS DRUHŮ BAGROVÝ LIEBHERR 914 + HYDRAULICKÉ KLADIVO

PROVÁDĚNÍ ODLEHČENÍ PRAHU TĚLESA KOMUNIKACE S RIGOLOVÁNÍM MATERIÁLU DO BETONOVÉHO KOŠE V KM 11,300 - 11,400 LEVÉ PRAHA KŘ PŘÍKOPU STAVENIŠTĚ

ZAJIŠTĚNÍ PŘÍSLUŠNÝCH DRUHŮ KONSTRUKCE VOZOVKY KOMUNIKACE + PRAVÉ PŘÍKOPOVÉ ŽLABY (PO 206) PRAHA PŘÍDRŽNÉ KŘ PŘÍKOPU STAVENIŠTĚ

DOVOZ NEBEZPEČNÉHO NEBEZPEČNÉHO MATERIÁLU A NEBEZPEČNÉ A PŘEVÁŽENÍ ZPĚT VČETNĚ

ZAJIŠTĚNÍ, DOPLNĚNÍ NEFUNKČNÍCH PRVKŮ PŘÍSLUŠNÝCH ČS DRUHŮ V KM 11,300 - 11,800 PRAVÉ PŘÍDRŽNÉ KŘ PŘÍKOPU STAVENIŠTĚ

upce investora (TDI

[redacted]

STRABAG

List č.: 3110705

SO 102

Datum: 28. 4. 2023 Den týdne: Pá

Nákladové středisko: 8411600 Název akce: II/102 HR. HL. N. PODHÁJ, ŠTĚKOVICE, REKONSTRUKCE, II. ETAPA

Počasí: POLOJASNO, DÉŠŤ + 4°C, POL. + 9°C, ODPOL. +11°C

Pracovní doba: 5⁰⁰ - 14⁰⁰ Pracovní přestávka: 11³⁰ - 12⁰⁰

Pracovníci (jména a příjmení): EDUARD KOUTENSKÝ, MIROSLAV KLÁD, MICHAL CHMELAŘ, VITALIJ HRATCHE, JAROSLAV ŠTÍPEK, OLEH BUCHKA, IVAN JOSEFOVIČ, VÁCLAV ŠEBEK, FRANTIŠEK JEDLIČKA, ANTONÍN STENCL, MICHAL DIVÍŠ, KAREL FENCL

Mechanismy: LIEBHERR 914, LIEBHERR 914, KOMATSU ČELNÍ NAKLADAČ, JCB FORD TRANSIT, W 210 - KOPBA, STAVEBNÍ VŮZ (SAMOJÍZDNÝ) - MERCEDES, KOLOVÝ VŮZ, VIBRAČNÍ + PADOVÁ DESKA, JCB NÁKLADNÍ AUTO, GLADIATOR, MOTOROVÁ PILA, VIBRAČNÍ DESKA

Materiál: ŠD FR. 0/32mm, REGULAČNÍ KAMENIVO, BETON

Zkoušky:

Provedené práce:
- PROVÁDĚNÍ ZHUTŇOVÁNÍ PODKLADU PRO TĚLESO KOMUNIKACE SO 102 S REGULAČNÍHO KAMENIVA DO BETONOVÉHO LOŽE V KM 11,730 - 11,880 PRAVÁ STRANA VE SMĚRU STANIČENÍ
- PROVÁDĚNÍ POSTŘIKU STÁVAJÍCÍHO ASFALTOVÉHO POVRCHU V KM 13,800 - 14,100 PRAVÁ STRANA VE SMĚRU STANIČENÍ PRO ZDS + ZDVOJ ASFALTOVÉHO BETONU PRO OBALOVÁNÍ OBRUBNÍKŮ + ZAPRAŠOVÁNÍ PŘÍP. ASFALTOVÉHO POVRCHU PRO PODBETONOVÁNÍ PRO ZDS
- PROVÁDĚNÍ ÚPRAVY ODVODŇOVACÍHO ŽLABU STÁVAJÍCÍM LOŽEM (SAMOSPÁDEM) V KM 13,700 - 14,100 PRAVÁ STRANA VE SMĚRU STANIČENÍ
- PROVÁDĚNÍ FRÉZOVÁNÍ STÁVAJÍCÍ CS DÉŠŤ V KM 10,840 - 10,880 LEVÁ STRANA VE SMĚRU STANIČENÍ PRO ZDS
- ZDVOJ BETONOVÉHO BETONÁŘE NA MEZIDEPONII
- PROVÁDĚNÍ ČERPÁNÍ STÁVAJÍCÍ CS DÉŠŤ V KM 11,255 - 11,285 LEVÁ STRANA VE SMĚRU STANIČENÍ (DOPRAVNÍ ZDRŽENÍ PROVOZU - POŽADAVEK ORGÁNŮ POLICIE A DI-POŘ)
- PROVÁDĚNÍ BOURÁNÍ ZPEVNĚNÉ STÁVAJÍCÍ CS DÉŠŤ V KM 11,255 - 11,285 (LIEBHERR 914 + BOURACÍ KLADIVO) + NAKLÁDKA + ZDVOZ BETONOVÝCH KUSŮ NA MEZIDEPONII
- PROVÁDĚNÍ ŘEZÁNÍ SPÁR PRO PŘÍČNÝ ŽLAB V KM 11,253 - 11,285 LEVÁ STRANA VE SMĚRU STANIČENÍ + ZDVOZ VÝKOPOVÉHO MATERIÁLU NA MEZIDEPONII + HUTNĚNÍ PODKLADOVÉ SPÁRY VIBRAČNÍ DESKOU
- PROVÁDĚNÍ BETONOVÉHO PODKLADU PRO PŘÍČNÝ ŽLAB V KM 11,253 - 11,285 LEVÁ STRANA VE SMĚRU STANIČENÍ + POKLÁDKA ODTOKOVÉHO DÍLU DO BETONOVÉHO LOŽE + POKLÁDKA PVC ROURY DN 200 SN 12 DO PŘÍČNÉHO LOŽE

Podpis zástupce investora (TDI):

Podpis stavbyvedoucího:

RABAG

List č.: 3110707

SO 102

Datum: 29.4.2023 Den týdne: So

vé středisko: 841/2602 Název akce: II/102 HR. KR. N. PRAHY, ŠTĚCHOVICE, REKONSTRUKCE, II. ETAPA

počasí: POLOJASNO, RÁNO +4°C, PŘ. +9°C, ODPOL. + 15°C

i doba: 5⁰⁰ - 13⁰⁰ Pracovní přestávka: 11⁰⁰ - 12⁰⁰

ící (jména a příjmení): FRANTIŠEK JEDLIČKA, VÁCLAV ŽEBEN, JAROSLAV ŠTÍPEK, PATRIK LEHEČKA, MATOUŠ POSPÍŠIL, OLEH BUCHILA, MARTIN VLAD, MICHAEL OHLENDEF, VITALIY HRITCYK, KAREL FENCL, ANTONÍN FENCL

ismy: LIEBHERR 914, LIEBHERR 912, FENDT X/210, KOMATSU WA, 4X NÁKLADNÍ AUTO, KOMPRESOR ČELNÍ NAKLADAČ, VÁLEC HAMM

l: BETONOVÉ VOZOVKY - ŠTĚRBINOVÝ ŽLAB, BETON

y:

lené práce: - PROVÁDĚNÍ POKLÁDKY ŠTĚRBINOVÝCH ŽLABŮ DO BETONOVÉHO LOŽE V KM 11,255 - 11,285 LEVÁ STRANA VE STYKU STAVENÍ (DOPLNĚNÍ ODSTRANĚNÉHO ÚSEKU - PŮVODNÍHO OBCE HORNÍ A JI - PŮS) + OBETONOVÁNÍ ŠTĚRBINOVÉHO ŽLABU

- PROVÁDĚNÍ FRÉZOVÁNÍ STÁVAJÍCÍ CB DESKY V KM 11,060 - 11,180 LEVÁ STRANA VE STYKU STAVENÍ + ODVOZ BETONOVÉHO RECYKLÁTU NA MEZIDEPONII

- PROVÁDĚNÍ ODTĚŽENÍ STÁVAJÍCÍCH KONSTRUKČNÍCH VRSTEV KOMUNIKACE SO 102 NA ÚROVEŇ PLÁNĚ V KM 10,940 - 10,980 LEVÁ STRANA VE STYKU STAVENÍ OBE RUCE + ODVOZ VÝKOPOVÉHO MATERIÁLU NA MEZIDEPONII + HUTNĚNÍ PLÁNĚ VÁLCEM HAMM

- PROVÁDĚNÍ ODTĚŽENÍ BETONOVÉHO ASFALTOVÉHO POVRCHU A STÁVAJÍCÍ CB DESKY V KRAJNICI KOMUNIKACE SO 102 V KM 10,940 - 10,980 A 11,060 - 11,180 LEVÁ STRANA VE STYKU STAVENÍ (ŠÍŘKA OD 0,35 - 0,5 m) + ODVOZ NA MEZIDEPONII

- PROVÁDĚNÍ ODTĚŽENÍ STÁVAJÍCÍCH KONSTRUKČNÍCH VRSTEV KOMUNIKACE SO 102 NA ÚROVEŇ PLÁNĚ V KM 11,060 - 11,180 LEVÁ STRANA VE STYKU STAVENÍ OBE RUCE + ODVOZ VÝKOPOVÉHO MATERIÁLU NA MEZIDEPONII + HUTNĚNÍ PLÁNĚ VÁLCEM HAMM

- PROVÁDĚNÍ ČÁSTEČNÉHO FRÉZOVÁNÍ STÁVAJÍCÍ CB DESKY V KM 10,980 - 11,060 A KM 11,060 - 11,300 LEVÁ STRANA VE STYKU STAVENÍ OBE RUCE + ODVOZ BETONOVÉHO RECYKLÁTU NA MEZIDEPONII

pis zástupce inves

STRABAG

List č.: 3110709

SO 102

Datum: 2.5.2023 Den týdne: ÚT

Hlavové středisko: Chlístov / Název akce: II/102 MO. HL. M. PRAHY, STŘEMYSLICE, REKONSTRUKCE 1. STUPEŇ

Stav: OBLAČNO, POLOJASNO, RÁNO +8°C, POL. +13°C, ODPOL. +17°C

Pracovní doba: 5°° - 17°°

Pracovní přestávka: 11°° - 12°°

Pracovníci (jména a příjmení): FRANTIŠEK JANOUŠEK, KAROLÍNA ŠUSTEN, JAROSLAV STŘÍŽ, PETR LEHEČKA, ANTONÍN POSPÍŠIL, ALEŠ RUCHKA, MICHAL ONDRUŠEK, VÁCLAV KLAS, MILOŠ MATOUŠEK, MICHAL DIVÍŠ, KAREL ŠENCL, ANTONÍN MĚNCL, ALEŠ POLÁCH

Mechanismy: LIEBHERR 914, LIEBHERR 912, BOBCAT, KOMATSU ČELNÍ NAKLADAČ, 3x NÁKLADNÍ AUTO, VÁLEC, HUTNÍ, 2x PUMPA KRAJNÍ,

Materiál: RECYKLOVANÝ KAMENIVO, BETON, PILAMOVÝ OBRUBY, ŠD FR. 0/32mm A

Práce: STAVEBNÍ ZAŘÍZENÍ, ČIŠTĚNÍ - KRÁJ 2x

Provedené práce: - PROVÁDĚNÍ ODSTRAŇOVÁNÍ STARÝCH TĚLESA KOMUNIKACE SO 102 A RECYKLOVANÉHO KAMENIVA DO BETONOVÉHO LOŽE V km 11,930 - 11,930 PRAVÁ STRANA VE SMĚRU STANIČENÍ

- PROVÁDĚNÍ POKLÁDKY PILAMOVÝM OBRUB DO BETONOVÉHO LOŽE V km 11,255 - 11,245 LEVÁ STRANA VE SMĚRU STANIČENÍ (DOPLNĚNÍ ODSTRANĚNÉHO ÚSEKU) - POSTUPNĚ OBRUB DÁVKE A VI - PÓR)

- PROVÁDĚNÍ KONTROLENÍ VRSTVY A ŠD FR. 0/32mm A V km 10,840 - 10,880 A 11,060 - 11,180 LEVÁ STRANA VE SMĚRU STANIČENÍ ODSTRANĚNÍ + HUTNĚNÍ ŠD FR. 0/32mm A KÓTOVÁNÍ VRSTVY

ZÁSTUPCE ZHOTOVITELE: ZÁSTUPCE ZHOTOVITELE (A. STŘECHA a.s.) PROVÁDÍ LEVÁ STRANA STAVEBNÍ DOHLED MINĚNÍ P. MIRAVSKÝ KONTROLU O SPRÁVNÉ PROVÁDĚNÍ PROVÁDĚNÍ ODSTRAŇOVÁNÍ VRSTVY A ŠD FR. 0/32mm A V Z. 220 mm V km 11,840 - 10,880 A km 11,060 - 11,180 LEVÁ STRANA VE SMĚRU STANIČENÍ

ZÁPIS TDI: PO PROVEDENÍ KONTROLY A NA ZÁKLADĚ VÝSLEDKŮ KONTROL. ZKOUŠEK POKLÁDKY POKLÁDKA ŠD V UVEDENÉM ÚSEKU.

Podpis zástupce inve [redacted]

Podpis stavb [redacted]

ABAG

List č.: 3110710

SO 102

Datum: 3.5.2023 Den týdne: St

Středisko: (Mitterer) Název akce: M/102 MR. R2. 3. ETAPA, ŠÉE-HOLICE, REKONSTRUKCE, II. ETAPA

JARNO, RÁNO +6°C, POL. +15°C, ODPOL. +16°C

Doba: 6:00 - 17:00 Pracovní přestávka: 11:00 - 12:00

Jména a příjmení): EDENÉR LOUTENSKÝ, ALEŠ PANOŠ, JAROSLAV ŠÍPEK, OLEH RICHTER, MATOUŠ POSPÍŠIL, MICHAL OMELKO, JOSEF KLAD, VITALIJ KRATSTER, VÁCLAV ŠKRDLA, FRANTIŠEK JABLOŠKA, MICHAL DIVÍŠ, KAREL FENCL, ANTONÍN FENCL

Stroje: LIEBHERR 914, LIEBHERR 914, KRAMER ČELNÍ NAKLADAČ, ROBUR, 3x NÁKLADNÍ AUTO, MOTOROVÁ BRUSKA, SOUPRAVA VLEČNÉHO VOZIDLA, 2x FORD TRANSIT, VÁLEC HAMM, VIBRAČNÍ DESKA DPU

REGULAČNÍ KÓTER, BETON, SC 5/16, OBRUBNÍKY Š. 10cm, ŠD FR. 0/32mm Ø

REFLEXNÍ SVĚTELNÁ SMĚROVKA (2x ŠD FR. 0/32mm Ø)

Hlavní práce: - PROVÁDĚNÍ ODSTŘELEM SKALNÍHO TĚLESA KOMUNIKACE SO 102 A OBRUBOVACÍHO KOTEVNÍHO DO BETONOVÉHO LOŽE V km 11,235 - 11,280 LEVÁ STRANA VE SMĚRU STANIČENÍ

ZÁPIS DOHLÍDACÍHO: ZÁSTUPCE DOHLÍDACÍHO (F. STANISLAV a.s.) NAŘÍZENÍ LÍPA ŠÉE ~~STAVEBNÍHO~~ ~~DOHLÍDACÍHO~~ STAVEBNÍ DOZOR) INVESTORA p. MICHÁLKA NA ZÁVĚR O POVOLENÍ PROVÁDĚNÍ KONSTRUKČNÍCH VRSTEV A SC 5/16 ~~V km~~ V TL. 150mm V km 11,230 - 11,180 a km 11,060 - 11,180 LEVÁ STRANA VE SMĚRU STANIČENÍ

- PROVÁDĚNÍ KONSTRUKČNÍCH VRSTEV A SC 5/16 V TL. 150mm OBOUSTRANNĚ V km 11,230 - 10,880 a V km 11,060 - 11,180 LEVÁ STRANA VE SMĚRU STANIČENÍ + HUTNĚNÍ SC 5/16 VÁLCEM HAMM + VIBR. DESKA
- PROVÁDĚNÍ POKLÁDKY OBRUBNÍKŮ DO BETONOVÉHO LOŽE V km 11,235 - 11,280 LEVÁ STRANA VE SMĚRU STANIČENÍ (DOČIŠTĚNÍ ODSTŘELENÉHO SKALNÍKU) - POKLÁDKA OBRUB PAVLE A DI-PÍK)
- PROVÁDĚNÍ KONSTRUKČNÍCH VRSTEV A ŠD FR. 0/32mm A PRO SÁZENOVOU OBRUBU V km 11,235 - 11,280 LEVÁ STRANA VE SMĚRU STANIČENÍ

ZÁPIS DODAVATELE:

PŘI ODSTŘELOVÁNÍ SKÁLNÍCH OB BYLO V km 11,060 - 11,180 LEVÁ *

Podpis zástupce investora (TDI): [redacted] Podpis [redacted]

ZABAG

List č.: 3110712

SO 102

Datum: 4.5.2023 Den týdne: ČT

středisko: (Praha) Název akce: M/102 MÍR. NÁ. M. PRAHY, ŠTĚRBOHOLCE, BETONÁŽ REKONSTRUKCE, II. ETAPA

počasí: JASNO, RÁNO + 5°C, POL. + 12°C, ODPOL. + 19°C

doba: 7:00 – 14:00 Pracovní přestávka: 11:00 - 12:00

ci (jména a příjmení): EDENĚK KOVENSKÝ, PETRIK LEHEČKA, JAROSLAV ŠÍPEK, OLEH RUDNÍK, VLADIMÍR POSPÍŠIL, MICHAL ČARNECKÝ, VÁCLAV VLAD, VITALIJ HRITSYK, MICHAL DIVÍŠ, KAREL FENCL, ANTONÍN MENCL

šmy: LIEBHERR 914, LIEBHERR 922, KRAMER ČELNÍ NAKLADAČ, MOTOROVÁ ŠTĚRBAČKA, 2x FORD TRANSIT, 3x VÁLEČKOVÝ ZHUTŇOVAČ, ČERPADLO MOŽ. (BETONÁŽNÍ), VIBRAČNÍ DESKA DPV

ODBOURÁNÍ KRYTU, BETON, OBRUSY, DO FR. 0/32 mm a

lené práce: - PROVIZORNÍ ZAJIŠTĚNÍ SVAHU JÍŽDNÍHO PRUHU KOMUNIKACE SO 102 S ODBOURANÝM KRYTEM DO BETONÁŽNÍHO LOŽE V km 11,230 - 11,330 PRAVÉ STRANA VE SMĚRU STAVBĚNÍ

- ODVOZ NEVHODNÉHO VÝSYPNÉHO MATERIÁLU S MEZISKLADOVÁNÍM NA PŘEDEPSANÉ MÍSTO VOZU

- PROVIZORNÍ ÚPRAVA SVAHU JÍŽDNÍHO PRUHU KOMUNIKACE SO 102 V km 11,240 - 11,300 LEVÁ STRANA VE SMĚRU STAVBĚNÍ

- PROVÁDĚNÍ GEODETICKÝCH PRACÍ PRO ZAMĚŘENÍ A ODSOUHLASENÍ STAVEBNÍCH ČÁSTÍ (ZAMĚŘENÍ OCHR. VRSTVY PR. STAVEBNÍ DENÍK - ZÁPIS 2 ST. 5.5.2023) + ČERPÁNÍ + ODBOURÁNÍ V km 11,260 - 11,060 A 11,120 - 11,300 LEVÁ STRANA VE SMĚRU STAVBĚNÍ

- PROVIZORNÍ ÚPRAVA KOMUNIKACE V km 11,240 - 11,300 LEVÁ STRANA VE SMĚRU STAVBĚNÍ (ČISTÍCÍ VOZ - AUTOJEŘÁB)

- PROVÁDĚNÍ PODSYPU Z PŘ. FR. 0/32 mm a PRO BETONOVÉ OBRUBY + KRYTÍNÍ (ZAMĚŘENÍ ODEBRANÉHO MATERIÁLU - POSUDKOVÉ OBCE ODVOZ A DL - PČE) V km 11,230 - 11,260 LEVÁ STRANA VE SMĚRU STAVBĚNÍ + DOVOZ BETONOVÉM OBRUBU DO BETONÁŽNÍHO LOŽE

- PROVÁDĚNÍ ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍ HORNINÉ VRSTVY (LIEBHERR 914 + BOURACÍ KLADIVO) V km 11,290 PRAVÁ STRANA VE SMĚRU STAVBĚNÍ + ODVOZ ODSOUHLASENÝCH ČÁSTÍ NA MEZISKLADOVÁNÍ

- PROVÁDĚNÍ ČISTÝ PRO NOVOU HORNINOU VRSTVY OSE KOS (SOUHLASÍ PRACOVNÍHO PROSTORU)

Zápis z jednání:

Zástupce zhotovitele (F. Prager a.s.) žádá o posouzení možnosti na klouzání horninové vrstvy ke svahování *

Podpis zástupce investora (TDI): [redacted] Podpis stavbyvedoucího: [redacted]

ABAG

List č.: 3110721

SO 102

Datum: 11. 5. 2023 Den týdne: ČT

Středisko: 811/Praha Název akce: 11/102 HR. HL. N. PRAHY, STŘEDOMOSTÍ, REKONSTRUKCE, II. ETAPA

Počasí: JASNO, RÁNO 16°C, POL. +16°C, ODPOL. +19°C

Začátek: 9:00 – Pracovní přestávka: 11:00 - 12:00

Jména a příjmení): FRANTIŠEK JEDLIČKA, VÁCLAV ŠEIDEL, JAROSLAV ŠTÍTEK, PATRIK LEHKÝŘ, OLEH RUBAŇKA, MATOUŠ FORKOŠIL, ZDENĚK KOUTENSKÝ, JOSEF HEAD, VITALIJ HOTYCK, MICHAL CHMELÍČEK, MICHAL DIVÍŠ, KAREL FENCL, ANTONÍN MENCL

Stroje: LIEBHERR 914, LIEBHERR 912, 9+ NÁKLADNÍ AUTO, 2x FORD TRANSIT, FINIŠER VÖGELE, 3+ VÁLEC HAMM, MOTOROVÁ BRUSLIČKA

REKULTIVACE VÁPNEM, BETON, ŽÁTKOVÁ DLAŽBA, GEOMŘÍŽE, ACL 16+, SPOJ EMODIF., ACO 16+ PITS, SPOJOVACÍ POSTŘIK @ 0,3 kg/m² A 1,2 kg/m²

Provedené práce: - PROVÁDĚNÍ ODVOZU NEVHODNÉHO VÝKOPOVÉHO MATERIÁLU S NAVEZENÍM NA SKLÁDKU NOVÍ VRCH

- PROVÁDĚNÍ ODSTRANĚNÍ SPRAHU ŽELEZA KONTRAKCE SO 102 A REKULTIVAČNÍHO PLÁTNA DO BETONOVÉHO LOŽE V km 11,830 - 11,830 PRAVÁ STRANA VE SMĚRU STANIČENÍ

- PROVÁDĚNÍ DLAŽDĚNÍ + ODŘEZÁNÍ ŽÁTKOVÉ DLAŽBY V km 11,225 - 11,245 LEVÁ STRANA VE SMĚRU STANIČENÍ (ODŘEZÁNÍ PŘOUŽEK)

- PROVÁDĚNÍ POKLÁDÁNÍ VYROVNÁVACÍ ASFALTOBETONOVÉ VRSTVY ACL 16+ DLE ODS V km 13,700 - 14,100 PRAVÁ STRANA VE SMĚRU STANIČENÍ

- PROVÁDĚNÍ SPOJOVACÍHO POSTŘIKU NA VYROVNÁVACÍ VRSTVĚ 1,2 kg/m²

- PROVÁDĚNÍ ASFALTOVÉ VRSTVY VE SNÍŽENÉ ODOLNOSTI PROTI SMYKU TENKÝM SPOJ E MODIF. + ROZTÍRÁNÍ VRSTVY VÁLCI HAMM ~~PROVÁDĚNÍ~~ V km 13,700 - 14,100 PRAVÁ STRANA VE SMĚRU STANIČENÍ

- PROVÁDĚNÍ SPOJOVACÍHO POSTŘIKU 0,3 kg/m² V km 13,700 - 14,100 PRAVÁ STRANA VE SMĚRU STANIČENÍ

- PROVÁDĚNÍ POKLÁDÁNÍ ASFALTOBETONOVÉ VRSTVY ACL 16+ PITS V km 13,700 - 14,100 PRAVÁ STRANA VE SMĚRU STANIČENÍ + ROZTÍRÁNÍ VRSTVY VÁLCI HAMM

- PROVÁDĚNÍ SPOJOVACÍHO POSTŘIKU EMULZÍ 0,3 kg/m² V km 13,700 - 14,100 PRAVÁ STRANA VE SMĚRU STANIČENÍ + LEPENÍ OBRUBNÍKŮ (SPOJOVACÍ POSTŘIK EMULZÍ 1,2 kg/m²)

- PROVÁDĚNÍ SPOJOVACÍHO POSTŘIKU EMULZÍ 0,3 kg/m² V km 11,830 - 11,300 LEVÁ STRANA VE SMĚRU STANIČENÍ + LEPENÍ OBRUBNÍKŮ (SPOJOVACÍ POSTŘIK EMULZÍ 1,2 kg/m²)

Podpis zástupce investora (TDI): [redacted] Podpis stavby: [redacted]

TRABAG

List č.: 3110727

SO 102

Datum: 17.5. 2023 Den týdne: ST

Stavební středisko: PRAHA Název akce: III/101 MP. HL. M. PRAHA, STŘEMYSLICE, DOBRONICE, II. ETAPA

Počasí: OBLAČNO, RÁNO +8°C, POZ. +10°C, ODPOZ. 14°C

Pracovní doba: 5:00 - 15:00 Pracovní přestávka: 11:30 - 12:00

Pracovníci (jména a příjmení): FRANTIŠEK, JAROSLAV, MILOŠ, JAROSLAV, MICHAL, PETR, IVO, KAREL, ANTONÍN, OLEH, MATOUŠ, VÝTAHY MANITOU, VOJTA, MICHAL

Mechanismy: LIEBHERR 914, LIEBHERR 914, FENDT 310, ROPICÍ VŮZ, SAMOSBĚR (ČERVENÝ VŮZ), 5+ NÁKLADNÍ AUTO, MÍCHAČKA MANITOU

Materiál: RECYKLOVANÝ KAMENIVO, BETON, ŽULOVÉ KOSTKY

Poznámky:

Provedené práce:
- PROVÁDĚNÍ ODSTRANĚNÍ VRCHNÍ ČÁSTI KONSTRUKCE SO 102 A ROZPOJOVÁNÍ NA KAMENIVO DO SPODNÍHO LOŽE V KM 11,830 - 11,830 PRAVÁ STRANA VE SMĚRU STAVBĚNÍ
- DOVOZ NEMRZNOUCÍHO VÝKOPOVÉHO MATERIÁLU A MRAZOVÉ NA SPODNÍ VRSTVU
- ČÁSTEČNÉ ODSTRAŇOVÁNÍ KONSTRUKCE V KM 11,870 - 11,800 OBRUBNÍKŮ (SAMOSBĚR)
- PROVEDENÍ GEODETICKÝCH PRACÍ NA MĚŘENÍ NOVÉHO SMĚROVÉHO OBLOUKU V KM 11,822,6 - 11,858,6 PRAVÁ STRANA VE SMĚRU STAVBĚNÍ
- PROVÁDĚNÍ PODKLADNÍCH VRSTEV ZE ŠTĚRKODRTI V KM 11,840 - 11,880 A 11,060 - 11,120 PRAVÁ STRANA VE SMĚRU STAVBĚNÍ DLE ČSN 5. 5. 2023 + DOVOZ ZBYTKOVÉHO RECYKLÁTU NA MEZIDEPONII
- PROVÁDĚNÍ ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍCH KONSTRUKČNÍCH VRSTEV KONSTRUKCE SO 102 V KM 11,840 - 11,880 PRAVÁ STRANA VE SMĚRU STAVBĚNÍ DLE ČSN + DOVOZ VÝKOPOVÉHO MATERIÁLU NA MEZIDEPONII + HRUBÉNÍ PLOCHY MÍSTNÍ MANITU
- PROVÁDĚNÍ ÚPRAVY SPÁRY MEZI BETONEM A ŽULOVÝM KOSTKY V KM 13,300 - 13,340 PRAVÁ STRANA VE SMĚRU STAVBĚNÍ (PROVÁDĚNÍ ROZPOJOVÁNÍ ŽULOVÝCH KOSTEK + PODBETONOVÁNÍ NA POŽADOVANOU ÚROVEŇ OBRUBNÍ HRANY 40MM + PDB + DOPLNĚNÍ ŽULOVÝCH KOSTEK V STANOVENÝCH ČÁSTECH SPÁROVÁNÍ KAMENIVEM
- PODKLÁDÁNÍ A ROVNÁNÍ STÁVAJÍCÍCH ASFALTOVÝCH PRUHŮ ŠKARP (ODFRÉZOVÁNÍ KONSTRUKCE) + POKLÁDKA NOVÝCH PRUHŮ ŠKARP DO SPODNÍHO LOŽE (CCA 6M)

Podpis zástupce investora (TDI): [redacted] Podpis stavbyvedoucího: [redacted]

TRABAG

List č.: 3110728

SO 102/

Datum: 18.5. 2023 Den týdne: ČT

ové středisko: 811/2[illegible] Název akce: 11/102 AR. NL. M. PRAHA, STŘEDOVICE, PŘERONSKÉ LUCE, II. ETAPA

: VÝLEŽNO, BÉŽNO +8°C, POZ. +13°C, ODPOZ. +7°C

vní doba: 5:00 - 15:00 Pracovní přestávka: 11:00 - 11:30

vníci (jména a příjmení): FRANTIŠEK JEDLIČKA, MIROSLAV BERTEN, JAROSLAV ŠTÍTEČ, MICHAL DIVIŠ, RADEK FENCL, ANTONÍN MENCL, OLEH RUCHLA, MARIUS POSPÍŠIL, VITALIJ HRYSCIK, JOSEF KLAN, MICHAL CHENDĚJ, ZDENĚK KOUTENSKÝ

ízmy: LIEBHERR 912, LIEBHERR 914, 2x FORD FRONTÍ, KOLEČ HAMM, VIBRAČNÍ DESKA, 3+NÁKLADNÍ AUTO, MOTOROVÁ ŘEZAČKA, VIBRAČNÍ DESKA

ál: NEHLUBOŠNÍ KAMEN, BETON, ŽELEZOVÉ KOSTRY, ŠD FR. 0/32 mm P

ušky: 24 BAŤŮVSKÝCH STAVEBNÍCH ZÁKOPŮ - PLOŠ

vedené práce:
- PROVÁDĚNÍ ODVOZU SYPKÉ HMOTY TĚLESA KOMUNIKACE SO 102/ A OBSYPÁVACÍHO KAMENE DO BETONOVÉHO LOŽE V km 11,830 - 11,830 PRAVÁ STRANA VE SMĚRU STANIČENÍ
- PROVÁDĚNÍ ČERPÁNÍ STAVEBNÍCH JÁM DO DATE V km 11,22225 - 11,25236 PRAVÁ STRANA VE SMĚRU STANIČENÍ (AUTOJEŘÁBOVÁ SOUPRAVA - STŘEDOVÁ JÁMA)
- PROVÁDĚNÍ BOURÁNÍ BETONOVÝCH ZÁKLADŮ DO DATE (LIEBHERR 914 + HYDRAULICKÉ KLADIVO) + ODVOZ BETONOVÉHO SUTI NA MEZIDEPONII (AUTOJEŘÁBOVÁ SOUPRAVA - STŘEDOVÁ JÁMA V km 11,22225 - 11,25246 PRAVÁ STRANA VE SMĚRU STANIČENÍ)
- PODKLÁDÁNÍ TĚLESA ZEMNÍ SYPÍ + ODVOZ NA MEZIDEPONII + PROKLÁDÁNÍ PODEPSU Z ŠD FR. 0/32 mm P + HUTNĚNÍ VIBR. DESKOU / + PROVÁDĚNÍ PODKLADNÍHO BETONU (STŘEDOVÁ JÁMA V km 11,22225 - 11,25246 PRAVÁ STRANA VE SMĚRU STANIČENÍ)
- PROVÁDĚNÍ OBTÉKÁNÍ STÁVAJÍCÍCH KONSTRUKČNÍCH PRVKŮ KOMUNIKACE SO 102/ V km 11,060 - 11,120 PRAVÁ STRANA VE SMĚRU STANIČENÍ DLE [illegible] DOPISU Z 3.5. 2023 + ODVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU NA MEZIDEPONII + KOTVENÍ PLOCHÝCH MOSTNÍCH
- PROVÁDĚNÍ ČÁSTEČNÉ DEMOLICE ŽELEZOVÉ KOSTRY V km 15,300 - 15,340 PRAVÁ STRANA VE SMĚRU STANIČENÍ (PROVÁDĚNÍ DEMONTÁŽE ŽELEZOVÉ KOSTRY + PODBETONOVÁNÍ NA PODKLADNÍ VRSTVU OBRUBNÍ MOSTNÍ RÍMS + PÍSY + DOPLNĚNÍ ŽELEZOVÉ KOSTRY V OHROŽENÝCH ČÁSTECH ODSTRANĚNÉ BETONOVÉ
- PROVÁDĚNÍ STAVEBNÍCH ZÁKOPŮ (PLOŠ) V km 10,940 - 10,980 a 11,060 - 11,120 PRAVÁ STRANA VE SMĚRU STANIČENÍ

Podpis zástupce investora (T[illegible] Podpis stavbyve[illegible]

ABAG

List č.: 3110730

SO 102

Datum: 19.5.2023 Den týdne: Pá

Středisko: 84/Blansko Název akce: 11/102 Rb. Rz. 17. Praha, Štěnovice, Obchvat Plzně, II. etapa

Počasí: zataženo, déšť + 9°C, 6 m/s, +12°C, odpol. +13°C

Doba: 7:00 - 16:30 Pracovní přestávka: 11:30 - 12:00

Jména a příjmení: Václav Šetřen, František Jedlička, Jaroslav Šíšek, Oleh Kucmira, Matouš Pasečník, Zdeněk Kovtenský, Vitalii Hatiuk, Michal Chenadet, Vasil Vlad, Michal Divíš, Robert Fenyl, Antonín Mencl

Stroje: Liebherr 9K, Bobcat, Liebherr 914, Kramer čelní nakladač, 3t Hydrauldumper auto, Clifford Transit, Kolesa Matiz, Vibrační deska

Na Rb. 017.mm.A, betonové patky dílec (středový žlab)

~~Se Správcem Dodavatele~~

Vykonané práce: - Provádění kontrolních měření u Rb. 017.mm.A v km 10,840 - 10,880 a 11,060 - 11,120 pravá strana ke směru Stěnovice + Měření Rb. 017.mm.A kolejí Matiz + Liber. Pracovní den

- Provádění podkladní štěrkového žlabu v km 11,220/285 - 11,315/316 pravá strana ke směru Stěnovice + Nivelační zaměření podkladního štěrku + Provádění kamerové výstroje

Zápis Správce: Zástupce Správce

Z Strabag a.s. Martin / Liška Zápis Zástupce Správce

Investora p. Miroslava kolaudu o povolení provádění kontrolních měření u SO 516 v km 10,840 - 10,880, a 11,060 - 11,120 pravá strana ke směru Stěnovice

ZÁPIS PODLE: PO VIZUÁLNÍ KONTROLE A NA ZÁKLADĚ VYHOVUJÍCÍCH KONTROL. ZKOUŠEK PODLEHLÝ PODKLADU SO 516 V UVEDENÝCH ÚSECÍCH.

[redacted]

Podpis zástupce investora [redacted] Podpis stavbyved [redacted]

BAG

List č.: 3110734

SO 102

Datum: 23.5.2023 Den týdne: Út

disko: SÚ Rudná Název akce: II/102 HO.-NL. II. ETAPA, ŠTĚRKOVIŠTĚ, REKONSTRUKCE, II. ETAPA

ASFALTOVÁNÍ, 620 t 140°C, POZ. 130°C, ODPOZ. 125°C

7:00 - 13:30 Pracovní přestávka: 11:00 - 11:30

éna a příjmení): FRANTIŠEK SEDLIČKA, MICHAL DIVIŠ, RADEK FENCL, ANTONÍN HENCL, JAROSLAV ŠIMEK, ZDENĚK KNITTEL, VÁCLAV HOTTEK, MICHAL CHMELÍK, MILOŠ POSPÍŠIL, OLEH BUCHILA

DUMPERY 9X, ZÁMEČNICKÉ AUTO, ASFALTKA (PRACOVNÍ SADA), VIBRAČNÍ DESKA NA ZÁMEČNICKÉ, VIBRAČNÍ DESKA,

REKULTIVACE, KÁMEN, BETON, SO 516, BETONOVÉ PATKY, ŽULOVÉ KOSTKY

e práce:
- PROVÁDĚNÍ ODLEHČENÍ SPODNÍ STAVBY KOMUNIKACE SO 102 V KM 11,830 - 11,830 PRAVÁ STRANA VE SMĚRU STANIČENÍ A REKULTIVAČNÍHO ZÁSYPU DO BETONOVÉHO LOŽE
- PROVÁDĚNÍ KONSTRUKČNÍCH VRSTEV U SO 516 PODÉL STÁVAJÍCÍHO SILNICE V KM 11,22207 - 11,21516 PRAVÁ STRANA VE SMĚRU STANIČENÍ + KÁMENNÝ SO 516 VIBRACÍ DESKOU
- PROVÁDĚNÍ ODSTRANĚNÍ NEKVALITNÍCH ČÁSTÍ ZPEVNĚNÉHO ASFALTOVÉHO SOUVRSTVÍ + ODVOZ ODSTRAŇOVANÉHO MATERIÁLU NA MEZIDEPONII (KM 11,305 - 10,840 PRAVÁ STRANA VE SMĚRU STANIČENÍ)
- PROVÁDĚNÍ PODKLADNÍCH BETONOVÝCH ZÁKLADŮ DO BETONOVÉHO LOŽE PODÉL HORNÍ HRANY V KM 13,890 PRAVÁ STRANA VE SMĚRU STANIČENÍ
- PROVÁDĚNÍ ODLEHČENÍ PODLOŽÍ ZÁSYP HORNÍ HRANY V KM 13,890 (ŽULOVÉ KOSTKY DO BETONOVÉHO LOŽE
- PROVÁDĚNÍ STAVEBNÍCH PRACÍ (NÁSADA TĚŽKÁ PRAVÁ POZDOLNÍ KONSTRUKCE VOZOVKY V KM 13,940 - 13,110 + VÝMĚNA A DOPLNĚNÍ BETONOVÝCH VOUSEK
- PROVÁDĚNÍ ODTĚŽENÍ ZELENINY V KM 13,764 - 13,885 (DL 114m) KM 13,883 - 13,8803 (DL. 57m) + ODVOZ NA MEZIDEPONII + PROVÁDĚNÍ STĚRKOVÉHO PODSYPU PŘED BETONOVÝ ZÁKLADY S FR. 0/32mm A+ KOTVENÍ VIBRACÍ DESKOU

is zástupce investora (TDI): [redacted] Podpis stavbyvedoucího: [redacted]

AG

List č.: 3110748

SO 203 102

Datum: 7.6. 2023 Den týdne: ST

ko: SVÍTKOVÉ Název akce: III/102 HR. KL. ČR. HRANICE, REKONSTRUKCE, II. ETAPA

ENO, RÁNO +16°C, POL. +19°C, ODPOL. +21°C

7:00-12:00 Pracovní přestávka: 11:30-12:00

a příjmení): FRANTIŠEK UHLÍŘOVÁ, VOJTĚCH ZUBTSEV, JAROSLAV ŠVEC, PETR LEHEČKA, ALEŠ RUCHKA, MIROSLAV POSPÍCHAL, MICHAL DVOŘÁK, KAMIL TENCL

LIBEREC 912, LIBEREC 914, TATRA TERNIT, 2x NÁKLADNÍ AUTO, VOLNÝCH ČELNÍ NAKLADAČ

ce: - PROVIZORNÍ ÚPRAVY KOMUNIKACE (STAVENIŠTĚ) V km 11,580 - 11,580 LEVÁ STRANA SE SVÍTKEM SPOJOVACÍM (VOLNÝCH PODÁVÁ VLNOU)
- PROVIZORNÍ ÚPRAVY PRO POKLÁDKU ŽÁROVÉ (ASFALTOVÝ BETON)
V km 11,000 - 11,280 LEVÁ STRANA SE SVÍTKEM SPOJOVACÍM
- PROVIZORNÍ ÚPRAVY STAVENIŠTĚ V km 10,000 - 11,580

upce investora (T

Zhotovitel :

M-konstrukce s.r.o.
Oříkov 43
264 01 Sedlčany
IČ : 24314234
DIČ: CZ24314234

www.m-konstrukce.cz

Objednatel :

Karel Šimek
DiS. Martin Lísa
Strabag a.s.

Značka: N-P-234/Strabag/II/2023 *Datum: 22.05.2023*

*Nabídka na akci**: „ zastávka u Kiliána v Davli“***
Na základě Vaší poptávky a předané výkresové dokumentace Vám předkládáme cenovou nabídku na výše uvedenou zakázku.

Dvoumadlové trubkové zábradlí 25,8 m		*x*	*3 790,00 Kč/m*	*=*	*97 782,00 Kč*
VTD	*1 SO*	*x*	*7 000,00 Kč*	*=*	*7 000,00 Kč*
Doprava	*1 nájezd*	*x*	*20 000,00 Kč*	*=*	*20 000,00 Kč*
Nabídková cena celkem bez DPH					*124 782,00 Kč*

*Nabídková cena zahrnuje výrobu, protikorozní ochranu PKO (zinek + nátěr I.cenové kategorie – celkem 280 um) dle TKP 19, dopravu a montáž **dvoumadlového trubkového zábradlí** dle předané dokumentace včetně spojovacího materiálu, kotvení, podmazání patních desek, dílenské přejímky, technologické postupy, závěrečnou zprávu v 1 vyhotovení.*

Cena neobsahuje zemní práce, výkopy, PVC trubky v gabionech, dodávku betonu, zpevněné plochy pro jeřáb, přístupové lávky/lešení, příjezdové komunikace přímo na most/opěrné zeď, zaměření na stavbě, geodetické zaměření, vytyčení inženýrských sítí. Pokud nebudeme umožněn dostatečný přístup na konstrukcí, požadujeme součinnost stavby včetně případného poskytnutí pomocných konstrukcí, mechanizací bezúplatně. V případě více nájezdů na stavbu bude účtován příplatek 20 000 Kč/nájezd/SO.

Splatnost faktur bude 30 dní a neobsahuje pozastávky. Fakturace bude rozdělena po částech : 60 % po výrobě a přejímce v černém stavu, 30 % po přejímce PKO a zbývajících 10 % po montáži – vždy po dohodě s objednatelem. Záruční doba je 60 měsíců od předání díla objednateli

Před zahájením prací musí být uzavřena SOD nebo objednávka. Platnost cenové nabídky je 14 dnů od data podání nabídky a to z důvodů neustálého zvyšování vstupního materiálu z hutí.

Žádáme Vás o stanovisko k námi nabízené ceně. Případnou objednávku nebo dotazy zašlete na email:

S pozdravem

Petr Moudrý

PORR a.s.
Úsek Dopravních a inženýrských staveb PORR a.s., Oblast Čechy

PORR a.s. – Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10

p. Karel Šimek
STRABAG a.s.
E-mail:

Vaše značka:
Váš dopis ze dne: 21.05.2023
Naše značka: NPS/055/2023
Náš dopis ze dne:
Jméno: Pavel Růzha
Telefon:
Mobil:
Fax:
E-Mail:

Místo, datum: Praha, 22.05.2023

Nabídka na stavbu „Zastávka u Kiliána v Davli"

Vážený pane,

děkujeme za Vaši poptávku na výše uvedený projekt a dovolujeme si Vám nabídnout provedení stavebních prací za cenu

Celkem bez DPH **146 255,00 Kč**
Viz přiložený rozpočet

Tato cena je předběžná cena ve výši součtu cen všech položek seznamu výkonů, přičemž fakturace bude prováděna na základě skutečně provedených výkonů za jednotkovou cenu dle seznamu výkonů.

1. Podklady k nabídce

Výše uvedená cena byla kalkulována na základě následujících podkladů:

a) Cenová poptávka viz. Váš e-mail ze dne 21.05.2023

2. Nabízené výkony

Námi nabízená cena zahrnuje výrobu, PKO (žárový zinek + nátěry, RAL I. kategorie, celkem 285um), dopravu na 1 nájezd (kompletní připravenost staveniště), montáž trubkového zábradlí, dle předané dokumentace včetně přídavného a spojovacího materiálu výrobní dokumentaci ve 2 vyhotovení, dílenské přejímky, závěrečné zprávy ve 2 vyhotovení, spolupráci při tvorbě RDS pro výstavbu **„Zastávka u Kiliána v Davli"** které jsou popsány v podkladech jmenovaných pod bodem č. 1, při zohlednění následujících podmínek:

PORR a.s.
Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10 | Tel. +420 267 226 111 | Fax +420 267 226 801
porras@porr.cz | www.porr.cz
Sídlo: Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10, OR u MS v Praze, Oddíl B, Vložka 1006, IČO 43005560, DIČ CZ43005560
Raiffeisenbanka.s. | IBAN: CZ9755000001091107720 | BIC: RZBCCZPP

PORR a.s./ 03.11.2023

2.1. **Vyjádření úřadů:** Nařízení a podmínky úřadů, související zejména se stavebním povolením, jsou v této nabídce zohledněny jen tehdy, pokud jsou uvedeny v podkladech, vyjmenovaných v bodě č.1 tohoto dopisu, či jsou uvedeny jednotlivě, nebo vyplývají z právních předpisů, platných k datu odevzdání nabídky.

2.2. **Projektové práce:** Naše nabídka obsahuje provedení následujících projektových prací:

- výrobně technická dokumentace včetně technologických postupů
- dílenské výkresy

2.3. **Příjezd, geodetické vytyčení, DIO:** V nabídce není obsaženo zajištění příjezdové komunikace, dopravně inženýrské opatření, uzavírky, geodetické vytyčení, vytyčení podzemních inženýrských sítí, pro námi nabízené práce.

2.4. **Fakturace** bude probíhat **dle dohody** po částech a to: 50% po přejímce v černém stavu, 25% po přejímce v laku, 25% po kompletní montáži

2.5. **Cena neobsahuje**: RAL II a III kategorie (navýšení ceny 80-120 Kč/m2), náklady na ukončení svodidel – náběhy/koncovky, napojení na betonová svodidla, oblouky (pokud nejsou patrné z výkresové dokumentace), dále pak se bude fakturovat skutečný počet nájezdů nad rámec kalkulace (13500 Kč/nájezd).

3. Termíny

Jednotlivé doby výstavby budou upřesněny po předložení hmg celé stavby. Zahájení prací je možné od předložení následujících podmínek a po výzvě objednatele k zahájení stavby:

- uzavření smlouvy o dílo a její nabytí platnosti;
- předložení platného a pravomocného stavebního povolení včetně všech jeho příloh;
- předání staveniště
- předání platné projektové dokumentace

4. Obchodně – právní podmínky smlouvy:

Jelikož není k dispozici návrh smlouvy o dílo, vychází naše nabídka ze smluvních standardů smluv FIDIC, ČSN a našich návrhů, které jsou obsahem tohoto dopisu.

Naše nabídka je kalkulována na základě níže uvedených podmínek:

4.1. **Platební podmínky:** Naše nabídková cena byla kalkulována na základě následujících platebních podmínek: Platba smluvní ceny v měsíčních splátkách, splatných do 30 dnů. Výše měsíčních splátek se bude stanovovat v návaznosti na hodnotu skutečně provedených prací. Cena je stanovena **bez pozastávek**.

4.2. **Ostatní daně:** Naše nabídka obsahuje daně a poplatky, které souvisejí s provedením našich prací pouze do té míry, do jaké se zakládají na daňové sazbě a sazbě poplatků platných dva týdny před datem odevzdání nabídky. Dojde-li ke zvýšení těchto sazeb, přeúčtujeme Vám takto vzniklé vícenáklady oproti dokladu o zvýšení těchto sazeb.

4.3. **Doba poskytnutí záruky:** Na veškeré práce kromě níže uvedených poskytujeme záruku na dobu 60 měsíců.

4.4. **Řešení sporů:** Všechny spory vznikající z této nabídky nebo z uzavírané smlouvy a v souvislosti s ní budou rozhodovány s konečnou platností u příslušného soudu ČR.

Tato nabídka je pro nás závazná do 21.05.2023

S pozdravem

.....

Pavel Růzha

AEROLUX s.r.o., Noviny pod Ralskem 142, 471 24 Mimoň, Česká Republika

Strabag a.s.

DiS. Martin Lísa

Váš dopis značky/Ze dne	Naše značka	Vyřizuje/Telefon	Místo/Datum
	096/01/2023	Ivan Bernát +420 602 658 008	Noviny pod Ralskem 21.5.2023

VĚC: Zábradlí zastávka u Killiána Davle

Dobrý den,

na základě Vaší poptávky Vám předkládám cenovou nabídku na dodávku a montáž zábradlí výše uvedenou zakázku.

Položka	MJ	množství	JC	Celkem
Zábradlí dvoumadlové v=1,1m	m	25,8	5 130,00 Kč	132 354,00 Kč
Cena v případě splatnosti 35 dní				**132 354,00 Kč**
Cena v případě splatnosti 60 dní				138 971,70 Kč

PKO zábradlí systém IIIA.
Cena obsahuje dílenskou dokumentaci, výrobu a montáž.
Cena neobsahuje dlouhodobou pozastávku.
Platnost nabídky 30 dní.
Odpovědnost za vady 60 měsíců.

S přátelským pozdravem
Ivan Bernát
jednatel společnosti

	Vypracoval:		Kontroloval:		Schválil	
	Jméno:	Miroslav MOUDRÝ	Jméno:		Jméno:	
	Datum:	23.5.2023	Datum:		Datum:	
	Podpis:		Podpis:		Podpis:	
M-KONSTRUKCE s.r.o. Oříkov 43 264 01 Sedlčany	Akce: II/102 DAVLE - ŠTĚCHOVICE SO 102 TRUBKOVÉ ZÁBRADLÍ				Stupeň dokumentace: VTD	

SESTAVA ZÁBRADLÍ

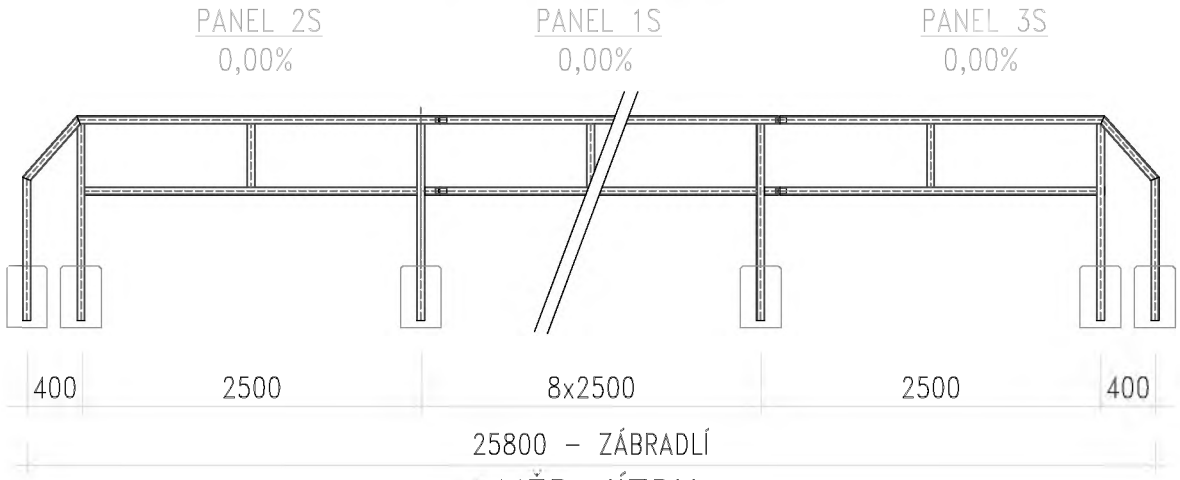

REKAPITULACE DÍLCŮ ZÁBRADLÍ

PANEL	POČET KUSŮ	HMOTNOST 1 ks	HMOTNOST CELKEM	PLOCHA 1 ks	PLOCHA CELKEM
	[ks]	[kg]	[kg]	[m2]	[m2]
1S	8	28,61	228,88	1,13	9,04
2S	1	42,50	42,50	1,95	1,95
3S	1	34,06	34,06	1,56	1,56

CELKEM 305,44 kg 12,55 m2
SVARY +3% 314,60 kg

POZNÁMKY:

TYP VÝROBKU: TRUBKOVÉ ZÁBRADLÍ
MATERIÁL – S235 JR
PŘÍDAVNÝ MATERIÁL – ESAB ARISTOROD 12,50 0,8mm
VÝROBA DLE 1090-1 – EXC2
PŘÍPRAVA PRO PKO DLE ČSN EN ISO 8501-3 STUPEŇ P3
PROTIKOROZNÍ OCHRANA: DLE TEPŘ PKO

	Vypracoval:		Kontrolovala:		Schválil	
	Jméno:	Miroslav MOUDRÝ	Jméno:		Jméno:	
	Datum:	23.5.2023	Datum:		Datum:	
	Podpis:		Podpis:		Podpis:	
M-KONSTRUKCE s.r.o. Oříkov 43 264 01 Sedlčany	Akce:	II/102 DAVLE – ŠTĚCHOVICE		Objekt: SO 102		
	Název: SESTAVA ZÁBRADLÍ			Číslo výkresu: Z-01		

POHLED A

SMĚR JÍZDY

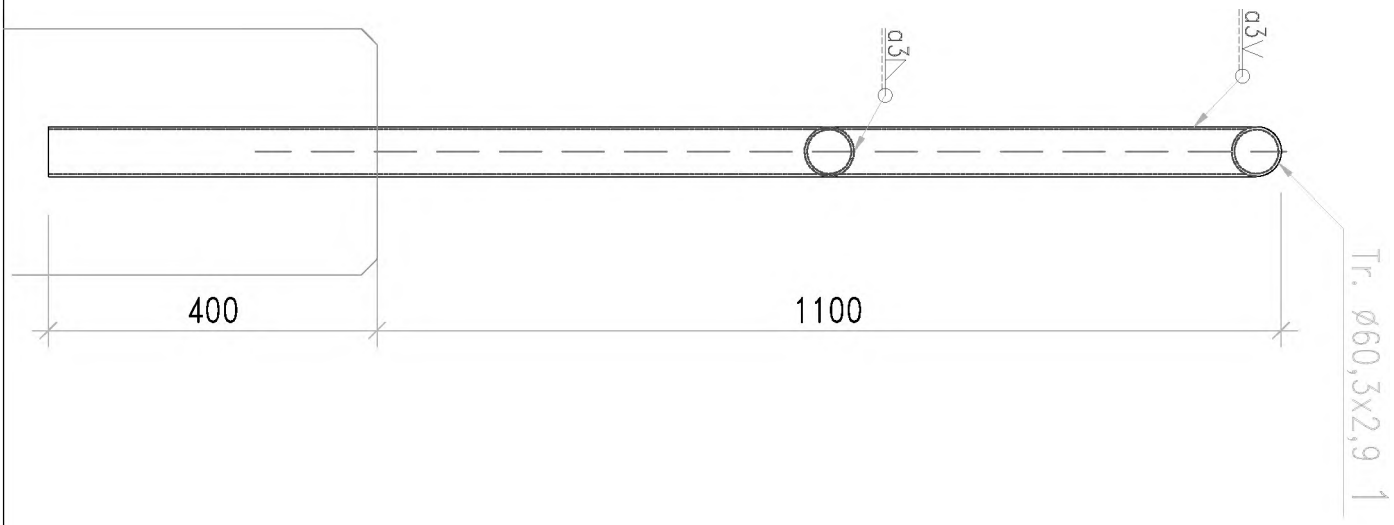

ZÁKLADNÍ ÚDAJE OK:

DOKUMENT KONTROLY	IC 3.1.
PŘÍDAVNÝ MATERIÁL	G3Si1
METODA SVAŘOVÁNÍ	135
TŘÍDA JAKOSTI PROVEDENÍ SVARU ČSN EN ISO 5817	C
TOLERANCE SVAŘOVANÉ KONSTRUKCE ČSN EN ISO 13920	C,C,G

	Vypracoval:		Kontrolovala:		Schválil	
	Jméno:	Miroslav MOUDRÝ	Jméno:		Jméno:	
	Datum:	23.5.2023	Datum:		Datum:	
	Podpis:		Podpis:		Podpis:	
M-KONSTRUKCE s.r.o.	Akce:	II/102 DAVLE – ŠTĚCHOVICE		Objekt:	SO 102	
Oříkov 43 264 01 Sedlčany	Název:	POHLED A		Číslo výkresu:	Z-02	

PANEL 1S

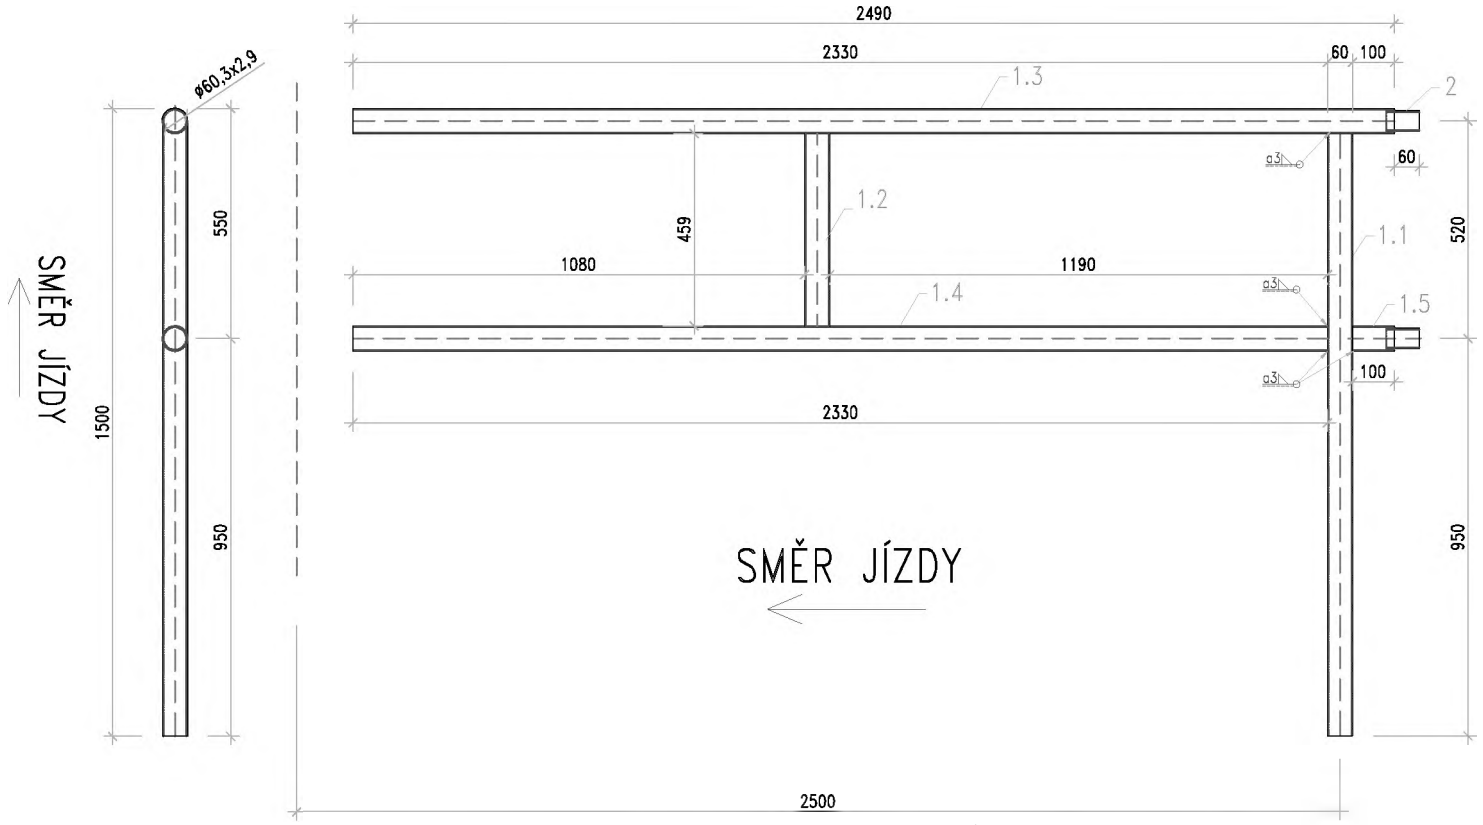

ZÁKLADNÍ ÚDAJE OK:

DOKUMENT KONTROLY	IC 3.1.
PŘÍDAVNÝ MATERIÁL	G3Si1
METODA SVAŘOVÁNÍ	135
TŘÍDA JAKOSTI PROVEDENÍ SVARU ČSN EN ISO 5817	C
TOLERANCE SVAŘOVANÉ KONSTRUKCE ČSN EN ISO 13920	C,C,G

TABULKA PODÉLNÝCH SKLONŮ

PODÉLNÝ SKLON			POČET KUSŮ
OZNAČENÍ		±#D(mm)	
1S		0	8

PANEL 1S

KUSŮ: 8

ČÍSLO POLOŽKY	POČET KS	PRŮŘEZ	ŠÍŘKA [mm]	DÉLKA [mm]	HM. KUS [ks/kg]	HMOTNOST CELKEM [kg]	PLOCHA KUS [ks/m2]	PLOCHA CELKEM [m2]
1.1	1	Tr. ø60x2,9		1440				
1.2	1	Tr. ø60x2,9		459				
1.3	1	Tr. ø60x2,9		2490				
1.4	1	Tr. ø60x2,9		2330				
1.5	1	Tr. ø60x2,9		100				
2	2	Tr. ø49x3		80				

CELKEM 1 dílec: 28,61 kg 1,13 m2
CELKEM: 228,88 kg 9,04 m2

POZNÁMKY:

TYP VÝROBKU: TRUBKOVÉ ZÁBRADLÍ
MATERIÁL – S235 JR
VÝROBA DLE 1090-1 – EXC2
PŘÍPRAVA PRO PKO DLE ČSN EN ISO 8501-3 STUPEŇ P3
PROTIKOROZNÍ OCHRANA: DLE TEPŘ PKO
PŘÍDAVNÝ MATERIÁL – ESAB ARISTOROD 12,50 0,8mm



	Vypracoval:		Kontrolovala:		Schválil	
	Jméno:	Miroslav MOUDRÝ	Jméno:		Jméno:	
	Datum:	23.5.2023	Datum:		Datum:	
	Podpis:		Podpis:		Podpis:	
M-KONSTRUKCE s.r.o. Oříkov 43 264 01 Sedlčany	Akce:	II/102 DAVLE – ŠTĚCHOVICE	Objekt:	SO 102		
	Název:	PANEL 1S	Číslo výkresu:	Z-03		

PANEL 2S

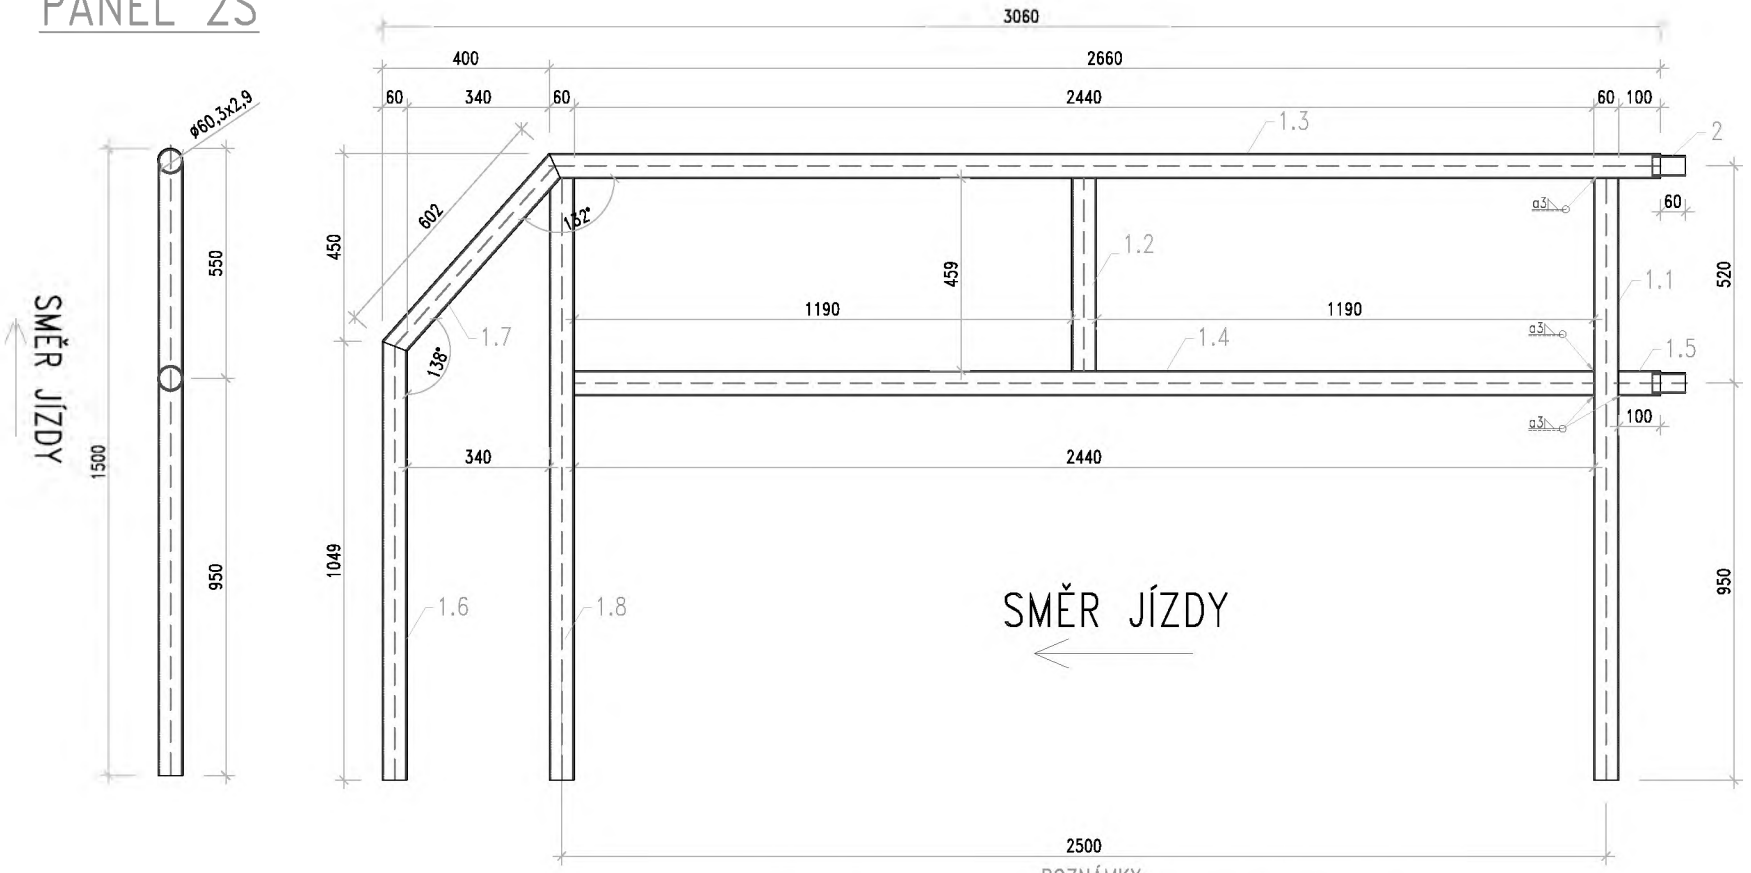

ZÁKLADNÍ ÚDAJE OK:

DOKUMENT KONTROLY	IC 3.1.
PŘÍDAVNÝ MATERIÁL	G3Si1
METODA SVAŘOVÁNÍ	135
TŘÍDA JAKOSTI PROVEDENÍ SVARU ČSN EN ISO 5817	C
TOLERANCE SVAŘOVANÉ KONSTRUKCE ČSN EN ISO 13920	C,C,G

TABULKA PODÉLNÝCH SKLONŮ

PODÉLNÝ SKLON			POČET KUSŮ
OZNAČENÍ		±#D(mm)	
2S		0	1

PANEL 2S

KUSŮ: 1

ČÍSLO POLOŽKY	POČET KS	PRŮŘEZ	ŠÍŘKA [mm]	DÉLKA [mm]	HM. KUS [ks/kg]	HMOTNOST CELKEM [kg]	PLOCHA KUS [ks/m2]	PLOCHA CELKEM [m2]
1.1	1	Tr. ø60x2,9		1440				
1.2	1	Tr. ø60x2,9		459				
1.3	1	Tr. ø60x2,9		2660				
1.4	1	Tr. ø60x2,9		2440				
1.5	1	Tr. ø60x2,9		100				
1.6	1	Tr. ø60x2,9		1049				
1.7	1	Tr. ø60x2,9		602				
1.8	1	Tr. ø60x2,9		1440				
2	2	Tr. ø49x3		80				

CELKEM 1 dílec: 42,50 kg 1,95 m2
CELKEM: 42,50 kg 1,95 m2

POZNÁMKY:

TYP VÝROBKU: TRUBKOVÉ ZÁBRADLÍ
MATERIÁL – S235 JR
VÝROBA DLE 1090-1 – EXC2
PŘÍPRAVA PRO PKO DLE ČSN EN ISO 8501-3 STUPEŇ P3
PROTIKOROZNÍ OCHRANA: DLE TEPŘ PKO
PŘÍDAVNÝ MATERIÁL – ESAB ARISTOROD 12,50 0,8mm



	Vypracoval:		Kontrolovala:		Schválil	
	Jméno:	Miroslav MOUDRÝ	Jméno:		Jméno:	
	Datum:	23.5.2023	Datum:		Datum:	
	Podpis:		Podpis:		Podpis:	
M-KONSTRUKCE s.r.o. Oříkov 43 264 01 Sedlčany	Akce:	II/102 DAVLE – ŠTĚCHOVICE	Objekt:	SO 102		
	Název:	PANEL 2S	Číslo výkresu:	Z-04		

PANEL 3S

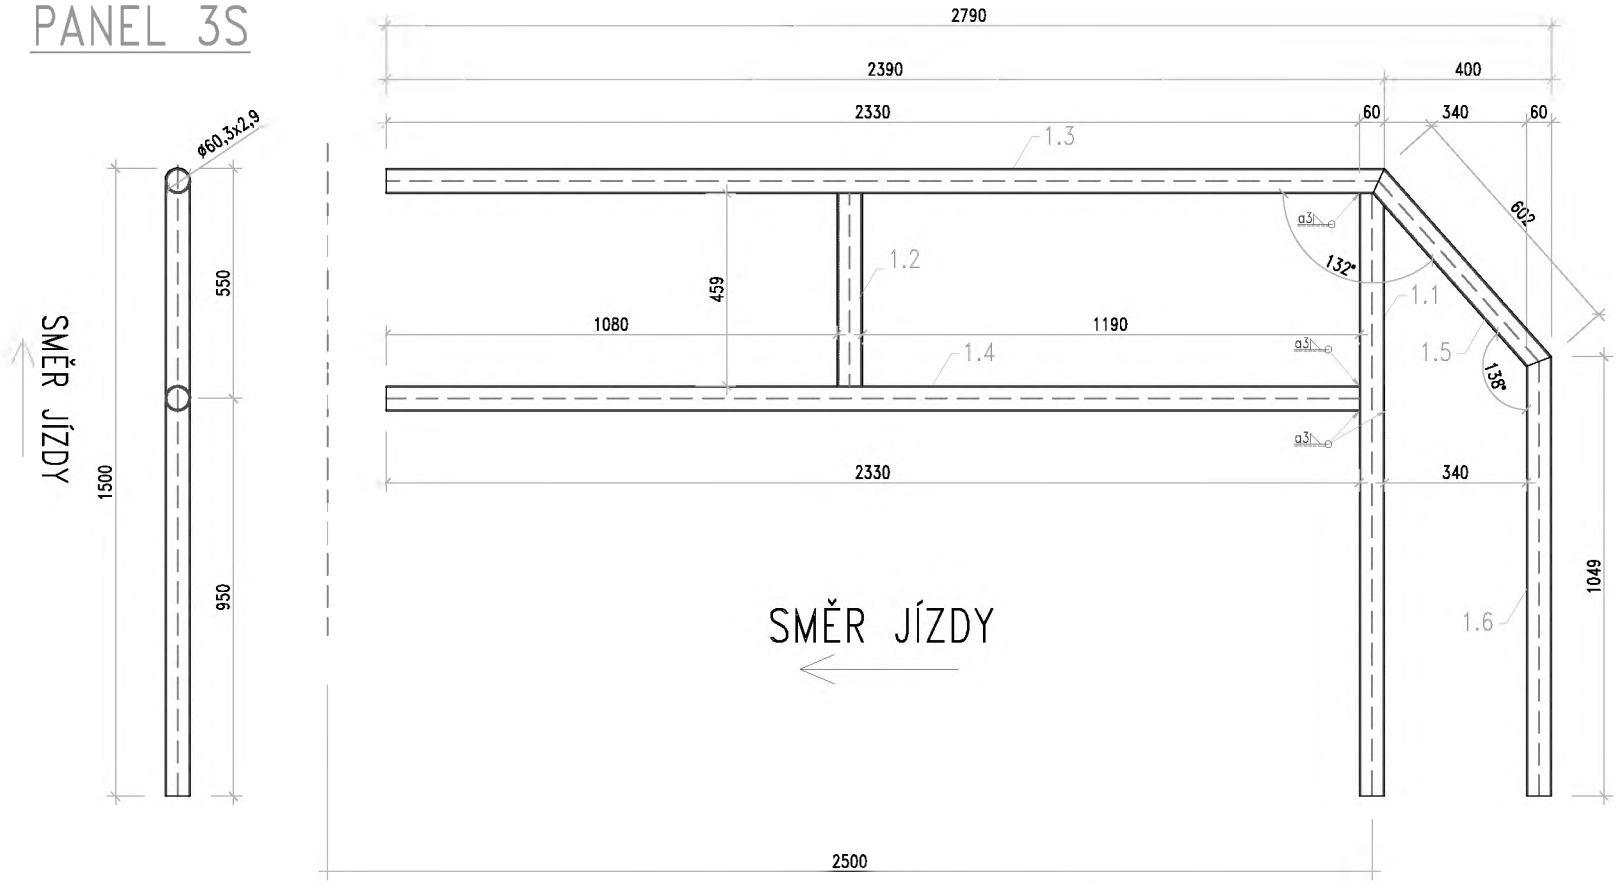

ZÁKLADNÍ ÚDAJE OK:

DOKUMENT KONTROLY	IC 3.1.
PŘÍDAVNÝ MATERIÁL	G3Si1
METODA SVAŘOVÁNÍ	135
TŘÍDA JAKOSTI PROVEDENÍ SVARU ČSN EN ISO 5817	C
TOLERANCE SVAŘOVANÉ KONSTRUKCE ČSN EN ISO 13920	C,C,G

TABULKA PODÉLNÝCH SKLONŮ

PODÉLNÝ SKLON			POČET KUSŮ
OZNAČENÍ		±#D(mm)	
3S		0	1



PANEL 3S KUSŮ: 1

ČÍSLO POLOŽKY	POČET KS	PRŮŘEZ	ŠÍŘKA [mm]	DÉLKA [mm]	HM. KUS [ks/kg]	HMOTNOST CELKEM [kg]	PLOCHA KUS [ks/m2]	PLOCHA CELKEM [m2]
1.1	1	Tr. ø60x2,9		1440				
1.2	1	Tr. ø60x2,9		459				
1.3	1	Tr. ø60x2,9		2390				
1.4	1	Tr. ø60x2,9		2330				
1.5	1	Tr. ø60x2,9		602				
1.6	1	Tr. ø60x2,9		1049				

CELKEM 1 dílec: 34,06 kg 1,56 m2
CELKEM: 34,06 kg 1,56 m2

POZNÁMKY:

TYP VÝROBKU: TRUBKOVÉ ZÁBRADLÍ
MATERIÁL – S235 JR
VÝROBA DLE 1090-1 – EXC2
PŘÍPRAVA PRO PKO DLE ČSN EN ISO 8501-3 STUPEŇ P3
PROTIKOROZNÍ OCHRANA: DLE TEPŘ PKO
PŘÍDAVNÝ MATERIÁL – ESAB ARISTOROD 12,50 0,8mm

	Vypracoval:		Kontrolovala:		Schválil	
	Jméno:	Miroslav MOUDRÝ	Jméno:		Jméno:	
	Datum:	23.5.2023	Datum:		Datum:	
	Podpis:		Podpis:		Podpis:	
M-KONSTRUKCE s.r.o. Oříkov 43 264 01 Sedlčany	Akce:	II/102 DAVLE – ŠTĚCHOVICE	Objekt:	SO 102		
	Název:	PANEL 3S	Číslo výkresu:	Z-05		

B 7634/RD683/MSPH
Fj 479008/2022/MSPH

USNESENÍ

Městský soud v Praze rozhodl vyšší soudní úřednicí Marií Šiškovou v právní věci

navrhovatele: **STRABAG a.s.**, IČO 608 38 744
sídlem Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5

o návrhu na zápis změny do obchodního rejstříku

takto:

V obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze v oddílu B, vložce číslo 7634

se vymazává

Statutární orgán
člen představenstva
Ing. JARMILA POVAŽANOVÁ, dat. nar. 19. října 1962, r.č. 626019/6514
82101 Bratislava, Drieňova 16175/1B, Slovenská republika
Den vzniku členství: 3. června 2019

Prokura
Ing. RENATA HAMRSKÁ, dat. nar. 19. března 1961, r.č. 615319/0153
Hvozdíková 837, Liberec XXV-Vesec, 463 12 Liberec

Ing. TOMÁŠ HOZA, dat. nar. 8. května 1969, r.č. 690508/4406
Purkyňova 749/10, 767 01 Kroměříž

Ing. JIŘÍ JAROŠ, dat. nar. 31. ledna 1962, r.č. 620131/0643
Plachého 272/25, České Budějovice 1, 370 01 České Budějovice

se zapisuje

Statutární orgán
U vymazávané osoby: Ing. JARMILA POVAŽANOVÁ, dat. nar.19. října 1962, r.č.626019/6514
Den zániku členství: 7. prosince 2022

člen představenstva
Ing. TOMÁŠ HOZA, dat. nar. 8. května 1969, r.č. 690508/4406
Purkyňova 749/10, 767 01 Kroměříž
Den vzniku členství: 8. prosince 2022

Prokura
Ing. KAREL KLOFÁČ, dat. nar. 18. června 1973, r.č. 730618/2972
U Rybníčku 4041, 580 01 Havlíčkův Brod

Shodu s prvopisem potvrzuje Ilona Žďárská

Den zápisu změny: Dnem nabytí právní moci

Poučení:

Proti tomuto usnesení lze podat odvolání do patnácti dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím nadepsaného soudu.

Praha 19. prosince 2022

Marie Šišková v. r.
vyšší soudní úřednice

Shodu s prvopisem potvrzuje Ilona Žďárská

Výpis

z obchodního rejstříku, vedeného
Městským soudem v Praze
oddíl B, vložka 7634

Datum vzniku a zápisu:
1. března 1994

Spisová značka:
B 7634 vedená u Městského soudu v Praze

Obchodní firma:
STRABAG a.s.

Sídlo:
Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5

Identifikační číslo:
608 38 744

Právní forma:
Akciová společnost

Předmět podnikání:
Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

projektová činnost ve výstavbě

výroba betonu a obalovaných živičných směsí

opravy silničních vozidel

hornická činnost a činnost prováděná hornickým způsobem v rozsahu: (otvírka, příprava a dobývání výhradních ložisek s omezením pro povrchové dobývání; zřizování, zajišťování a likvidace důlních děl; úprava a zušlechťování nerostů prováděné v souvislosti s jejich dobýváním; zřizování a provozování odvalů, výsypek a odkališť; dobývání ložisek nevyhrazených nerostů, vyhledávání a průzkum ložisek nevyhrazených nerostů; podzemní sanační práce; zemní práce prováděné za použití strojů a výbušnin; podzemní práce spočívající v hloubení důlních jam a studní, v ražení štol a tunelů)

silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny, - vnitrostátní příležitostná osobní, - mezinárodní příležitostná osobní

výkon zeměměřických činností

provádění trhacích a ohňostrojných prací

výzkum, vývoj, výroba, ničení, zneškodňování, zpracování, nákup a prodej výbušnin

zámečnictví, nástrojářství

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení

poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

distribuce pohonných hmot

Statutární orgán:

předseda představenstva:

Dipl. Ing. MORITZ FREYBORN, dat. nar. 1. září 1975
1180 Vídeň, Haizingergasse 1-3/32, Rakouská republika
Den vzniku funkce: 1. listopadu 2022
Den vzniku členství: 1. listopadu 2022

člen představenstva:

Ing. PAVEL BRYCHCÍN, dat. nar. 25. května 1972
Zakšínská 607/11, Střížkov, 190 00 Praha 9

Den vzniku členství: 1. července 2020

člen představenstva:

Ing. TOMÁŠ HOZA, dat. nar. 8. května 1969
Purkyňova 749/10, 767 01 Kroměříž
Den vzniku členství: 8. prosince 2022

Počet členů:

3

Způsob jednání:

Statutárním orgánem je představenstvo. Jménem společnosti jedná vůči třetím osobám, před soudy, správními a samosprávnými orgány ve všech záležitostech představenstvo a to vždy předseda představenstva s dalším členem představenstva nebo dva členové představenstva. Podepisování se děje tím způsobem, že k napsané firmě společnosti nebo otisku razítka připojí svůj podpis předseda představenstva s dalším členem představenstva nebo dva členové představenstva s označením své funkce.

Prokura:

Ing. RADEK HRADIL, dat. nar. 2. února 1964
Okružní 660, Mařatice, 686 05 Uherské Hradiště

Ing. ROSTISLAV KRONES, dat. nar. 8. května 1968
č.p. 46, 592 03 Kadov

Ing. JIŘÍ HORÁLEK, dat. nar. 16. listopadu 1964
Ludvíka Podéště 777/16, Stránice, 602 00 Brno

Ing. JAN HÝZL, dat. nar. 6. ledna 1976
Profesora Fuky 1276/4, Nová Ulice, 779 00 Olomouc

Ing. JAN CHROMÝ, dat. nar. 30. června 1974
Litvínovice - Mokré 119, PSČ 37001

Ing. PAVEL KLAS, dat. nar. 22. listopadu 1964
č.p. 5, 386 01 Radošovice

Ing. RADIM AULICKÝ, dat. nar. 22. června 1974
Oldřicha Nového 833, 252 64 Velké Přílepy

Ing. ALEXEJ KOROTKOV, dat. nar. 1. dubna 1978
Lechowiczova 2827/11, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava

Ing. LUKÁŠ PŘIBYL, dat. nar. 21. prosince 1982
Slunečná 333, 373 71 Adamov

Ing. RICHARD FISCHER, dat. nar. 7. října 1975
V Podhradí 33, 250 73 Jenštejn

Ing. Mag. MICHAL PRISTAŠ, dat. nar. 14. dubna 1981
2460 Bruckneudorf, Marc Aurel Strasse 2f, Rakouská republika
Ing. Mag. Michal Pristaš je oprávněn zastupovat Společnost spolu s dalším prokuristou. Toto zmocnění zahrnuje i oprávnění nabýt, zcizit nebo zatížit nemovitou věc.

MICHAL VANĚČEK, dat. nar. 27. března 1978
Pod Nouzovem 1007/25, Kbely, 197 00 Praha 9

Ing. MICHAL KOPPER, dat. nar. 15. května 1979
82104 Bratislava - Ružinov, Doležalova 3424/15F, Slovenská republika
Ing. Michal Kopper je oprávněn zastupovat Společnost spolu s dalším prokuristou. Toto zmocnění zahrnuje i oprávnění nabýt, zcizit nebo zatížit nemovitou věc.

Ing. TOMÁŠ RYS, dat. nar. 17. listopadu 1981
U sanatoria 737/20, Radotín, 153 00 Praha 5

PETR KAFKA, dat. nar. 21. února 1962
Sadová 246, Nemošice, 530 03 Pardubice

Ing. arch. JAN HAVELKA, dat. nar. 9. srpna 1988
č.p. 228, 373 32 Jílovice

Ing. JIŘÍ SVOBODA, Ph.D., dat. nar. 27. září 1984

U Hřiště 456, Mladcová, 760 01 Zlín

Ing. KAREL KLOFÁČ, dat. nar. 18. června 1973
U Rybníčku 4041, 580 01 Havlíčkův Brod

Ing. MARTIN BAŠÁR, dat. nar. 3. září 1979
Dělnická 443, 252 41 Dolní Břežany

K zastupování a podepisování za společnost jsou oprávněni vždy dva prokuristé. Prokuristé podepisují tím způsobem, že k firmě společnosti připojí svůj podpis s dodatkem označujícím prokuru.

Dozorčí rada:

předseda dozorčí rady:

Dipl. Ing. (FH) ALFRED WATZL, dat. nar. 13. září 1970
05-080 Izabelin C, Krasinskiego 37, Polská republika
Den vzniku funkce: 13. června 2022
Den vzniku členství: 13. června 2022

člen dozorčí rady:

Mgr. KARIN BÍLKOVÁ, dat. nar. 18. dubna 1975
Bezručova 603, 250 91 Zeleneč
Den vzniku členství: 4. prosince 2018

člen dozorčí rady:

Mag. HERIBERT HERZOG, dat. nar. 15. září 1964
7423 Grafenschachen, Grafenschachen 22, Rakouská republika
Den vzniku členství: 12. ledna 2023

Počet členů:

3

Jediný akcionář:

Bau Holding Beteiligungs GmbH
9800 Spittal an der Drau, Ortenburgerstraße 27, Rakouská republika
Registrační číslo: FN 117476 i
Právní forma: společnost s ručeným omezeným

Akcie:

1 000 ks kmenové akcie na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 10 000,- Kč

11 096 ks kmenové akcie na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 100 000,- Kč

Základní kapitál:

1 119 600 000,- Kč
Splaceno: 1 119 600 000,- Kč

Ostatní skutečnosti:

Akciová společnost byla založena notářským zápisem osvědčenou zakladatelskou listinou tří zakladatelů, fyzických osob, ze dne 23.2.1994, rozdělením současně zrušené společnosti s ručením omezeným SAREMO, se sídlem České Budějovice, ul.Plachého 27, na dvě nově vzniklé společnosti SAREMO a.s. a HYDROLINE s.r.o., se sídlem České Budějovice, Lidická 1131.
Zakladatelé současně schválili stanovy a.s. a zvolili členy orgánů společnosti.
Notářský zápis, zakladatelská smlouva a stanovy a.s. byly přiloženy.

Základní jmění je splaceno v plném rozsahu.

Valná hromada společnosti rozhodla dne 30.6.1999 o sloučení se společností STRABAG ČR a.s.

Na společnost STRABAG a.s. se sídlem Praha 5, Na Bělidle 198/21, PSČ 150 00, IČ 608 38 744, jako nástupnickou společnost, přešlo na základě smlouvy o fúzi sloučením ze dne 20. 11. 2006 s rozhodným dnem sloučení 1. 10. 2006 jmění společnosti ILBAU Plzeň a.s. se sídlem České Budějovice , Vrbenská 31,

IČ 648 34 352, jako zanikající společnosti.
Společnost STRABAG a.s. se sídlem Praha 5, Na Bělidle 198/21, PSČ 150 00 , IČ 608 38 744 je právním nástupcem bez likvidace zrušené a zaniklé společnosti ILBAU Plzeň a.s. se sídlem České Budějovice, Vrbenská 31, IČ 648 34 352, dosud zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích oddílu B vložce 1148.

Na společnost STRABAG a.s. se sídlem Praha 5, Na Bělidle 198/21, PSČ 150 00, IČ 608 38 744, jako nástupnickou společnost, přešlo na základě smlouvy o fúzi sloučením ze dne 20.11.2006 s rozhodným dnem sloučení 1.10.2006 jmění společnosti Stavební technologie, spol. s r.o. se sídlem Humpolec, Nádražní 729, okres Pelhřimov, PSČ 396 01, IČ 251 83 133, jajo zanikající společnosti.
Společnost STRABAG a.s. se sídlem Praha 5, Na Bělidle 198/21, PSČ 150 00, IČ 608 38 744 je právním nástupcem bez likvidace zrušené a zaniklé společnosti Stavební technologie, spol. s r.o. se sídlem Humpolec, Nádražní 729, okres Pelhřimov, PSČ 396 01, IČ 251 83 133, dosud zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích C 8266.

Obchodní společnost STRABAG a.s. jako společnost nástupnická převzala v důsledku vnitrostátní fúze sloučením jmění zanikající společnosti STRABAG konstrukce s.r.o., IČ 252 63 579, se sídlem Chrudim, Tovární 209.

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.

Na společnost STRABAG a.s., jako na společnost nástupnickou, přešlo v důsledku fúze sloučením jmění zanikajících společností JHP spol. s r.o., se sídlem Ústřední 423/62, Štěrboholy, 102 00 Praha 10, identifikační číslo 45798290 a MiTTaG spol. s r.o. pozemní a průmyslové stavitelství, se sídlem Na bělidle 198/21, Smíchov, 150 00 Praha 5, identifikační číslo 00547514. Rozhodným dnem fúze byl 1. leden 2016.

Na základě projektu vnitrostátní fúze sloučením ze dne 11.8.2017 došlo ke sloučení společnosti Dálniční stavby Praha, a.s., se sídlem Praha 5, Na Bělidle 198/21, PSČ 15000, identifikační číslo 40614948, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu B, vložce 744, jako zanikající společnosti, do společnosti STRABAG a.s., jako nástupnické společnosti, přičemž na nástupnickou společnost STRABAG a.s. přešlo jmění zanikající společnosti Dálniční stavby Praha, a.s.

Odštěpné závody:

Odštěpný závod:

Označení odštěpného závodu:

STRABAG a.s. odštěpný závod Praha

Sídlo nebo umístění:

Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5

Předmět podnikání:

montáž, opravy údržba revize vyhrazených el. zařízení

výroba betonu a obalovaných živičných směsí

výkon zeměměřických činností

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

zámečnictví, nástrojářství

opravy silničních vozidel

provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Vedoucí odštěpného závodu:

Ing. MARTIN BAŠÁR, dat. nar. 3. září 1979
Dělnická 443, 252 41 Dolní Břežany

Odštěpný závod:

Označení odštěpného závodu:

STRABAG a.s. odštěpný závod České Budějovice

Sídlo nebo umístění:

České Budějovice, Vrbenská 31, PSČ 37006

Předmět podnikání:

výkon zeměměřičských činností

projektová činnost ve výstavbě

výroba betonu a obalovaných živičných směsí

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

zámečnictví, nástrojářství

opravy silničních vozidel

provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Vedoucí odštěpného závodu:

Ing. PAVEL KLAS, dat. nar. 22. listopadu 1964
č.p. 5, 386 01 Radošovice

Odštěpný závod:

Označení odštěpného závodu:

STRABAG a.s. odštěpný závod Morava

Sídlo nebo umístění:

Holická 1004/29, Hodolany, 779 00 Olomouc

Předmět podnikání:

výroba betonu a obalovaných živičných směsí

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

opravy silničních vozidel

provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Vedoucí odštěpného závodu:

Ing. JAN HÝZL, dat. nar. 6. ledna 1976
Profesora Fuky 1276/4, Nová Ulice, 779 00 Olomouc

Odštěpný závod:

Označení odštěpného závodu:

STRABAG a.s. odštěpný závod pozemní a inženýrské stavitelství Praha

Sídlo nebo umístění:

Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5

Předmět podnikání:

výroba betonu a obalovaných živičných směsí

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny, - vnitrostátní příležitostná osobní, - mezinárodní příležitostná osobní

provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Vedoucí odštěpného závodu:

PETR KAFKA, dat. nar. 21. února 1962
Sadová 246, Nemošice, 530 03 Pardubice

Odštěpný závod:

Označení odštěpného závodu:

STRABAG a.s. odštěpný závod pozemní a inženýrské stavitelství České Budějovice

Sídlo nebo umístění:

České Budějovice, Vrbenská /31, PSČ 37006

Předmět podnikání:

- Provádění staveb, jejich změn a odstraňování
- projektová činnost ve výstavbě
- výkon zeměměřických činností
- zámečnictví, nástrojářství
- silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, -

nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny, - vnitrostátní příležitostná osobní, - mezinárodní příležitostná osobní
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
- montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení

Vedoucí odštěpného závodu:

Ing. JAN CHROMÝ, dat. nar. 30. června 1974
Mokré 119, 370 01 Litvínovice

Odštěpný závod:

Označení odštěpného závodu:

STRABAG a.s. odštěpný závod STRABAG Real Estate

Sídlo nebo umístění:

Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5

Předmět podnikání:

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor

Vedoucí odštěpného závodu:

Dipl. Ing. SONJA WERTITSCH, dat. nar. 29. září 1976
1210 Vídeň, Kugelfanggasse 79a, Rakouská republika

Tento výpis je neprodejný a byl pořízen na Internetu (http://www.justice.cz).
Dne: 7.9.2023 10:56
Údaje platné ke dni 7.9.2023 03:54

Naše značka: TD/262/19-120/VM/23
Vaše značka:

Vyřizuje: M. Valenta
Tel. [redacted]

e-mail:[redacted]
Datum: 9. 11. 2023

KSÚS Středočeského kraje

Ing. Milan PEŠKA
Technicko-provozní náměstek

Zborovská 11
150 21 Praha 5

Stavba: II/102 hr. hl. m Prahy – Štěchovice, rekonstrukce, etapa II.

Věc: Stanovisko TDS k návrhu ZBV č. 45 SO 102 Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice (Zastávka u Kiliána, ŠŽ ve stávajících zastávkách).

Zhotovitel stavby dne 23. 8. 2023 předložil a po připomínkách TDS doplnil 20. 10. 2023 návrh ZBV č. 45 SO 102 (102/19) Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice (Zastávka u Kiliána, ŠŽ ve stávajících zastávkách).

Návrh změny řeší odvodnění komunikace štěrbinovými žlaby v úseku v km 11,220 – 11,258 a 11,687 - 11,720 vpravo. Dále řeší z podnětu městyse Davle změnu stavby před dokončením provedení úprav v místě stávající autobusové zastávky U Kiliána.

Změny měly vliv na položky č. 6, 8, 9, 11, 15, 16, 18, 19, 21, 22, 31, 41, 50, 51, 55, 56, 92, 92, 94, 105, 119, 121, 124, 125, 126, 128, 129 a nové položky č. 130, 157, 160, 170,187,193 až 209.

TDS potvrzuje skutečnosti uvedené v návrhu ZBV č. 45 SO 102 (102/19) Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice (Zastávka u Kiliána, ŠŽ ve stávajících zastávkách).

[redacted]

M. Valenta
Technický dozor investora

Na vědomí: Ing. Karel Šimek

Krycí list ZBV

Název a evidenční číslo Stavby:	Číslo SO/PS /	Číslo ZBV:
II/102 hr. hl. města Prahy-Štěchovice, rekonstrukce. ETAPA II, Z2019-014610 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): **SO 102 - Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice**	/ číslo Změny SO/PS: **102/20**	**46**

Objednatel: Krajská správa a údržba Středočeského kraje, příspěvková organizace
Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5, Smíchov
IČ: 00066001 DIČ: CZ00066001

Zhotovitel: STRABAG a. s.
Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5
IČ: 60838744 DIČ: CZ60838744

Rekapitulace ZBV č. 46 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
46.1	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
46.2	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
46.3	0,00	321 762,37	321 762,37

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
46.4	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
46.5	0,00	0,00	0,00

Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
46	**0,00**	**321 762,37**	**321 762,37**

Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.
Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy
a pro Rozpis ocenění změn položek.

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby:	Číslo SO/PS /	Číslo ZBV:
II/102 hr. hl. města Prahy-Štěchovice, rekonstrukce. ETAPA II, Z2019-014610	/ číslo Změny SO/PS:	
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):	**102/20**	**46**
SO 102 - Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice		

Strany smlouvy o dílo č. S-468/00066001/2020 na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 3.3.2020 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Krajská správa a údržba Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5, Smíchov

Zhotovitel: STRABAG a. s., Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5

Přílohy Změnového listu:

1. Krycí list	1	počet listů
2. Změnový list	1	počet listů
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	1	počet listů
4. Rozpis ocenění Změn položek	1	počet listů
5. Přehled zařazení změn do skupin	2	počet listů
6. Přehled dalších dokladů	1	počet listů
Další doklady dle přehledu dokladů	69	počet listů

Paré č.	Příjemce
1, 2	Objednatel
3, 4	Zhotovitel
5	Projektant (AD)
6	Stavební dozor
7	Supervize

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis a zdůvodnění Změny:

Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice / km 13,900 HV, měřičský bod, šachta km 14,269

1) HV a měř. bod

V PDPS byla řešena oprava propustku v km 13,900 vložkováním a zřízení nové HV v témže km jako monolitické ze železobetonu. Zrušení geodetického bodu II. řádu, který zasahoval do těžby stavební jámy pro novou horskou vpusť PDPS neuvažovala.

Po vyčištění trub propustu od zanesení bylo konstatováno na místě samém projektantem a AD (příloha č. 12), že není nutné celý propust vložkovat, je v dobré kondici a pouze doporučují vyměnit jednu výtokovou troubu s úpravou vyústění. Nová horská vpusť byla řešena nakonec jako prefabrikovaná ze dvou důvodů: Urychlení výstavby v daném místě a omezení DIO na nezbytně nutnou dobu. Při těžení stavební jámy bylo nutné po dohodě se zeměměřičským úřadem (příloha č. 09, 12) odstranit překážející geodetický bod II. řádu za finanční náhradu (pol. č. 210 cena 14 904,- Kč), což dokladujeme fakturou (příloha č. 16). Při těžbě stavební jámy byla zastižena skalní hornina v třídě těžitelnosti III, což dokladujeme fotodokumentací s použitím rozpojovací techniky na bagru a geodetickým zaměřením(příl. č. 13 a 14), Změna se týká pol. č. 211 a 212.

2) Šachta V km 14,269 vlevo ve staničení silnice II/102 se nachází betonová revizní šachta DN 1000, kterou prochází odpadní a výtlačné potrubí v ocel. chráničce provozovatele čerpací stanice MOL. Tato revizní šachta je ve výškové a polohové kolizi s budoucí opěrnou zdí č. 63 SO 253. Bylo dohodnuto za účasti provozovatele č. stanice, AD a zhotovitele šachtu odbourat do úrovně stávajícího potrubí a to prodloužit se svahu násypového tělesa a zakončit krátkým skluzem. Pro potrubí bude v budoucí OZ vynechán prostup a upraveno armování základu. Pol. č. 227, 223 a 224 cena 11 087,00 Kč.

Jedná se o Změnu nepodstatnou, nepředvídanou, která je tak podle § 5, odst. 1, písm.c), resp. podle § 10 Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 01.01.2022) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zařazena do Skupiny 3 (změny z nepředvídaných důvodů). Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. Změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst. 6 se jedná o změnu, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a to z důvodu nepředvídaných fyzických podmínek vzniklých na stavbě v průběhu realizace a hodnota těchto dodatečných stavebních prací nepřekračuje 50 % původní hodnoty závazku.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných
0,00	**321 762,37**	**321 762,37**	**321 762,37**

Technická pomoc Objednatele	jméno	Ing. Lubomír Smetana	datum		podpis

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Zhotovitel (stavbyvedoucí): STRABAG a.s.	jméno	Ing. Karel Šimek	datum		podpis
Projektant (autorský dozor): Pontex, spol. s.r.o.	jméno	Ing. David Dvořáček	datum		podpis
Stavební dozor: Pragoprojekt, a. s.	jméno	Miroslav Valenta	datum		podpis
Supervize (Regionální dotační kancelář)	jméno		datum		podpis
Zástupce Objednatele: KSÚS SK	jméno	Ing. Milan Peška	datum		podpis
Zástupce Objednatele odpovědný za cenové projednání Změny	jméno	Ing. Jaroslava Jurková	datum		podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele)	jméno	Ing. Jan Fidler, DiS.	datum		podpis
Zhotovitel	jméno	Ing. Martin Bašár Ing. Karel Klofáč	datum		podpis

Číslo paré:

Příloha č. 3

ZÁPIS

o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS) pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 46

Název Stavby: **II/102 hr. hl. města Prahy-Štěchovice, rekonstrukce. ETAPA II**
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: 102/20
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 102 - Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
113 362 946,56

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	-14 482 870,38	33 804 049,32	132 684 125,50	19 321 178,94

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	0,00	321 762,37	34 125 811,69	30,10%

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1
stavební/montážní práce	-14 482 870,38	133 005 887,87	19 642 941,31	17,33%

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo 46

Evidenční číslo a název stavby: Z2019-014610, II/102 hr. hl. města Prahy-Štěchovice, rekonstrukce. ETAPA II

Číslo a název SO/PS: SO 102 - Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice

Číslo a název rozpočtu: SO 102 - Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

102

Skupina změn 3

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14	122201403	Vykopávky v zemníku na suchu v hornině tř. 3 objem do 5000 m3	M3	3 694,800	3 744,300	49,500	84,05	310 547,94	0,00	4 160,48	314 708,42	4 160,48	1,34%
16	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	M3	15 023,840	15 128,240	104,400	504,88	7 585 236,34	0,00	52 709,47	7 637 945,81	52 709,47	0,69%
18	171201201	Uložení sypaniny na skládky	M3	10 725,990	10 780,890	54,900	16,70	179 124,03	0,00	916,83	180 040,86	916,83	0,51%
19	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	T	22 695,246	22 810,236	114,990	138,17	3 135 802,14	0,00	15 888,17	3 151 690,31	15 888,17	0,51%
21	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	M3	182,700	232,200	49,500	254,57	46 509,94	0,00	12 601,22	59 111,16	12 601,22	27,09%
23	182201101	Svahování násypů	M2	2 350,000	2 352,000	2,000	43,01	101 073,50	0,00	86,02	101 159,52	86,02	0,09%
31	451317777	Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu 1:5 z betonu prostého tl do 100 mm	M2	5 223,400	5 227,530	4,130	581,54	3 037 616,04	0,00	2 401,76	3 040 017,80	2 401,76	0,08%
33	464511111	Pohoz z lomového kamene neupraveného tříděného z terénu	M3	3,000	7,450	4,450	3 481,56	10 444,68	0,00	15 492,94	25 937,62	15 492,94	148,33%
124	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	T	310,867	320,106	9,239	51,81	16 106,02	0,00	478,67	16 584,69	478,67	2,97%
125	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	T	4 352,138	4 481,484	129,346	5,76	25 068,31	0,00	745,03	25 813,34	745,03	2,97%
126	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	T	10 352,419	10 361,658	9,239	34,54	357 572,55	0,00	319,12	357 891,67	319,12	0,09%
128	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	T	5 047,476	5 054,886	7,410	147,76	745 815,05	0,00	1 094,90	746 909,95	1 094,90	0,15%
129	998225194	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živičným, betonovým do 5000 m	T	5 047,476	5 054,886	7,410	29,55	149 152,92	0,00	218,97	149 371,89	218,97	0,15%
		NOVÉ POLOŽKY											
130	012002000	OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ	KPL	0,000	1 580,109	1 580,109	1,00	0,00	0,00	1 580,11	1 580,11	1 580,11	100,00%
210	01200200R	OSTATNÍ POŽADAVKY - zrušení zeměměřičského bodu	KPL	0,000	1,000	1,000	14 904,00	0,00	0,00	14 904,00	14 904,00	14 904,00	100,00%
225	122351101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 20 m3 strojně	M3	0,000	4,450	4,450	517,00	0,00	0,00	2 300,65	2 300,65	2 300,65	100,00%
211	133254102	Hloubení šachet zapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3	M3	0,000	37,600	37,600	1 280,00	0,00	0,00	48 128,00	48 128,00	48 128,00	100,00%
212	133451101	Hloubení šachet nezapažených v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 objem do 20 m3	M3	0,000	17,300	17,300	2 220,00	0,00	0,00	38 406,00	38 406,00	38 406,00	100,00%
213	810441811	Bourání stávajícího potrubí z betonu DN přes 400 do 600	M	0,000	2,500	2,500	402,00	0,00	0,00	1 005,00	1 005,00	1 005,00	100,00%
214	812442121	Montáž potrubí z trub TBH s integrovaným pryžovým těsněním otevřený výkop sklon do 20 % DN 600	M	0,000	2,500	2,500	891,00	0,00	0,00	2 227,50	2 227,50	2 227,50	100,00%
215	812442222	Montáž podkladků trub od DN 600 do DN 800	KUS	0,000	2,000	2,000	151,00	0,00	0,00	302,00	302,00	302,00	100,00%
216	59223023	trouba betonová hrdlová DN 600	M	0,000	2,500	2,500	2 630,00	0,00	0,00	6 575,00	6 575,00	6 575,00	100,00%
217	59223734	podkladek pod trouby betonové/ŽB DN 600-800	KUS	0,000	2,000	2,000	287,00	0,00	0,00	574,00	574,00	574,00	100,00%
218	899203112	Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno pro třídu zatížení B125, C250	KUS	0,000	1,000	1,000	1 340,00	0,00	0,00	1 340,00	1 340,00	1 340,00	100,00%
219	895941103	Osazení vpusti kanalizační horské z betonových dílců rozměru 1200/900	KUS	0,000	1,000	1,000	5 480,00	0,00	0,00	5 480,00	5 480,00	5 480,00	100,00%
220	977213514	Řezání betonových, železobetonových nebo kameninových trub kruhových ve výkopu kolmý řez DN 500	KUS	0,000	1,000	1,000	3 180,00	0,00	0,00	3 180,00	3 180,00	3 180,00	100,00%
221	59224000R	Vpusť horská - atypická včetně mříže	KUS	0,000	1,000	1,000	66 045,65	0,00	0,00	66 045,65	66 045,65	66 045,65	100,00%
222	85024000R	VÝŘEZ, VÝSEK, ÚTES NA POTRUBÍ DN DO 300MM	KUS	0,000	1,000	1,000	11 513,88	0,00	0,00	11 513,88	11 513,88	11 513,88	100,00%
206	935112211	Osazení příkopového žlabu do betonu tl 100 mm z betonových tvárnic š přes 500 do 800 mm -skluzy	M	0,000	2,000	2,000	2 293,50	0,00	0,00	4 587,00	4 587,00	4 587,00	100,00%
223	890411851	Bourání šachet z prefabrikovaných skruží strojně obestavěného prostoru do 1,5 m3	KUS	0,000	1,000	1,000	3 100,00	0,00	0,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	100,00%
224	894410302	Osazení betonových dílců pro kanalizační šachty DN 1000 deska zákrytová (demontáž a zpětná montáž)	KUS	0,000	2,000	2,000	1 700,00	0,00	0,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	100,00%
		Celkem						15 389 521,52	0,00	321 762,37	16 021 831,83	321 762,37	2,09%

Odpovědný zástupce Objednatele i odpovědný zástupce Zhotovitele odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu.
Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny.

(vedoucí projektu)

Datum:
Podpis:

Za Objednatele: Miroslav Valenta, (TDI)

Datum:
Podpis:

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN

Název a evidenční číslo Stavby: **II/102 hr. hl. města Prahy-Štěchovice, rekonstrukce. ETAPA II**

1	**Přijatá smluvní částka bez rezervy a DPH**	**377 812 002,59**
2=1+19+20	**Aktuální smluvní částka (cena stavby)**	401 391 319,52
	Aktuální smluvní částka (cena stavby) včetně DPH	**485 683 496,62**
3=(2/1)*100	**Procento změny Přijaté smluvní částky**	**106,24%**
4=(25/1)*100	**Sledování vyhrazených změn (Skupina 1)**	**0,00%**
5=(28/1)*100	**Sledování záměny položek (Skupina 2)**	**0,00%**
40=(19/1)*100	**Sledování limitu 15 % pro podstatnou změnu pro Změny záporné dle § 14, odst. (5), písm. b)**	**-7,31%**

6=32+36	**Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a Skupiny 4**	**24 341 584,28**
7=(6/1)*100	**Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4**	**6,44%**
8=1*0,3	**Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4**	**113 343 600,78**

9=(32A/1)*100	**Sledování limitu 50 % Skupina 3**	**18,56%**
10=(36A/1)*100	**Sledování limitu 50 % Skupina 4**	**1,24%**
10A=32A+36A	**Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných pro Skupinu 3 a Skupinu 4**	**74 809 346,40**
11=1*0,5	**Zákonný limit 50 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4**	**188 906 001,30**

12=(37/1)*100	**Sledování limitu (15%)**	**56 671 800,39**
13=37	**Sledování limitu 140 448 000 Kč**	**399839261,00%**
14=140448000-37		**136 449 607,39**

					- 1 -			- 2 -			- 3 -				- 4 -				- 5 -	
					Vyhrazené změny (Doměrky) (dle §100 zákona č. 134/2016 Sb.)			Záměna položek (dle §222 odst. (7) zákona č. 134/2016 Sb.)			Změny nepředvídané (dle §222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb.)				Změny nezbytné (dle §222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb.)				Změny de minimis	
SO	**ZBV č.**	**Název SO/PS / předmět Změny**	**Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus)**	**Změny kladné**	**Hodnota ZBV**	**Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus)**	**Změny kladné**	**Suma Změn záporných a Změn kladných**	**Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus)**	**Změny kladné**	**Suma Změn záporných a Změn kladných**	**Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus)**	**Změny kladné**	**Suma Změn záporných a Změn kladných**	**Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných**	**Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus)**	**Změny kladné**	**Suma Změn záporných a Změn kladných**	**Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných**	**Změny de minimus (15% nebo limit 140 448 000,- Kč**	**limit 15 %**
16	**17**	**18**	**19=23+26+29+33**	**20=24+27+30+34 +37+39**	**21=19+20**	**23**	**24**	**25=23+24**	**26**	**27**	**28=26+27**	**29**	**30**	**32=29+30**	**32A=ABS(29)+30**	**33**	**34**	**36=33+34**	**36A=ABS(33)+34**	**37**	**38=(37/1)*100**
		II/102 hr. hl. města Prahy-Štěchovice, rekonstrukce. ETAPA II	**- 27 614 211,04**	**51 193 527,97**	**23 579 316,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**- 25 171 327,38**	**44 961 387,66**	**19 790 060,28**	**70 132 715,04**	**- 62 553,68**	**4 614 077,68**	**4 551 524,00**	**4 676 631,36**	**3 998 392,61**	**0,01**
103	1	Rekonstrukce vozovky - Průtah Štěchovicemi / úprava poklopů a vodoznaků	0,00	124 942,66	124 942,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 942,66	124 942,66	124 942,66	0,00	0,00%
103/2	2	Rekonstrukce vozovky - Průtah Štěchovicemi / přeložka vodovodní přípojky km 14,815-14,895, kolize s kabelem CETIN	0,00	158 202,22	158 202,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 202,22	158 202,22	158 202,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
103/3	3	Rekonstrukce vozovky - Průtah Štěchovicemi / odstranění žulových kostek	- 147 928,60	470 739,23	322 810,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 147 928,60	470 739,23	322 810,63	618 667,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
103/4	4	Rekonstrukce vozovky - Průtah Štěchovicemi / oprava objízdné trasy Masečín	0,00	514 671,37	514 671,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514 671,37	514 671,37	514 671,37	0,00	0,00%
103/5	5	Rekonstrukce vozovky - Průtah Štěchovicemi / kolize kabelů s kanalizací a novým profilem vozovky	0,00	1 072 447,19	1 072 447,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 072 447,19	1 072 447,19	1 072 447,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
102	6	Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice / zvýšené množství odstraňování křovin	- 62 553,68	2 301 662,61	2 239 108,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 62 553,68	2 301 662,61	2 239 108,93	2 364 216,29	0,00	0,00%
901	7	Provizorní most přes Kočábu / změna založení mostního provizoria	- 535 759,98	1 068 988,13	533 228,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 604 748,11	0,42%
207	8	Most ev.č.102-017 / Zajištění skalního svahu	0,00	728 985,00	728 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	728 985,00	728 985,00	728 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
207/2	9	Most ev.č.102-017 / odstranění vrstvy žulových kostek + podkladní vrstva pod OP1	0,00	75 186,27	75 186,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 186,27	75 186,27	75 186,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
102/2	10	Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice/ frézování a doplnění konstrukčních vrstev vozovky	0,00	43 669,94	43 669,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 669,94	43 669,94	43 669,94	0,00	0,00%
103/6	11	Rekonstrukce vozovky - průtah Štěchovicemi / předláždění chodníků, obruby, úprava plotové zídky u křižovatky Hlavní a Školní	0,00	671 285,54	671 285,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	671 285,54	671 285,54	671 285,54	0,00	0,00%
102/3	12	Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice / odvodňovací proužek	- 1 844 570,00	549 074,50	- 1 295 495,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 393 644,50	0,63%
102/4	13	Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice / Úprava svahu dlažbou z lomového kamene km 10,360-10,840 L.S.	0,00	5 693 724,53	5 693 724,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 693 724,53	5 693 724,53	5 693 724,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
253	14	Opěrné zdi - Davle - Štěchovice - vlevo / sanace základové spáry v založení SO 253, zeď č. 61 vlevo	0,00	277 190,48	277 190,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277 190,48	277 190,48	277 190,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
102/5	15	Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice / Km 13,200-13,700 svodidlo, krajnice, žulové kostky	0,00	881 187,01	881 187,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	881 187,01	881 187,01	881 187,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
334	16	Kanalizace ve Štěchovicích / zaslepení nefunkční dešťové kanalizace	0,00	587 837,86	587 837,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	587 837,86	587 837,86	587 837,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
102/6	17	Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice /Změna množství odfrézovaných vrstev AB	- 784 390,50	1 450 696,44	666 305,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 784 390,50	1 450 696,44	666 305,94	2 235 086,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
334/2	18	Kanalizace ve Štěchovicích / Kolize s kabelem ČEZ	0,00	39 769,75	39 769,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 769,75	39 769,75	39 769,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
204	19	Most ev.č. 102-012 / Změna spodní stavby, dobetonávky k původním opěrám	- 13 158,52	158 423,56	145 265,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 13 158,52	158 423,56	145 265,04	171 582,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
102/7	20	Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice / Úprava v kraji vozovky km 13,15-13,202 vlevo	0,00	210 681,35	210 681,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 681,35	210 681,35	210 681,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
102/8	21	Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice / Změna tlouštěk AB vrstev	- 685 017,85	2 326 749,68	1 641 731,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 685 017,85	2 326 749,68	1 641 731,83	3 011 767,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
334/3	22	Kanalizace ve Štěchovicích / Štěrbinové žlaby, vpusti, žlaby	- 848 332,68	893 335,27	45 002,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 848 332,68	893 335,27	45 002,59	1 741 667,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102/9	23	Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice / Změna podkladní vrstvy	- 3 315 045,75	4 872 115,58	1 557 069,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 3 315 045,75	4 872 115,58	1 557 069,83	8 187 161,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103/7	24	Rekonstrukce vozovky - Průtah Štěchovicemi / Ochrana proti ostřiku	0,00	386 957,63	386 957,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386 957,63	386 957,63	386 957,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
253/2	25	Opěrné zdi - Davle - Štěchovice - vlevo / změna zatřídění hornin	- 11 482 675,35	4 065 440,24	- 7 417 235,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 11 482 675,35	4 065 440,24	-7 417 235,11	15 548 115,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102/10	26	Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice / zvýšené množství odstraňování křovin	0,00	893 825,06	893 825,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	893 825,06	893 825,06	893 825,06	0,00	0,00
102/11	27	Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice / lokální opravy CB desek	0,00	439 876,30	439 876,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439 876,30	439 876,30	439 876,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103/8	28	Rekonstrukce vozovky - Průtah Štěchovicemi / úpravy v km 14,915, 14,950 a 15,070	0,00	337 421,30	337 421,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337 421,30	337 421,30	337 421,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000/1	29	Vedlejší a ostatní náklady/ RDS vypracování změn	0,00	1 879 064,84	1 879 064,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 879 064,84	1 879 064,84	1 879 064,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
331/1	30	Přeložka kanalizace u mostu 102-012/ doplnění šoupátek	0,00	41 604,72	41 604,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 604,72	41 604,72	41 604,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

332/1	31	Přeložka kanalizace u mostu 102-013 / doplnění šoupátek	0,00	41 604,72	41 604,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 604,72	41 604,72	41 604,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333/1	32	Přeložka kanalizace u mostu 102-014 / doplnění šoupátek	0,00	41 604,72	41 604,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 604,72	41 604,72	41 604,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341/1	33	Přeložka vodovodu u mostu 102-012 / doplnění šoupátek	- 13 643,95	26 030,02	12 386,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 13 643,95	26 030,02	12 386,07	39 673,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342/1	34	Přeložka vodovodu u mostu 102-013 / doplnění šoupátek	- 13 643,95	26 030,02	12 386,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 13 643,95	26 030,02	12 386,07	39 673,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343/1	35	Přeložka vodovodu u mostu 102-014 / doplnění šoupátek	- 13 643,95	26 030,02	12 386,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 13 643,95	26 030,02	12 386,07	39 673,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
181.2/1	36	Přechodné dopravní značení / posunutí semaforu	0,00	64 020,50	64 020,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 020,50	64 020,50	64 020,50	0,00	0,00
102/12	37	Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice / lokální opravy CB desek SAL, zábradlí propustek	- 86 929,80	1 684 180,84	1 597 251,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 86 929,80	1 684 180,84	1 597 251,04	1 771 110,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102/13	38	Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice / betonová svodidla	0,00	1 530 172,61	1 530 172,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 530 172,61	1 530 172,61	1 530 172,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102/14	39	Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice / úprava svahu z lomového	- 6 111 253,89	5 276 219,41	- 835 034,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 6 111 253,89	5 276 219,41	-835 034,48	11 387 473,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
253/3	40	Opěrné zdi - Davle - Štěchovice - vlevo / úprava římsy u OZ č. 71	0,00	272 560,35	272 560,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272 560,35	272 560,35	272 560,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102/15	41	Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice / frézování AB a CS vrstev	- 1 513 978,75	2 868 019,53	1 354 040,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 1 513 978,75	2 868 019,53	1 354 040,78	4 381 998,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102/16	42	Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice /úprava v km 11,780-12,440 vpravo	0,00	3 235 947,09	3 235 947,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 235 947,09	3 235 947,09	3 235 947,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102/17	43	Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice /Ocelové svodidlo,dlažba v Davli	0,00	854 066,44	854 066,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	854 066,44	854 066,44	854 066,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102/18	44	Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice / Změna DZ	- 141 683,84	574 840,90	433 157,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 141 683,84	574 840,90	433 157,06	716 524,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102/19	45	Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice / Zastávka u Kiliána, ŠŽ ve stávajících zastávkách	0,00	1 134 682,17	1 134 682,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 134 682,17	1 134 682,17	1 134 682,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102/20	46	Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice / km 13,900 HV, měřičský bob, šachta km 14,269	0,00	321 762,37	321 762,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321 762,37	321 762,37	321 762,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Přehled dalších dokladů

Číslo ZBV:	**46**
Název a evidenční číslo stavby:	**II/102 hr. hl. města Prahy-Štěchovice, rekonstrukce. ETAPA II, Z2019-014610**
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	SO 102 - Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	102/20

Doklad	**Součást dokumentace ZBV**	
	ANO (počet listů)	**NE - Uloženo**
07 Změnový soupis prací SO 102 po změně 20 pro ZBV 46	43	
08 Vyjádření projektanta - propustek	2	
09 Email. Zrušení měřičského bodu	3	
10 Oznámení zhotovitele o nové skutečnosti	1	
11 Stanovisko KSÚSSK a pokyn ke zpracování ZBV	1	
12 Vyjádření AD č. 68 - propustek km 13,900	1	
13 Geodetický protokol Š II 28/2023	1	
14 Fotodokumentace HV	2	
15 Fotodokumentace propustek	2	
16 Faktura - zrušení měřičského bodu	1	
17 Obj. Betonika - horská vpusť	2	
18 Nabídka BaBc	1	
19 Zápis Ing. Kloáče do obch. Rejstříku	2	
20 Výpis z obch.rejstříku - Ing.Bašár	6	
21 Stanovisko TDS	1	
Počet listů celkem	69	

Změnový soupis prací SO 102 po změně 20 pro ZBV 46

Evidenční číslo a název stavby: II/102 hr. hl. města Prahy-Štěchovice, rekonstrukce. ETAPA II
Číslo a název SO/PS: SO 102 - Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice
Číslo a název rozpočtu: SO 102 - Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)
102
Celkem

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		1 Zemní práce											
1	113106122	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z kamenných dlaždic	M2	50,000	150,900	100,900	91,95	4 597,50	0,00	9 277,76	13 875,26	9 277,76	201,80%
		Rozebrání dlažeb a dílců komunikací pro pěší, vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek komunikací pro pěší s ložem z kameniva nebo živice a s výplní spár z kamenných dlaždic nebo desek											
		SoD *100*0.5 stáv. odvodňov. proužek na ZÚ vpravo, odhad šířky 50 cm - vč. odstranění lože=50,000 [A]* *ZBV č. 15* *dle geodetického protokolu č. Š II 3/2022* *km 13,2-13,7 100,9=100,900 [A]*											
2	113106123	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší ze zámkových dlaždic	M2	60,000	60,000	0,000	91,95	5 517,00	0,00	0,00	5 517,00	0,00	0,00%
		Rozebrání dlažeb a dílců komunikací pro pěší, vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek komunikací pro pěší s ložem z kameniva nebo živice a s výplní spár ze zámkové dlažby											
		SoD *(20*0.5)+(100*0.5) chodník na KÚ 60 dlažba před KÚ vpravo - šířka cca 0,5 m z důvodu bourání vozovky 60 příp. rektifikace obrubníku, vč. lože=60,000 [A]*											
3	113107222	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 200 mm	M2	11 027,000	11 027,000	0,000	26,23	289 238,21	0,00	0,00	289 238,21	0,00	0,00%
		Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm											
		SoD *11027 bourání celk. konstrukce stáv. vozovky - štěrk s příměsí jemnozrnné zeminy - tl. 160 mm=11 027,000 [A]*											
4	113107230	Odstranění podkladu pl nad 200 m2 z betonu prostého tl 100 mm	M2	11 027,000	11 027,000	0,000	102,45	1 129 716,15	0,00	0,00	1 129 716,15	0,00	0,00%
		Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 z betonu prostého, o tl. vrstvy do 100 mm											
		SoD *11027 bourání celkové konstrukce stáv. vozovky - stabilizace cementem tl. 60 mm - odhad dle situace 11027 řezů=11 027,000 [A]*											
5	113154334	Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š 2 m pl do 10000 m2 bez překážek v trase	M2	27 731,600	13 881,100	-13 850,500	59,90	1 661 122,84	-835 778,71	6 133,76	831 477,89	-829 644,95	-49,94%
		Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 1 000 do 10 000 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 100 mm											
		SoD *13995 asf. beton v tl. 60 mm - odhad dle situace 13995 řezů=13 995,000 [A]* *2160 asf. beton tl. 100 mm - dle situace 13995 řezů v km 13,2 - 13,7 vlevo, vč. reprofilace příčného sklonu=2 160,000 [B]* *11027 asf.beton tl.60mm - bourání celkové konstrukce vozovky - dle situace 13995 řezů=11 027,000 [C]* *549.6 odfrézování nájezdových klínů=549,600 [D]* *Celkem: 13995+2160+11027+549.6=27 731,600 [E]* *ZBV ZBV č. 10* *dle zaměření tl. 40 mm 60,3=60,300 [A]* *dle zaměření tl. 60 mm 42,1=42,100 [B]* *A+B=102,400 [C]*											

Změnový soupis prací SO 102 po změně 20 pro ZBV 46														
Evidenční číslo a název stavby: II/102 hr. hl. města Prahy-Štěchovice, rekonstrukce. ETAPA II									ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
Číslo a název SO/PS: SO 102 - Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice									102					
Číslo a název rozpočtu: SO 102 - Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice									Celkem					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
		ZBV č. 17 dle geodetických protokolů *km 12,822 - 12,846 vpravo protokol Š II 51/2021 prům. tl. 46 mm - bez odpočtu plochy 105,6 m2* *km 12,846 - 13,201 vpravo protokol Š II 51/2021 prům. tl. 162 mm - odpočet plochy -1530,8 m2=-1 530,800 [A]* *km 10,360 - 10,840 vpravo protokol Š II 63/2021 prům. tl. 128 mm - odpočet plochy -2374,1 m2=-2 374,100 [B]* *km 13,199 - 13,696 vlevo protokol Š II 88/2021 prům. tl. 133 mm - odpočet plochy -2272,6 m2=-2 272,600 [C]* *km 10,550 - 10,680 vlevo protokol Š II 32/2021 prům. tl. 129 mm - odpočet plochy -595,5 m2=- 595,500 [D]* *km 10,680 - 10,840 vlevo protokol Š II 32/2021 prům. tl. 99 mm - bez odpočtu plochy 790,4 m2* *km 10,360 - 10,550 vlevo protokol Š II 26/2021 prům. tl. 135 mm - odpočet plochy -851,1 m2=- 851,100 [E]* *km 12,820 - 13,200 vlevo protokol Š II 23/2021 prům. tl. 207 mm - odpočet plochy -1411,0 m2=-1 411,000 [F]* *km 12,820 - 13,200 vlevo protokol Š II 23/2021 prům. tl. 103 mm - odpočet plochy -190 m2=- 190,000 [G]* *km 12,820 - 13,200 vlevo protokol Š II 23/2021 prům. tl. 40 mm -bez odpočtu plochy 17 m2* *km 13,199 - 13,696 vpravo protokol Š II 101/2021 prům. tl. 89 mm - bez odpočtu plochy 2042,5 m2* *km 13,396 - 13,427 vpravo protokol Š II 101/2021 dodatečné dofrézování prům. tl. 62 mm - přípočet plochy 125,6 m2=125,600 [H]* *km 12,440 - 12,850 vlevo protokol D 8/2020 prům. tl. 186 mm - odpočet plochy -1654 m2=-1 654,000 [I]* *km 10,250 - 10,360 vpravo protokol D 6/2020 prům. tl. 40 mm - odpočet plochy -580,5 m2=- 580,500 [J]* *km 10,250 - 10,360 vlevo protokol D 3/2020 prům. tl. 100 mm - bez odpočtu plochy 595 m2* *km 12,440 - 12,720 vpravo protokol Š II 5/2022 prům. tl.140 mm - odpočet plochy -1302 m2=-1 302,000 [K]* *km 12,720 - 12,848 vpravo protokol Š II 5/2022 prům. tl.181 mm - odpočet plochy -459 m2=- 459,000 [L]* *A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L=-13 095,000 [M]*													
		ZBV č. 41 *geodetický protokol* *Š II 7/2022 km 9,999-10,117 vlevo prům. tl. 90 mm 765,5=765,500 [A]* *km 10,130-10,246 vlevo prům. tl. 90 mm 600,30=600,300 [B]* *prům. tl. 100 mm 577,10=577,100 [C]* *prům. tl. 100 mm 562,0=562,000 [D]* *Š II 37/2022 km 11,298-11,356 vlevo prům. tl. 98 mm 273,10=273,100 [E]* *Š II 2/2023 km 11,773-12,438 vlevo prům. tl. 178 mm 2*3012,30=6 024,600 [F]* *Š II 20/2023 km13,694-14,114 vpravo prům. tl. 63 mm 1463,80=1 463,800 [G]* *Š II 26/2023 km 14,130-14,429 vpravo prům. tl. 64 mm 1429,50=1 429,500 [H]* *Š II 36/2022 km 14,480-14,522 vlevo prům. tl. 104 mm 198,30=198,300 [I]* *Š II 37/2022 km 11,385-11,780 vlevo prům. tl. 102 mm 1637,8=1 637,800 [J]* *Š II 59/2022 km 14,424-14,580 vpravo prům. tl. 106 mm 137,00=137,000 [K]* *km 14,424-14,580 vpravo prům. tl. 103 mm 43,40=43,400 [L]* *12/2020 Masečím 317,50=317,500 [M]* *Š II 101/2021 -2*125,6=- 251,200 [N]* *odpočet původního množství a ZBV č. 17 množstství -(27731,6-13095)=-14 636,600 [O]* *A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O=- 857,900 [O]*													
6	113154335	Frézování živičného krytu tl 200 mm pruh š 2 m pl do 10000 m2 bez překážek v trase	M2	13 516,000	26 061,500	12 545,500	109,73	1 483 110,68	-74 078,72	1 450 696,47	2 859 728,43	1 376 617,75	92,82%	
		Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 1 000 do 10 000 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 200 mm												
		SoD *5501+8015 asf. beton tl. 150 mm - bourání v místě změny příčného sklonu - odhad dle situace 13516 řezů=13 516,000 [A]* *ZBV č. 17 dle geodetických protokolů* *km 12,846 - 13,201 vpravo protokol Š II 51/2021 prům. tl. 162 mm 1530,8 m2=1 530,800 [A]* *km 10,360 - 10,840 vpravo protokol Š II 63/2021 prum. tl. 128 mm 2374,1 m2=2 374,100 [B]* *km 13,199 - 13,696 vlevo protokol Š II 88/2021 prum. tl. 133 mm 2272,6 m2=2 272,600 [C]* *km 10,550 - 10,680 vlevo protokol Š II 32/2021 prum. tl. 129 mm 595,5 m2=595,500 [D]* *km 10,360 - 10,550 vlevo protokol Š II 26/2021 prum. tl. 135 mm 851,1 m2=851,100 [E]* *km 12,820 - 13,200 vlevo protokol Š II 23/2021 prum. tl. 103 mm 190 m2=190,000 [F]* *km 12,440 - 12,850 vlevo protokol D 8/2020 prum. tl. 186 mm 1654 m2=1 654,000 [G]* *km 10,250 - 10,360 vpravo protokol D 6/2020 prum. tl. 140 mm 580,5 m2=580,500 [H]* *km 12,440 - 12,720 vpravo protokol Š II 5/2022 prum. tl.140 mm 1302 m2=1 302,000 [I]* *km 12,720 - 12,848 vpravo protokol Š II 5/2022 prum. tl.181 mm 459 m2=459,000 [J]* *km 12,820 - 13,200 vlevo protokol Š II 23/2021 prum. tl. 207 mm 1411,0 m2=1 411,000 [K]* *A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K=13 220,600 [L]*													

Změnový soupis prací SO 102 po změně 20 pro ZBV 46

Evidenční číslo a název stavby: II/102 hr. hl. města Prahy-Štěchovice, rekonstrukce. ETAPA II
Číslo a název SO/PS: SO 102 - Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice
Číslo a název rozpočtu: SO 102 - Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)
102
Celkem

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		ZBV č. 41 *geodetický protokol* *D 8/2020 km 12,440-12,850 vlevo prům. tl. 200 mm 128,90=128,900 [A]* *Š 101/2021 km 13,199 - 13,696 vpravo tl. 151mm 125,60=125,600 [B]* *Š II 33/2022 km 14,220-14,580 vlevo prům. tl. 155 mm 1618,00=1 618,000 [C]* *Š II 52/2022 km11,278-11,357 vpravo prům. tl. 148 mm 281,10=281,100 [D]* *km11,357-11,381 vpravo prům. tl. 166 mm 137,60 =137,600 [E]* *km11,381-11,780 vpravo prům. tl. 189 mm 1958,90=1 958,900 [F]* *km 14,424-14,580 vpravo prům. tl. 174 mm 506,90=506,900 [G]* *Š II 19/2023 km 11,780-12,437 vpravo prům. tl. 182 mm 2501,20=2 501,200 [H]* *Š II 20/2023 km 13,788-13,934 vpravo prům. tl. 118 mm 299,40=299,400 [I]* *Š II 21/2023 km 13,788-13,934 vpravo prům. tl. 168 mm 2408,90 =2 408,900 [J]* *Š II 6/2022 km 13,695-14,224 vlevo prům. tl, 204 mm 2444,40=2 444,400 [K]* *Š II 33/2022 km 14,580-14,609 vlevo prům. tl. 220 mm 130,50=130,500 [L]* *Š II 37/2022 km 11,519-11,630 vlevo prům. tl. 224 mm 299,50=299,500 [M]* *A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M=12 840,900 [N]* *odpočet původního množství -13516=-13 516,000 [O]* *N+O=- 675,100 [P]*											
7	113155332	Frézování betonového krytu tl 40 mm pruh š 2 m pl do 10000 m2 bez překážek v trase	M2	13 995,000	5 151,720	-8 843,280	74,99	1 049 485,05	-663 157,57	0,00	386 327,48	-663 157,57	-63,19%
		Frézování betonového podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 1 000 do 10 000 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 40 mm											
		SoD *13995 odfrézování na požadovanou niveletu 13995 srovnání do příčného sklonu v místech jen frézování na tl. 60 mm=13 995,000 [A]*											
		ZBV č. 41 *geodetický protokol* *Š II26/2021 km 10,518-10548 vlevo prům. tl. 131 mm 77,10=77,100 [A]* *Š II 63/2021 km 10,580-10663 vpravo prům. tl. 39 mm 433,60=433,600 [B]* *Š II 7/2022 km 10,001-10,117 vlevo prům. tl. 220 mm 751,90=751,900 [C]* *km 10,190-10,234 vlevo prům. tl. 20 mm 158,80=158,800 [D]* *Š II 17/2022 km 10,130-10,192 vpravo prům. tl. 320 mm 307,00=307,000 [E]* *Š II 33/2022 km 14,220-14,480 vlevo prům. tl. 225 mm 1145,00=1 145,000 [F]* *km 14,522-14,570 vlevo prům. tl. 221 mm 225,60=225,600 [G]* *Š II 37/2022 km 11,519-11,630 vlevo prům. tl. 215 mm 299,5=299,500 [H]* *Š II 52/2022 km 11,357-11,381 vpravo prům. tl.40 mm 137,60=137,600 [I]* *Š II 59/2022 km 14,424-14,580 vpravo prům. tl. 224 mm 506,90=506,900 [J]* *Š II 21/2023 km 10,881-11,060 vlevo prům tl. 24 mm 862,50=862,500 [K]* *km 10,060-11,881vlevo prům tl. 25 mm 81,92=81,920 [L]* *Š II 87/2021 km10,520-10,587 vpravo prům. tl. 114 mm 97,90=97,900 [M]* *km 10,741-10,780 vpravo prům. tl. 224 mm 55,10=55,100 [N]* *km 10,748-10,754 vpravo prům. tl. 216 mm 11,30=11,300 [O]* *odpočet původního množství -13995,00=-13 995,000 [P]* *A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P=-8 843,280 [Q]*											
8	113155333	Frézování betonového krytu tl 50 mm pruh š 2 m pl do 10000 m2 bez překážek v trase	M2	11 027,000	2 730,600	-8 296,400	87,43	964 090,61	-725 354,25	0,00	238 736,36	-725 354,25	-75,24%
		Frézování betonového podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 1 000 do 10 000 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 50 mm											
		SoD *11027 bourání celkové konstrukce stáv. vozovky - CB konstrukce fréza v tl. 50 mm - odhad dle situace 11027 řezů=11 027,000 [A]*											
		ZBV č. 41 *geodetivký protokol* *D 3/2020 km 10,250-10,360 vlevo prům. tl. 250 mm 595=595,000 [A]* *D 8/2020 km 12,440-12,850 vlevo prům. tl. 250 mm 1654+228,70=1 882,700 [B]* *Š II 7/2022 km 10,190-10,324 vlevo prům. tl. 50 mm 252,90=252,900 [C]* *odpočet původního množství -11027,00=-11 027,000 [D]* *A+B+C+D=-8 296,400 [E]*											

Změnový soupis prací SO 102 po změně 20 pro ZBV 46

Evidenční číslo a název stavby: II/102 hr. hl. města Prahy-Štěchovice, rekonstrukce. ETAPA II
Číslo a název SO/PS: SO 102 - Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice
Číslo a název rozpočtu: SO 102 - Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)
102
Celkem

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9	113155334	Frézování betonového krytu tl 100 mm pruh š 2 m pl do 10000 m2 bez překážek v trase	M2	22 029,000	42 028,500	19 999,500	166,82	3 674 877,78	0,00	3 336 316,59	7 011 194,37	3 336 316,59	90,79%
		Frézování betonového podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 1 000 do 10 000 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 100 mm											
		SoD *5501*2 bourání voz. v místě změny příčného sklonu - tl. CB konstrukce tl.200 mm - odhad dle situace 11002 řezů=11 002,000 [A]* *11027 bourání celkové konstrukce stáv. vozovky - tl. CB konstrukce 150 mm - fréza v tl. 100 mm - odhad dle situace 11002 řezů=11 027,000 [B]* *Celkem: 11002+11027=22 029,000 [C]*											
		ZBV č. 41 *geodetický protokol* *D 3/2020 km 10,250-10,360 vlevo prům. tl. 250 mm 2*595=1 190,000 [A]* *D 6/202 km 10,250-10,360 vpravo prům. tl. 100 mm 505,0=505,000 [B]* *D 8/2020 km 12,440-12,850 vlevo prům. tl. 250 mm 2*(1654,0+228,70)=3 765,400 [C]* *Š II23/2021 km12,820-13,200 vlevo prům. tl. 181 mm 2*1382,0=2 764,000 [D]* *Š II 26/2021 km 13,60-10,420 vlevo prům. tl. 292 mm 3*268,80=806,400 [E]* *Š II26/2021 km 10,518-10,548 vlevo prům. tl. 131 mm 77,10=77,100 [F]* *Š II 32/2021 km 10,360-10,680 vlevo prům. tl. 287 mm 3*1194,50=3 583,500 [G]* *km 10,780-10,840 vlevo prům. tl. 289 mm 3*299,60=898,800 [H]* *Š II 51/2021 km 12,917-12,930 vpravo prům. tl. 289 mm 3*57,50=172,500 [I]* *Š II 63/2021 km 10,663-10,680 vpravo prům. tl. 205 mm 2*80,10=160,200 [J]* *km 10,700-10,780 vpravo prům. tl. 88 mm 391=391,000 [K]* *Š II 6/2022 km 13,695-14,224 vpravo prům. tl. 298 mm 3*2418,50=7 255,500 [L]* *Š II 7/2022 km 10,001-10,117 vlevo prům. tl.220 mm 2* 751,90=1 503,800 [M]* *km 10,130-10,190 vlevo prům. tl. 300 mm 3*292,60=877,800 [N]* *km 10,190-10,234 vlevo prům. tl. 300 mm 3*107,00=321,000 [O]* *Š II 17/2022 km 10,020-10,117 vpravo prům. tl. 260 mm 3*537,90=1 613,700 [P]* *km 10,130-10,192 vpravo prům. tl. 320 mm 3*307,00=921,000 [Q]* *Š II 23/2022 km 10,192-10,246 vpravo prům. tl. 270 mm 3*252,90=758,700 [R]* *Š II 33/2022 km 14,220-14,480 vlevo prům. tl. 225 mm 2*1145,00=2 290,000 [S]* *km 14,522-14,570 vlevo prům. tl. 221 mm 2*225,60=451,200 [T]* *Š II 36/2022 km 14,480-14,522 vlevo prům. tl. 205 mm 2*198,40=396,800 [U]* *Š II 37/2022 km 11,519-11,630 vlevo prům. tl. 215 mm 2*299,5=599,000 [V]* *Š II 59/2022 km 14,424-14,580 vpravo prům. tl. 224 mm 2*506,90=1 013,800 [W]* *Š II 5/2023 km 11,779-11,970 vlevo prům. tl. 193 mm 2*396,10=792,200 [X]* *km 11,779-11,970 vlevo prům. tl. 195 mm 2*915,80=1 831,600 [Y]* *Š II 21/2023 km 10,840-10,881 vlevo prům tl. 196 mm 2* 203,60=407,200 [Z]* *km 10,881-11,060 vlevo prům tl. 195 mm 2*67,30=134,600 [AA]* *km 10,060-11,182 vlevo prům tl.194 mm 2*653,20 =1 306,400 [AB]*											
		Š II 87/2021 km10,520-10,587 vpravo prům. tl. 114 mm 97,90=97,900 [AC] *km 10,741-10,780 vpravo prům. tl. 224 mm 2* 55,10=110,200 [AD]* *km 10,748-10,754 vpravo prům. tl. 216 mm 2*11,30=22,600 [AE]* *odpočet fakturovaného množství -22021,8=-22 021,800 [AF]* *A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q+R+S+T+U+V+W+X+Y+Z+AA+AB+AC+AD+AE+AF=14 997,100*											
		ZBV č. 42 *dle geodetického protokolu Š II 14/2023* *km 11,780-12,437 tl. 170 mm 2* 2501,20=5 002,400 [A]*											

Změnový soupis prací SO 102 po změně 20 pro ZBV 46

Evidenční číslo a název stavby: II/102 hr. hl. města Prahy-Štěchovice, rekonstrukce. ETAPA II
Číslo a název SO/PS: SO 102 - Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice
Číslo a název rozpočtu: SO 102 - Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)
102
Celkem

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
10	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	M	88,000	88,000	0,000	91,95	8 091,60	0,00	0,00	8 091,60	0,00	0,00%
		Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých											
		SoD *48+20+20=88,000 [A]*											
11	122101103	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 1 a 2 objem do 5000 m3	M3	4 322,500	6 326,760	2 004,260	122,97	531 537,83	0,00	246 463,85	778 001,68	246 463,85	46,37%
		Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v horninách tř. 1 a 2 přes 1 000 do 5 000 m3											
		SoD *910*4.75 odkop poslední vrstvy vozovky 4322.5 podloží pod vozovkou pro úpravu typu B2 - délka dle sit. x plocha ze vzor.řezu=4 322,500 [A]* *ZBV č. 13* *Odkop svahu se svahovými stupni* *km 10,360 - 10,380 24 m3=24,000 [A]* *km 10,380 - 10,420 190,7 m3 - úprava s geomříží =190,700 [B]* *km 10,420 - 10,465 45 m3=45,000 [C]* *km 10,465 - 10,475 11,9 m3=11,900 [D]* *km 10,476 - 10,485 9,2 m3=9,200 [E]* *km 10,485 - 10,575 126,3 m3=126,300 [F]* *km 10,575 - 10,650 68,2 m3=68,200 [G]* *km 10,706 - 10,840 161,7 m3=161,700 [H]* *A+B+C+D+E+F+G+H=637,000 [I]* *ZBV č. 20* *odkop pro rozšíření vozovky km 13,150-13,210* *1,9*0,37*60,0=42,180 [A]*											
		ZBV č. 39 *geodetické protokoly* *Š II 33/2021 km 13,150-13,190 vlevo 89,90=89,900 [A]* *Š II 10/2022 km 10,140-10,250 vlevo 191,10=191,100 [B]* *Š II 12/2022 km 10,001-10,101 vlevo 112,90=112,900 [C]* *Š II 16/2022 km 10,103-10,140 vlevo 63,0+55,20-77=41,200 [D]* *Š II 27/2022 km 11,430-11,520 vlevo 191,60=191,600 [E]* *Š II 35/2022 km 11,220-11,430 vlevo 67,90+268,30=336,200 [F]* *Š II 43/2022 km 11,520-11663 vlevo 303,20=303,200 [G]* *Š II 45/2022 km 11,140-11,220 vlevo 187,80=187,800 [H]* *Š II 47/2022 km 11,671-11,780 vlevo 215,0=215,000 [I]* *Š II 53/2022 km 14,462-14,580 vlevo 249,30=249,300 [J]* *Š II 62/2022 km 11,056-11,140 vlevo 214,20=214,200 [K]* *Š II 65/2022 km 11,340-11,400 vlevo 47,0+160,30=207,300 [L]* *Š II 1/2023 km 10,840-10947 vlevo 188,7 =188,7 [V]* *Š II 4/2023 km 10,947-11,031 vlevo 165,60=165,600 [M]* *Š II 7/2023 km 11,976-12,440 vlevo 805,30=805,300 [N]* *Š II 8/2023 km 11,780-11,971 vlevo 231,10+1,70=232,800 [O]* *Š II 11/2023 km 14,410-14,460 vlevo 75,40+21,50=96,900 [P]* *Š II 13/2023 km 14,425 vlevo 22,40=22,400 [Q]* *Š II 16/2023 km 11,928-12,060 vpravo 279,50=279,500 [R]* *Š II 27/2023 km 11,733-11,832 vpravo 332,70=332,700 [S]* *(A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q+R+S+V)*0,25=1115,9 [T]*											

Změnový soupis prací SO 102 po změně 20 pro ZBV 46

Evidenční číslo a název stavby: II/102 hr. hl. města Prahy-Štěchovice, rekonstrukce. ETAPA II
Číslo a název SO/PS: SO 102 - Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice
Číslo a název rozpočtu: SO 102 - Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)
102
Celkem

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		ZBV č. 42 *geodetický protokol Š II 14/2023* *km 11,780-11,868 94,20=94,200 [A]* *km 11,881-11,909 23,50=23,500 [B]* *km 11,923-12,435 512,20=512,200 [C]* *(A+B+C)*0,25=157,475 [D]* *ZBV č. 43* *geodetický protokol Š II 37/2023 dlažba pro obec Davle* *(6,1+9,0+17,2+9,0+10,2+6,0+23,10+10,3)*0,45=40,905 [A]* *ZBV č. 45* *U Kiliána 10,8=10,800 [A]*												
12	122101403	Vykopávky v zemníku na suchu v hornině tř. 1 a 2 objem do 5000 m3	M3	1 701,750	1 701,750	0,000	84,05	143 032,09	0,00	0,00	143 032,09	0,00	0,00%
		Vykopávky v zemnících na suchu s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v horninách tř. 1 a 2 přes 1 000 do 5 000 m3											
		SoD *11345*0.15 potřeba ornice na ohumusování dle pol. 182301132 x tl. 15 cm=1 701,750 [A]*											
13	122201103	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 5000 m3	M3	4 077,490	4 077,490	0,000	122,97	501 408,95	0,00	0,00	501 408,95	0,00	0,00%
		Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 přes 1 000 do 5 000 m3											
		SoD *5501*0.2 Písek hlinitý v místě změny příčného sklonu - odtěžení na požadovanou niveletu, srovnání do příčného sklonu 1100.2 přehutnění=1 100,200 [A]* *11027*0.27 Štěrk hlinitý tl. 270 mm - bourání vozovky komplet=2 977,290 [B]* *Celkem: 1100.2+2977.29=4 077,490 [C]*											
14	122201403	Vykopávky v zemníku na suchu v hornině tř. 3 objem do 5000 m3	M3	3 694,800	3 744,300	49,500	84,05	310 547,94	0,00	4 160,48	314 708,42	4 160,48	1,34%
		Vykopávky v zemnících na suchu s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 přes 1 000 do 5 000 m3											
		SoD *910*2.31 délka x plocha v řezu - dle pol. 564581111 - úprava typu B2=2 102,100 [A]* *1410 dle pol. 182201101 x hloubka 60 cm - vhodná zemina pro svahové stupně=1 410,000 [B]* *182.7 dle pol. 174101101 - obsyp propustku v km 12,925=182,700 [C]* *Celkem: 2102.1+1410+182.7=3 694,800 [D]* *ZBV č. 46* *zásyp 54,9-(1,5*1,2*3)=49,500 [A]*											
15	131203101	Hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3	M3	0,315	3,905	3,590	4 417,49	1 391,51	0,00	15 858,79	17 250,30	15 858,79	1139,68%
		Hloubení zapažených i nezapažených jam ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 soudržných											
		SoD *5*(0.3*0.3*0.7) počet sloupků pro svislé DZ x odhad rozměrů jámy =0,315 [A]* *ZBV č. 37* *zábradlí propustek* *0,5*0,5*0,85*12=2,55* *ZBV č. 45* *zábradlí u Kiliána (autobusová zastávka)* *0,4*0,4*0,5*13=1,04*											

Změnový soupis prací SO 102 po změně 20 pro ZBV 46

Evidenční číslo a název stavby: II/102 hr. hl. města Prahy-Štěchovice, rekonstrukce. ETAPA II
Číslo a název SO/PS: SO 102 - Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice
Číslo a název rozpočtu: SO 102 - Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)
102
Celkem

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
16	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	M3	15 023,840	17 842,470	2 818,630	504,88	7 585 236,34	0,00	1 423 069,97	9 008 306,31	1 423 069,97	18,76%
		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m											
		SoD *1701.75 dovoz ornice na ohumusování dle pol. 122101403=1 701,750 [A]* *4322.5 odvoz odkopané zeminy dle pol. 122101103=4 322,500 [B]* *2102.1 dovoz podsypu dle pol. 122201403 pro úpravu svahu typu B2=2 102,100 [C]* *4077.490 odvoz odkopaného hlinitého písku dle pol. 122201103=4 077,490 [D]* *2350*0.6*2 odvoz vykopané zeminy ze svahových stupňů dle pol. 182201101 x odhad hloubky 60cm - 1701.75* *dovoz vhodné zeminy pro zpětný zásyp stupňů=2 820,000 [E]* *Celkem: 1701.75+4322.5+2102.1+4077.49+2820=15 023,840 [F]* *ZBV č. 13* *dle pol. 122101103 637=637,000 [A]* *ZBV č. 20* *odvoz odkopané zeminydle pol. č. 122101103* *42,18=42,18 [A]* *ZBV č. 37* *zábradlí propustek* *0,5*0,5*0,85*12=2,55*											
		ZBV č. 39 *dle pol. č. 122101103 1115,9=1115,9 [A]* *111301111 4463,60*0,15=669,54 [B]* *A+B=1 785,44 [C]* *ZBV č. 42* *dle pol. č. 122101103* *157,475=157,475 [A]* *ZBV č. 43* *dle pol. č. 122101103 40,905=40,905 [A]* *ZBV č. 45* *U Kiliána 10,8=10,800 [A]* *km 11,687-11,720 (0,8*0,35*34)+(3,0*2,0*1,5)=18,520 [B]* *km 11,2228-11,2584 (0,8*0,35*37)+(3,0*2,0*1,5)=19,360 [C]* *A+B+C=48,68 [E]* *ZBV č. 46* *Hloubení 37,6+17,3=54,900 [A]* *zásyp 54,9-(1,5*1,2*3)=49,500 [B]* *A+B=104,400 [C]*											
17	171151222	Strmý svah vyztužením zeminy ocelovou sítí s kamenivem pohled svah přes 2 m do 4 m	M2	2 275,000	0,000	-2 275,000	1 323,12	3 010 098,00	-3 010 098,00	0,00	0,00	-3 010 098,00	-100,00%
		Strmý svah ze zemin vyztužených geosyntetiky s pohledovou plochou upraveného svahu ocelovou sítí vyplněnou kamenivem [RockWall], výšky přes 2 m do 4 m											
		SoD *910*2.5 délka x odhadnutá výška svahu - úprava typ B2=2 275,000 [A]*											
		ZBV č. 39 *odpočet neprovádělo se* *-2275,000=-2275,00*											

Změnový soupis prací SO 102 po změně 20 pro ZBV 46

Evidenční číslo a název stavby: II/102 hr. hl. města Prahy-Štěchovice, rekonstrukce. ETAPA II
Číslo a název SO/PS: SO 102 - Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice
Číslo a název rozpočtu: SO 102 - Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)
102
Celkem

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
18	171201201	Uložení sypaniny na skládky	M3	10 725,990	13 495,120	2 769,130	16,70	179 124,03	0,00	46 244,47	225 368,50	46 244,47	25,82%
		Uložení sypaniny na skládky											
		SoD *4322.500 dle pol. 122101103=4 322,500 [A]* *4580*0.2 plocha krajnic x tl. - dle pol. 938909612=916,000 [B]* *4077.490 hlinitý písek - dle pol. 122201103=4 077,490 [C]* *2350*0.6 odvoz vykopané zeminy ze svahových stupňů dle pol. 182201101 x odhad hloubky 60cm=1 410,000 [D]* *Celkem: 4322.5+916+4077.49+1410=10 725,990 [E]* *ZBV č. 13* *dle pol. 122101103 637=637,000 [A]* *ZBV č. 20* *vykopaná zemina 42,18=42,18 [A]* *ZBV č. 37* *zábradlí propustek* *0,5*0,5*0,85*12=2,55* *ZBV č. 39* *dle pol. č. 1622701105 1785,44=1785,44 [A]* *ZBV č. 42* *dle pol. č. 162701105* *157,475=157,475 [A]* *ZBV č. 43* *dle pol. č. 162701105* *40,905=40,905 [A]*											
		ZBV č. 45 *U Kiliána 10,8=10,800 [A]* *km 11,687-11,720 (0,8*0,35*34)+(3,0*2,0*1,5)=18,520 [B]* *km 11,2228-11,2584 (0,8*0,35*37)+(3,0*2,0*1,5)=19,360 [C]* *A+B+C=48,68 [D]* *ZBV č. 46* *Hloubení 37,6+17,3=54,900 [A]*											

Změnový soupis prací SO 102 po změně 20 pro ZBV 46

Evidenční číslo a název stavby: II/102 hr. hl. města Prahy-Štěchovice, rekonstrukce. ETAPA II
Číslo a název SO/PS: SO 102 - Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice
Číslo a název rozpočtu: SO 102 - Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)
102
Celkem

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
19	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	T	22 695,246	27 971,364	5 276,118	138,17	3 135 802,14	0,00	729 001,22	3 864 803,36	729 001,22	23,25%
		Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)											
		SoD *4322.5*1.9 výkop dle pol. 171201201 x koef. přepočtu na tuny=8 212,750 [A]* *2494.356 z čištění příkopů, vpustí 8212.75 propustků dle pol. 997221551a=2 494,356 [B]* *1154.16 ze sejmutí nánosů na krajnicích dle pol. 938909612=1 154,160 [C]* *4077.49*2.0 dle pol. 122201103 x koef. přepočtu na tuny=8 154,980 [D]* *1410*1.9 odvoz vykopané zeminy ze svahových stupňů dle pol. 171201201 x koef. přepočtu na tuny=2 679,000 [E]* *Celkem: 8212.75+2494.356+1154.16+8154.98+2679=22 695,246 [F]* *ZBV č. 13* *dle pol. 122101103 637*1,9=1 210,300 [A]* *ZBV č. 20* *odkopaná zemina 42,18*1,9=80,142 [A]* *ZBV č. 37* *zábradlí propustek* *0,5*0,5*0,85*12*1,9=4,845* *ZBV č. 39* *dle pol. č. 171201201 1785,44*1,9=3 392,336 [A]* *ZBV č. 42* *dle pol. č. 171201201* *157,475*1,9=299,203 [A]* *ZBV č. 43* *dle pol. č. 171201201* *40,905*1,9=81,81 [A]*											
		ZBV č. 45 *U Kiliána 10,8=10,800 [A]* *km 11,687-11,720 (0,8*0,35*34)+(3,0*2,0*1,5)=18,520 [B]* *km 11,2228-11,2584 (0,8*0,35*37)+(3,0*2,0*1,5)=19,360 [C]* *(A+B+C)*1,9=92,492 [D]* *ZBV č. 46* *37,6*2+17,3*2,3=114,990 [A]*											
20	171201211a	Poplatek za zemník	T	10 481,925	10 481,925	0,000	23,03	241 398,73	0,00	0,00	241 398,73	0,00	0,00%
		Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)											
		SoD *1701.75*1.9 dle pol. 122101402 x koef. 1,9 pro přepočet na tuny=3 233,325 [A]* *2102.1*2.0 dle pol. 122201403 x koef.2,0 pro přepočet na tuny=4 204,200 [B]* *1410*1.9 dle pol. 182201101 x hloubka 60 cm - vhodná zemina pro svahové stupně=2 679,000 [C]* *182.7*2.0 dle pol. 174101101 - obsyp propustku v km 12,925=365,400 [D]* *Celkem: 3233.325+4204.2+2679+365.4=10 481,925 [E]*											
21	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	M3	182,700	237,590	54,890	254,57	46 509,94	0,00	13 973,35	60 483,29	13 973,35	30,04%
		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách											
		SoD *14.5*(5.3*2+2.0) délka x plocha v řezu - obsyp propustku v km 12,925=182,700 [A]* *ZBV č. 45* *km 11,687-11,720 (34*0,8-33*0,6)*0,35=2,590 [A]* *km 11,2228-11,2584 (37*0,8-36*0,6)*0,35=2,800 [B]* *A+B=5,390 [C]* *ZBV č. 46* *54,9-(1,5*1,2*3)=49,500 [A]*											

Změnový soupis prací SO 102 po změně 20 pro ZBV 46

Evidenční číslo a název stavby: II/102 hr. hl. města Prahy-Štěchovice, rekonstrukce. ETAPA II
Číslo a název SO/PS: SO 102 - Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice
Číslo a název rozpočtu: SO 102 - Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)
102
Celkem

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
22	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	M2	11 027,000	12 262,200	1 235,200	33,80	372 712,60	0,00	41 749,76	414 462,36	41 749,76	2,25%
		Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním											
		ZBV č. 15 *dle geodetického protokolu č. Š II 3/2022* *km 13,2-13,7* *žlaby 69,4=69,400 [A]* *žulové kostky 100,9=100,900 [B]* *A+B=170,300 [C]* *ZBV č. 20* *1,9*60=114,00 [A]* *ZBV ZBV č. 27* *geodetický protokol Š II 51/2022 92,2 m2=92,200 [A]* *geodetický protokol Š II 58/2022 183,8 m2 =183,800 [B]* *A+B=276,000 [C]*											

Změnový soupis prací SO 102 po změně 20 pro ZBV 46

Evidenční číslo a název stavby: II/102 hr. hl. města Prahy-Štěchovice, rekonstrukce. ETAPA II
Číslo a název SO/PS: SO 102 - Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice
Číslo a název rozpočtu: SO 102 - Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)
102
Celkem

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		ZBV č. 42 *geodetický protokol Š II 14/2023* *km 11,780-11,868 94,20=94,200 [A]* *km 11,881-11,909 23,50=23,500 [B]* *km 11,923-12,435 512,20=512,200 [C]* *A+B+C=629,900 [D]* *ZBV č. 45* *U Kiliána 45=45,000 [A]*											
23	182201101	Svahování násypů	M2	2 350,000	7 946,300	5 596,300	43,01	101 073,50	0,00	240 696,86	341 770,36	240 696,86	36,22%
		Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním výkopku při svahování násypů v jakékoliv hornině											
		SoD *(420+50)*5 zřízení svahových stupňů v km 11,720 - 12,140 2350 v km 12,030 - 12,080 - délka x odhad prům.šířky ve svahu=2 350,000 [A]* *ZBV č. 13* *dle geodetického zaměření* *km 10,360 - 10,422 111,9 m2=111,900 [A]* *km 10,422 - 10,454 48,7 m2=48,700 [B]* *km 10,455 - 10,476 44,9 m2 =44,900 [C]* *km 10,480 - 10,654 369,6 m2=369,600 [D]* *km 10,706 - 10,730 41,4 m2=41,400 [E]* *km 10,730 - 10,840 234,7 m2=234,700 [F]* *A+B+C+D+E+F=851,200 [G]*											
		ZBV č. 39 *geodetické protokoly* *Š II 33/2021 km 13,150-13,190 vlevo 89,90=89,900 [A]* *Š II 10/2022 km 10,140-10,250 vlevo 191,10=191,100 [B]* *Š II 12/2022 km 10,001-10,101 vlevo 112,90=112,900 [C]* *Š II 16/2022 km 10,103-10,140 vlevo 63,0+55,20-77=41,200 [D]* *Š II 27/2022 km 11,430-11,520 vlevo 191,60=191,600 [E]* *Š II 35/2022 km 11,220-11,430 vlevo 67,90+268,30=336,200 [F]* *Š II 43/2022 km 11,520-11663 vlevo 303,20=303,200 [G]* *Š II 45/2022 km 11,140-11,220 vlevo 187,80=187,800 [H]* *Š II 47/2022 km 11,671-11,780 vlevo 215,0=215,000 [I]* *Š II 53/2022 km 14,462-14,580 vlevo 249,30=249,300 [J]* *Š II 62/2022 km 11,056-11,140 vlevo 214,20=214,200 [K]* *Š II 65/2022 km 11,340-11,400 vlevo 47,0+160,30=207,300 [L]* *Š II 1/2023 km 10,840-10947 vlevo 188,7 =188,7 [V]* *Š II 4/2023 km 10,947-11,031 vlevo 165,60=165,600 [M]* *Š II 7/2023 km 11,976-12,440 vlevo 805,30=805,300 [N]* *Š II 8/2023 km 11,780-11,971 vlevo 231,10+1,70=232,800 [O]* *Š II 11/2023 km 14,410-14,460 vlevo 75,40+21,50=96,900 [P]* *Š II 13/2023 km 14,425 vlevo 22,40=22,400 [Q]* *Š II 16/2023 km 11,928-12,060 vpravo 279,50=279,500 [R]* *Š II 27/2023 km 11,733-11,832 vpravo 332,70=332,700 [S]* *celkem A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q+R+S+V=4463,60 [U]*											
		ZBV č. 42 *geodetický protokol Š II 16/2023* *km 11,928-12,060 279,50=279,500 [A]* *ZBV č. 46* *km 14,269 vlevo 1*2=2,000 [A]*											

Změnový soupis prací SO 102 po změně 20 pro ZBV 46

Evidenční číslo a název stavby: II/102 hr. hl. města Prahy-Štěchovice, rekonstrukce. ETAPA II
Číslo a název SO/PS: SO 102 - Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice
Číslo a název rozpočtu: SO 102 - Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)
102
Celkem

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
24	182301132	Rozprostření ornice pl přes 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 150 mm	M2	11 345,000	80,110	-11 264,890	36,89	418 517,05	-415 561,78	0,00	2 955,27	-415 561,78	-99,29%
		Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy přes 100 do 150 mm											
		SoD *490*5.0 délka dle situace x odhad šířky - úprava svahu typu 2450=2 450,000 [A]* *910*3.0*2 délka dle situace x odhad šířky x na obou stranách - úprava svahu typu B2=5 460,000 [B]* *4580*1.5*0.5 délka trasy x odhadnutá šířka ohumusování x odhad 50 %=3 435,000 [C]* *Celkem: 2450+5460+3435=11 345,000 [D* *ZBV č. 39* *odpočet, neprovádělo se* *-11264,89=-11 264,890 [A]*											
25	183405211	Výsev trávníku hydroosevem na ornici	M2	11 345,000	11 345,000	0,000	20,49	232 459,05	0,00	0,00	232 459,05	0,00	0,00%
26	005724740	osivo směs travní krajinná - svahová	KG	283,625	283,625	0,000	155,44	44 086,67	0,00	0,00	44 086,67	0,00	0,00%
27	184802631	Chemické odplevelení po založení kultury postřikem na široko ve svahu do 1:1	M2	11 345,000	11 345,000	0,000	4,26	48 329,70	0,00	0,00	48 329,70	0,00	0,00%
		Chemické odplevelení po založení kultury na svahu přes 1:2 do 1:1 postřikem na široko											
28	185803113	Ošetření trávníku shrabáním ve svahu do 1:1	M2	11 345,000	11 345,000	0,000	4,61	52 300,45	0,00	0,00	52 300,45	0,00	0,00%
		Ošetření trávníku jednorázové na svahu přes 1:2 do 1:1											
29	185804312	Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2	M3	340,350	340,350	0,000	556,12	189 275,44	0,00	0,00	189 275,44	0,00	0,00%
		Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2											
		SoD *11345.000*0.01*3=340,350 [A]*											
	2	**Zakládání**											
30	213221111	Ochranná vrstva na základové spáře z bet. prost. se zvýš. nároky na prostředí C 25/30 tl do 150 mm	M3	16,530	16,530	0,000	3 321,98	54 912,33	0,00	0,00	54 912,33	0,00	0,00%
		Ochranná vrstva na základové spáře z prostého betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30 tl. do 150 mm											
		SoD *1.7*3.0*0.30 Betonové lože C25/30-XF3 pod stupně z lomového kamene u propustku v km 12,925=1,530 [A]* *2.5*20.0*0.3 betonové lože C25/30-XF3 pod propustkem=15,000 [B]* *Celkem: 1.53+15=16,530 [C]*											
	4	**Vodorovné konstrukce**											
31	451317777	Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu 1:5 z betonu prostého tl do 100 mm	M2	5 223,400	5 440,610	217,210	581,54	3 037 616,04	-441 854,09	568 170,47	3 163 932,41	126 316,37	4,16%
		Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5, tloušťky od 50 do 100 mm z betonu prostého											
		ZBV č. 13 dle geoetického zaměření Š II 37/2021 km 10,360 - 10,422 111,9 m2=111,900 [A] Š II 30/2021 km 10,422 - 10,454 48,7 m2=48,700 [B] Š II 34/2021 km 10,455 - 10,476 44,9 m2 =44,900 [C] Š II 30/2021 km 10,480 - 10,654 369,6 m2=369,600 [D] Š II 30/2021 km 10,706 - 10,730 41,4 m2=41,400 [E] Š II 38/2021 km 10,730 - 10,840 234,7 m2=234,700 [F] A+B+C+D+E+F=851,200 [G]											

Změnový soupis prací SO 102 po změně 20 pro ZBV 46

Evidenční číslo a název stavby: II/102 hr. hl. města Prahy-Štěchovice, rekonstrukce. ETAPA II
Číslo a název SO/PS: SO 102 - Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice
Číslo a název rozpočtu: SO 102 - Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)
102
Celkem

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		ZBV č. 39 geodetické protokoly Š II 33/2021 km 13,150-13,190 vlevo 89,90=89,900 [A] Š II 10/2022 km 10,140-10,250 vlevo 191,10=191,100 [B] Š II 12/2022 km 10,001-10,101 vlevo 112,90=112,900 [C] Š II 16/2022 km 10,103-10,140 vlevo 63,0+55,20-77=41,200 [D] Š II 27/2022 km 11,430-11,520 vlevo 191,60=191,600 [E] Š II 35/2022 km 11,220-11,430 vlevo 67,90+268,30=336,200 [F] Š II 43/2022 km 11,520-11663 vlevo 303,20=303,200 [G] Š II 45/2022 km 11,140-11,220 vlevo 187,80=187,800 [H] Š II 47/2022 km 11,671-11,780 vlevo 215,0=215,000 [I] Š II 53/2022 km 14,462-14,580 vlevo 249,30=249,300 [J] Š II 62/2022 km 11,056-11,140 vlevo 214,20=214,200 [K] Š II 65/2022 km 11,340-11,400 vlevo 47,0+160,30=207,300 [L] Š II 1/2023 km 10,840-10947 vlevo 188,7=188,700 [M] Š II 4/2023 km 10,947-11,031 vlevo 165,60=165,600 [N] Š II 7/2023 km 11,976-12,440 vlevo 805,30=805,300 [O] Š II 8/2023 km 11,780-11,971 vlevo 231,10+1,70=232,800 [P] Š II 11/2023 km 14,410-14,460 vlevo 75,40+21,50=96,900 [Q] Š II 13/2023 km 14,425 vlevo 22,40=22,400 [R] Š II 16/2023 km 11,928-12,060 vpravo 279,5=279,500 [S] Š II 27/2023 km 11,733-11,832 vpravo 332,70=332,700 [T] celkem A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q+R+S+T=4 463,600 [U] odpočet původního množství -5223,4=-5 223,400 [V] celkem U+V=- 759,800 [W]												
		ZBV č. 42 geodetický protokol Š II 34/2023 km 11,904-11,930 25,10=25,100 [A]											
		ZBV č. 43 geodetický protokol Š II 37/2023 dlažba pro obec Davle km 10,474 vlevo 6,1=6,100 [A] km 10,590 vpravo 9,0=9,000 [B] km 10,675-10,690 vpravo17,2 =17,200 [C] km 11,049 vlevo 9,0=9,000 [D] km 11,082 vpravo 10,2=10,200 [E] km 11,166 vlevo 6,0=6,000 [F] km 11,255-11,286 vlevo 23,10=23,100 [G] km 11,666-11,673 vlevo 10,3=10,300 [H] A+B+C+D+E+F+G+H=90,900 [I] ZBV č. 45 km 11,687-11,720 0,8*0,1*34=2,720 [A] km 11,2228-11,2584 0,8*0,1*37=2,960 [B] A+B=5,680 [C] ZBV č. 46 pod HV 1,4*1,7=2,380 [A] propustek 2,5*0,7=1,750 [B] A+B=4,130 [C]												
32	452318510	Zajišťovací práh z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí	M3	9,950	9,950	0,000	8 203,04	81 620,25	0,00	0,00	81 620,25	0,00	0,00%
		Zajišťovací práh z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí na dně a ve svahu melioračních kanálů s patkami nebo bez patek											
		SoD *(0.5*0.8*2.5)*2+(0.3*0.8*2.5)*2+(0.5*1.8*2.5)*3 =9,950 [A]*											

Změnový soupis prací SO 102 po změně 20 pro ZBV 46

Evidenční číslo a název stavby: II/102 hr. hl. města Prahy-Štěchovice, rekonstrukce. ETAPA II
Číslo a název SO/PS: SO 102 - Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice
Číslo a název rozpočtu: SO 102 - Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)
102
Celkem

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
33	464511111	Pohoz z lomového kamene neupraveného tříděného z terénu	M3	3,000	4,450	1,450	3 481,56	10 444,68	-10 444,68	15 492,94	15 492,94	5 048,26	48,33%
		Pohoz dna nebo svahů jakékoliv tloušťky z lomového kamene neupraveného tříděného z terénu											
		SoD *5.0*3.0*0.2 Zpevnění dna toku pohozeným lomovým kamenem =3,000 [A]*											
		ZBV č. 39 *odpočet neprovádělo se* *-3,00=-3,00* *ZBV č. 46* *výměna trouby 1,5*2,5*(1+1,75)/2-3,14*0,3*0,3*2,5=4,450 [A]*											
	5	**Komunikace pozemní**											
34	564251111	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 150 mm	M2	63,750	63,750	0,000	152,90	9 747,38	0,00	0,00	9 747,38	0,00	0,00%
		Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP s rozprostřením, vlhčením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm											
		SoD *(0.5*2.5)*5+(0.3*2.5)*2 podsyp pod betonové prahy=7,750 [A]* *20.0*2.8 ŠP podsyp od propustkem=56,000 [B]* *Celkem: 7.75+56=63,750 [C]*											
35	564581111	Zřízení podsypu nebo podkladu ze sypaniny tl 300 mm	M2	6 552,000	6 552,000	0,000	154,21	1 010 383,92	0,00	0,00	1 010 383,92	0,00	0,00%
		Zřízení podsypu nebo podkladu ze sypaniny s rozprostřením, vlhčením, a zhutněním, po zhutnění tl. 300 mm											
		SoD *(910*3.6)*2 délka x šířka x dvakrát do tl. 600mm - úprava typu B2=6 552,000 [A]*											
36	564861113	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 220 mm	M2	17 520,100	17 910,100	390,000	215,26	3 771 376,73	0,00	83 951,40	3 855 328,13	83 951,40	2,23%
		Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 220 mm											
		SoD *11027*1.3 výměna celé konstrukce vozovky=14 335,100 [A]* *910*3.5 délka x šířka - úprava svahu typu B2=3 185,000 [B]* *Celkem: 14335.1+3185=17 520,100 [C]* *ZBV č. 20* *podklad ze ŠD v rozšíření* *1,9*60=114,00 [A]* *ZBV ZBV č. 27* *geodetický protokol Š II 51/2022 92,2 m2=92,200 [A]* *geodetický protokol Š II 58/2022 183,8 m2 =183,800 [B]* *A+B=276,000 [C]*											
37	564871111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm	M2	3 731,000	4 360,900	629,900	298,95	1 115 382,45	0,00	188 308,61	1 303 691,06	188 308,61	16,88%
		Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 250 mm											
		SoD *910*4.1 délka x šířka - polštář ze ŠD v min.tl.0,25m - úprava typu B2=3 731,000 [A]* *ZBV č. 42* *geodetický protokol Š II 14/2023 - rozšíření vozovky* *km 11,780-11,868 94,20=94,200 [A]* *km 11,881-11,909 23,50=23,500 [B]* *km 11,923-12,435 512,20=512,200 [C]* *A+B+C=629,900 [D]*											
38	564951413R	Recyklovaná směs (v mísícím centru) RS 0/32 C3/4 CA (TP 208), tl. 150 mm	M2	19 007,200	0,000	-19 007,200	174,41	3 315 045,75	-3 315 045,75	0,00	0,00	-3 315 045,75	-100,00%
		Podklad nebo podsyp z asfaltového recyklátu s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm											
		SoD *11027*1.15 výměna celé konstrukce vozovky=12 681,050 [A]* *5501*1.15 změna příčného sklonu=6 326,150 [B]* *Celkem: 12681.05+6326.15=19 007,200 [C]*											
		ZBV č. 23 *odpočet původního množství -19 007,20* *nahrazeno novou položkou č. 151*											

Změnový soupis prací SO 102 po změně 20 pro ZBV 46

Evidenční číslo a název stavby: II/102 hr. hl. města Prahy-Štěchovice, rekonstrukce. ETAPA II
Číslo a název SO/PS: SO 102 - Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice
Číslo a název rozpočtu: SO 102 - Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)
102
Celkem

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
39	565125000R	Asfaltová vrstva se zvýšenou odolností proti šíření trhlin SAL tl. 30 mm	M2	13 995,000	20 155,500	6 160,500	246,93	3 455 785,35	0,00	1 521 212,27	4 976 997,62	1 521 212,27	44,02%
		Asfaltová vrstva se zvýšenou odolností proti šíření trhlin SAL tl. 30 mm											
		SoD *13995 frézování v tl. 60mm=13 995,000 [A]* *ZBV č. 37* *vrstva SAL* *Geodetický protokol* *D 6/2020 505,00=505,000 [A]* *D 13/2020 1873,00=1 873,000 [B]* *Š II 60/2021 450,00=450,000 [C]* *Š II 78/2021 1562,30=1 562,300 [D]* *Š II 100/2021 2203,30=2 203,300 [E]* *Š II 15/2022 251,90=251,900 [F]* *Š II 49/2022 2175,00=2 175,000 [G]* *Š II 63/2022 143,30=143,300 [H]* *Š II 66/2022 1957,40=1 957,400 [I]* *Š II 10/2023 2982,70=2 982,700 [J]* *Š II 22/2023 827,40+467,80=1 295,200 [K]* *Š II 23/2023 1859,90=1 859,900 [L]* *Š II 25/2023 1414,50=1 414,500 [M]* *Š II 30/2023 1482,00=1 482,000 [N]* *odpočet původního množství -13995,00=-13 995,000 [O]* *Celkem A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O=6 160,500 [P]*											
40	565135111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š do 3 m	M2	18 180,800	18 882,900	702,100	235,41	4 279 942,13	0,00	165 281,36	4 445 223,49	165 281,36	3,86%
		Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm											
		SoD *11027*1.1 výměna celé konstrukce vozovky=12 129,700 [A]* *5501*1.1 frézování v tl. 150 mm - změna příčného sklonu=6 051,100 [B]* *Celkem: 12129.7+6051.1=18 180,800 [C]* *ZBV ZBV č. 12* *náhrada odvodňovacího proužku v místě nové opěrné zdi1300*0,5=650,000 [A]* *ZBV č. 21* *protokol Š II 100/2021 km 10,360-10,841 vpravo* *vrstva navíc 52,1=52,100 [A]*											
41	569851111	Zpevnění krajnic štěrkodrtí (recyklát) tl 150 mm	M2	3 435,000	3 558,000	123,000	402,88	1 383 892,80	0,00	49 554,24	1 433 447,04	49 554,24	3,58%
		Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění štěrkodrtí tl. 150 mm											
		SoD *4580*0.5*2*0.75 délka x šířka x obě strany - odhad 75%=3 435,000 [A]* *ZBV č. 45* *U Kiliána 123=123,000 [A]*											
130	572241112	Vyspravení výtluků asfaltovým betonem ACO (AB) tl do 60 mm při vyspravované ploše do 10% na 1 km	M2	2 034,900	2 034,900	0,000	362,06	736 755,89	0,00	0,00	736 755,89	0,00	0,00%
		Vyspravení výtluků materiálem na bázi asfaltu s řezáním, vysekáním, očištěním, zaplněním směsí a zhutněním asfaltovým betonem ACO (AB) při vyspravované ploše na 1 km komunikace do 10 % tl. přes 40 do 60 mm											
		SoD *(11027+13995+2160+5501+8015)*0.05 5% z plochy obrusné vrstvy=2 034,900 [A]*											
42	572531131	Oprava trhlin asfaltovou sanační hmotou š do 40 mm	M	6 674,400	6 674,400	0,000	128,96	860 730,62	0,00	0,00	860 730,62	0,00	0,00%
		Vyspravení trhlin dosavadního krytu asfaltovou sanační hmotou oprava trhlin šířky přes 30 do 40 mm											
		SoD *21600*1.03*0.3=6 674,400 [A]*											

Změnový soupis prací SO 102 po změně 20 pro ZBV 46													
Evidenční číslo a název stavby: II/102 hr. hl. města Prahy-Štěchovice, rekonstrukce. ETAPA II								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
Číslo a název SO/PS: SO 102 - Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice								102					
Číslo a název rozpočtu: SO 102 - Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice								Celkem					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
43	573191111	Nátěr infiltrační kationaktivní v množství emulzí 1 kg/m2	M2	38 153,750	38 803,750	650,000	28,06	1 070 594,23	0,00	18 239,00	1 088 833,23	18 239,00	1,70%
		Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1,00 kg/m2											
		SoD *11027*1.25 výměna celé konstrukce vozovky=13 783,750 [A]* *13995*1.25 frézování v tl. 60mm=17 493,750 [B]* *5501*1.25 frézování v tl. 150 mm při změně příčného sklonu=6 876,250 [C]* *Celkem: 13783.75+17493.75+6876.25=38 153,750 [D]* *ZBV ZBV č. 12* *náhrada odvodňovacího proužku v místě nové opěrné zdi1300*0,5=650,000 [A]*											
44	573231106	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze modif v množství 0,30 kg/m2	M2	40 367,809	47 238,609	6 870,800	12,24	494 101,98	0,00	84 098,59	578 200,57	84 098,59	17,02%
		Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,30 kg/m2											
		ZBV ZBV č. 10 *60,3 dle zaměření =60,300 [A]* *ZBV ZBV č. 12* *náhrada odvodňovacího proužku v místě nové opěrné zdi1300*0,5=650,000 [A]*											
		ZBV č. 37 *vrstva SAL* *dle pol. č. 565125000R* *6160,50 m2*											
45	573231113R	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze modif v množství 1,20 kg/m2	M2	41 348,000	41 554,400	206,400	30,47	1 259 873,56	0,00	6 289,01	1 266 162,57	6 289,01	0,50%
		Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,80 kg/m2											
		SoD *11027 výměna celé konstrukce vozovky=11 027,000 [A]* *1300*0.5 v odvodňovacím proužku v místě nové opěrné zdi=650,000 [B]* *13995 frézování v tl. 60mm=13 995,000 [C]* *2160 frézování tl. 100 mm=2 160,000 [D]* *5501+8015 frézování v tl. 150 mm=13 516,000 [E]* *Celkem: 11027+650+13995+2160+13516=41 348,000 [F]* *ZBV ZBV č. 10* *42,1 dle zaměření =42,100 [A]* *ZBV č. 21* *protokol Š II 100/21 km 10,360 -10,841 vpravo* *ACL 16 vyrovnávka tl. 60 mm.....164,3 m2 - přípočet (vrstva navíc)* *164,30=164,300 [A]*											
46	577134131	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu	M2	40 698,000	41 408,300	710,300	241,37	9 823 276,26	0,00	171 445,11	9 994 721,37	171 445,11	1,75%
		Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 40 mm											
		SoD *11027 výměna celé konstrukce vozovky=11 027,000 [A]* *13995 frézování v tl. 60mm=13 995,000 [B]* *2160 frézování tl. 100 mm=2 160,000 [C]* *5501+8015 frézování v tl. 150 mm 11027 při změně příčného sklonu=13 516,000 [D]* *Celkem: 11027+13995+2160+13516=40 698,000 [E]* *ZBV ZBV č. 10* *60,3 dle zaměření =60,300 [A]* *ZBV ZBV č. 12* *náhrada odvodňovacího proužku v místě nové opěrné zdi1300*0,5=650,000 [A]*											

Změnový soupis prací SO 102 po změně 20 pro ZBV 46

Evidenční číslo a název stavby: II/102 hr. hl. města Prahy-Štěchovice, rekonstrukce. ETAPA II
Číslo a název SO/PS: SO 102 - Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice
Číslo a název rozpočtu: SO 102 - Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)
102
Celkem

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
47	577155132	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu	M2	44 402,580	43 003,980	-1 398,600	327,65	14 548 505,34	-685 017,86	226 766,57	14 090 254,05	-458 251,29	-3,15%
		Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 60 mm											
		SoD *11027*1.01 výměna celé konstrukce vozovky=11 137,270 [A]* *13995*1.01 frézování v tl. 60mm=14 134,950 [B]* *2160*1.01 frézování tl. 100 mm=2 181,600 [C]* *(5501+8015)*1.01 frézování v tl. 150 mm 11137.27 při změně příčného sklonu=13 651,160 [D]* *(4580*0.40)*1.5 vyrovnávací vrstva - odhad 40 % délky x šířka=2 748,000 [E]* *183.2*3 délka příčné spáry x délka klínu=549,600 [F]* *Celkem: 11137.27+14134.95+2181.6+13651.16+2748+549.6=44 402,580 [G]* *ZBV ZBV č. 10* *42,1 dle zaměření =42,100 [A]* *ZBV ZBV č. 12* *náhrada odvodňovacího proužku v místě nové opěrné zdi1300*0,5=650,000 [A]* *ZBV č. 21* *protokol Š II 89/21 km 13,199 - 13,696 vlevo* *ACL 16 modif. prům tl. 84,1 mm -2255=-2 255,000 [A]* *protokol Š II 100/2021 km 10,360 -10,841 vpravo* *ACL 16 vyrovnávka tl. 60 mm (vrstva navíc) 164,3=164,300 [B]* *A+B=-2 090,700 [C]*											
48	578133131	Litý asfalt MA 11 IV tl 30 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu	M2	3 250,000	0,000	-3 250,000	518,12	1 683 890,00	-1 683 890,00	0,00	0,00	-1 683 890,00	-100,00%
		Litý asfalt MA 11 (LAS) s rozprostřením z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tl. 30 mm											
		SoD *1300*0.5*5 v odvodňovacím proužku v místě nové opěrné zdi x počet vrstev pro dosažení tl. 60+90=150mm=3 250,000 [A]* *ZBV ZBV č. 12* *odpočet dle SOD - proužek nahrazen konstrukčními vrstvami přilehlé vozovky - 3 250*											
49	594511111	Dlažba z lomového kamene s provedením lože z betonu	M2	5 226,400	5 436,800	210,400	2 927,76	15 301 644,86	-2 233 295,33	2 849 296,03	15 917 645,56	616 000,70	4,03%
		Dlažba nebo přídlažba z lomového kamene lomařsky upraveného rigolového v ploše vodorovné nebo ve sklonu tl. do 250 mm, bez vyplnění spár, s provedením lože tl. 50 mm z betonu											
		SoD *(2*4.5)+(4*3)+(4*1.7*3.0) odláždění šikmých čel u propustku v km 12,925 41.4 zpevnění stupňů u propustku =41,400 [A]* *970*3.0 odláždění svahu - úprava typu B1 - odhad prům.šířky=2 910,000 [B]* *910*2.5 obložení povrchu svahu s obalovanými čely - úprava typu B2 - odhad prům.šířky=2 275,000 [C]* *Celkem: 41.4+2910+2275=5 226,400 [D]* *ZBV č. 13* *dle geoetického zaměření* *Š II 37/2021 km 10,360 - 10,422 111,9 m2=111,900 [A]* *Š II 30/2021 km 10,422 - 10,454 48,7 m2=48,700 [B]* *Š II 34/2021 km 10,455 - 10,476 44,9 m2 =44,900 [C]* *Š II 30/2021 km 10,480 - 10,654 369,6 m2=369,600 [D]* *Š II 30/2021 km 10,706 - 10,730 41,4 m2=41,400 [E]* *Š II 38/2021 km 10,730 - 10,840 234,7 m2=234,700 [F]* *A+B+C+D+E+F=851,200 [G]*											

Změnový soupis prací SO 102 po změně 20 pro ZBV 46													
Evidenční číslo a název stavby: II/102 hr. hl. města Prahy-Štěchovice, rekonstrukce. ETAPA II Číslo a název SO/PS: SO 102 - Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice Číslo a název rozpočtu: SO 102 - Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS) 102 Celkem					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		ZBV č. 39 geodetické protokoly Š II 33/2021 km 13,150-13,190 vlevo 89,90=89,900 [A] Š II 10/2022 km 10,140-10,250 vlevo 191,10=191,100 [B] Š II 12/2022 km 10,001-10,101 vlevo 112,90=112,900 [C] Š II 16/2022 km 10,103-10,140 vlevo 63,0+55,20-77=41,200 [D] Š II 27/2022 km 11,430-11,520 vlevo 191,60=191,600 [E] Š II 35/2022 km 11,220-11,430 vlevo 67,90+268,30=336,200 [F] Š II 43/2022 km 11,520-11663 vlevo 303,20=303,200 [G] Š II 45/2022 km 11,140-11,220 vlevo 187,80=187,800 [H] Š II 47/2022 km 11,671-11,780 vlevo 215,0=215,000 [I] Š II 53/2022 km 14,462-14,580 vlevo 249,30=249,300 [J] Š II 62/2022 km 11,056-11,140 vlevo 214,20=214,200 [K] Š II 65/2022 km 11,340-11,400 vlevo 47,0+160,30=207,300 [L] Š II 1/2023 km 10,840-10947 vlevo 188,7=188,700 [M] Š II 4/2023 km 10,947-11,031 vlevo 165,60=165,600 [N] Š II 7/2023 km 11,976-12,440 vlevo 805,30=805,300 [O] Š II 8/2023 km 11,780-11,971 vlevo 231,10+1,70=232,800 [P] Š II 11/2023 km 14,410-14,460 vlevo 75,40+21,50=96,900 [Q] Š II 13/2023 km 14,425 vlevo 22,40=22,400 [R] Š II 16/2023 km 11,928-12,060 vpravo 279,5=279,500 [S] Š II 27/2023 km 11,733-11,832 vpravo 332,70=332,700 [T] celkem A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q+R+S+T=4 463,600 [U] odpočet původního množství -5226,4=-5 226,400 [V] celkem U+V=- 762,800 [W]												
		ZBV č. 42 geodetický protokol Š II 34/2023 km 11,904-11,930 25,10=25,100 [A] ZBV č. 43 dle pol. č. 451317777 90,90=90,90 ZBV č. 45 6m2											
50	596811221	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva vel do 0,25 m2 plochy do 100 m2	M2	60,000	105,000	45,000	396,53	23 791,80	0,00	17 843,85	41 635,65	17 843,85	75,00%
		Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikací pro pěší s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m s ložem z kameniva těženého tl. do 30 mm velikosti dlaždic přes 0,09 m2 do 0,25 m2, pro plochy přes 50 do 100 m2											
		ZBV č. 45 U Kiliána 45=45,000 [A]											
51	59245212	dlažba zámková profilová základní 19,6x16,1x6 cm přírodní	M2	12,000	61,500	49,500	237,30	2 847,60	0,00	11 746,35	14 593,95	11 746,35	412,50%
		dlažba zámková profilová základní 19,6x16,1x6 cm přírodní											
		SoD *60*0.20 cca 20 % nové dlažby při obnově chodníků, předpokládá se především využití stávající=12,000 [A]* *ZBV č. 45* *U Kiliána 45*1,1=49,500 [A]*											
	8	**Trubní vedení**											
56	592238200	vpusť betonová uliční TBV-Q 500/290 K /skruž/ 29x50x5 cm	KUS	2,000	5,000	3,000	609,76	1 219,52	0,00	1 829,28	3 048,80	1 829,28	150,00%
		vpusť betonová uliční /skruž/ 29x50x5 cm											
		ZBV č. 45 *U Kiliána 1=1,000 [A]* *km 11,687-11,720 1=1,000 [B]* *km 11,2228-11,2584 1=1,000 [C]* *A+B+C=3,000 [D]*											
57	592238210	vpusť betonová uliční TBV-Q 660/180 /prstenec/ 18x66x10 cm	KUS	2,000	2,000	0,000	676,46	1 352,92	0,00	0,00	1 352,92	0,00	0,00%
		vpusť betonová uliční prstenec 18x66x10 cm											

Změnový soupis prací SO 102 po změně 20 pro ZBV 46

Evidenční číslo a název stavby: II/102 hr. hl. města Prahy-Štěchovice, rekonstrukce. ETAPA II
Číslo a název SO/PS: SO 102 - Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice
Číslo a název rozpočtu: SO 102 - Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)
102
Celkem

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
55	592238230	vpusť betonová uliční TBV-Q 500/626 D /dno/ 62,6 x 49,5 x 5 cm	KUS	2,000	5,000	3,000	1 041,47	2 082,94	0,00	3 124,41	5 207,35	3 124,41	150,00%
		vpusť betonová uliční dno 62,6 x 49,5 x 5 cm											
		ZBV č. 45 *U Kiliána 1=1,000 [A]* *km 11,687-11,720 1=1,000 [B]* *km 11,2228-11,2584 1=1,000 [C]* *A+B+C=3,000 [E]*											
52	871315241	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC vícevrstvé tuhost třídy SN12 DN 150	M	20,000	20,000	0,000	1 295,34	25 906,80	0,00	0,00	25 906,80	0,00	0,00%
		Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného vícevrstvého, tuhost třídy SN 12 DN 150											
		*2*10 přípojky k novým UV - odhad=20,000 [A]*											
53	895931111	Vpusti kanalizačních horské z betonu prostého C12/15 velikosti 1200/600 mm	KUS	1,000	1,000	0,000	35 858,74	35 858,74	0,00	0,00	35 858,74	0,00	0,00%
		Vpusti kanalizační horské z betonu prostého tř. C 12/15 velikosti 1200/600 mm											
54	895941111	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální	KUS	2,000	2,000	0,000	6 416,78	12 833,56	0,00	0,00	12 833,56	0,00	0,00%
		Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální											
58	898121129	Sanace potrubí DN 600 polyuretanový nástřik tl.2,4 mm	M	32,000	32,000	0,000	5 181,24	165 799,68	0,00	0,00	165 799,68	0,00	0,00%
		Sanace vodovodního potrubí litinového, ocelového nebo betonového polyuretanový nástřik sanační tloušťka 2,4 mm DN 600											
		SoD *13+19 sanace propustků 32 vtok. objektů přespárováním v km 11,917 32 12,086=32,000 [A]*											
59	898161134	Sanace potrubí vložkování skelným rukávcem DN 1000 tl.8,0 mm	M	32,000	32,000	0,000	22 912,62	733 203,84	0,00	0,00	733 203,84	0,00	0,00%
		Sanace vodovodního potrubí litinového, ocelového nebo betonového vložkování stávajícího potrubí skelným rukávcem [UV-Liner] sanační tloušťky 8 mm DN 1000											
		SoD *13+19 sanace vyvložkováním propustků, příp.vtok.objektů, v km 11,917 32 12,086=32,000 [A]*											
60	899131115R	Bourání uličních vpustí kompletních	KUS	3,000	3,000	0,000	1 344,82	4 034,46	0,00	0,00	4 034,46	0,00	0,00%
		Výměna šachtového rámu [technologií Hermes] tř. D 400 včetně poklopu s osazením a dodáním nového rámu z litiny a betonu [typ BEGU]											
		SoD *2+1 vč. odvozu 3 uložení na skládku=3,000 [A]*											
	9	**Ostatní konstrukce a práce, bourání**											
67	40445158	sloupek silniční směrový plastový 1200mm	KUS	66,168	66,168	0,000	363,84	24 074,57	0,00	0,00	24 074,57	0,00	0,00%
69	40445175	odrazka na svodidla V.1.B	KUS	54,800	54,800	0,000	716,16	39 245,57	0,00	0,00	39 245,57	0,00	0,00%
		odrazka na svodidla V.1.B											
71	40445175a	odrazka na svodidla M.1.B	KUS	4,000	3,000	-1,000	941,84	3 767,36	-941,84	0,00	2 825,52	-941,84	-25,00%
		ZBV č. 44 *odpočet množství skutečnost* *-1=-1,000 [A]*											
73	404454040	značka dopravní svislá nereflexní FeZn prolis, 500 x 700 mm	KUS	1,000	1,000	0,000	1 306,83	1 306,83	0,00	0,00	1 306,83	0,00	0,00%
74	404454070	značka dopravní svislá nereflexní FeZn prolis, 1100 x 330 mm	KUS	2,000	2,000	0,000	1 862,95	3 725,90	0,00	0,00	3 725,90	0,00	0,00%
75	404454320	značka dopravní svislá nereflexní FeZn-Al rám., D 700 mm	KUS	2,000	2,000	0,000	1 377,06	2 754,12	0,00	0,00	2 754,12	0,00	0,00%
62	55391534	zábradelní systém Pz s výplní ze svislých ocelových tyčí ZSNH4/H2	M	10,000	0,000	-10,000	7 829,44	78 294,40	-78 294,40	0,00	0,00	-78 294,40	-100,00%
		ZBV č. 37 *neprovádělo se*											
93	59217031	obrubník betonový silniční 100 x 15 x 25 cm	M	46,000	104,100	58,100	135,29	6 223,34	0,00	7 860,35	14 083,69	7 860,35	126,30%
		ZBV č. 38 *podklad pod svodidla* *12*2=24* *ZBV č. 45* *U Kiliána 31*1,1=34,100 [A]*											
97	59222001	trouba hrdlová přímá železobetonová s integrovaným těsněním 60 x 250 x 10 cm	M	13,000	13,000	0,000	1 784,45	23 197,85	0,00	0,00	23 197,85	0,00	0,00%

Změnový soupis prací SO 102 po změně 20 pro ZBV 46

Evidenční číslo a název stavby: II/102 hr. hl. města Prahy-Štěchovice, rekonstrukce. ETAPA II
Číslo a název SO/PS: SO 102 - Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice
Číslo a název rozpočtu: SO 102 - Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)
102
Celkem

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
99	59222003	trouba hrdlová přímá železobetonová s integrovaným těsněním 100 x 250 x 13 cm	M	20,000	20,000	0,000	6 372,85	127 457,00	0,00	0,00	127 457,00	0,00	0,00%

Změnový soupis prací SO 102 po změně 20 pro ZBV 46

Evidenční číslo a název stavby: II/102 hr. hl. města Prahy-Štěchovice, rekonstrukce. ETAPA II
Číslo a název SO/PS: SO 102 - Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice
Číslo a název rozpočtu: SO 102 - Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)
102
Celkem

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
61	911121111	Montáž zábradlí ocelového přichyceného vruty do betonového podkladu	M	10,000	0,000	-10,000	863,54	8 635,40	-8 635,40	0,00	0,00	-8 635,40	-100,00%
		ZBV č. 37 *neprovádělo se*											
63	911331135	Svodidlo ocelové jednostranné zádržnosti H1 typ KB1 RH1 V se zaberaněním sloupků v rozmezí do 4 m	M	2 740,000	2 749,000	9,000	1 093,82	2 997 066,80	0,00	9 844,38	3 006 911,18	9 844,38	0,33%
		Silniční svodidlo s osazením sloupků zaberaněním ocelové úroveň zádržnosti H1 vzdálenosti sloupků přes 2 do 4 m jednostranné [KB1 RH1 V]											
		SoD *150+120+26+70 vpravo - dle situace + u benzinky=366,000 [A]* *2374 vlevo - výměna stávajícího svodidla=2 374,000 [B]* *Celkem: 366+2374=2 740,000 [C]* *ZBV č. 38* *geodetický protokol Š II 39/2023* *km 13,887-13,896 v pravo* *9=9*											
64	911381124	Silniční svodidlo betonové jednostranné průběžné délky 4 m výšky 1,2 m	M	48,000	208,000	160,000	5 181,24	248 699,52	0,00	828 998,40	1 077 697,92	828 998,40	333,33%
		SoD *24+24=48,000 [A]* *ZBV č. 38* *geodetický protokol Š II 39/2023* *km 13,764-13,888 vpravo 124 m* *km 13,895-13,979 vpravo 84 m* *124+84=208* *odpočet původního množství -48* *208-48=160,00*											
65	911381813	Odstranění silničního betonového svodidla délky 2 m výšky 1,0 m	M	24,000	24,000	0,000	2 302,78	55 266,72	0,00	0,00	55 266,72	0,00	0,00%
		Odstranění silničního betonového svodidla s naložením na dopravní prostředek délky 2 m, výšky 1,0 m											
		SoD *24 dle situace - bude nahrazeno novým beton. svodidlem=24,000 [A]*											
66	912211111	Montáž směrového sloupku silničního plastového prosté uložení bez betonového základu	KUS	66,240	66,240	0,000	276,33	18 304,10	0,00	0,00	18 304,10	0,00	0,00%
		Montáž směrového sloupku plastového s odrazkou prostým uložením bez betonového základu silničního											
		SoD *(2880/50)*1.15 km 11,700 - 14,580=66,240 [A]*											
68	912311111	Montáž odrazky na ocelové svodidlo	KUS	54,800	54,800	0,000	217,61	11 925,03	0,00	0,00	11 925,03	0,00	0,00%
		SoD *2740/50 délka svodidla dle pol. 911331135/odrazky po 50-ti metrech - jen na jedné straně silnice, na druhé straně budou směrové sloupky=54,800 [A]*											
70	912321111	Montáž odrazky na betonové svodidlo	KUS	4,000	0,000	-4,000	316,63	1 266,52	-1 266,52	0,00	0,00	-1 266,52	-100,00%
		ZBV č. 44 *odpočet množství skutečnost* *-4=-4,000 [A]*											
72	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	KUS	5,000	5,000	0,000	609,08	3 045,40	0,00	0,00	3 045,40	0,00	0,00%
		Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly											
		SoD *2+1+2 2 x Z4a 5 1 x IJ4c + B21a 5 B21b=5,000 [A]*											
76	914511111	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem	KUS	5,000	5,000	0,000	995,95	4 979,75	0,00	0,00	4 979,75	0,00	0,00%
		Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do betonového základu											
77	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou	KUS	7,000	6,000	-1,000	995,95	6 971,65	-995,95	0,00	5 975,70	-995,95	-14,29%
		ZBV č. 44 *odpočet množství skutečnost* *-1=-1,000 [A]*											
78	915111111	Vodorovné dopravní značení dělící čáry souvislé š 125 mm základní bílá barva	M	2 450,000	1 281,000	-1 169,000	13,24	32 438,00	-15 477,56	0,00	16 960,44	-15 477,56	-47,71%
		Vodorovné dopravní značení stříkané barvou dělící čára šířky 125 mm souvislá bílá základní											
		SoD *2450 V1a - dle situace=2 450,000 [A]*											

Změnový soupis prací SO 102 po změně 20 pro ZBV 46													
Evidenční číslo a název stavby: II/102 hr. hl. města Prahy-Štěchovice, rekonstrukce. ETAPA II Číslo a název SO/PS: SO 102 - Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice Číslo a název rozpočtu: SO 102 - Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS) 102 Celkem					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		ZBV č. 44 *odpočet množství skutečnost* *-1169=-1 169,000 [A]*											

Změnový soupis prací SO 102 po změně 20 pro ZBV 46													
Evidenční číslo a název stavby: II/102 hr. hl. města Prahy-Štěchovice, rekonstrukce. ETAPA II								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
Číslo a název SO/PS: SO 102 - Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice								102					
Číslo a název rozpočtu: SO 102 - Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice								Celkem					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
79	915111115	Vodorovné dopravní značení dělící čáry souvislé š 125 mm základní žlutá barva	M	137,000	0,000	-137,000	19,57	2 681,09	-2 681,09	0,00	0,00	-2 681,09	-100,00%
		Vodorovné dopravní značení stříkané barvou dělící čára šířky 125 mm souvislá žlutá základní											
		SoD *35+38+64 V11a (0,125) - dle situace=137,000 [A]* *ZBV č. 44* *odpočet množství skutečnost* *-137,0=-137,00 [A]*											
80	915111121	Vodorovné dopravní značení dělící čáry přerušované š 125 mm základní bílá barva	M	1 050,000	1 050,000	0,000	11,51	12 085,50	0,00	0,00	12 085,50	0,00	0,00%
		Vodorovné dopravní značení stříkané barvou dělící čára šířky 125 mm přerušovaná bílá základní											
		SoD *550 V2a (3/6/0,125) - dle situace=550,000 [A]* *450 V2b (3/1,5/0,125) - dle situace=450,000 [B]* *50 V2b (1,5/1,5/0,12) - dle situace=50,000 [C]* *Celkem: 550+450+50=1 050,000 [D]*											
81	915121111	Vodorovné dopravní značení vodící čáry souvislé š 250 mm základní bíllá barva	M	9 466,000	6 642,000	-2 824,000	23,03	218 001,98	-65 036,72	0,00	152 965,26	-65 036,72	-29,83%
		Vodorovné dopravní značení stříkané barvou vodící čára bílá šířky 250 mm souvislá základní											
		SoD *9466 V4 (0,25) - dle situace=9 466,000 [A]*											
		ZBV č. 44 *odpočet množství skutečnost* *-2824=-2824*											
82	915131111	Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly základní bílá barva	M2	116,750	109,750	-7,000	110,53	12 904,38	-773,71	0,00	12 130,67	-773,71	-6,00%
		Vodorovné dopravní značení stříkané barvou přechody pro chodce, šipky, symboly bílé základní											
		SoD *100 V13a - dle situace=100,000 [A]* *10*1.5 V9a - dle situace - 10 ks x plocha jedné šipky=15,000 [B]* *3.5*0.5 V5(0,5) - dle situace - STOP čára=1,750 [C]* *Celkem: 100+15+1.75=116,750 [D]* *ZBV č. 44* *odpočet množství skutečnost* *-7=-7*											
83	915131115	Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly základní žlutá barva	M2	18,000	0,000	-18,000	234,88	4 227,84	-4 227,84	0,00	0,00	-4 227,84	-100,00%
		Vodorovné dopravní značení stříkané barvou přechody pro chodce, šipky, symboly žluté základní											
		SoD *(3.0*1.0)*6 nápisy BUS - rozměry dle TZ x 6 kusů=18,000 [A]* *ZBV č. 44* *odpočet množství skutečnost* *-18=-18*											
84	915211112	Vodorovné dopravní značení dělící čáry souvislé š 125 mm retroreflexní bílý plast	M	2 450,000	2 450,000	0,000	39,15	95 917,50	0,00	0,00	95 917,50	0,00	0,00%
		Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem dělící čára šířky 125 mm souvislá bílá retroreflexní											
		SoD *2450 V1a - dle situace=2 450,000 [A]*											
85	915211116	Vodorovné dopravní značení dělící čáry souvislé š 125 mm retroreflexní žlutý plast	M	137,000	0,000	-137,000	55,27	7 571,99	-7 571,99	0,00	0,00	-7 571,99	-100,00%
		Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem dělící čára šířky 125 mm souvislá žlutá retroreflexní											
		SoD *35+38+64 V11a (0,125) - dle situace=137,000 [A]* *ZBV č. 44* *odpočet množství skutečnost* *-137=-137*											
86	915211122	Vodorovné dopravní značení dělící čáry přerušované š 125 mm retroreflexní bílý plast	M	1 050,000	1 050,000	0,000	39,15	41 107,50	0,00	0,00	41 107,50	0,00	0,00%
		Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem dělící čára šířky 125 mm přerušovaná bílá retroreflexní											

Změnový soupis prací SO 102 po změně 20 pro ZBV 46													
Evidenční číslo a název stavby: II/102 hr. hl. města Prahy-Štěchovice, rekonstrukce. ETAPA II Číslo a název SO/PS: SO 102 - Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice Číslo a název rozpočtu: SO 102 - Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS) 102 Celkem					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		SoD *550 V2a (3/6/0,125) - dle situace=550,000 [A]* *450 V2b (3/1,5/0,125) - dle situace=450,000 [B]* *50 V2b (1,5/1,5/0,12) - dle situace=50,000 [C]* *Celkem: 550+450+50=1 050,000 [D]*											

Změnový soupis prací SO 102 po změně 20 pro ZBV 46													
Evidenční číslo a název stavby: II/102 hr. hl. města Prahy-Štěchovice, rekonstrukce. ETAPA II								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
Číslo a název SO/PS: SO 102 - Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice								102					
Číslo a název rozpočtu: SO 102 - Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice								Celkem					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
87	915221112	Vodorovné dopravní značení vodící čáry souvislé š 250 mm retroreflexní bílý plast	M	9 466,000	9 160,000	-306,000	78,29	741 093,14	-23 956,74	0,00	717 136,40	-23 956,74	-3,23%
		Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem vodící čára bílá šířky 250 mm souvislá retroreflexní											
		SoD *9466 V4 (0,25) - dle situace=9 466,000 [A]* *ZBV č. 44* *odpočet množství skutečnost* *-306=-306*											
88	915231112	Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly retroreflexní bílý plast	M2	116,750	116,750	0,000	385,71	45 031,64	0,00	0,00	45 031,64	0,00	0,00%
		Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem přechody pro chodce, šipky, symboly nápisy bílé retroreflexní											
		SoD *100 V13a - dle situace=100,000 [A]* *10*1.5 V9a - dle situace - 10 ks x plocha jedné šipky=15,000 [B]* *3.5*0.5 V5(0,5) - dle situace - STOP čára=1,750 [C]* *Celkem: 100+15+1.75=116,750 [D]*											
89	915231116	Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly retroreflexní žlutý plast	M2	18,000	18,000	0,000	690,83	12 434,94	0,00	0,00	12 434,94	0,00	0,00%
		Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem přechody pro chodce, šipky, symboly nápisy žluté retroreflexní											
		SoD *(3.0*1.0)*6 nápisy BUS - rozměry dle TZ x 6 kusů=18,000 [A]*											
90	915611111	Předznačení vodorovného liniového značení	M	13 103,000	12 660,000	-443,000	2,88	37 736,64	-1 275,84	0,00	36 460,80	-1 275,84	-3,38%
		Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot liniové dělicí čáry, vodicí proužky											
		SoD *2450+137+1050+9466 dle pol. 915111111, 915111115, 915111121 13103 915121111=13 103,000 [A]* *ZBV č. 44* *odpočet množství skutečnost* *-443=-443*											
91	915621111	Předznačení vodorovného plošného značení	M2	134,750	134,750	0,000	6,91	931,12	0,00	0,00	931,12	0,00	0,00%
		Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot plošné šipky, symboly, nápisy											
		SoD *116.75+18 dle pol. 915131111 134.75 915131115=134,750 [A]*											
92	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	M	46,000	109,000	63,000	518,95	23 871,70	0,00	32 693,85	56 565,55	32 693,85	136,96%
		Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z betonu prostého téže značky											
		SoD *29+17 dle situace=46,000 [A]* *ZBV č. 45* *U Kiliána 31+2+30=63,000 [A]*											
94	919122122	Těsnění spár zálivkou za tepla pro komůrky š 15 mm hl 30 mm s těsnicím profilem	M	696,000	244,000	-452,000	116,82	81 306,72	-75 933,00	23 130,36	28 504,08	-52 802,64	-64,94%
		Utěsnění dilatačních spár zálivkou za tepla v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezního nátěru s těsnicím profilem pod zálivkou, pro komůrky šířky 15 mm, hloubky 30 mm											

Změnový soupis prací SO 102 po změně 20 pro ZBV 46													
Evidenční číslo a název stavby: II/102 hr. hl. města Prahy-Štěchovice, rekonstrukce. ETAPA II Číslo a název SO/PS: SO 102 - Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice Číslo a název rozpočtu: SO 102 - Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS) 102 Celkem					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		SoD *1300*0.5 v odvodňovacím proužku v místě nové opěrné zdi=650,000 [A]* *46 podél obrubníku=46,000 [B]* *Celkem: 650+46=696,000 [C]* *ZBV ZBV č. 12* *odpočet dle SOD - proužek nahrazen konstrukčními vrstvami přilehlé vozovkyč. 12 odpočet -650* *ZBV č. 45* *U Kilána 58=58,000 [A]* *km 11,687-11,720 2,0*(33+0,5)=67,000 [C]* *km 11,2228-11,2584 2,0*(36,0+0,5)=73,000 [B]* *A+B+C=198,000 [D]*												

Změnový soupis prací SO 102 po změně 20 pro ZBV 46

Evidenční číslo a název stavby: II/102 hr. hl. města Prahy-Štěchovice, rekonstrukce. ETAPA II
Číslo a název SO/PS: SO 102 - Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice
Číslo a název rozpočtu: SO 102 - Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)
102
Celkem

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
95	919131210R	Kotvení na povrchu z betonářské výztuže dl. do 3m	KUS	227,500	227,500	0,000	4 029,86	916 793,15	0,00	0,00	916 793,15	0,00	0,00%
		Vyztužení dilatačních spár v cementobetonovém krytu kotvami průměru 16 mm, délky 1 200 mm											
		SoD *910/1.0/4 kotvy po jednom metru, potřebná délka cca 600mm, tzn. jedna výztuž dl.3,0m rozdělená na čtvrtiny=227,500 [A]*											
96	919521140	Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo ŽB DN 600	M	13,000	13,000	0,000	3 333,04	43 329,52	0,00	0,00	43 329,52	0,00	0,00%
		Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo železobetonových DN 600 mm											
		SoD *13 v km 13,89=13,000 [A]*											
98	919521180	Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo ŽB DN 1000	M	20,000	20,000	0,000	5 724,70	114 494,00	0,00	0,00	114 494,00	0,00	0,00%
		Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo železobetonových DN 1000 mm											
		SoD *20 v km 12,925=20,000 [A]*											
100	919535558	Obetonování trubního propustku betonem prostým tř. C 20/25	M3	29,680	29,680	0,000	4 081,06	121 125,86	0,00	0,00	121 125,86	0,00	0,00%
		Obetonování trubního propustku betonem prostým bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25											
		SoD *(13*0.50)+(19*1.22) délka x plocha obetonování v řezu =29,680 [A]*											
101	919716111	Výztuž cementobetonového krytu ze svařovaných sítí KARI hmotnosti do 7,5 kg/m2	T	0,077	0,077	0,000	32 954,10	2 537,47	0,00	0,00	2 537,47	0,00	0,00%
		Ocelová výztuž cementobetonového krytu ze svařovaných sítí KARI hmotnosti do 7,5 kg/m2											
		SoD *((1.7*3.0)*7.5*2)*0.001 vyztužení betonového lože dle v.č. 5=0,077 [A]*											
102	919721101	Geomříž pro stabilizaci podkladu tkaná z PP podélná pevnost v tahu do 50 kN/m	M2	3 185,000	3 185,000	0,000	176,12	560 942,20	0,00	0,00	560 942,20	0,00	0,00%
		Geomříž pro stabilizaci podkladu tkaná z polyesteru, podélná pevnost v tahu do 50 kN/m											
		SoD *910*3.5 délka x šířka - úprava svahu typu B2=3 185,000 [A]*											
103	919721202	Geomříž pro vyztužení asfaltového povrchu z PP s geotextilií	M2	40 698,000	40 698,000	0,000	102,22	4 160 149,56	0,00	0,00	4 160 149,56	0,00	0,00%
		Geomříž pro vyztužení asfaltového povrchu z polypropylénu s geotextilií											
		SoD *11027 bouraná vozovka v celé tloušťce =11 027,000 [A]* *13995+5501+8015+2160 frézování v různých tloušťkách=29 671,000 [B]* *Celkem: 11027+29671=40 698,000 [C]*											
104	919732221	Styčná spára napojení nového živičného povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm bez prořezání	M	4 826,200	5 068,200	242,000	116,82	563 796,68	0,00	28 270,44	592 067,12	28 270,44	5,01%
		Styčná pracovní spára při napojení nového živičného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm bez prořezání spáry											
		SoD *(55+8) řezání v napojeních na vedl.ulice + na ZÚ 63 na KÚ - při napojování vrstev=63,000 [A]* *4580 podélná spára=4 580,000 [B]* *(4580/200)*8.0 příčné spáry - předpoklad stavebních úseků po 200 m=183,200 [C]* *Celkem: 63+4580+183.2=4 826,200 [D]* *ZBV ZBV č. 10* *33,0 + 2*0,5 dle zaměření km 10,250 - 10,283 =34,000 [A]* *ZBV č. 38* *nové betonové svodidlo 208*											

Změnový soupis prací SO 102 po změně 20 pro ZBV 46													
Evidenční číslo a název stavby: II/102 hr. hl. města Prahy-Štěchovice, rekonstrukce. ETAPA II								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
Číslo a název SO/PS: SO 102 - Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice								102					
Číslo a název rozpočtu: SO 102 - Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice								Celkem					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
105	919735113	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 150 mm	M	5 585,200	5 133,200	-452,000	130,38	728 198,38	-84 747,00	25 815,24	669 266,62	-58 931,76	-8,09%
		Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm											
		SoD *(55+8)*2 řezání v napojeních na vedl.ulice + na ZÚ 126 na KÚ - při frézování 126 při napojování vrstev=126,000 [A]* *46 podél obrubníku=46,000 [B]* *4580 podélná spára=4 580,000 [C]* *(4580/200)*8.0 příčné spáry - předpoklad stavebních úseků po 200 m=183,200 [D]* *650 v odvodňovacím proužku v místě nové opěrné zdi=650,000 [E]* *Celkem: 126+46+4580+183.2+650=5 585,200 [F]* *ZBV č. 12* *odpočet -650* *ZBV č. 45* *U Kiliána 58=58,000 [A]* *km 11,687-11,720 (33+0,5)*2=67,000 [B]* *km 11,2228-11,2584 (36+0,5)*2=73,000 [C]* *A+B+C=198,000 [D]*											
106	938902113	Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosu do 0,5 m3/m	M	2 290,000	2 290,000	0,000	95,49	218 672,10	0,00	0,00	218 672,10	0,00	0,00%
		Profilace a čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem s odstraněním travnatého porostu nebo nánosu, s úpravou dna a svahů do předepsaného profilu a s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m nezpevněných nebo zpevněných objemu nánosu přes 0,30 do 0,50 m3/m											
		SoD *4580/2 odhad půlka trasy=2 290,000 [A]*											
107	938902462	Čištění propustků ručně D do 1000 mm při tl nánosu do 50% DN	M	32,000	32,000	0,000	481,28	15 400,96	0,00	0,00	15 400,96	0,00	0,00%
		Čištění propustků s odstraněním travnatého porostu nebo nánosu, s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m ručně tloušťky nánosu přes 25 do 50% průměru propustku přes 500 do 1000 mm											
		SoD *8 propust v km 12,068 - větší délka než 8 m musí být v příplatku - dle pol. 938902499=8,000 [A]* *8 propust v km 11,917 - větší délka než 8 m musí být v příplatku - dle pol. 938902499=8,000 [B]* *2*8 čištění přípojek v km 11,612 8 11,262 u výměny UV=16,000 [C]* *Celkem: 8+8+16=32,000 [D]*											
108	938902499	Příplatek k čištění propustků delších než 8 m za každý další 1 m délky	M	16,000	16,000	0,000	96,26	1 540,16	0,00	0,00	1 540,16	0,00	0,00%
		Čištění propustků s odstraněním travnatého porostu nebo nánosu, s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m Příplatek k cenám za délku propustku přes 8 m za každý další 1 m											
		SoD *(19-8)+(13-8) =16,000 [A]*											
109	938902500R	Čištění stávajících uličních vpustí	KUS	43,000	43,000	0,000	2 562,99	110 208,57	0,00	0,00	110 208,57	0,00	0,00%
		SoD *7*2 7 kusů dvojitých horských vpustí dle situace=14,000 [A]* *29 UV dle situace=29,000 [B]* *Celkem: 14+29=43,000 [C]*											
110	938909331	Čištění vozovek metením ručně podkladu nebo krytu betonového nebo živičného	M2	29 671,000	29 731,300	60,300	3,65	108 299,15	0,00	220,09	108 519,24	220,09	0,20%
		Čištění vozovek metením bláta, prachu nebo hlinitého nánosu s odklizením na hromady na vzdálenost do 20 m nebo naložením na dopravní prostředek ručně povrchu podkladu nebo krytu betonového nebo živičného											
		SoD *13995+(5501+8015)+2160 po frézování asf. krytu 29671 CB konstrukce=29 671,000 [A]* *ZBV ZBV č. 10* *60,3 dle zaměření =60,300 [A]*											
111	938909612	Odstranění nánosu na krajnicích tl do 200 mm	M2	4 580,000	4 580,000	0,000	376,22	1 723 087,60	0,00	0,00	1 723 087,60	0,00	0,00%
		Čištění krajnic odstraněním nánosu (ulehlého, popř. zaježděného) naneseného vlivem silničního provozu, s přemístěním na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ale bez složení průměrné tloušťky přes 100 do 200 mm											
		SoD *4580*0.5*2=4 580,000 [A]*											

Změnový soupis prací SO 102 po změně 20 pro ZBV 46

Evidenční číslo a název stavby: II/102 hr. hl. města Prahy-Štěchovice, rekonstrukce. ETAPA II
Číslo a název SO/PS: SO 102 - Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice
Číslo a název rozpočtu: SO 102 - Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)
102
Celkem

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
112	966005311	Rozebrání a odstranění silničního svodidla s jednou pásnicí	M	2 444,000	4 393,000	1 949,000	291,03	711 277,32	0,00	567 217,47	1 278 494,79	567 217,47	79,75%
		Rozebrání a odstranění silničního zábradlí a ocelových svodidel s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 10 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásypem jam po odstraněných sloupcích a s jeho zhutněním svodidla včetně sloupků, s jednou pásnicí silničního											
		SoD *2374 VLEVO=2 374,000 [A]* *70 vpravo v km 14,3 u benzinky=70,000 [B]* *Celkem: 2374+70=2 444,000 [C]* *ZBV č. 15* *dle geodetického protokolu č. Š II 3/2022* *km 13,196-13,596 400=400,000 [A]* *ZBV. Č. 43* *geodetický protokol Š II 35/2023* *vlevo celkem 3233=3 233,000 [A]* *vpravo celkem 760=760,000 [B]* *odpočet původního množství -2444=-2 444,000 [C]* *A+B+C=1 549,000 [D]*											
113	966006132	Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami	KUS	10,000	0,000	-10,000	1 727,08	17 270,80	-17 270,80	0,00	0,00	-17 270,80	-100,00%
		Odstranění dopravních nebo orientačních značek se sloupkem s uložením hmot na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásypem jam a jeho zhutněním s betonovou patkou											
		SoD *2 dle situace vč. sloupků=2,000 [A]* *6+2 odstranění stáv. značek s ponecháním na místě - nově zabudovat do římsy dle SO 253=8,000 [B]* *Celkem: 2+8=10,000 [C]* *ZBV č. 44* *odpočet množství skutečnost* *-10=-10*											
114	966006211	Odstranění svislých dopravních značek ze sloupů, sloupků nebo konzol	KUS	2,000	0,000	-2,000	103,62	207,24	-207,24	0,00	0,00	-207,24	-100,00%
		Odstranění (demontáž) svislých dopravních značek s odklizením materiálu na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ze sloupů, sloupků nebo konzol											
		ZBV č. 44 *odpočet množství skutečnost* *-2=-2*											
115	966008113	Bourání trubního propustku do DN 800	M	13,000	13,000	0,000	1 135,27	14 758,51	0,00	0,00	14 758,51	0,00	0,00%
		Bourání trubního propustku s odklizením a uložením vybouraného materiálu na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z trub DN přes 500 do 800 mm											
		13 v km 13,890 výměna trubního propustku DN 600=13,000 [A]											
116	966008116R	Bourání trubního propustku do DN 1200	M	15,000	15,000	0,000	1 892,11	28 381,65	0,00	0,00	28 381,65	0,00	0,00%
		Bourání trubního propustku s odklizením a uložením vybouraného materiálu na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z trub DN přes 800 do 1200 mm											
		15 km 12,925 vpravo - bourání kamenného propustku se ŽB deskou vč.zemních prací, bude nahrazen trubním prop. DN 1000 se šikmými čely=15,000 [A]											
117	977141132	Vrty pro kotvy do betonu průměru 32 mm hloubky 220 mm s vyplněním epoxidovým tmelem	KUS	7,000	7,000	0,000	287,85	2 014,95	0,00	0,00	2 014,95	0,00	0,00%
		Vrty pro kotvy do betonu s vyplněním epoxidovým tmelem, průměru 32 mm, hloubky 220 mm											
118	979071121	Očištění dlažebních kostek drobných s původním spárováním kamenivem těženým	M2	10,000	110,900	100,900	84,40	844,00	0,00	8 515,96	9 359,96	8 515,96	1009,00%
		Očištění vybouraných dlažebních kostek od spojovacího materiálu, s uložením očištěných kostek na skládku, s odklizením odpadových hmot na hromady a s odklizením vybouraných kostek na vzdálenost do 3 m drobných, s původním vyplněním spár kamenivem těženým											
		SoD *10 dlažba z chodníku na ZÚ=10,000 [A]* *ZBV č. 15* *dle geodetického protokolu č. Š II 3/2022* *km 13,2-13,7 100,9=100,900 [A]*											

Změnový soupis prací SO 102 po změně 20 pro ZBV 46

Evidenční číslo a název stavby: II/102 hr. hl. města Prahy-Štěchovice, rekonstrukce. ETAPA II
Číslo a název SO/PS: SO 102 - Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice
Číslo a název rozpočtu: SO 102 - Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)
102
Celkem

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	997	**Přesun sutě**											
119	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	T	3 197,830	4 180,677	982,847	13,82	44 194,01	0,00	13 582,95	57 776,96	13 582,95	30,73%
		Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km											
		SoD *3197.83=3 197,830 [A]* *ZBV ZBV č. 27* *geodetický protokol Š II 51/2022 92,2 m2=92,200 [A]* *geodetický protokol Š II 58/2022 183,8 m2 =183,800 [B]* *dle pol. č. 153 výměna podloží 60% z celkového množství 276 m2, tl. 20-30 cm* *(276*0,6)*0,25*2=82,8 [C]* *(A+B)*0,22*2,0+82,8=204,24 [D]* *ZBV č. 38* *dle pol. č. 113107223 a 132151101* *325,5*(0,25+0,3)/2*1,9+0,9*1,9=171,784* *ZBV č. 41* *(574,1*0,04+327,1*0,05+2818,2*0,1-675,1*0,2)*2,5=465,298 [A]* *ZBV č. 45* *U Kiliána* *153*0,15*2,5=57,375 [A]* *153*0,25*2,2=84,150 [B]* *A+B=141,525 [D]*											
120	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	T	2 494,356	2 494,356	0,000	13,82	34 472,00	0,00	0,00	34 472,00	0,00	0,00%
		Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km											
		SoD *741.96+4.128+0.688+593.42+1154.16=2 494,356 [A]*											
121	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	T	79 690,604	93 450,462	13 759,858	7,03	560 224,95	0,00	96 731,80	656 956,75	96 731,80	17,27%
		Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km											
		SoD *(3197.83+2494.356)*14 celková vzdálenost odvozu 15 km =79 690,604 [A]* *ZBV ZBV č. 27* *dle pol. č. 997221551* *204,24*14=2859,36 [A]* *ZBV č. 38* *dle pol. č. 997221551* *171,784*14=2404,976* *ZBV č. 41* *dle pol .č. 997221551* *465,298*14=6 514,172 [A]* *ZBV č. 45* *U Kiliána dle pol. č. 997221551 141,525*14=1 981,350 [A]*											
122	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	T	11 138,845	11 239,165	100,320	27,06	301 417,15	0,00	2 714,66	304 131,81	2 714,66	0,90%
		Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km											
		SoD *2646.48+1441.485+1411.456+5639.424=11 138,845 [A]* *ZBV č. 38* *svodidlo (36+48+48)*0,76=100,32*											

Změnový soupis prací SO 102 po změně 20 pro ZBV 46

Evidenční číslo a název stavby: II/102 hr. hl. města Prahy-Štěchovice, rekonstrukce. ETAPA II
Číslo a název SO/PS: SO 102 - Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice
Číslo a název rozpočtu: SO 102 - Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)
102
Celkem

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
123	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	T	155 943,830	156 837,590	893,760	0,58	90 447,42	0,00	518,38	90 965,80	518,38	0,57%
		Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km											
		SoD *11138.845*14 celkem vzdálenost skládky 15 km - odhad=155 943,830 [A]* *ZBV č. 38* *dle pol. č. 997221561* *63,84*14=893,76*											
124	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	T	310,867	6 945,525	6 634,658	51,81	16 106,02	0,00	343 741,63	359 847,65	343 741,63	2134,24%
		Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km											
		11.75+15.6+18.04+21.072+170.268+0.172+26.715+45.9 +1.35=310,867 [A] *ZBV č. 13* *dle pol. 114203103 297,85*2,6=774,410 [A]* *ZBV č. 15* *žlab 69,4*0,134=9,300 [A]* *podkla. beton (69,4+100,9)*0,24=40,872 [B]* *svodidlo 400*0,042=16,800 [C]* *A+B+C=66,972 [D]* *ZBV ZBV č. 27* *geodetický protokol Š II 51/2022 92,2 m2=92,200 [A]* *geodetický protokol Š II 58/2022 183,8 m2 =183,800 [B]* *(A+B)*0,15*2,3=95,220 [C]* *ZBV č. 39* *dle pol. 114203102 1562,26*2,6=4061,876 [A]* *ZBV č. 41* *(8843,28*0,04 8296,4*0,05+14097,1*0,1)*2,2=1 608,549[A]*											

Změnový soupis prací SO 102 po změně 20 pro ZBV 46

Evidenční číslo a název stavby: II/102 hr. hl. města Prahy-Štěchovice, rekonstrukce. ETAPA II
Číslo a název SO/PS: SO 102 - Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice
Číslo a název rozpočtu: SO 102 - Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)
102
Celkem

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		ZBV č. 42 *odbourání původní zdi propustku* *geodetický protokol Š II 18/2023* *vpravo 3,26=3,260 [A]* *vlevo 2,70=2,700 [B]* *(A+B)*2,2=13,112 [C]*											
		ZBV č. 45 *km 11,687-11,720 2,0*3,0*0,2=1,200 [A]* *km 11,2228-11,2584 2,0*3,0*0,2=1,200 [B]* *(A+B)*2,2=5,280 [C]* *ZBV č. 46* *HV, trouba, skruž 2,5*0,7+5,5692+1,92=9,239 [A]*											
125	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	T	4 352,138	97 237,045	92 884,907	5,76	25 068,31	0,00	535 017,06	560 085,37	535 017,06	2134,24%
		Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km											
		SoD *310.867*14 celkem vzdálenost skládky 15 km - odhad=4 352,138 [A]* *ZBV č. 13* *do vzdálenosti 15 km* *dle pol. 114203103 297,85*2,6*14=10 841,740 [A]* *ZBV č. 15* *do vzdálenosti 15 km* *dle pol č. 997221571* *66,972*14=937,608 [A]* *ZBV ZBV č. 27* *dle pol. č. 997221571* *95,22*14=1 333,080 [A]* *ZBV č. 39* *dlle pol. č. 997221571* *4061,876*14=56866,264 [A]* *ZBV č. 41* *dle pol. č. 997221571* *1608,527*14=22 519,378 [A]*											

Změnový soupis prací SO 102 po změně 20 pro ZBV 46													
Evidenční číslo a název stavby: II/102 hr. hl. města Prahy-Štěchovice, rekonstrukce. ETAPA II Číslo a název SO/PS: SO 102 - Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice Číslo a název rozpočtu: SO 102 - Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS) 102 Celkem					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		ZBV č. 42 *dle pol. č. 997221571* *13,112*14=183,568 [A]* *ZBV č. 45* *dle pol. č. 99722157 5,28*14=73,920 [A]* *ZBV č. 46* *dle pol. č. 997221571 9,239*14=129,346 [A]*											
126	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	T	10 352,419	10 673,432	321,013	34,54	357 572,55	0,00	11 087,79	368 660,34	11 087,79	3,10%
		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) betonového											
		SoD *310.867-170.268 dle pol. 997221571 - odečet ocelového svodidla dle pol. 966005311=140,599 [A]* *10211.82 dle pol. 997221561=10 211,820 [B]* *Celkem: 140.599+10211.82=10 352,419 [C]* *ZBV č. 15* *dle pol č. 997221571* *50,172=50,172 [A]* *ZBV ZBV č. 27* *dle pol. č. 9777221571* *95,22=95,220 [A]* *ZBV č. 38* *svodidlo (36+48)*0,76=63,84* *ZBV č. 42* *dle pol. č. 997221571* *13,112=13,112 [A]* *ZBV č. 45* *U Kiliána 153*0,25*2,2=84,150 [A]* *dle pol. č. 99722157 5,28=5,280 [B]* *A+B=89,43 [D]* *ZBV č. 46* *dle pol. č. 997221815 9,239*											
127	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	T	3 197,830	4 348,264	1 150,43	34,54	110 453,05	0,00	39 735,99	150 189,04	39 735,99	100,00%
		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z kameniva											
		SoD *3197.83 dle pol. 997221551=3 197,830 [A]* *ZBV č. 13* *dle pol. 114203103 297,85*2,6=774,410 [A]* *ZBV ZBV č. 27* *dle pol. č. 997221551* *204,24=204,24 [A]* *ZBV č. 38* *dle pol. č. 997111551* *171,784=171,784*											

Změnový soupis prací SO 102 po změně 20 pro ZBV 46

Evidenční číslo a název stavby: II/102 hr. hl. města Prahy-Štěchovice, rekonstrukce. ETAPA II
Číslo a název SO/PS: SO 102 - Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice
Číslo a název rozpočtu: SO 102 - Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)
102
Celkem

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	998	**Přesun hmot**											
128	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	T	5 047,476	5 850,048	802,57	147,76	745 815,05	0,00	118 588,04	864 403,09	118 588,04	100,00%
		Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu											
		ZBV č. 13 *dle pol. 594511111 851,2*0,614=522,637 [A]* *ZBV č. 15* *dle geodetického protokolu č. Š II 3/2022* *km 13,2-13,7* *žlaby 69,4*0,134=9,300 [A]* *ZBV č. 38* *svodidlo160*0,76=121,6* *dlažba 15*0,101=1,515* *palisáda 75*0,6702=50,265* *celkem 121,60+1,515+50,265=173,38* *ZBV č. 42* *dle pol. 594511111 25,10*0,614=15,411 [A]* *ZBV č. 43* *dle pol. 594511111 90,90*0,614=55,813 [A]* *ZBV č. 45* *45*0,161+33*0,102+30*0,011+(29+33+36)*0,0735+3*0,101+3*0,058=18,621 [A]* *ZBV č. 46* *6+1,41=7,410 [A]*											
129	998225194	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živičným, betonovým do 5000 m	T	5 047,476	5 850,048	802,57	29,55	149 152,92	0,00	23 716,00	172 868,92	23 716,00	100,00%
		Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 5000 m											
		ZBV č. 13 dle pol. 998225111 851,2*0,614=522,637 [A] ZBV č. 15 dle geodetického protokolu č. Š II 3/2022 km 13,2-13,7 žlaby 69,4*0,134=9,300 [A] ZBV č. 38 dle pol. č. 998225111 173,38=173,38 ZBV č. 42 dle pol. 594511111 25,10*0,614=15,411 [A] ZBV č. 43 dle pol. 594511111 90,90*0,614=55,813 [A] ZBV č.45 dle pol. č. 998225111 18,621=18,621 ZBV č. 46 6+1,41=7,410 [A]											

Změnový soupis prací SO 102 po změně 20 pro ZBV 46

Evidenční číslo a název stavby: II/102 hr. hl. města Prahy-Štěchovice, rekonstrukce. ETAPA II
Číslo a název SO/PS: SO 102 - Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice
Číslo a název rozpočtu: SO 102 - Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)
102
Celkem

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		NOVÉ POLOŽKY											
130	12002000	Geodetické práce - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ	KČ	0,000	87 170,14	87 170,137	1,00	0,00	0,00	87 170,14	87 170,14	87 170,14	100,00%
		Cena položky dle kompletní položky z SO 000, tj. 0,5 % z hodnoty prací											
		"ZBV ZBV č. 10 217,26=217,260 [A] ZBV ZBV č. 13 19214,04=19 214,040 [A]" ZBV č. 15 3566,36=3566,36 ZBV č. 20 1048,17=1048,17 ZBV č. 27 2188,111=2188,111 ZBV č. 38 7717,175=7717,175 ZBV č. 39 26 386,609=26 386,609 ZBV č. 42 15 309,005=15 309,005 ZBV č. 43 4249,087=4249,087 ZBV č. 45 5694,21=5694,21 ZBV č. 46 1580,109=1580,109											
131	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm	M	0,000	34,000	34,00	81,10	0,00	0,00	2 757,40	2 757,40	2 757,40	100,00%
		Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm											
		ZBV ZBV č. 10 *33,0 + 2*0,5 dle zaměření km 10,250 - 10,283 =34,000 [A]*											

Změnový soupis prací SO 102 po změně 20 pro ZBV 46													
Evidenční číslo a název stavby: II/102 hr. hl. města Prahy-Štěchovice, rekonstrukce. ETAPA II								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
Číslo a název SO/PS: SO 102 - Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice								102					
Číslo a název rozpočtu: SO 102 - Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice								Celkem					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
132	111301111	SEJMUTÍ DRNU	M2	0,000	5 400,600	5 400,600	44,17	0,00	0,00	238 544,50	238 544,50	238 544,50	100,00%
		Cena položky dle SoD SO 901 pol. 11											
		ZBV č. 13 Nánosy na stávajícícm svahu, dle zaměření 937 m2=937,000 [A] ZBV č. 39 geodetické protokoly Š II 33/2021 km 13,150-13,190 vlevo 89,90=89,900 [A] Š II 10/2022 km 10,140-10,250 vlevo 191,10=191,100 [B] Š II 12/2022 km 10,001-10,101 vlevo 112,90=112,900 [C] Š II 16/2022 km 10,103-10,140 vlevo 63,0+55,20-77=41,200 [D] Š II 27/2022 km 11,430-11,520 vlevo 191,60=191,600 [E] Š II 35/2022 km 11,220-11,430 vlevo 67,90+268,30=336,200 [F] Š II 43/2022 km 11,520-11663 vlevo 303,20=303,200 [G] Š II 45/2022 km 11,140-11,220 vlevo 187,80=187,800 [H] Š II 47/2022 km 11,671-11,780 vlevo 215,0=215,000 [I] Š II 53/2022 km 14,462-14,580 vlevo 249,30=249,300 [J] Š II 62/2022 km 11,056-11,140 vlevo 214,20=214,200 [K] Š II 65/2022 km 11,340-11,400 vlevo 47,0+160,30=207,300 [L] Š II 1/2023 km 10,840-10947 vlevo 188,7 =188,7 [V] Š II 4/2023 km 10,947-11,031 vlevo 165,60=165,600 [M] Š II 7/2023 km 11,976-12,440 vlevo 805,30=805,300 [N] Š II 8/2023 km 11,780-11,971 vlevo 231,10+1,70=232,800 [O] Š II 11/2023 km 14,410-14,460 vlevo 75,40+21,50=96,900 [P] Š II 13/2023 km 14,425 vlevo 22,40=22,400 [Q] Š II 16/2023 km 11,928-12,060 vpravo 279,50=279,500 [R] Š II 27/2023 km 11,733-11,832 vpravo 332,70=332,700 [S] celkem A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q+R+S+V=4463,60 [T]											
133	114203102	Rozebrání dlažeb z lomového kamene nebo betonových tvárnic nasucho se zalitými spárami cementovou maltou	M3	0,000	1 860,110	1 860,110	763,00	0,00	0,00	1 419 263,94	1 419 263,94	1 419 263,94	100,00%
		Cena položky dle ÚRS 2021 02											
		ZBV č. 13 851*0,35=297,850 [A]											
		ZBV č. 39 geodetické protokoly Š II 33/2021 km 13,150-13,190 vlevo 89,90=89,900 [A] Š II 10/2022 km 10,140-10,250 vlevo 191,10=191,100 [B] Š II 12/2022 km 10,001-10,101 vlevo 112,90=112,900 [C] Š II 16/2022 km 10,103-10,140 vlevo 63,0+55,20-77=41,200 [D] Š II 27/2022 km 11,430-11,520 vlevo 191,60=191,600 [E] Š II 35/2022 km 11,220-11,430 vlevo 67,90+268,30=336,200 [F] Š II 43/2022 km 11,520-11663 vlevo 303,20=303,200 [G] Š II 45/2022 km 11,140-11,220 vlevo 187,80=187,800 [H] Š II 47/2022 km 11,671-11,780 vlevo 215,0=215,000 [I] Š II 53/2022 km 14,462-14,580 vlevo 249,30=249,300 [J] Š II 62/2022 km 11,056-11,140 vlevo 214,20=214,200 [K] Š II 65/2022 km 11,340-11,400 vlevo 47,0+160,30=207,300 [L] Š II 1/2023 km 10,840-10947 vlevo 188,7 =188,7 [V] Š II 4/2023 km 10,947-11,031 vlevo 165,60=165,600 [M] Š II 7/2023 km 11,976-12,440 vlevo 805,30=805,300 [N] Š II 8/2023 km 11,780-11,971 vlevo 231,10+1,70=232,800 [O] Š II 11/2023 km 14,410-14,460 vlevo 75,40+21,50=96,900 [P] Š II 13/2023 km 14,425 vlevo 22,40=22,400 [Q] Š II 16/2023 km 11,928-12,060 vpravo 279,50=279,500 [R] Š II 27/2023 km 11,733-11,832 vpravo 332,70=332,700 [S] celkem A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q+R+S+V=4463,60 [T] 4463,60*0,35=1 562,26[W]											
134	153311212	Zřízení armování svahů, násypů a opěrných stěn vrstvou z geomříže tuhé sklonu přes 1:2 do 1:1	M2	0,000	936,000	936,000	74,90	0,00	0,00	70 106,40	70 106,40	70 106,40	100,00%
		Cena položky dle ÚRS 2021 02											

Změnový soupis prací SO 102 po změně 20 pro ZBV 46													
Evidenční číslo a název stavby: II/102 hr. hl. města Prahy-Štěchovice, rekonstrukce. ETAPA II Číslo a název SO/PS: SO 102 - Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice Číslo a název rozpočtu: SO 102 - Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS) 102 Celkem					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		ZBV č. 13 Požadavek Povodí Vltavy z 6.4.2021 vyztužení svahu v km 10,381 - 10,420 vlevo vyztužení svahu 6 vrstvami geomříže prům. šířky 3,5 m + 0,5 přesah na zajištění v úseku svahu délky 39 m 6*(3,5+0,5)*39=936,000 [A]											

Změnový soupis prací SO 102 po změně 20 pro ZBV 46													
Evidenční číslo a název stavby: II/102 hr. hl. města Prahy-Štěchovice, rekonstrukce. ETAPA II								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
Číslo a název SO/PS: SO 102 - Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice								102					
Číslo a název rozpočtu: SO 102 - Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice								Celkem					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
135	271922211	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z recyklátu betonového	M3	0,000	637,000	637,000	964,00	0,00	0,00	614 068,00	614 068,00	614 068,00	100,00%
		Cena položky dle ÚRS 2020 01											
		položka zahrnuje dodávku betonového recyklátu, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak											
		ZBV č. 13 dle geodetického zaměření km 10,360 - 10,380 24 m3=24,000 [A] km 10,380 - 10,420 190,7 m3 - úprava s geomříží =190,700 [B] km 10,420 - 10,465 45 m3=45,000 [C] km 10,465 - 10,475 11,9 m3=11,900 [D] km 10,476 - 10,485 9,2 m3=9,200 [E] km 10,485 - 10,575 126,3 m3=126,300 [F] km 10,575 - 10,650 68,2 m3=68,200 [G] km 10,706 - 10,840 161,7 m3=161,700 [H] A+B+C+D+E+F+G+H=637,000 [I]											
136	452313141R	ZÁKLADY Z PROST BETONU C 16/20 včetně bednění	M3	0,000	91,875	91,875	3 200,00	0,00	0,00	294 000,00	294 000,00	294 000,00	100,00%
		Cena položky převzata z SOD SO 341 pol. 6											
		ZBV č. 13 Betonové patky v patě svahu km 10,360 - 10,381 21*0,5*0,5/2 m3=2,625 [A] km 10,381 - 10,420 39*1,5*1,5/2 m3=43,875 [B] km 10,420 - 10,475 55*0,5*0,5/2 m3 =6,875 [C] km 10,476 - 10,650 174*0,5*0,5/2 m3=21,750 [D] km 10,706 - 10,840 134*0,5*0,5/2 m2=16,750 [F] A+B+C+D+F=91,875 [G]											
137	636195111R	Vyplnění spár cementovou maltou dosavadní dlažby z lomového kamene melioračních kanálů	M2	0,000	5 411,700	5 411,700	357,00	0,00	0,00	1 931 976,90	1 931 976,90	1 931 976,90	100,00%
		Cena položky dle ÚRS 2021 02											
		ZBV č. 13 Požadavek Povodí Vltavy na vyplnění spár odláždění cementovou maltou dle geodetického zaměření km 10,360 - 10,422 111,9 m2=111,900 [A] km 10,422 - 10,454 48,7 m2=48,700 [B] km 10,455 - 10,476 44,9 m2 =44,900 [C] km 10,480 - 10,654 369,6 m2=369,600 [D] km 10,706 - 10,730 41,4 m2=41,400 [E] km 10,730 - 10,840 234,7 m2=234,700 [F] A+B+C+D+E+F=851,200 [G]											

Změnový soupis prací SO 102 po změně 20 pro ZBV 46													
Evidenční číslo a název stavby: II/102 hr. hl. města Prahy-Štěchovice, rekonstrukce. ETAPA II Číslo a název SO/PS: SO 102 - Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice Číslo a název rozpočtu: SO 102 - Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS) 102 Celkem					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		ZBV č. 39 geodetické protokoly Š II 33/2021 km 13,150-13,190 vlevo 89,90=89,900 [A] Š II 10/2022 km 10,140-10,250 vlevo 191,10=191,100 [B] Š II 12/2022 km 10,001-10,101 vlevo 112,90=112,900 [C] Š II 16/2022 km 10,103-10,140 vlevo 63,0+55,20-77=41,200 [D] Š II 27/2022 km 11,430-11,520 vlevo 191,60=191,600 [E] Š II 35/2022 km 11,220-11,430 vlevo 67,90+268,30=336,200 [F] Š II 43/2022 km 11,520-11663 vlevo 303,20=303,200 [G] Š II 45/2022 km 11,140-11,220 vlevo 187,80=187,800 [H] Š II 47/2022 km 11,671-11,780 vlevo 215,0=215,000 [I] Š II 53/2022 km 14,462-14,580 vlevo 249,30=249,300 [J] Š II 62/2022 km 11,056-11,140 vlevo 214,20=214,200 [K] Š II 65/2022 km 11,340-11,400 vlevo 47,0+160,30=207,300 [L] Š II 1/2023 km 10,840-10947 vlevo 188,7 =188,700 [T] Š II 4/2023 km 10,947-11,031 vlevo 165,6=165,600 [M]] Š II 7/2023 km 11,976-12,440 vlevo 805,3=805,300 [N]] Š II 8/2023 km 11,780-11,971 vlevo 231,10+1,7=232,800 [O]] Š II 11/2023 km 14,410-14,460 vlevo 75,40+21,5=96,900 [P]] Š II 13/2023 km 14,425 vlevo 22,4=22,400 [Q]] Š II 16/2023 km 11,928-12,060 vpravo 279,5=279,500 [R]] Š II 27/2023 km 11,733-11,832 vpravo 332,7=332,700 [S]] celkem A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q+R+S+T=4 463,600 [U] ZBV č. 43 dle pol. č.594511111 90,9=90,900 [A] ZBV č. 45 6m2												
138	69321023	Geomříž jednoosá HDPE s tahovou pevností 90kN/m	M2	0,000	1 076,400	1 076,400	144,00	0,00	0,00	155 001,60	155 001,60	155 001,60	100,00%
		Cena položky dle ÚRS 2021 02											
		ZBV č. 13 Požadavek Povodí Vltavy z 6.4.2021 a vyjádření AD č. 28 vyztužení svahu v km 10,381 - 10,420 vlevo 6 vrstev prům. šířky 3,5 m + přesah do čela svahu 0,5 m , ztratné 15% 6*(3,5+0,5)*39*1,15=1 076,400 [A]											
139	113107170	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2do 200 m2 z betonu prostého tl. 100mm	M2	0,000	170,300	170,300	149,00	0,00	0,00	25 374,70	25 374,70	25 374,70	100,00%
		Cena položky dle ÚRS 2021 02											
		ZBV č. 15 dle geodetického protokolu č. Š II 3/2022 km 13,2-13,7 žlaby 69,4=69,400 [A] žulové kostky 100,9=100,900 [B] A+B=170,300 [C]											
140	451319777	Podklad nebo lože pod dlažbu příplatek k cenám za každých dalších i započatých 100 mm podkladu nebo lože z betonu prostého	M2	0,000	115,900	115,900	30,40	0,00	0,00	3 523,36	3 523,36	3 523,36	100,00%
		Cena položky dle ÚRS 2021 02											
		ZBV č. 15 dle geodetického protokolu č. Š II 3/2022 km 13,2-13,7 žulové kostky 100,9=100,900 [A] ZBV č. 38 okolo HV 7,5*2=15											

Změnový soupis prací SO 102 po změně 20 pro ZBV 46													
Evidenční číslo a název stavby: II/102 hr. hl. města Prahy-Štěchovice, rekonstrukce. ETAPA II								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
Číslo a název SO/PS: SO 102 - Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice								102					
Číslo a název rozpočtu: SO 102 - Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice								Celkem					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
141	591141111	Kladení dlažby z kostek velkých z kamene, do lože z cementové malty s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici	M2	0,000	115,900	115,900	608,00	0,00	0,00	70 467,20	70 467,20	70 467,20	100,00%
		Cena položky dle ÚRS 2021 02											
		ZBV č. 15 dle geodetického protokolu č. Š II 3/2022 krajnice ze žulových kostek km 13,2-13,7 100,9=100,900 [A] ZBV č. 38 okolo HV 7,5*2=15											
142	59227029	Žlabovka příkopová betonová 500x680x60	M	0,000	76,340	76,340	415,00	0,00	0,00	31 681,10	31 681,10	31 681,10	100,00%
		Cena položky dle ÚRS 2021 02											
		položka zahrnuje dodávku betonového recyklátu, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak											
		ZBV č. 15 dle geodetického protokolu č. Š II 3/2022 km 13,2-13,7 64,9 m+ 10% ztratné žlaby 69,4*1,1=76,340 [A]											
143	911331123	Silniční svodidlo s osazením sloupků zaberaněním ocelové úroveň zádržnosti N2 vzdálenosti sloupků přes 2 do 4 m jednostranné	M	0,000	400,000	400,000	1 450,00	0,00	0,00	580 000,00	580 000,00	580 000,00	100,00%
		Cena položky dle ÚRS 2021 02											
		ZBV č. 15 dle geodetického protokolu č. Š II 3/2022 km 13,196-13,596 400=400,000 [A]											
144	935112211	Osazení betonového příkopového žlabu z betonových příkopových tvárnic šířky přes 500 do800 mm do lože z betonu tl. 100 mm	M	0,000	69,400	69,400	271,00	0,00	0,00	18 807,40	18 807,40	18 807,40	100,00%
		Cena položky dle ÚRS 2021 02											
		ZBV č. 15 dle geodetického protokolu č. Š II 3/2022 km 13,2-13,7 žlaby 69,4=69,400 [A]											
145	966008212	Bourání odvodňovacího žlabu z betonových příkopových tvátnic šířky přes 500 do 800 mm	M	0,000	69,400	69,400	73,90	0,00	0,00	5 128,66	5 128,66	5 128,66	100,00%
		Cena položky dle ÚRS 2021 02											
		ZBV č. 15 dle geodetického protokolu č. Š II 3/2022 km 13,2-13,7 žlaby 69,4=69,400 [A]											
146	275351111	Bednění základových konstrukcí bloků tradiční oboustranné	M2	0,000	250,500	250,500	580,00	0,00	0,00	145 290,00	145 290,00	145 290,00	100,00%
		Cena položky dle ÚRS 2021 02											
		ZBV č. 13 Betonové patky v patě svahu km 10,360 - 10,381 21*0,5=10,50 [A] km 10,381 - 10,420 39*1,5*=58,50 [B]											
147	567123114	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 5/6 (KSC II) tl 150 mm	M2	0,000	102,000	102,000	340,00	0,00	0,00	34 680,00	34 680,00	34 680,00	100,00%
		Cena položky dle ÚRS 2021 02											
		ZBV č. 20 *podklad ze směsi SC 5/6 v rozšíření vozovky t. 150 mm* *1,7*60,0=102,000 [A]*											
148	567133111	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 5/6 (KSC II) tl 160 mm	M2	0,000	300,000	300,000	361,00	0,00	0,00	108 300,00	108 300,00	108 300,00	100,00%
		Cena položky dle ÚRS 2021 02											
		ZBV č. 20 *podklad ze směsi SC 5/6 doplnění konstrukce s šíří 4,99m tl. 120-200 mm* *průměrná tl. 160 mm* *5,0*52,0=300,00 [A]*											
149	565125111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 40 mm š do 3 m	M2	0,000	2 259,400	2 259,40	244,00	0,00	0,00	551 293,60	551 293,60	551 293,60	100,00%
		Cena převzata z ÚRS 2021/02											

Změnový soupis prací SO 102 po změně 20 pro ZBV 46													
Evidenční číslo a název stavby: II/102 hr. hl. města Prahy-Štěchovice, rekonstrukce. ETAPA II Číslo a název SO/PS: SO 102 - Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice Číslo a název rozpočtu: SO 102 - Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS) 102 Celkem					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		ZBV č. 21 protokol Š II 71/2021 km 10,360 - 10,840 vlevo ACP 16 prům tl. 89,9 mm (nadspotřeba 40 mm) 2259,4=2 259,400 [A]											

Změnový soupis prací SO 102 po změně 20 pro ZBV 46

Evidenční číslo a název stavby: II/102 hr. hl. města Prahy-Štěchovice, rekonstrukce. ETAPA II
Číslo a název SO/PS: SO 102 - Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice
Číslo a název rozpočtu: SO 102 - Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)
102
Celkem

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
150	577135132	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 40 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu	M2	0,000	1 342,000	1 342,00	270,00	0,00	0,00	362 340,00	362 340,00	362 340,00	100,00%
		Cena převzata z ÚRS 2021/01											
		ZBV č. 21 protokol D 13/2020 km 12,440 - 12,850 vpravo ACL 16 modif. prům tl. 30,7 mm (vrstva navíc) 1342=1 342,000 [A]											
151	577145132	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 50 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu	M2	0,000	4 510,000	4 510,00	349,00	0,00	0,00	1 573 990,00	1 573 990,00	1 573 990,00	100,00%
		Cena převzata z ÚRS 2021/02											
		ZBV č. 21 protokol Š II 89/21 13,199 - 13,696 vlevo ACL 16 modif. tl. 100 mm tloušťka 2x50 2255*2=4 510,000 [A]											
152	567123114a	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 5/6 (KSC II) tl 150 mm	M2	0,000	19 283,200	19 283,20	256,33	0,00	0,00	4 942 862,66	4 942 862,66	4 942 862,66	100,00%
		cena dle kalkulace z SoD (záměna recyklované směsi za SC 5/6)											
		ZBV č. 23 nahrazuje pol. č. 38 19007,2=19 007,200 [A] ZBV ZBV č. 27 geodetický protokol Š II 51/2022 92,2 m2=92,200 [A] geodetický protokol Š II 58/2022 183,8 m2 =183,800 [B] A+B=276,000 [C]											
153	113107323	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 do 300 mm strojně pl do 50 m2	M2	0,000	441,600	441,600	110,00	0,00	0,00	48 576,00	48 576,00	48 576,00	100,00%
		Cena položky dle ÚRS 2022 02											
		ZBV ZBV č. 27 *geodetický protokol Š II 51/2022 92,2 m2=92,200 [A]* *geodetický protokol Š II 58/2022 183,8 m2 =183,800 [B]* *(183,8+92,2)*0,6=165,600 [C]* *A+B+C=441,600 [C]*											
154	113107331	Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 100 do 150 mm strojně pl do 50 m2	M2	0,000	276,000	276,000	256,00	0,00	0,00	70 656,00	70 656,00	70 656,00	100,00%
		Cena položky dle ÚRS 2022 02											
		ZBV ZBV č. 27 *geodetický protokol Š II 51/2022 92,2 m2=92,200 [A]* *geodetický protokol Š II 58/2022 183,8 m2 =183,800 [B]* *A+B=276,000 [C]*											
155	564970315	Podklad z betonového recyklátu plochy do 100 m2 tl 250 mm	M2	0,000	165,600	165,600	240,00	0,00	0,00	39 744,00	39 744,00	39 744,00	100,00%
		Cena položky dle ÚRS 2022 02											
		ZBV ZBV č. 27 *výměna podloží 60% z celkového množství 276 m2, tl. 20-30 cm* *276*0,6=165,600 [A]*											
156	919735123	Řezání stávajícího betonového krytu hl přes 100 do 150 mm	M	0,000	318,585	318,585	293,00	0,00	0,00	93 345,40	93 345,40	93 345,40	100,00%
		Cena položky dle ÚRS 2022 02											
		ZBV ZBV č. 27 *318,585=318,585*											
157	275313711	Základové patky z betonu tř. C 20/25	M3	0,000	3,290	3,290	4 160,00	0,00	0,00	13 686,39	13 686,39	13 686,39	100,00%
		Cena položky dle ÚRS 2023 02											
		ZBV č. 37 *zábradlí propustek* *0,5*0,5*0,75*12=2,25* *ZBV č. 45* *zábradlí* *0,4*0,4*0,5*13=1,04*											
158	91111111	Montáž zábradlí ocelového zabetonovaného	M	0,000	20,000	20,000	192,00	0,00	0,00	3 840,00	3 840,00	3 840,00	100,00%
		Cena položky dle ÚRS 2023 02											
		ZBV č. 37 *zábradlí propustek 6+4+6+4=20*											

Změnový soupis prací SO 102 po změně 20 pro ZBV 46

Evidenční číslo a název stavby: II/102 hr. hl. města Prahy-Štěchovice, rekonstrukce. ETAPA II
Číslo a název SO/PS: SO 102 - Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice
Číslo a název rozpočtu: SO 102 - Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)
102
Celkem

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
225	74910606	zábradlí městské obloukové bezpečnostní lakovaný povrch 2000x1000mm	KUS	0,000	10,000	10,000	6 110,00	0,00	0,00	61 100,00	61 100,00	61 100,00	
		Cena položky dle ÚRS 2023 02											
		ZBV č. 37 *zábradlí propustek 6+4+6+4=20m*											
159	113107223	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 do 300 mm strojně pl přes 200 m2	M2	0,000	315,000	315,000	64,80	0,00	0,00	20 412,00	20 412,00	20 412,00	100,00%
		cena dle URS 2023/1											
		ZBV č. 38 krajnice pod svodidla km 13,7647-13,8887 km 13,8963-139803 210*1,5m=315,00 tl. 250-300mm											
160	132151101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 20 m3 strojně	M3	0,000	20,780	20,780	585,00	0,00	0,00	12 156,30	12 156,30	12 156,30	100,00%
		cena dle URS 2023/1											
		ZBV č. 38 1,0*0,25*0,15*24=0,9 ZBV č. 45 km 11,687-11,720 0,8*0,35*34=9,520 [A] km 11,2228-11,2584 0,8*0,35*37=10,360 [B] A+B=19,880 [C]											
161	339921112	Osazování betonových palisád do betonového základu jednotlivě výšky prvku přes 0,5 do 1m	KUS	0,000	75,000	75,000	216,00	0,00	0,00	16 200,00	16 200,00	16 200,00	100,00%
		cena dle URS 2023/1											
		ZBV č. 38 u HV 7,5/0,11*1,1=75											
162	273313911	Základové desky z betonu tř. C 30/37	M3	0,000	47,250	47,250	4 180,00	0,00	0,00	197 505,00	197 505,00	197 505,00	100,00%
		cena dle URS 2023/1											
		ZBV č. 38 betonový práh pod nová svodidla km 13,7647-13,8887 km 13,8963-13,9803 210*1,5*0,15=47,25											
163	273351121	Zřízení bednění základových desek	M2	0,000	63,900	63,900	560,00	0,00	0,00	35 784,00	35 784,00	35 784,00	100,00%
		cena dle URS 2023/1											
		ZBV č. 38 km 13,7647-13,8887 km 13,8963-13,9803 210*2*0,15+1,5*0,15*4=63,90											
164	273351122	Odstranění bednění základových desek	M2	0,000	63,900	63,900	138,00	0,00	0,00	8 818,20	8 818,20	8 818,20	100,00%
		cena dle URS 2023/1											
		ZBV č. 38 viz pol. č. 274354111											
165	564841112	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 130 mm	M2	0,000	315,000	315,000	167,00	0,00	0,00	52 605,00	52 605,00	52 605,00	100,00%
		cena dle URS 2023/1											
		ZBV č. 38 pod nová svodidla 210*1,5=315,00											
166	59228408	palisáda betonová tyčová hranatá přírodní 110x110x600mm	KUS	0,000	75,000	75,000	181,00	0,00	0,00	13 575,00	13 575,00	13 575,00	100,00%
		Cena položky dle ÚRS 2023 01											
		ZBV č. 38 7,5/0,11*1,1=75											

Změnový soupis prací SO 102 po změně 20 pro ZBV 46

Evidenční číslo a název stavby: II/102 hr. hl. města Prahy-Štěchovice, rekonstrukce. ETAPA II
Číslo a název SO/PS: SO 102 - Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice
Číslo a název rozpočtu: SO 102 - Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)
102
Celkem

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
170	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 150 mm	M2	0,000	93,000	93,000	139,52	0,00	0,00	12 975,36	12 975,36	12 975,36	100,00%
		Cena položky dle SoD SO 103 pol.č. 16											
		ZBV č. 38 pod stávající svodidlo 48*1,0=48,000 [A] ZBV č. 45 U Kiliána 45=45,000 [A]											
167	911381124a	Silniční svodidlo betonové jednostranné průběžné délky 4 m výšky 1,2 m montáž s přesunem (bez dodávky)	M	0,000	48,000	48,000	1 381,67	0,00	0,00	66 320,16	66 320,16	66 320,16	100,00%
		položka převzata z SoD SO 901pol. č. 911EC3											
		dle geodetického protokolu Š II 36/2023 km 14,351-14,399 vpravo 48 m											
168	911381824	Odstranění silničního betonového svodidla délky 4 m výšky 1,2 m	M	0,000	132,000	132,000	939,00	0,00	0,00	123 948,00	123 948,00	123 948,00	100,00%
		URS 2023/1											
		ZBV č. 38 geodetický protokol Š II 36/2023 km 13,763-13,799 vpravo 36m km 13,843-13,891 vpravo 48m km 14,351-14,399 vpravo 48m 36+48+48=132											
171	58381008	Kostka štípaná dlažební žula velká 15/17	M2	0,000	16,500	16,500	1 610,00	0,00	0,00	26 565,00	26 565,00	26 565,00	100,00%
		Cena dle URS 2023/1											
		ZBV č. 38 okolo HV 7,5*2*1,1=16,5											
172	919735111	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm	M	0,000	208,000	208,00	77,60	0,00	0,00	16 140,80	16 140,80	16 140,80	100,00%
		Cena dle URS 2023/1											
		ZBV č. 38 nové betonové svodidlo 208=208											
169	113154122	Frézování živičného krytu tl 40 mm pruh š přes 0,5 do 1 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	M2	0,000	574,100	574,100	108,00	0,00	0,00	62 002,80	62 002,80	62 002,80	1,75%
		Cena dle URS 2022/2											
		ZBV č. 41 geodetický protokol Š II17/2022 km 10,020-10,246 vpravo prům. tl. 40 mm 18,10=18,100 [A] Š II 33/2022 km 14,580-14,608 vlevo prům. tl. 41 mm 39,1=39,100 [B] nájezd k MOL km 14,130-14429 vpravo prům. tl. 42 mm - bez odpočtu plochy 37,9=37,900 [C] výjezd od MOL km 14,130-14429 vpravo prům. tl. 42 mm - bez odpočtu plochy 49,0=49,000 [D] Š II 33/2022 km 14,580-14,609 vlevo prům. tl. 220 mm 130,50=130,500 [E] Š II 37/2022 km 11,519-11,630 vlevo prům. tl. 224 mm 299,50=299,500 [F] A+B+C+D+E+F=574,100 [G]											
226	113154123	Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š přes 0,5 do 1 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	M2	0,000	327,100	327,100	119,00	0,00	0,00	38 924,90	38 924,90	38 924,90	1,75%
		Cena dle URS 2022/2											
		ZBV č. 41 geodetický protokol Š II 23/2022 km 10,222 -10,246 vpravo prům. tl. 50 mm 70,10=70,100 [A] kaslíky km 14,226-14,273 vpravo prům. tl. 51 mm - bez odpočtu plochy 92,40=92,400 [B] km 14,302-14,343 vpravo prům. tl. 53 mm - bez odpočtu plochy 86,80=86,800 [C] km 14,354-14,393 vpravo prům. tl. 51 mm - bez odpočtu plochy 77,80=77,800 [D] A+B+C+D=327,100 [E]											
173	171152501	Zhutnění podloží z hornin soudržných nebo nesoudržných pod násypy (SAT)	M2	0,000	629,900	629,900	8,19	0,00	0,00	5 158,88	5 158,88	5 158,88	100,00%
		Cena dle URS 2023/1											

Změnový soupis prací SO 102 po změně 20 pro ZBV 46

Evidenční číslo a název stavby: II/102 hr. hl. města Prahy-Štěchovice, rekonstrukce. ETAPA II
Číslo a název SO/PS: SO 102 - Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice
Číslo a název rozpočtu: SO 102 - Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)
102
Celkem

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		ZBV č. 42 geodetický protokol Š II 14/2023 - rozšíření vozovky km 11,780-11,868 94,20=94,200 [A] km 11,881-11,909 23,50=23,500 [B] km 11,923-12,435 512,20=512,200 [C] A+B+C=629,900 [D]											

Změnový soupis prací SO 102 po změně 20 pro ZBV 46													
Evidenční číslo a název stavby: II/102 hr. hl. města Prahy-Štěchovice, rekonstrukce. ETAPA II								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
Číslo a název SO/PS: SO 102 - Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice								102					
Číslo a název rozpočtu: SO 102 - Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice								Celkem					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
174	273311128	Základové desky z betonu prostého C 30/37	M3	0,000	3,500	3,500	4 980,00	0,00	0,00	17 430,00	17 430,00	17 430,00	100,00%
		Cena dle URS 2023/1											
		ZBV č. 42 geodetický protokol Š II 41/2023 3,5=3,500 [A]											
175	273311191	Příplatek k základovým deskám za betonáž malého rozsahu do 25 m3	M3	0,000	3,500	3,500	618,00	0,00	0,00	2 163,00	2 163,00	2 163,00	100,00%
		Cena dle URS 2023/1											
		ZBV č. 42 dle pol. č. 273311191 3,5=3,500 [A]											
176	317321118	Mostní římsy ze ŽB C 30/37	M3	0,000	32,750	32,750	6 520,00	0,00	0,00	213 530,00	213 530,00	213 530,00	100,00%
		Cena dle URS 2023/1											
		ZBV č. 42 geodetický protokol Š II 41/2023 římsa pravá 9,25=9,250 [A] levá 23,50=23,500 [B] A+B=32,750 [C]											
177	317353121	Bednění mostních říms všech tvarů - zřízení	M2	0,000	69,123	69,123	2 340,00	0,00	0,00	161 747,82	161 747,82	161 747,82	100,00%
		Cena dle URS 2023/1											
		ZBV č. 42 levá (0,295+1,2+0,847+0,15)*14=34,888 [A] 2*1,6*((1,2+0,847+0,15)/2)=3,515 [B] pravá (0,245+1,05+0,15+0,511)*14=27,384 [C] 2*1,95*((1,05+0,15+0,511)/2)=3,336 [D] A+B+C+D=69,123 [E]											
178	317353221	Bednění mostních říms všech tvarů - odstranění	M2	0,000	69,123	69,123	182,00	0,00	0,00	12 580,39	12 580,39	12 580,39	100,00%
		Cena dle URS 2023/1											
		ZBV č. 42											
179	317361116	Výztuž mostních říms z betonářské oceli 10 505	T	0,000	2,623	2,623	62 900,00	0,00	0,00	164 986,70	164 986,70	164 986,70	100,00%
		Cena dle URS 2023/1											
		ZBV č. 42 viz. výkres výztuže (2113,2+509,5)/1000=2,623 [A]											
180	317171126	Kotvení monolitického betonu římsy do mostovky kotvou do vývrtu	KUS	0,000	24,000	24,000	868,00	0,00	0,00	20 832,00	20 832,00	20 832,00	100,00%
		Cena dle URS 2023/1											
		ZBV č. 42											
181	464531112	Pohoz z hrubého drceného kameniva zrno 63 až 125 mm z terénu	M3	0,000	55,900	55,900	1 290,00	0,00	0,00	72 111,00	72 111,00	72 111,00	100,00%
		Cena dle URS 2023/1											
		ZBV č. 42 geodetický protokol Š II 16/2023 km 11928-12,060 279,5*0,2=55,900 [A]											
182	55342284R	ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ LANKOVÉ - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	0,000	27,200	27,200	4 605,55	0,00	0,00	125 270,96	125 270,96	125 270,96	100,00%
		Cena srovnatelná s cenou z SoD SO 207 pol. č. 9111C1											
		ZBV č. 42 geodetický protokol Š II 40/2023 vpravo 13,60=13,600 [A] vlevo 13,60=13,600 [B] A+B=27,200 [C]											
183	567511121	Recyklace za studena tl. 150mm	M2	0,000	2 959,200	2 959,20	119,00	0,00	0,00	352 144,80	352 144,80	352 144,80	100,00%
		Cena dle URS 2023/1											
		ZBV č. 42 Geodetický protokol Š II 17/2023 km 11,771-12,436 vpravo 2959,20=2 959,200 [A]											
184	58522150	cement	T	0,000	34,623	34,623	3 770,00	0,00	0,00	130 528,71	130 528,71	130 528,71	100,00%
		Cena dle URS 2023/1											

Změnový soupis prací SO 102 po změně 20 pro ZBV 46													
Evidenční číslo a název stavby: II/102 hr. hl. města Prahy-Štěchovice, rekonstrukce. ETAPA II Číslo a název SO/PS: SO 102 - Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice Číslo a název rozpočtu: SO 102 - Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS) 102 Celkem					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		ZBV č. 42 6% cementu (1300*0,06/1000)*2959,2*0,15=34,623											

Změnový soupis prací SO 102 po změně 20 pro ZBV 46

Evidenční číslo a název stavby: II/102 hr. hl. města Prahy-Štěchovice, rekonstrukce. ETAPA II
Číslo a název SO/PS: SO 102 - Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice
Číslo a název rozpočtu: SO 102 - Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)
102
Celkem

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
185	11162540	emulze asfaltová obalovací pro použití za studena	T	0,000	7,546	7,546	37 000,00	0,00	0,00	279 202,00	279 202,00	279 202,00	100,00%
		Cena dle URS 2023/1											
		ZBV č. 42 1% asfaltu (1700*0,01/1000)*2959,2*0,15=7,546											
186	911334111	Svodidlo ocelové zábradelní zádržnosti H2 kotvené do římsy bez výplně	M	0,000	38,000	38,000	8 289,99	0,00	0,00	315 019,62	315 019,62	315 019,62	100,00%
		cena srovnatelná s cenou z SoD SO 204,205,206 pol. č. 9117C1											
		ZBV č 42 geodetický protokol Š II 40/2023 vpravo 19=19,000 [A] vlevo 19=19,000 [B] A+B=38,000 [C]											
187	963051111	Bourání mostní nosné konstrukce z ŽB Odboudání původní zdi propustu ŽB geodetický protokol Š II km 11,917 3,26+2,70	M3	0,000	5,960	5,960	9 390,00	0,00	0,00	55 964,40	55 964,40	55 964,40	100,00%
		Cena dle URS 2023/1											
		ZBV č. 42 Odboudání původní zdi propustu ŽB geodetický protokol Š II 18/2023 km 11,917 3,26+2,70=5,960 [A]											
189	914111100R	Svislé dopravní značení	SOUB	0,000	1,000	1,000	107 888,40	0,00	0,00	107 888,40	107 888,40	107 888,40	100,00%
		cena dle nabídky subdodavatele 93 816,- Kč+ režie a zisk (15%)											
		ZBV č. 44 1=1											
190	915211100R	Vodorovné dopravní značení	SOUB	0,000	1,000	1,000	262 878,50	0,00	0,00	262 878,50	262 878,50	262 878,50	100,00%
		cena dle nabídky subdodavatele 228 590,- Kč+ režie a zisk (15%)											
		ZBV č. 44 1=1											
191	912521111	Montáž dopravního knoflíku zapuštěného do komunikace	KUS	0,000	167,000	167,000	272,00	0,00	0,00	45 424,00	45 424,00	45 424,00	100,00%
		Cena dle URS 2023/1											
		ZBV č. 44 176=176											
192	56288005	Knoflík trvalý zafrézovaný pro dopravní značení	KUS	0,000	167,000	167,000	950,00	0,00	0,00	158 650,00	158 650,00	158 650,00	100,00%
		Cena dle URS 2023/1											
		ZBV č. 44 176=176											
193	113107172	Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 150 do 300 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	M2	0,000	56,800	56,800	334,00	0,00	0,00	18 971,20	18 971,20	18 971,20	100,00%
		Cena dle URS 2022/1											
		ZBV č. 45 km 11,687-11,720 34*0,8=27,200 [A] km 11,2228-11,2584 37*0,8=29,600 [B] A+B=56,800 [C]											
194	131151100	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 20 m3 strojně	M3	0,000	18,000	18,000	377,00	0,00	0,00	6 786,00	6 786,00	6 786,00	100,00%
		Cena dle URS 2022/1											
		ZBV č. 45 vsakovací jímka km 11,687-11,720 3,0*2,0*1,5=9,000 [A] km 11,2228-11,2584 3,0*2,0*1,5=9,000 [B] A+B=18,000 [C]											
195	182351023	Rozprostření ornice pl do 100 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 200 mm strojně	M2	0,000	12,000	12,000	114,00	0,00	0,00	1 368,00	1 368,00	1 368,00	100,00%
		Cena dle URS 2022/1											
		ZBV č. 45 vsakovací jímky 2*3,0*2,0=12,000 [A]											
196	28611176	*trubka kanalizační PVC DN 200x1000mm SN10*	M	0,000	12,000	12,000	906,00	0,00	0,00	10 872,00	10 872,00	10 872,00	100,00%
		Cena dle URS 2022/1											
		ZBV č. 45 U Kiliána 4=4,000 [A] km 11,687-11,720 4=4,000 [B] km 11,2228-11,2584 4=4,000 [C] A+B+C=12,000 [D]											

Změnový soupis prací SO 102 po změně 20 pro ZBV 46

Evidenční číslo a název stavby: II/102 hr. hl. města Prahy-Štěchovice, rekonstrukce. ETAPA II
Číslo a název SO/PS: SO 102 - Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice
Číslo a název rozpočtu: SO 102 - Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)
102
Celkem

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
197	464531111	Pohoz z hrubého drceného kamenivo zrno 32 až 63 mm z terénu	M3	0,000	16,200	16,200	1 250,00	0,00	0,00	20 250,00	20 250,00	20 250,00	100,00%
		Cena dle URS 2022/1											
		ZBV č. 45 vsakovací jímky km 11,687-11,720 2,0*3,0*1,35=8,100 [A] km 11,2228-11,2584 2,0*3,0*1,35=8,100 [B] A+B=16,200 [C]											
198	569903311	Zřízení zemních krajnic se zhutněním	M3	0,000	30,750	30,750	366,00	0,00	0,00	11 254,50	11 254,50	11 254,50	100,00%
		Cena dle URS 2022/1											
		ZBV č. 45 U Kiliána 30,75=30,750 [A]											
199	59217052	*obrubník betonový pro kruhový objezd vnější R0,5 200x270x300mm*	M	0,000	2,200	2,200	896,00	0,00	0,00	1 971,20	1 971,20	1 971,20	100,00%
		Cena dle URS 2022/1											
		ZBV č. 45 U Kiliána 2*1,1=2,200 [A]											
200	59228436	*žlab štěrbinový betonový čistící 400x500x1000mm*	KUS	0,000	6,000	6,000	10 200,00	0,00	0,00	61 200,00	61 200,00	61 200,00	100,00%
		Cena dle URS 2022/1											
		ZBV č. 45 U Kiliána 1+1=2,000 [A] km 11,687-11,720 1+1=2,000 [B] km 11,2228-11,2584 1+1=2,000 [C] A+B+C=6,000 [D]											
201	871350310	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 10 z polypropylenu DN 200	M	0,000	12,000	12,000	161,00	0,00	0,00	1 932,00	1 932,00	1 932,00	100,00%
		Cena dle URS 2022/1											
		ZBV č. 45 U Kiliána 4=4,000 [A] km 11,687-11,720 4=4,000 [B] km 11,2228-11,2584 4=4,000 [C] A+B+C=12,000 [D]											
202	895941301	Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců dno s výtokem	KUS	0,000	3,000	3,000	1 120,00	0,00	0,00	3 360,00	3 360,00	3 360,00	100,00%
		Cena dle URS 2022/1											
		ZBV č. 45 U Kiliána 1=1,000 [A] km 11,687-11,720 1=1,000 [B] km 11,2228-11,2584 1=1,000 [C] A+B+C=3,000 [D]											
203	895941322	Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců skruž středová 295 mm	KUS	0,000	3,000	3,000	654,00	0,00	0,00	1 962,00	1 962,00	1 962,00	100,00%
		Cena dle URS 2022/1											
		ZBV č. 45 U Kiliána 1=1,000 [A] km 11,687-11,720 1=1,000 [B] km 11,2228-11,2584 1=1,000 [C] A+B+C=3,000 [D]											
204	911111111	Zábradlí ocelové zabetonované - montáž a dodávka	M	0,000	25,800	25,800	5 561,99	0,00	0,00	143 499,34	143 499,34	143 499,34	100,00%
		cena dle nabídky subdodavatele (8690,00+ režie a zisk (15%)) 124782,-+15%=143499,30Kč/25,8m = 5561,99Kč/bm											
		ZBV č. 45 U Kiliána 25,8=25,800 [A]											
205	919735125	Řezání stávajícího betonového krytu hl přes 200 do 250 mm	M	0,000	320,000	320,000	517,00	0,00	0,00	165 440,00	165 440,00	165 440,00	100,00%
		Cena dle URS 2022/1											
		ZBV č. 45 U Kiliána tl. 250mm 180=180 km 11,687-11,720 (33+0,5)*2=67,000 [B] km 11,2228-11,2584 (36+0,5)*2=73,000 [C] A+B+C=320,000 [D]											

Změnový soupis prací SO 102 po změně 20 pro ZBV 46

Evidenční číslo a název stavby: II/102 hr. hl. města Prahy-Štěchovice, rekonstrukce. ETAPA II
Číslo a název SO/PS: SO 102 - Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice
Číslo a název rozpočtu: SO 102 - Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)
102
Celkem

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
206	935114122	Štěrbinový odvodňovací betonový žlab 450x500 mm se spádem 0,5% se základem	M	0,000	92,000	92,000	3 720,00	0,00	0,00	342 240,00	342 240,00	342 240,00	100,00%
		Cena dle URS 2022/1											
		ZBV č. 45 U Kiliána 29-2=27,000 [A] km 11,687-11,720 33-2=31,000 [B] km 11,2228-11,2584 36-2=34,000 [C] A+B+C=92,000 [D]											
207	28376414	deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch 300kPA tl 20mm	M2	0,000	99,500	99,500	93,60	0,00	0,00	9 313,20	9 313,20	9 313,20	100,00%
		Cena dle URS 2022/1											
		ZBV č. 45 U Kiliána 2*(29+0,5)*0,5=29,500 [A] km 11,687-11,720 2*(33,0+0,5)*0,5=33,500 [B] km 11,2228-11,2584 2*(36,0+0,5)*0,5=36,500 [C] A+B+C=99,500 [D]											
208	113105113	Rozebrání dlažeb z lomového kamene kladených na MC vyspárované MC	M2	0,000	6,000	6,000	436,00	0,00	0,00	2 616,00	2 616,00	2 616,00	100,00%
		Cena dle URS 2023/1											
		ZBV č. 45 6m2											
209	113107232	Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 150 do 300 mm strojně pl přes 200 m2		0,000	153,000	153,000	239,00	0,00	0,00	36 567,00	36 567,00	36 567,00	100,00%
		Cena dle URS 2023/1											
		ZBV č. 45 zastávka u Kiliána 153 m2											
169	59217011	*obrubník betonový zahradní 500x50x200mm*	M	0,000	33,000	33,000	116,00	0,00	0,00	3 828,00	3 828,00	3 828,00	100,00%
		Cena dle URS 2023/1											
		ZBV č. 45 U Kiliána 30*1,1=33,000 [A]											
210	01200200R	OSTATNÍ POŽADAVKY - zrušení zeměměřičského bodu	KPL	0,000	1,000	1,000	14 904,00	0,00	0,00	14 904,00	14 904,00	14 904,00	100,00%
		cena dle faktury subdodavatele (12960,-Kč + režie a zisk (15%))											
		ZBV č. 46 1=1,000 [A]											
211	133254102	Hloubení šachet zapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3	M3	0,000	37,600	37,600	1 280,00	0,00	0,00	48 128,00	48 128,00	48 128,00	100,00%
		cena dle URS 2023/I											
		ZBV č. 46 geodetický protokol Š II 28/2023 37,6=37,600 [A]											
212	133451101	Hloubení šachet nezapažených v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 objem do 20 m3	M3	0,000	17,300	17,300	2 220,00	0,00	0,00	38 406,00	38 406,00	38 406,00	100,00%
		cena dle URS 2023/I											
		ZBV č. 46 Geodetický protokol Š II 28/2023 17,3=17,300 [A]											
213	810441811	Bourání stávajícího potrubí z betonu DN přes 400 do 600	M	0,000	2,500	2,500	402,00	0,00	0,00	1 005,00	1 005,00	1 005,00	100,00%
		cena dle URS 2023/I											
		ZBV č. 46 výmena roury 2,5=2,500 [A]											
214	812442121	Montáž potrubí z trub TBH s integrovaným pryžovým těsněním otevřený výkop sklon do 20 % DN 600	M	0,000	2,500	2,500	891,00	0,00	0,00	2 227,50	2 227,50	2 227,50	100,00%
		cena dle URS 2023/I											
		ZBV č. 46 výmena roury 2,5=2,500 [A]											
215	812442222	Montáž podkladků trub od DN 600 do DN 800	KUS	0,000	2,000	2,000	151,00	0,00	0,00	302,00	302,00	302,00	100,00%
		cena dle URS 2023/I											
		ZBV č. 46 2=2,000 [A]											
216	59223023	trouba betonová hrdlová DN 600	M	0,000	2,500	2,500	2 630,00	0,00	0,00	6 575,00	6 575,00	6 575,00	100,00%
		cena dle URS 2023/I											
		ZBV č. 46 výmena roury 2,5=2,500 [A]											

Změnový soupis prací SO 102 po změně 20 pro ZBV 46

Evidenční číslo a název stavby: II/102 hr. hl. města Prahy-Štěchovice, rekonstrukce. ETAPA II
Číslo a název SO/PS: SO 102 - Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice
Číslo a název rozpočtu: SO 102 - Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)
102
Celkem

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
217	59223734	podkladek pod trouby betonové/ŽB DN 600-800	KUS	0,000	2,000	2,000	287,00	0,00	0,00	574,00	574,00	574,00	100,00%
		cena dle URS 2023/I											
		ZBV č. 46 2=2,000 [A]											
218	899203112	Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno pro třídu zatížení B125, C250	KUS	0,000	1,000	1,000	1 340,00	0,00	0,00	1 340,00	1 340,00	1 340,00	100,00%
		cena dle URS 2023/I											
		ZBV č. 46 1=1,000 [A]											
219	895941103	Osazení vpusti kanalizační horské z betonových dílců rozměru 1200/900 mm	KUS	0,000	1,000	1,000	5 480,00	0,00	0,00	5 480,00	5 480,00	5 480,00	100,00%
		cena dle URS 2023/I											
		ZBV č. 46 1=1,000 [A]											
220	977213514	Řezání betonových, železobetonových nebo kameninových trub kruhových ve výkopu kolmý řez DN 500	KUS	0,000	1,000	1,000	3 180,00	0,00	0,00	3 180,00	3 180,00	3 180,00	100,00%
		cena dle URS 2023/I											
		ZBV č. 46 1=1,000 [A]											
221	59224000R	Vpusť horská - atypická včetně mříže	KUS	0,000	1,000	1,000	66 045,65	0,00	0,00	66 045,65	66 045,65	66 045,65	100,00%
		cena dle faktury subdodavatele (57431,-Kč + režie a zisk (15%))											
		ZBV č. 46 1=1,000 [A]											
222	85024000R	VÝŘEZ, VÝSEK, ÚTES NA POTRUBÍ DN DO 300MM	KUS	0,000	1,000	1,000	11 513,88	0,00	0,00	11 513,88	11 513,88	11 513,88	100,00%
		cena pol. srovnatelná s pol z SoD SO 344 pol. 29											
		ZBV č. 46 napojení přípojky do HV 1=1,000 [A]											
223	890411851	Bourání šachet z prefabrikovaných skruží strojně obestavěného prostoru do 1,5 m3	KUS	0,000	1,000	1,000	3 100,00	0,00	0,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	100,00%
		cena dle URS 2022/II											
		ZBV č. 46 km 14,269 1=1,000 [A]											
224	894410302	Osazení betonových dílců pro kanalizační šachty DN 1000 deska zákrytová (demontáž a zpětná montáž)	KUS	0,000	2,000	2,000	1 700,00	0,00	0,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	100,00%
		cena dle URS 2022/II											
		ZBV č. 46 km 14,269 1+1=2,000 [A]											
225	122351101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 20 m3 strojně	M3	0,000	4,450	4,450	517,00	0,00	0,00	2 300,52	2 300,52	2 300,52	100,00%
		cena dle URS 2023/I											
		ZBV č. 46 odkop pro výměnu trouby 1,5*2,5*(1+1,75)/2-3,14*0,3*0,3*2,5=4,450 [A]											
227	935112211	Osazení příkopového žlabu do betonu tl 100 mm z betonových tvárnic š přes 500 do 800 mm -skluzy	M	0,000	2,000	2,000	2 293,50	0,00	0,00	4 587,00	4 587,00	4 587,00	100,00%
		cena pol. srovnatelná s pol z SoD SO 207 pol. 82											
		ZBV č. 46 šachta 2 m											
		Celkem						113 362 946,56	- 14 482 870,38	34 125 811,69	133 005 887,87	19 642 941,31	17,33%

ZBč. 33

Karel Simek

Od: Dvořáček David Ing. <dvoracek@pontex.cz>
Odesláno: pátek 3. února 2023 9:48
Komu: Karel Simek
Kopie: Martin Lisa; CtiborJiří Ing.
Předmět: [EXTERNAL] II/102 Praha-Štěchovice, II. etapa - propustek v km 13.89

Dobrý den,

k akci II/102 Praha-Štěchovice, II. etapa... na základě posouzení podkladů sděluji za AD k propustku v km 13.89 následující:

- Poškození stávajícího propustku spočívá především v poškození levé krajní trubky. Navazující trubka obsahuje pouze menší trhlinu na jednom z boků. V nevyhovujícím stavu je vpusť vpravo.
- V RDS je uvažováno s výměnou horské vpusti vpravo a vyvložkováním původního potrubí.
- Jako alternativu navrhujeme nahradit vložkování potrubí výměnou levé krajní poškozené trubky. Zbytek potrubí by zůstal bez zásahu. Na realizaci nové horské vpusti trváme.

S pozdravem

--
Ing. David Dvořáček [ddv@pontex.cz]
Pontex s. r. o. [www.pontex.cz] [pontex@pontex.cz]
Bezová 1658
147 00 Praha 4

Tel.: +420 720 951 172
Tel.: +420 244 462 219

K ČÚZ – NOVÁ ÚKOL
MĚŘ. č. 13,790
ZAK č. 33

Karel Simek

Od: Jana.Kopalova@cuzk.cz
Odesláno: středa 10. května 2023 10:40
Komu: Karel Simek
Předmět: [EXTERNAL] FW: Štěchovice II. etapa měřičský bod bránící zřízení HV
Přílohy: SCZPDSLOSLO23050510050.pdf

Dobrý den,

geodetický bod **Ibd-23.1** je součástí pořadu II. řádu Základního výškového bodového pole (dále jen „ZVBP") a geodetických základů ČR. Měřické značky uvedených bodů geodetických základů jsou chráněny zákonem 200/1994 Sb., o zeměměřictví, ve znění pozdějších předpisů.
O zrušení měřických značek bodů geodetických základů rozhoduje Zeměměřický úřad, jako orgán státní správy, podle zákona 359/1992 Sb.

Pokud by vlastník nebo oprávněný uživatel nemovitosti trval na odstranění bodu ZVBP, je řešením zrušení bodu, avšak za podmínky, že žadatel poskytne finanční náhradu, vypočtenou ve výši vlastních nákladů Zeměměřického úřadu na zřízení adekvátního nového bodu. U bodu **Ibd-23.1se jedná o částku cca 13 000- Kč**. Přesná částka se určí dle stanovených cen za zřizování značek.
Sdělte nám prosím veškeré své údaje, nezbytné pro vystavení faktury naším úřadem - tj.: přesnou adresu, včetně jména zodpovědného pracovníka, k jehož rukám bude faktura zaslána, IČO, DIČ, bankovní spojení - číslo účtu. Výpočet náhrady podle platného Jednacího řádu ZÚ bude přiložen k faktuře.

Znehodnocení bodu ZVBP bez rozhodnutí o jeho zrušení vydaného Zeměměřickým úřadem by bylo posuzováno jako přestupek, což zakládá důvod k vyvolání správního řízení ve věci porušení pořádku na úseku zeměměřictví.

s přáním hezkého dne
Jana Kopalová

From: Karel Simek <[redacted]
Sent: Friday, May 5, 2023 9:58 AM
To: CZEPOS <[redacted]
Subject: Štěchovice II. etapa měřičský bod bránící zřízení HV

NIVELAČNÍ ÚDAJE

Nivelační pořad: lbd Jíloviště-Neveklov

Předchozí bod	Nivelační bod	Délka v km		Nadmořská výška Bpv	Výška z roku
		oddílu	od počátku		
lbd-22.1	**lbd-23.1**	0.410	13.450	**205.919 m**	1983

Místopisný popis:
Masečín, skála

Místopis:

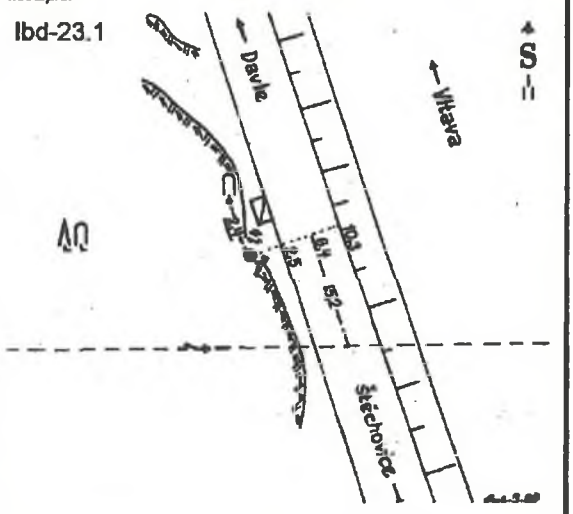

Stav a stáří objektu:
značka 0,2 m nad zemí
nezvětralá skalní stěna

Poznámky:
1.Vyhledávací tyč 24 cm dlouhá (bod vlevo 0,2 m; -0,6 m)

Úz. jednotka:	321007602
Okres:	Praha-západ
Obec:	Štěchovice
Kat. území:	Masečín
Vlastník/parc. č.:	/

ZM-50	12-44	SMO-5	BENEŠOV 9-4

Druh zn.	Stupeň stab.	Stabilizoval	Druh bodu	Souřadnice v S-JTSK		
Č VI	3	GÚ Praha		Y	748000 m	dig.
	Druh stab.	Janků				
	S	1980		X	1068178 m	

Zeměpisná délka	Zeměpisná šířka	Gs	Gn	Ba
14° 23' 54,7"	49° 51' 27,7"	981007 mgal	981053 mgal	8 mgal

Datum: 4.5.2023

Karel Simek

Od: Karel Simek
Odesláno: čtvrtek 11. května 2023 11:28
Komu: Jana.Kopalova@cuzk.cz
Předmět: RE: [EXTERNAL] FW: Štěchovice II. etapa měřičský bod bránící zřízení HV
Přílohy: Message from CZPDSLOSLO-077

Dobrý den paní Kopalová,
posílám Vám za firmu Strabag a.s. požadované údaje na vystavení faktury.
Strabag a.s.
Kačírkova 982/4
158 00 Praha 5
IČ:60838744
DIČ:CZ608838744
Zodpovědný pracovník za stavbu, které se tato záležitost týká: Ing. Karel Šimek
Název stavby: **II/102 hr.hl.m.Prahy -Štěchovice, rekonstrukce II. etapa**
Pro jistotu Vám posílám 1. stranu výpisu z obchodního rejstříku-viz příloha. Náš účet na vystavení faktury nepotřebujete-uvádíte u sebe.
My posíláme peníze Vám.
V případě dotazů volejte přímo mně-mobil 602 224 685

Hezký den
Karel Šimek

From: Jana.Kopalova@cuzk.cz <Jana.Kopalova@cuzk.cz>
Sent: Wednesday, May 10, 2023 10:40 AM
To: Karel Simek <karel.simek@strabag.com>
Subject: [EXTERNAL] FW: Štěchovice II. etapa měřičský bod bránící zřízení HV

Dobrý den,

geodetický bod **Ibd-23.1** je součástí pořadu II. řádu Základního výškového bodového pole (dále jen „ZVBP“) a geodetických základů ČR. Měřické značky uvedených bodů geodetických základů jsou chráněny zákonem 200/1994 Sb., o zeměměřictví, ve znění pozdějších předpisů.
O zrušení měřických značek bodů geodetických základů rozhoduje Zeměměřický úřad, jako orgán státní správy, podle zákona 359/1992 Sb.

Karel Simek

Od: Karel Simek
Odesláno: pátek 5. května 2023 10:35
Komu: pete.lambert@cuzk.cz
Kopie: Martin Lisa
Předmět: Štěchovice II. etapa žádost o zrušení nebo přeložení měřičského bodu v kat. území Masečín u obce Štěchovice
Přílohy: Message from CZPDSLOSLO-077

Dobrý den pane Lamberte,
po dohodě s Vaším kolegou posílám žádost o přeložení nebo zrušení měřičského bodu-viz příloha. Bod zasahuje do prostoru nově budovaného odvodnění rekonstruované vozovky.
Prosim o rychlou odpověď jak postupovat dál, abychom neohrozili probíhající stavební práce v dopravní uzávěře .Náklady spojené s přeložením nebo rušením bodu uhradíme.
Posílám na sebe mobilní kontakt 602 224 685.

Děkuji za vstřícnost a přeji hezký den

Karel Šimek

STRABAG a.s.
Odštěpný závod Praha
Kačírkova 982/4
158 00 Praha5

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje
Ing. Milan Peška
Zborovská 11
150 21 Praha 5

Vyřizuje:
Ing.Karel Šimek
[redacted]

Naše značka:
KSÚS_/46

Předmět: Oznámení o nové skutečnosti

Název stavby: II/102 hr. hl. města Prahy-Štěchovice, rekonstrukce. ETAPA II.

V souladu se smlouvou o dílo č. **S-468/00066001/2020** Vás informujeme o následujících nově zjištěných skutečnostech.
V PDPS byla řešena oprava propustku v km 13,900 vložkováním a zřízení nové HV v témže km jako monolitické ze železobetonu. Zrušení geodetického bodu II. řádu, který zasahoval do těžby stavební jámy pro novou horskou vpusť PDPS neuvažovala.
Po vyčištění trub propustu od zanesení bylo konstatováno na místě samém projektantem a AD, že není nutné celý propust vložkovat, je v dobré kondici a pouze doporučují vyměnit jednu výtokovou troubu s úpravou vyústění. Nová horská vpusť byla řešena nakonec jako prefabrikovaná z důvodu minimalizace času a prostoru pro její zřízení. Při těžení stavební jámy bylo nutné po dohodě se zeměměřičským úřadem odstranit překážející geodetický bod II. řádu za finanční náhradu, což dokladujeme fakturou. Při těžbě stavební jámy byla zastižena skalní hornina v třídě těžitelnosti III, což dokladujeme fotodokumentací s použitím rozpojovací techniky na bagru a geodetickým zaměřením.
V km 14,269 vlevo ve staničení silnice II/102 se nachází betonová revizní šachta DN 1000, kterou prochází odpadní a výtlačné potrubí v ocel. chráničce provozovatele čerpací stanice MOL. Tato revizní šachta je ve výškové a polohové kolizi s budoucí opěrnou zdí č. 63 SO 253. Bylo dohodnuto za účasti provozovatele č. stanice, AD a zhotovitele šachtu odbourat do úrovně stávajícího potrubí, a to prodloužit se svahu násypového tělesa a zakončit krátkým skluzem. Pro potrubí bude v budoucí OZ vynechán prostup a upraveno armování základu.

Tato skutečnost má vliv na změnu soupisu prací. Žádáme tímto (zapsáno v příslušném stavebním deníku) o písemný pokyn k provedení prací nad rámec smlouvy.

S přátelským pozdravem

[redacted]

Ing. Karel Šimek

[redacted]

STRABAG a.s.
Ústřední 423/62
102 00 Praha 10/Česká republika
Tel. +420 272 701-667
Fax +420 272 701-701

[redacted]

Sídlo společnosti: Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 - Jinonice. Zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, sp. zn. B 7634.
IČO 60838744, DIČ CZ60838744

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, IČ 00066001,
150 21 PRAHA 5, Zborovská 11

STRABAG a.s
Kačírkova 982/4,
158 00 Praha 5

Věc: **Souhlasné stanovisko k ZBV**

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace v návaznosti na projednání s TDS a zhotovitelem v rámci akce „II/102 hr. hl. města Prahy-Štěchovice, rekonstrukce. ETAPA II" **souhlasí** s navrženou a projednanou změnou. Jmenovitě souhlasí se změnami realizovanými na základě skutečností (dobrý stav propusti) zjištěné na propustku v km 13.900, včetně odstranění geodetického bodu.Dále souhlasí s úpravou revizní šachty v km 14,269 u čerpací stanice MOL.
Další práce požadujeme provést v koordinaci v souladu s pokyny AD a TDS a v souladu s uzavřenou SOD.

S pozdravem

Ing. Milan Peška
technicko – provozní náměstek

IČ 00066001
DIČ CZ00066001

e-mail:milan.peska@ksus.cz
telefon: 601159692

Pontex, spol. s r. o., Bezová 1658/1, 147 00 Praha 4 - Braník

KSÚS Středočeského kraje
Ing. Milan Peška
Zborovská 81/11
150 00 Praha 5

Č. j.: Px 4371/2023/DDv
Datum: 20. 6. 2023
Vyřizuje: Ing. David Dvořáček, *tel.:* [redacted]

II/102 hr. hl. m. Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, II. etapa
Vyjádření autorského dozoru č. 68 - SO 102, propustek v km 13.900

Po provedení čištění stávajícího propustku v km 13.900 bylo zjištěno, že stavební stav konstrukce je lepší, než bylo předpokládáno v přípravné dokumentaci. Výrazné poškození bylo zjištěno pouze nátoku a výtoku propustku. Bylo dohodnuto, že rozsah opravy propustku bude následující:

- výměna trouby na výtoku z propustku,
- výměna horské vpusti na nátoku propustku, horská vpust bude použita prefabrikovaná.

Výše uvedený posutup zajistí požadované parametry a funkciu propustku s minimalizací negativních vlivů vyplývajících z jeho rekonstrukce.

Po provedení čištění bylo dále zjištěno, že se v blízkosti propustku nachází geodetický bod II. řádu stabilizovaný do skalního masivu. Geodetický bod byl přímo ohrožen zemními pracemi nutnými pro provedení horské vpusti. Po odsouhlasení Zeměměřickým úřadem byl geodetický bod odstraněn bez náhrady. Odstranění geodetického bodu bylo podmíneno zaplacením poplatku.

Za AD sdělujeme, že s výše uvedeným postupem souhlasíme. Postup byl s AD průběžně konzultován.

S pozdravem

Ing. David Dvořáček,
hlavní inženýr projektu

[redacted]

Na vědomí (zasláno pouze elektronicky):

1. Objednatel, KSÚS, Ing. Mi
2. Objednatel, KSÚS, Ing. Al
3. TDI, Pragoprojekt, a. s., In
4. Strabag, a. s., Karel Šimek,
5. Strabag, a. s., Martin Lísa,
6. Atelier PROMIKA, s. r. o.,

STRABAG a.s.
Dopravní stavitelství
direkce TC
Kačírkova 982/4
CZ – 158 00 Praha 5 / Česká republika

Stavba: **II/102 HR. HL.MĚSTA PRAHY – ŠTĚCHOVICE, REKONSTRUKCE**
Dodavatel: **STRABAG a.s. Kačírkova 982/4, Praha 5**

Číslo předávacího protokolu: Š II 28/2023

Předmět měření: **SO 102 – REKONSTRUKCE VOZOVKY - DAVLE - ŠTĚCHOVICE**
Úsek C – km 13,892 – vlevo – HV – výkop a odtěžení skály

Kubatura – výkop		37,6 m^3
	skála nad	17,3 m^3
celkem		**54,9 m^3**

Měření bylo provedeno totální stanicí TOPCON IS 305.
Dopustné odchylky měření a výpočtu nebyly překročeny,

Souřadnicový systém:	S-JTSK
Výškový systém:	Bpv
Přílohy:	Seznam souřadnic
	Náčrt

Zaměřil:	5.2023	Ing. S. Bílek
Zpracoval:	13.6.2023	Ing. S. Bílek
Ověřil:	13.6.2023	Ing. S.Bílek

Ověření výsledků zeměměřických činností ve výstavbě
podle §13 odst.1 písm. c) zák. č. 200/1994 Sb

II/102 HR. HL.MĚSTA PRAHY – ŠTĚCHOVICE, REKONSTRUKCE, etapa II

SO 102 – REKONSTRUKCE VOZOVKY - DAVLE - ŠTĚCHOVICE

Úsek C, km 13,892 – vlevo - HV – výkop a odtěžení skály

Seznam souřadnic

Bod	Y	X	Výška	popis
1	747997.53	1068189.46	206.02	vrch
2	747995.88	1068189.12	206.07	vrch
3	747994.72	1068195.15	205.97	vrch
4	747996.04	1068195.44	205.99	vrch
5	747996.52	1068194.86	206.09	vrch
6	747997.26	1068194.26	206.13	vrch
7	747997.47	1068192.90	206.10	vrch
8	747997.36	1068192.26	206.03	vrch
9	747997.47	1068191.68	205.93	vrch
10	747997.36	1068189.58	202.94	dno
11	747995.94	1068189.28	202.96	dno
12	747994.80	1068195.08	203.06	dno
13	747996.04	1068195.33	203.02	dno
14	747996.86	1068193.94	203.12	dno
15	747997.52	1068190.50	203.12	skála
16	747997.21	1068190.60	203.12	skála
17	747997.03	1068191.60	203.12	skála
18	747997.01	1068192.59	203.12	skála
19	747997.10	1068193.90	203.12	skála
20	747997.02	1068194.50	203.12	skála

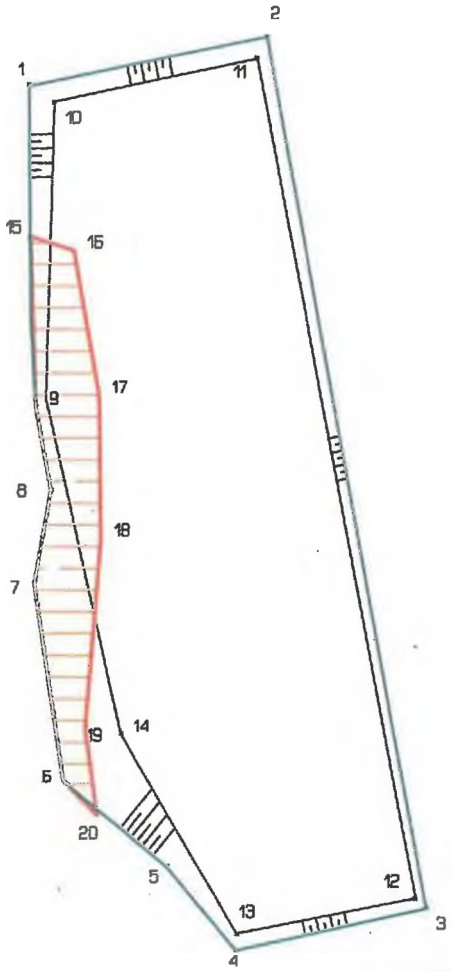

STRABAG a.s. Kačírkova 982/41, Praha 5			číslo zakázky		
			ověřil	Ing. S. Brlek	
			datum	13.6.2023	
			číslo ověření		
akce **II/102 Hr. Hl. Města Prahy – Štěchovice, rekonstrukce, etapa I** SO 102 Rekonstrukce vozovky, Davle – Štěchovice Úsek C, km 13,892 – HV – výkop a obtěžení skály					výkres číslo
				měřítko	1 : 50
zaměřil	Ing. Stanislav Brlek	datum	5.2023	souř. systém	S-JTSK
kreslil	Ing. Stanislav Brlek	datum	13.6.2023	výšk. systém	Bpv

ZAKAZAN

FAKTURA / DAŇOVÝ DOKLAD

DODAVATEL (*) **IČ** 60458500 Nejsme plátci DPH !	**Variabilní symbol** **2330017** **Konstantní symbol** 0058

Zeměměřický úřad
Pod sídlištěm 9
182 11 Praha 8

Česká republika

Typ organizace Org. složka státu
BANKOVNÍ SPOJENÍ
ÚČET **19-2828071/0710**
IBAN CZ64 0710 0000 1900 0282 8071
BIC CNBACZPP

STRABAG a.s.

Kačírkova 982/4
158 00 Praha 5
Česká republika

Objednávka/nabídka ze dne 11. 5. 2023

IČ 60838744 **DIČ** CZ60838744

Středisko	132	**Zakázka**	67160
Řada dokladů	VF23	**Evidenční číslo**	17

Konečný příjemce odběratel

Způsob platby	Převodem na účet
Datum vystavení	17.05.2023
Datum splatnosti	**16.06.2023**
Datum plnění	17.05.2023

Účtujeme náhradu nákladů spojených se zrušením nivelačního bodu

Ibd-23.1 Ibd Jiloviště-Neveklov

Důvodem zrušení výše uvedeného bodu je kolize jeho značky se stavbou „II/102 hr.hl.m.Prahy – Štěchovice, rekonstrukce II. etapa"

Přílohy: Souhlas se zrušením ZÚ-02253/2023-13200 a ZÚ-02180/2023-13200
Výpočet finanční náhrady
Nivelační údaje

QR Platba:

Vystavil(a) Vendulka VLČKOVÁ
Telefon 284041602
E-mail [redacted]

Celkem	12 960.00 Kč
Zaokrouhleno	12 960.00 Kč
Zaplaceno	0.00 Kč
K úhradě	**12 960.00** Kč

Ř [redacted]

Razítko a podpis .....

Nebude-li včas provedena úhrada, bude postupováno podle § 1968 -až § 1974 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a podle § 14 zák. 219/2000 Sb.

(*) Dodavatel je jiný správní úřad zřízený ve smyslu zák.359/92 Sb. o zeměměř.a katastr.orgánech ve znění pozdějších práv.předp.

BTK
BETONIKA

NABÍDKA č. 20230081

Dodavatel	Odběratel
BETONIKA spol.s r.o. Lobodice 221 751 01 Tovačov IČO: 00561681 DIČ: CZ00561681 C 72 vedená u Krajského soudu v Ostravě	**STRABAG a.s.** Lidická 802 266 01 Beroun Kontakt: Ing. Alice Pavlíková

Místo dodání:		Vystavil:	Alexandra Škrabalová
Štěchovice		Telefon:	
Splatnost:	**30** dnů	E-mail:	
Platnost nabídky:	**31/01/2023**	Datum vystavení:	17/01/2023

Dobrý den, na základě Vaší poptávky Vám zasíláme informativní cenovou nabídku:

Označení položky	Hmotnost kg / ks	Počet MJ	Cena / MJ po slevě	Celkem Kč bez DPH
V2239063 TZZ-Q 1500/1200/2000-HV *dno horské vpusti*	3 850	1,00 ks	20 746,00	20 746,00
V2239077 TZV-Q 1500/1200/150-HV-deska *rám s mřížemi pro hrskou vpusť C250* *rám s mříží z polyplastu pro zatížení C250*	450	1,00 ks	18 975,00	18 975,00
V2239075 TZV-Q 1500/1200/300-HV *vyrovnávací prstenec pro horskou vpusť*	510	3,00 ks	4 807,00	14 421,00
V2239073 TZV-Q 1500/1200/100-HV *vyrovnávací prstenec pro horskou vpusť*	170	1,00 ks	3 289,00	3 289,00
Hmotnost celkem:	6000 kg	6,00		

CELKEM bez DPH KČ	**57 431,00**

Poznámka dokladu:

Uvedené ceny jsou po slevě, bez DPH, EXW výrobní závod BETONIKA spol. s r.o. Lobodice a jsou platné do 31.1.2023. V nabídce jsou naceněny prvky, jež má naše firma ve výrobním a obchodním sortimentu.

Stavební výška horské vpusti bude 3m.

Doprava:
Cena dopravy na místo určení je cca 10.000 Kč bez DPH. Doprava je služba, kterou zajišťujeme přes vytěžovací střediska, její dostupnost a cena je závislá na aktuální nabídce přepravců, proto ji nelze dlouhodobě garantovat.

Ceny v nabídce jsou platné pro ucelený odběr výrobků uvedených v nabídce. V případě objednání uvádějte prosím číslo této nabídky. Nabídka neobsahuje obalový a prokladový materiál. Prodej výrobků se řídí Všeobecnými dodacími podmínkami firmy BETONIKA spol. s r. o. Děkujeme za Váš zájem a těšíme se na další spolupráci.

S pozdravem

Ing. Alexandra Škrabalová

Dojde-li v období od podání nabídky do okamžiku objednání zboží ke zvýšení vstupních cen materiálů, energií, PHM či obchodního zboží, má dodavatel právo nabídkovou cenu zvýšit o tento rozdíl. Změna cen bude dodavatelem zdokumentována, což je na vyžádání objednatele dodavatel povinen objednateli předložit.

Prodej výrobků se řídí Všeobecnými dodacími podmínkami firmy BETONIKA spol. s r. o. Záruční doba na výrobky činí 24 měsíců.
BETONIKA spol. s r. o. je držitelem certifikátu ČSN EN ISO 9001:2016
Technické podmínky montáže výrobků jsou uvedeny na www.betonika.cz

Alice Pavlikova

Od: Rozsochová Marcela <[redacted]
Odesláno: pátek 13. ledna 2023 6:21
Komu: Alice Pavlikova
Předmět: [EXTERNAL] RE: Štěchovice II etapa - horská vpusť
Přílohy: technicky_list_horska_vpust (2).pdf

Dobrý den,

tak velký otvor do horské vpusti bohužel neuděláme. Naše výrobní možnosti jsou max. otvor DN500. Technický výkres zasílám přílohou.

S pozdravem a přáním hezkého dne

Aktuální otevírací doba je od 1.12. – 28.02. Po – Pá: 7:00 – 15:30 hod.
Vjezd pro nakládku je možný nejpozději do 14:30 hod!

Marcela Rozsochová
referent cen

B&BC, a.s.
Sokolská 464, 330 22 Zbůch

Tel.: +420 377 199 133
Fax: +420 377 931 082
E-mail: mrozsochova@babc.cz
http://www.babc.cz
GPS: 49°41'05"N, 13°13'26"E

From: Eva Markovová <emarkovova@babc.cz>
Sent: Friday, January 13, 2023 6:14 AM
To: nabidky@babc.cz
Subject: FW: Štěchovice II etapa - horská vpusť

From: Alice Pavlikova <[redacted]
Sent: Thursday, January 12, 2023 4:02 PM
To: [redacted]
Cc:
Subject: Štěchovice II etapa - horská vpusť

B 7634/RD683/MSPH
Fj 479008/2022/MSPH

USNESENÍ

Městský soud v Praze rozhodl vyšší soudní úřednicí Marií Šiškovou v právní věci

navrhovatele: **STRABAG a.s.**, IČO 608 38 744
sídlem Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5

o návrhu na zápis změny do obchodního rejstříku

takto:

V obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze v oddílu B, vložce číslo 7634

se vymazává

Statutární orgán
člen představenstva
Ing. JARMILA POVAŽANOVÁ, dat. nar. 19. října 1962, r.č. 626019/6514
82101 Bratislava, Drieňova 16175/1B, Slovenská republika
Den vzniku členství: 3. června 2019

Prokura
Ing. RENATA HAMRSKÁ, dat. nar. 19. března 1961, r.č. 615319/0153
Hvozdíková 837, Liberec XXV-Vesec, 463 12 Liberec

Ing. TOMÁŠ HOZA, dat. nar. 8. května 1969, r.č. 690508/4406
Purkyňova 749/10, 767 01 Kroměříž

Ing. JIŘÍ JAROŠ, dat. nar. 31. ledna 1962, r.č. 620131/0643
Plachého 272/25, České Budějovice 1, 370 01 České Budějovice

se zapisuje

Statutární orgán
U vymazávané osoby: Ing. JARMILA POVAŽANOVÁ, dat. nar.19. října 1962, r.č.626019/6514
Den zániku členství: 7. prosince 2022

člen představenstva
Ing. TOMÁŠ HOZA, dat. nar. 8. května 1969, r.č. 690508/4406
Purkyňova 749/10, 767 01 Kroměříž
Den vzniku členství: 8. prosince 2022

Prokura
Ing. KAREL KLOFÁČ, dat. nar. 18. června 1973, r.č. 730618/2972
U Rybníčku 4041, 580 01 Havlíčkův Brod

Shodu s prvopisem potvrzuje Ilona Žďárská

Den zápisu změny: Dnem nabytí právní moci

Poučení:

Proti tomuto usnesení lze podat odvolání do patnácti dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím nadepsaného soudu.

Praha 19. prosince 2022

Marie Šišková v. r.
vyšší soudní úřednice

Shodu s prvopisem potvrzuje Ilona Žďárská

Výpis

z obchodního rejstříku, vedeného
Městským soudem v Praze
oddíl B, vložka 7634

Datum vzniku a zápisu:
1. března 1994

Spisová značka:
B 7634 vedená u Městského soudu v Praze

Obchodní firma:
STRABAG a.s.

Sídlo:
Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5

Identifikační číslo:
608 38 744

Právní forma:
Akciová společnost

Předmět podnikání:
Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

projektová činnost ve výstavbě

výroba betonu a obalovaných živičných směsí

opravy silničních vozidel

hornická činnost a činnost prováděná hornickým způsobem v rozsahu: (otvírka, příprava a dobývání výhradních ložisek s omezením pro povrchové dobývání; zřizování, zajišťování a likvidace důlních děl; úprava a zušlechťování nerostů prováděné v souvislosti s jejich dobýváním; zřizování a provozování odvalů, výsypek a odkališť; dobývání ložisek nevyhrazených nerostů, vyhledávání a průzkum ložisek nevyhrazených nerostů; podzemní sanační práce; zemní práce prováděné za použití strojů a výbušnin; podzemní práce spočívající v hloubení důlních jam a studní, v ražení štol a tunelů)

silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny, - vnitrostátní příležitostná osobní, - mezinárodní příležitostná osobní

výkon zeměměřických činností

provádění trhacích a ohňostrojných prací

výzkum, vývoj, výroba, ničení, zneškodňování, zpracování, nákup a prodej výbušnin

zámečnictví, nástrojářství

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení

poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

distribuce pohonných hmot

Statutární orgán:

předseda představenstva:

Dipl. Ing. MORITZ FREYBORN, dat. nar. 1. září 1975
1180 Vídeň, Haizingergasse 1-3/32, Rakouská republika
Den vzniku funkce: 1. listopadu 2022
Den vzniku členství: 1. listopadu 2022

člen představenstva:

Ing. PAVEL BRYCHCÍN, dat. nar. 25. května 1972
Zakšínská 607/11, Střížkov, 190 00 Praha 9

Den vzniku členství: 1. července 2020

člen představenstva:

Ing. TOMÁŠ HOZA, dat. nar. 8. května 1969
Purkyňova 749/10, 767 01 Kroměříž
Den vzniku členství: 8. prosince 2022

Počet členů:

3

Způsob jednání:

Statutárním orgánem je představenstvo. Jménem společnosti jedná vůči třetím osobám, před soudy, správními a samosprávnými orgány ve všech záležitostech představenstvo a to vždy předseda představenstva s dalším členem představenstva nebo dva členové představenstva. Podepisování se děje tím způsobem, že k napsané firmě společnosti nebo otisku razítka připojí svůj podpis předseda představenstva s dalším členem představenstva nebo dva členové představenstva s označením své funkce.

Prokura:

Ing. RADEK HRADIL, dat. nar. 2. února 1964
Okružní 660, Mařatice, 686 05 Uherské Hradiště

Ing. ROSTISLAV KRONES, dat. nar. 8. května 1968
č.p. 46, 592 03 Kadov

Ing. JIŘÍ HORÁLEK, dat. nar. 16. listopadu 1964
Ludvíka Podéště 777/16, Stránice, 602 00 Brno

Ing. JAN HÝZL, dat. nar. 6. ledna 1976
Profesora Fuky 1276/4, Nová Ulice, 779 00 Olomouc

Ing. JAN CHROMÝ, dat. nar. 30. června 1974
Litvínovice - Mokré 119, PSČ 37001

Ing. PAVEL KLAS, dat. nar. 22. listopadu 1964
č.p. 5, 386 01 Radošovice

Ing. RADIM AULICKÝ, dat. nar. 22. června 1974
Oldřicha Nového 833, 252 64 Velké Přílepy

Ing. ALEXEJ KOROTKOV, dat. nar. 1. dubna 1978
Lechowiczova 2827/11, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava

Ing. LUKÁŠ PŘIBYL, dat. nar. 21. prosince 1982
Slunečná 333, 373 71 Adamov

Ing. RICHARD FISCHER, dat. nar. 7. října 1975
V Podhradí 33, 250 73 Jenštejn

Ing. Mag. MICHAL PRISTAŠ, dat. nar. 14. dubna 1981
2460 Bruckneudorf, Marc Aurel Strasse 2f, Rakouská republika
Ing. Mag. Michal Pristaš je oprávněn zastupovat Společnost spolu s dalším prokuristou. Toto zmocnění zahrnuje i oprávnění nabýt, zcizit nebo zatížit nemovitou věc.

MICHAL VANĚČEK, dat. nar. 27. března 1978
Pod Nouzovem 1007/25, Kbely, 197 00 Praha 9

Ing. MICHAL KOPPER, dat. nar. 15. května 1979
82104 Bratislava - Ružinov, Doležalova 3424/15F, Slovenská republika
Ing. Michal Kopper je oprávněn zastupovat Společnost spolu s dalším prokuristou. Toto zmocnění zahrnuje i oprávnění nabýt, zcizit nebo zatížit nemovitou věc.

Ing. TOMÁŠ RYS, dat. nar. 17. listopadu 1981
U sanatoria 737/20, Radotín, 153 00 Praha 5

PETR KAFKA, dat. nar. 21. února 1962
Sadová 246, Nemošice, 530 03 Pardubice

Ing. arch. JAN HAVELKA, dat. nar. 9. srpna 1988
č.p. 228, 373 32 Jílovice

Ing. JIŘÍ SVOBODA, Ph.D., dat. nar. 27. září 1984

U Hřiště 456, Mladcová, 760 01 Zlín

Ing. KAREL KLOFÁČ, dat. nar. 18. června 1973
U Rybníčku 4041, 580 01 Havlíčkův Brod

Ing. MARTIN BAŠÁR, dat. nar. 3. září 1979
Dělnická 443, 252 41 Dolní Břežany

K zastupování a podepisování za společnost jsou oprávněni vždy dva prokuristé. Prokuristé podepisují tím způsobem, že k firmě společnosti připojí svůj podpis s dodatkem označujícím prokuru.

Dozorčí rada:

předseda dozorčí rady:

Dipl. Ing. (FH) ALFRED WATZL, dat. nar. 13. září 1970
05-080 Izabelin C, Krasinskiego 37, Polská republika
Den vzniku funkce: 13. června 2022
Den vzniku členství: 13. června 2022

člen dozorčí rady:

Mgr. KARIN BÍLKOVÁ, dat. nar. 18. dubna 1975
Bezručova 603, 250 91 Zeleneč
Den vzniku členství: 4. prosince 2018

člen dozorčí rady:

Mag. HERIBERT HERZOG, dat. nar. 15. září 1964
7423 Grafenschachen, Grafenschachen 22, Rakouská republika
Den vzniku členství: 12. ledna 2023

Počet členů:

3

Jediný akcionář:

Bau Holding Beteiligungs GmbH
9800 Spittal an der Drau, Ortenburgerstraße 27, Rakouská republika
Registrační číslo: FN 117476 i
Právní forma: společnost s ručeným omezeným

Akcie:

1 000 ks kmenové akcie na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 10 000,- Kč

11 096 ks kmenové akcie na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 100 000,- Kč

Základní kapitál:

1 119 600 000,- Kč
Splaceno: 1 119 600 000,- Kč

Ostatní skutečnosti:

Akciová společnost byla založena notářským zápisem osvědčenou zakladatelskou listinou tří zakladatelů, fyzických osob, ze dne 23.2.1994, rozdělením současně zrušené společnosti s ručením omezeným SAREMO, se sídlem České Budějovice, ul.Plachého 27, na dvě nově vzniklé společnosti SAREMO a.s. a HYDROLINE s.r.o., se sídlem České Budějovice, Lidická 1131.
Zakladatelé současně schválili stanovy a.s. a zvolili členy orgánů společnosti.
Notářský zápis, zakladatelská smlouva a stanovy a.s. byly přiloženy.

Základní jmění je splaceno v plném rozsahu.

Valná hromada společnosti rozhodla dne 30.6.1999 o sloučení se společností STRABAG ČR a.s.

Na společnost STRABAG a.s. se sídlem Praha 5, Na Bělidle 198/21, PSČ 150 00, IČ 608 38 744, jako nástupnickou společnost, přešlo na základě smlouvy o fúzi sloučením ze dne 20. 11. 2006 s rozhodným dnem sloučení 1. 10. 2006 jmění společnosti ILBAU Plzeň a.s. se sídlem České Budějovice , Vrbenská 31,

IČ 648 34 352, jako zanikající společnosti.
Společnost STRABAG a.s. se sídlem Praha 5, Na Bělidle 198/21, PSČ 150 00 , IČ 608 38 744 je právním nástupcem bez likvidace zrušené a zaniklé společnosti ILBAU Plzeň a.s. se sídlem České Budějovice, Vrbenská 31, IČ 648 34 352, dosud zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích oddílu B vložce 1148.

Na společnost STRABAG a.s. se sídlem Praha 5, Na Bělidle 198/21, PSČ 150 00, IČ 608 38 744, jako nástupnickou společnost, přešlo na základě smlouvy o fúzi sloučením ze dne 20.11.2006 s rozhodným dnem sloučení 1.10.2006 jmění společnosti Stavební technologie, spol. s r.o. se sídlem Humpolec, Nádražní 729, okres Pelhřimov, PSČ 396 01, IČ 251 83 133, jajo zanikající společnosti.
Společnost STRABAG a.s. se sídlem Praha 5, Na Bělidle 198/21, PSČ 150 00, IČ 608 38 744 je právním nástupcem bez likvidace zrušené a zaniklé společnosti Stavební technologie, spol. s r.o. se sídlem Humpolec, Nádražní 729, okres Pelhřimov, PSČ 396 01, IČ 251 83 133, dosud zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích C 8266.

Obchodní společnost STRABAG a.s. jako společnost nástupnická převzala v důsledku vnitrostátní fúze sloučením jmění zanikající společnosti STRABAG konstrukce s.r.o., IČ 252 63 579, se sídlem Chrudim, Tovární 209.

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.

Na společnost STRABAG a.s., jako na společnost nástupnickou, přešlo v důsledku fúze sloučením jmění zanikajících společností JHP spol. s r.o., se sídlem Ústřední 423/62, Štěrboholy, 102 00 Praha 10, identifikační číslo 45798290 a MiTTaG spol. s r.o. pozemní a průmyslové stavitelství, se sídlem Na bělidle 198/21, Smíchov, 150 00 Praha 5, identifikační číslo 00547514. Rozhodným dnem fúze byl 1. leden 2016.

Na základě projektu vnitrostátní fúze sloučením ze dne 11.8.2017 došlo ke sloučení společnosti Dálniční stavby Praha, a.s., se sídlem Praha 5, Na Bělidle 198/21, PSČ 15000, identifikační číslo 40614948, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu B, vložce 744, jako zanikající společnosti, do společnosti STRABAG a.s., jako nástupnické společnosti, přičemž na nástupnickou společnost STRABAG a.s. přešlo jmění zanikající společnosti Dálniční stavby Praha, a.s.

Odštěpné závody:

Odštěpný závod:

Označení odštěpného závodu:

STRABAG a.s. odštěpný závod Praha

Sídlo nebo umístění:

Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5

Předmět podnikání:

montáž, opravy údržba revize vyhrazených el. zařízení

výroba betonu a obalovaných živičných směsí

výkon zeměměřických činností

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

zámečnictví, nástrojářství

opravy silničních vozidel

provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Vedoucí odštěpného závodu:

Ing. MARTIN BAŠÁR, dat. nar. 3. září 1979
Dělnická 443, 252 41 Dolní Břežany

Odštěpný závod:

Označení odštěpného závodu:

STRABAG a.s. odštěpný závod České Budějovice

Sídlo nebo umístění:

České Budějovice, Vrbenská 31, PSČ 37006

Předmět podnikání:

výkon zeměměřičských činností

projektová činnost ve výstavbě

výroba betonu a obalovaných živičných směsí

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

zámečnictví, nástrojářství

opravy silničních vozidel

provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Vedoucí odštěpného závodu:

Ing. PAVEL KLAS, dat. nar. 22. listopadu 1964
č.p. 5, 386 01 Radošovice

Odštěpný závod:

Označení odštěpného závodu:

STRABAG a.s. odštěpný závod Morava

Sídlo nebo umístění:

Holická 1004/29, Hodolany, 779 00 Olomouc

Předmět podnikání:

výroba betonu a obalovaných živičných směsí

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

opravy silničních vozidel

provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Vedoucí odštěpného závodu:

Ing. JAN HÝZL, dat. nar. 6. ledna 1976
Profesora Fuky 1276/4, Nová Ulice, 779 00 Olomouc

Odštěpný závod:

Označení odštěpného závodu:

STRABAG a.s. odštěpný závod pozemní a inženýrské stavitelství Praha

Sídlo nebo umístění:

Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5

Předmět podnikání:

výroba betonu a obalovaných živičných směsí

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny, - vnitrostátní příležitostná osobní, - mezinárodní příležitostná osobní

provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Vedoucí odštěpného závodu:

PETR KAFKA, dat. nar. 21. února 1962
Sadová 246, Nemošice, 530 03 Pardubice

Odštěpný závod:

Označení odštěpného závodu:

STRABAG a.s. odštěpný závod pozemní a inženýrské stavitelství České Budějovice

Sídlo nebo umístění:

České Budějovice, Vrbenská /31, PSČ 37006

Předmět podnikání:

- Provádění staveb, jejich změn a odstraňování
- projektová činnost ve výstavbě
- výkon zeměměřických činností
- zámečnictví, nástrojářství
- silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, -

nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny, - vnitrostátní příležitostná osobní, - mezinárodní příležitostná osobní
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
- montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení

Vedoucí odštěpného závodu:

Ing. JAN CHROMÝ, dat. nar. 30. června 1974
Mokré 119, 370 01 Litvínovice

Odštěpný závod:

Označení odštěpného závodu:

STRABAG a.s. odštěpný závod STRABAG Real Estate

Sídlo nebo umístění:

Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5

Předmět podnikání:

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor

Vedoucí odštěpného závodu:

Dipl. Ing. SONJA WERTITSCH, dat. nar. 29. září 1976
1210 Vídeň, Kugelfanggasse 79a, Rakouská republika

Tento výpis je neprodejný a byl pořízen na Internetu (http://www.justice.cz).
Dne: 7.9.2023 10:56
Údaje platné ke dni 7.9.2023 03:54

Naše značka: TD/308/19-120/VM/23
Vaše značka:

Vyřizuje: M. Valenta
Tel. [redacted]

e-mail: [redacted]
Datum: 10. 11. 2023

KSÚS Středočeského kraje

Ing. Milan PEŠKA
Technicko-provozní náměstek

Zborovská 11
150 21 Praha 5

Stavba: II/102 hr. hl. m Prahy – Štěchovice, rekonstrukce, etapa II.

Věc: Stanovisko TDS k návrhu ZBV č. 46 SO 102 Rekonstrukce vozovky Davle Štěchovice (Km 13,900 HV, měřičský bod, šachta km 14,269).

Zhotovitel stavby dne 28. 8. 2023 předložil návrh ZBV č. 46 (102/20) SO 102 Rekonstrukce vozovky Davle.

Návrh ZBV řeší:
- Osazení horské vpusti včetně zemních prací a opravu propustku v 13,900
- Zrušení geodetického bodu II. řádu
- V km 14,269 vlevo kolizi revizní šachty a potrubí provozovatele čerpací stanice MOL se základem opěrné zdi č. 63.

K ostatním změnám došlo zaměřením objemu skutečně provedených prací během realizace.

Změna měla vliv na položky č. 1, 2, 3, 4,10, 12 až 16, 18 až 21, 23, 25 až 29, 31, 33, 35, 36, 37, 40, 46, 52, 53, 58, 59, 60, 62, 95, 96, 97, 99 až 103, 110, 115 až 118, 124, 125, 128, 129, 130 a nové položky č. 130, 206, 210 až 224.

Položku poř. č. 221 Vpusť horská – atypická ocenit podle cenové soustavy ÚRS resp. doložením tří nezávislých nabídek jiných zhotovitelů.

TDS potvrzuje skutečnosti uvedené v návrhu ZBV č. 46 (102/20) SO 102 Rekonstrukce vozovky Davle.

[redacted]

M. Valenta
Technický dozor investora

Na vědomí:
Ing. Karel Šimek
