ID	Název činnosti	Task Name	Duration	Start	Finish	Predecessors	Resource Names
1	**Příloha č. 3 - Harmonogram**	**Annex No.3– The Schedule**	**804 dys**	**Wed 01.09.21**	**Mon 30.09.24**		
2	**Podpis smlouvy o dílo, zahájení**	**Signing off the Contract of Work, initiation**	**0 dys**	**Wed 01.09.21**	**Wed 01.09.21**		**OBJ, ZHO**
3	**Přípravná fáze, nastavení procesů komunikace, projektových struktur**	**Preparatory phase, setting up the communication processes and project**	**15 dys**	**Wed 01.09.21**	**Tue 21.09.21**	**2**	**OBJ, ZHO**
4	**Detailní analýza**	**Detailed analysis**	**70 dys**	**Thu 16.09.21**	**Wed 22.12.21**		
5	Zpracování výstupu Detailní analýza, včetně implementačního, integračního a migračního plánu, Analytické konzultace	Processing the output of Detailed analysis, including implementation, integration and migration plan, Analytical consultations	40 dys	Wed 22.09.21	Tue 16.11.21	3	OBJ, ZHO
6	Předání integračních rozhraní systémů třetích stran	Handover of integration interfaces of third party systems	1 dy	Thu 16.09.21	Thu 16.09.21	5SS	OBJ
7	Připomínkové řízení na straně Objednatele	Comment procedure on the Client's side	10 dys	Wed 17.11.21	Tue 30.11.21	5	OBJ
8	Zapracování připomínek k výstupu Zhotovitele	Incorporation of comments on the output b	5 dys	Wed 01.12.21	Tue 07.12.21	7	ZHO
9	Ověření způsobu zapracování připomínek k výstupu Objednatelem	Verification of the method of incorporating comments on the output by the Client	5 dys	Wed 08.12.21	Tue 14.12.21	8	OBJ
10	Finalizace výstupu Zhotovitelem	Finalization of the output by the Contractor	5 dys	Wed 15.12.21	Tue 21.12.21	9	ZHO
11	Formální provedení akceptace Objednatelem	Formal acceptance by the Client	1 dy	Wed 22.12.21	Wed 22.12.21	10	OBJ
12	Odsouhlasená Detailní analýza	Agreed Detailed analysis	0 dys	Wed 22.12.21	Wed 22.12.21	11	OBJ, ZHO
13	**Návrhová dokumentace**	**Design documentation**	**106 dys**	**Thu 23.12.21**	**Thu 19.05.22**		
14	Návrh vyšší úrovně (HLDD); Návrh nižší úrovně (LLDD)	Higher Level Design Documentation (HLDD); Lower Level Design Documentation	60 dys	Thu 23.12.21	Wed 16.03.22	12	ZHO
15	Zpřístupnění stávajících integračních rozhraní systémů třetích stran	Making access to existing integration interfaces of third party systems	5 dys	Thu 23.12.21	Wed 29.12.21	14SS	OBJ
16	Specifikace rozhraní	Interface Specification	40 dys	Thu 23.12.21	Wed 16.02.22	12	ZHO
17	Testovací scénáře pro FAT a SAT (zpracovává Zhotovitel v průběžné součinnosti	Test scenarios for FAT and SAT (processed by the Contractor in ongoing co-operation	60 dys	Thu 20.01.22	Wed 13.04.22	12FS+20 dys	OBJ, ZHO
18	Připomínkové řízení na straně Objednatele	Comment procedure on the Client's side	10 dys	Thu 14.04.22	Wed 27.04.22	14;16;17	OBJ
19	Zapracování připomínek k výstupu Zhotovitele	Incorporation of comments on the output b	5 dys	Thu 28.04.22	Wed 04.05.22	18	ZHO
20	Ověření způsobu zapracování připomínek k výstupu Objednatelem	Verification of the method of incorporating comments on the output by the Client	5 dys	Thu 05.05.22	Wed 11.05.22	19	OBJ
21	Finalizace výstupu Zhotovitelem	Finalization of the output by the Contractor	5 dys	Thu 12.05.22	Wed 18.05.22	20	ZHO
22	Formální provedení akceptace Objednatelem	Formal acceptance by the Client	1 dy	Thu 19.05.22	Thu 19.05.22	21	OBJ
23	Odsouhlasená Návrhová dokumentace	Agreed Design documentation	0 dys	Thu 19.05.22	Thu 19.05.22	22	OBJ, ZHO
24	**Dodávky nezbytných aplikační SW licencí pro upgrade stávajícího systému**	**Deliveries of necessary licenses of application SW to upgrade the existing**	**120 dys**	**Thu 12.05.22**	**Wed 26.10.22**		
25	Definování SW licencí	Definition of the SW licenses	10 dys	Thu 12.05.22	Wed 25.05.22	20	ZHO
26	Pořízení licencí	Acquisition of the licenses	30 dys	Thu 26.05.22	Wed 06.07.22	25	OBJ
27	Instalace a konfigurace aplikačního a systémového SW	Installation and configuration of application and system SW	40 dys	Thu 01.09.22	Wed 26.10.22	31;26	OBJ, ZHO
28	**Dodávky nezbytného HW pro upgrade stávajícího systému**	**Deliveries of the HW necessary to upgrade the existing system**	**80 dys**	**Thu 12.05.22**	**Wed 31.08.22**		
29	Definování HW běhového prostředí	Defining the HW of the runtime environmen	10 dys	Thu 12.05.22	Wed 25.05.22	20	ZHO
30	Pořízení HW	Acquisition of the HW	60 dys	Thu 26.05.22	Wed 17.08.22	29	OBJ
31	Instalace a konfigurace HW běhového prostředí	Installation and configuration of HW of the r	10 dys	Thu 18.08.22	Wed 31.08.22	30	OBJ
32	**Dodávky nových SW modulů pro rozšíření funkcionality celého systému a integrace se systémy Objednatele**	**Deliveries of new SW modules to expand functionality of the entire system and integration with the Client's systems**	**471 dys**	**Fri 20.05.22**	**Fri 08.03.24**		
33	Vývoj a postupná implementace	Development and gradual implementation	407 dys	Fri 20.05.22	Mon 11.12.23	23	ZHO
34	Kontrolní den 1 (prezentace stavu vývoje a implementace)	Control day 1 (Presentation of the implementation status)	1 dy	Mon 18.09.23	Mon 18.09.23		OBJ, ZHO
35	Kontrolní den 2 (prezentace stavu vývoje a implementace)	Control day 2 (Presentation of the implementation status)	1 dy	Mon 30.10.23	Mon 30.10.23		OBJ, ZHO
36	Kontrolní den 3 (prezentace stavu vývoje a implementace)	Control day 3 (Presentation of the implementation status)	1 dy	Mon 20.11.23	Mon 20.11.23		OBJ, ZHO
37	Testování a odstraňování chyb (bug fixing)	Testing and bugfixing	80 dys	Mon 20.11.23	Fri 08.03.24	6OFF	ZHO
38	Připravenost k FAT	FAT readiness	0 dys	Fri 08.03.24	Fri 08.03.24	37	ZHO
39	**Dodávky prací a služeb souvisejících se zákaznickými úpravami standardního (krabicového) SW**	**Deliveries of works and services related to custom modifications of standard (full package product) SW**	**471 dys**	**Fri 20.05.22**	**Fri 08.03.24**		
40	Vývoj a postupná implementace	Development and gradual implementation	407 dys	Fri 20.05.22	Mon 11.12.23	23	ZHO
41	Kontrolní den 1 (prezentace stavu vývoje a implementace)	Control day 1 (Presentation of the implementation status)	1 dy	Mon 18.09.23	Mon 18.09.23		OBJ, ZHO
42	Kontrolní den 2 (prezentace stavu vývoje a implementace)	Control day 2 (Presentation of the implementation status)	1 dy	Mon 30.10.23	Mon 30.10.23		OBJ, ZHO
43	Kontrolní den 3 (prezentace stavu vývoje a implementace)	Control day 3 (Presentation of the implementation status)	1 dy	Mon 20.11.23	Mon 20.11.23		OBJ, ZHO
44	Testování a odstraňování chyb (bug fixing)	Testing and bug fixing	80 dys	Mon 20.11.23	Fri 08.03.24	6OFF	ZHO
45	FAT Readiness	Readiness to the FAT	0 dys	Fri 08.03.24	Fri 08.03.24	44	ZHO
46	**Vývoj/Programování nových SW modulů, vytvoření rozhraní pro výměnu dat se SW třetích stran a jejich konfigurace**	Development/Programming of new SW modules, creation of interfaces for data exchange with third party SW and their configuration	**471 dys**	**Fri 20.05.22**	**Fri 08.03.24**		
47	Vývoj a postupná implementace	Development and gradual implementation	183 dys	Fri 20.05.22	Tue 31.01.23	23	ZHO
48	Příprava a zpřístupnění integračního rozhraní účetního systému	Preparation and making the access to the integration interface of the Accounting	105 dys	Wed 01.06.22	Tue 25.10.22	47SS	OBJ
49	Testování a odstraňování chyb (bug fixing)	Testing and bug fixing	233 dys	Wed 19.04.23	Fri 08.03.24	6OFF	ZHO
50	Připravenost k FAT	Readiness to the FAT	0 dys	Fri 08.03.24	Fri 08.03.24	49	ZHO
51	**Příprava a migrace testovacích dat**	**Preparation and migration of testing data**	**481 dys**	**Fri 20.05.22**	**Fri 22.03.24**		
52	Příprava na kontrolu dat, metodika, případné vytvoření pomocných nástrojů	Preparation for checking the data, methodology, or creation of auxiliary tools	60 dys	Fri 20.05.22	Thu 11.08.22	23	OBJ, ZHO
53	**Kontrola a oprava dat**	Checking the data and its correction	396 dys	Fri 02.09.22	Fri 08.03.24		
54	Kontrola a oprava dat	Checking the data and its correction	396 dys	Fri 02.09.22	Fri 08.03.24	6OFF	OBJ
55	Vývoj skriptu na korekci dat	Development of data correction script(s)	396 dys	Fri 02.09.22	Fri 08.03.24	6OFF	ZHO
56	Příprava pro FAT	Preparation for the FAT	80 dys	Mon 20.11.23	Fri 08.03.24	6OFF	ZHO
57	Příprava pro SAT, PT	Preparation for the SAT and PT	80 dys	Mon 20.11.23	Fri 08.03.24	6OFF	ZHO
58	Podepsaný Protokol o připravenosti testovacích dat	Signed Protocol on test data readiness	0 dys	Fri 08.03.24	Fri 08.03.24	57	OBJ, ZHO
59	**Testování typu Sanity Check**	**Sanity Check Phase**	**55 dys**	**Mon 08.01.24**	**Fri 22.03.24**		
60	Testování Objednatelem a opravy hlášených chyb Zhotovitelem	Testing by the Client and corrections of reported errors by the Contractor	45 dys	Mon 08.01.24	Fri 08.03.24		OBJ, ZHO
61	Rekonfigurace testovacího prostředí	Reconfiguring the testing environment	5 dys	Mon 11.03.24	Fri 15.03.24	60	ZHO
62	Zpracování zpětné vazby z testování Sanity Check	Processing feedback from Sanity Chech testing	10 dys	Mon 11.03.24	Fri 22.03.24	60	ZHO
63	**Testování dle testovacích scénářů (FAT)**	**Testing according to test scenarios (FAT)**	**61 dys**	**Mon 29.01.24**	**Mon 22.04.24**		
64	Plánování realizace FAT	Planning the FAT execution	30 dys	Mon 29.01.24	Fri 08.03.24	60FS-30 dys	ZHO
65	Příprava prostředí FAT	Preparation of the FAT environment	10 dys	Mon 26.02.24	Fri 08.03.24	64FF	ZHO
66	Výzva k připravenosti na FAT	Call for the readiness to the FAT	0 dys	Mon 26.02.24	Mon 26.02.24	64FS-10 dys	ZHO
67	Testování Objednatelem a opravy hlášených chyb Zhotovitelem	Testing by the Client and corrections of reported errors by the Contractor	30 dys	Mon 11.03.24	Fri 19.04.24	64	OBJ, ZHO
68	Vyhodnocení testování FAT	Assessment of the FAT	1 dy	Mon 22.04.24	Mon 22.04.24	67	OBJ
69	Úspěšné ukončení FAT	Successful completion of the FAT	0 dys	Mon 22.04.24	Mon 22.04.24	68	OBJ, ZHO
70	**Testování dle testovacích scénářů (SAT)**	**Testing according to test scenarios (SAT)**	**41 dys**	**Tue 23.04.24**	**Tue 18.06.24**		
71	Plánování realizace SAT	Planning the SAT execution	20 dys	Tue 23.04.24	Mon 20.05.24	69	ZHO
72	Příprava prostředí, včetně součinnosti Objedna	Environment preparation, includes co-opera	10 dys	Tue 07.05.24	Mon 20.05.24	71FF	OBJ, ZHO
73	Výzva k připravenosti na SAT	Call for the readiness to the SAT	0 dys	Tue 07.05.24	Tue 07.05.24	71FS-10 dys	ZHO
74	Testování Objednatelem a opravy hlášených chyb Zhotovitelem	Testing by the Client and corrections of reported errors by the Contractor	20 dys	Tue 21.05.24	Mon 17.06.24	71	OBJ, ZHO
75	Vyhodnocení testování SAT	Assessment of the SAT	1 dy	Tue 18.06.24	Tue 18.06.24	74	OBJ
76	Úspěšné ukončení SAT	Successful completion of the SAT	0 dys	Tue 18.06.24	Tue 18.06.24	75	OBJ, ZHO
77	**Průřezové testování (PT)**	**Cross-sectional testing (PT)**	**41 dys**	**Wed 19.06.24**	**Wed 14.08.24**		
78	Plánování realizace PT	Planning the PT execution	20 dys	Wed 19.06.24	Tue 16.07.24	76	ZHO
79	Příprava prostředí, včetně součinnosti Objedna	Environment preparation, includes co-opera	10 dys	Wed 03.07.24	Tue 16.07.24	78FF	OBJ, ZHO
80	Výzva k připravenosti na PT	Call for the readiness to the PT	0 dys	Wed 03.07.24	Wed 03.07.24	78FS-10 dys	ZHO
81	Testování Objednatelem a opravy hlášených chyb Zhotovitelem	Testing by the Client and corrections of reported errors by the Contractor	20 dys	Wed 17.07.24	Tue 13.08.24	78	OBJ, ZHO
82	Vyhodnocení testování PT	Assessment of the PT	1 dy	Wed 14.08.24	Wed 14.08.24	81	OBJ
83	Úspěšné ukončení PT	Successful completion of the PT	0 dys	Wed 14.08.24	Wed 14.08.24	82	OBJ, ZHO
84	**Školící materiály a školení klíčových osob**	**Training materials and training of key users**	**137 dys**	**Mon 19.02.24**	**Wed 28.08.24**		
85	Školení testerů před FAT	Training the testers before the FAT	5 dys	Mon 19.02.24	Mon 26.02.24	66FF	OBJ, ZHO
86	Školení testerů před SAT a PT	Training the testers before the SAT and the	5 dys	Tue 30.04.24	Tue 07.05.24	73FF	OBJ, ZHO
87	Školení uživatelů před Závěrečným ověřením funkčnosti	Training the users before the Final Functionality Verification	5 dys	Wed 21.08.24	Wed 28.08.24	91SF-5 dys	OBJ, ZHO
88	**Ukončení analytické, návrhové, vývojové, dodávkové, testovací a akceptační fáze**	**Completion of analytical, design, development, delivery, testing and**	**0 dys**	**Wed 14.08.24**	**Wed 14.08.24**	**83**	**OBJ, ZHO**
89	**Závěrečné ověření funkčnosti**	**Execution of the Final Functionality Verifica**	**45 dys**	**Thu 15.08.24**	**Wed 16.10.24**		
90	Vyčištění produkčního prostředí od zkušebních	Cleaning up the test data from the productic	1 dy	Thu 15.08.24	Thu 15.08.24	83	OBJ, ZHO
91	Příprava finální migrace produkčních dat, včetně součinnosti Objednatele	Preparation to the final migration of production data, includes co-operation of	9 dys	Thu 15.08.24	Tue 27.08.24	83	OBJ, ZHO
92	Finální migrace produkčních dat, včetně součinnosti Objednatele	Final migration of production data, includes co-operation of the Client	5 dys	Wed 28.08.24	Tue 03.09.24	91	OBJ, ZHO
93	Ověření funkčnosti (produkční data), zvýšená podpora zhotovitele on-site	Functionality verification (production data), increased Contractor's support on-site	30 dys	Wed 04.09.24	Tue 15.10.24	92	OBJ, ZHO
94	Soupis nahlášených neopravených chyb	List of reported uncorrected errors	0 dys	Tue 24.09.24	Tue 24.09.24	93FF-15 dys	OBJ
95	Oprava všech nahlášených chyb závažnosti 1, 2	Correction of all reported errors of the Seve	15 dys	Wed 25.09.24	Tue 15.10.24	94	ZHO
96	Vyhodnocení Závěrečného ověření funkčnosti	Assessment of the Final Functionality Verific	1 dy	Wed 16.10.24	Wed 16.10.24	93	OBJ
97	Úspěšné ukončení Závěrečného ověření funkčnosti	Successful completion of the Final Functionality Verification	0 dys	Wed 16.10.24	Wed 16.10.24	96	OBJ, ZHO
98	**Dokumentace skutečného provedení (DSkP)**	**Documentation of Actual Construction (DSi**	**117 dys**	**Tue 07.05.24**	**Wed 16.10.24**		
99	Zpracování DSkP	Elaboration of the DSkP	90 dys	Tue 07.05.24	Mon 09.09.24	73	ZHO
100	Připomínkové řízení na straně Objednatele	Comment procedure on the Client's side	10 dys	Tue 10.09.24	Mon 23.09.24	99	OBJ
101	Zapracování připomínek k výstupu Zhotovitele	Incorporation of comments on the output b	5 dys	Tue 24.09.24	Mon 30.09.24	100	ZHO
102	Ověření způsobu zapracování připomínek k výstupu Objednatelem	Verification of the method of incorporating comments on the output by the Client	5 dys	Tue 01.10.24	Mon 07.10.24	101	OBJ
103	Finalizace výstupu Zhotovitelem	Finalization of the output by the Contractor	5 dys	Tue 08.10.24	Mon 14.10.24	102	ZHO
104	Formální provedení akceptace Objednatelem	Formal acceptance by the Client	2 dys	Tue 15.10.24	Wed 16.10.24	103	OBJ
105	Odsouhlasená DSkP	Agreed DSkP	0 dys	Wed 16.10.24	Wed 16.10.24	104	OBJ, ZHO
106	Projektová rezerva (může být použita v odůvodněných případech v každé individuální části projektu)	Project time reserve (can be used in justified cases in individual phases of the project)	32 dys	Thu 17.10.24	Fri 29.11.24	98	
107							
108	**Smluvní termín ukončení projektu**	**Contractual date of the Project completion**	**0 dys**	**Fri 29.11.24**	**Fri 29.11.24**	**106FF**	

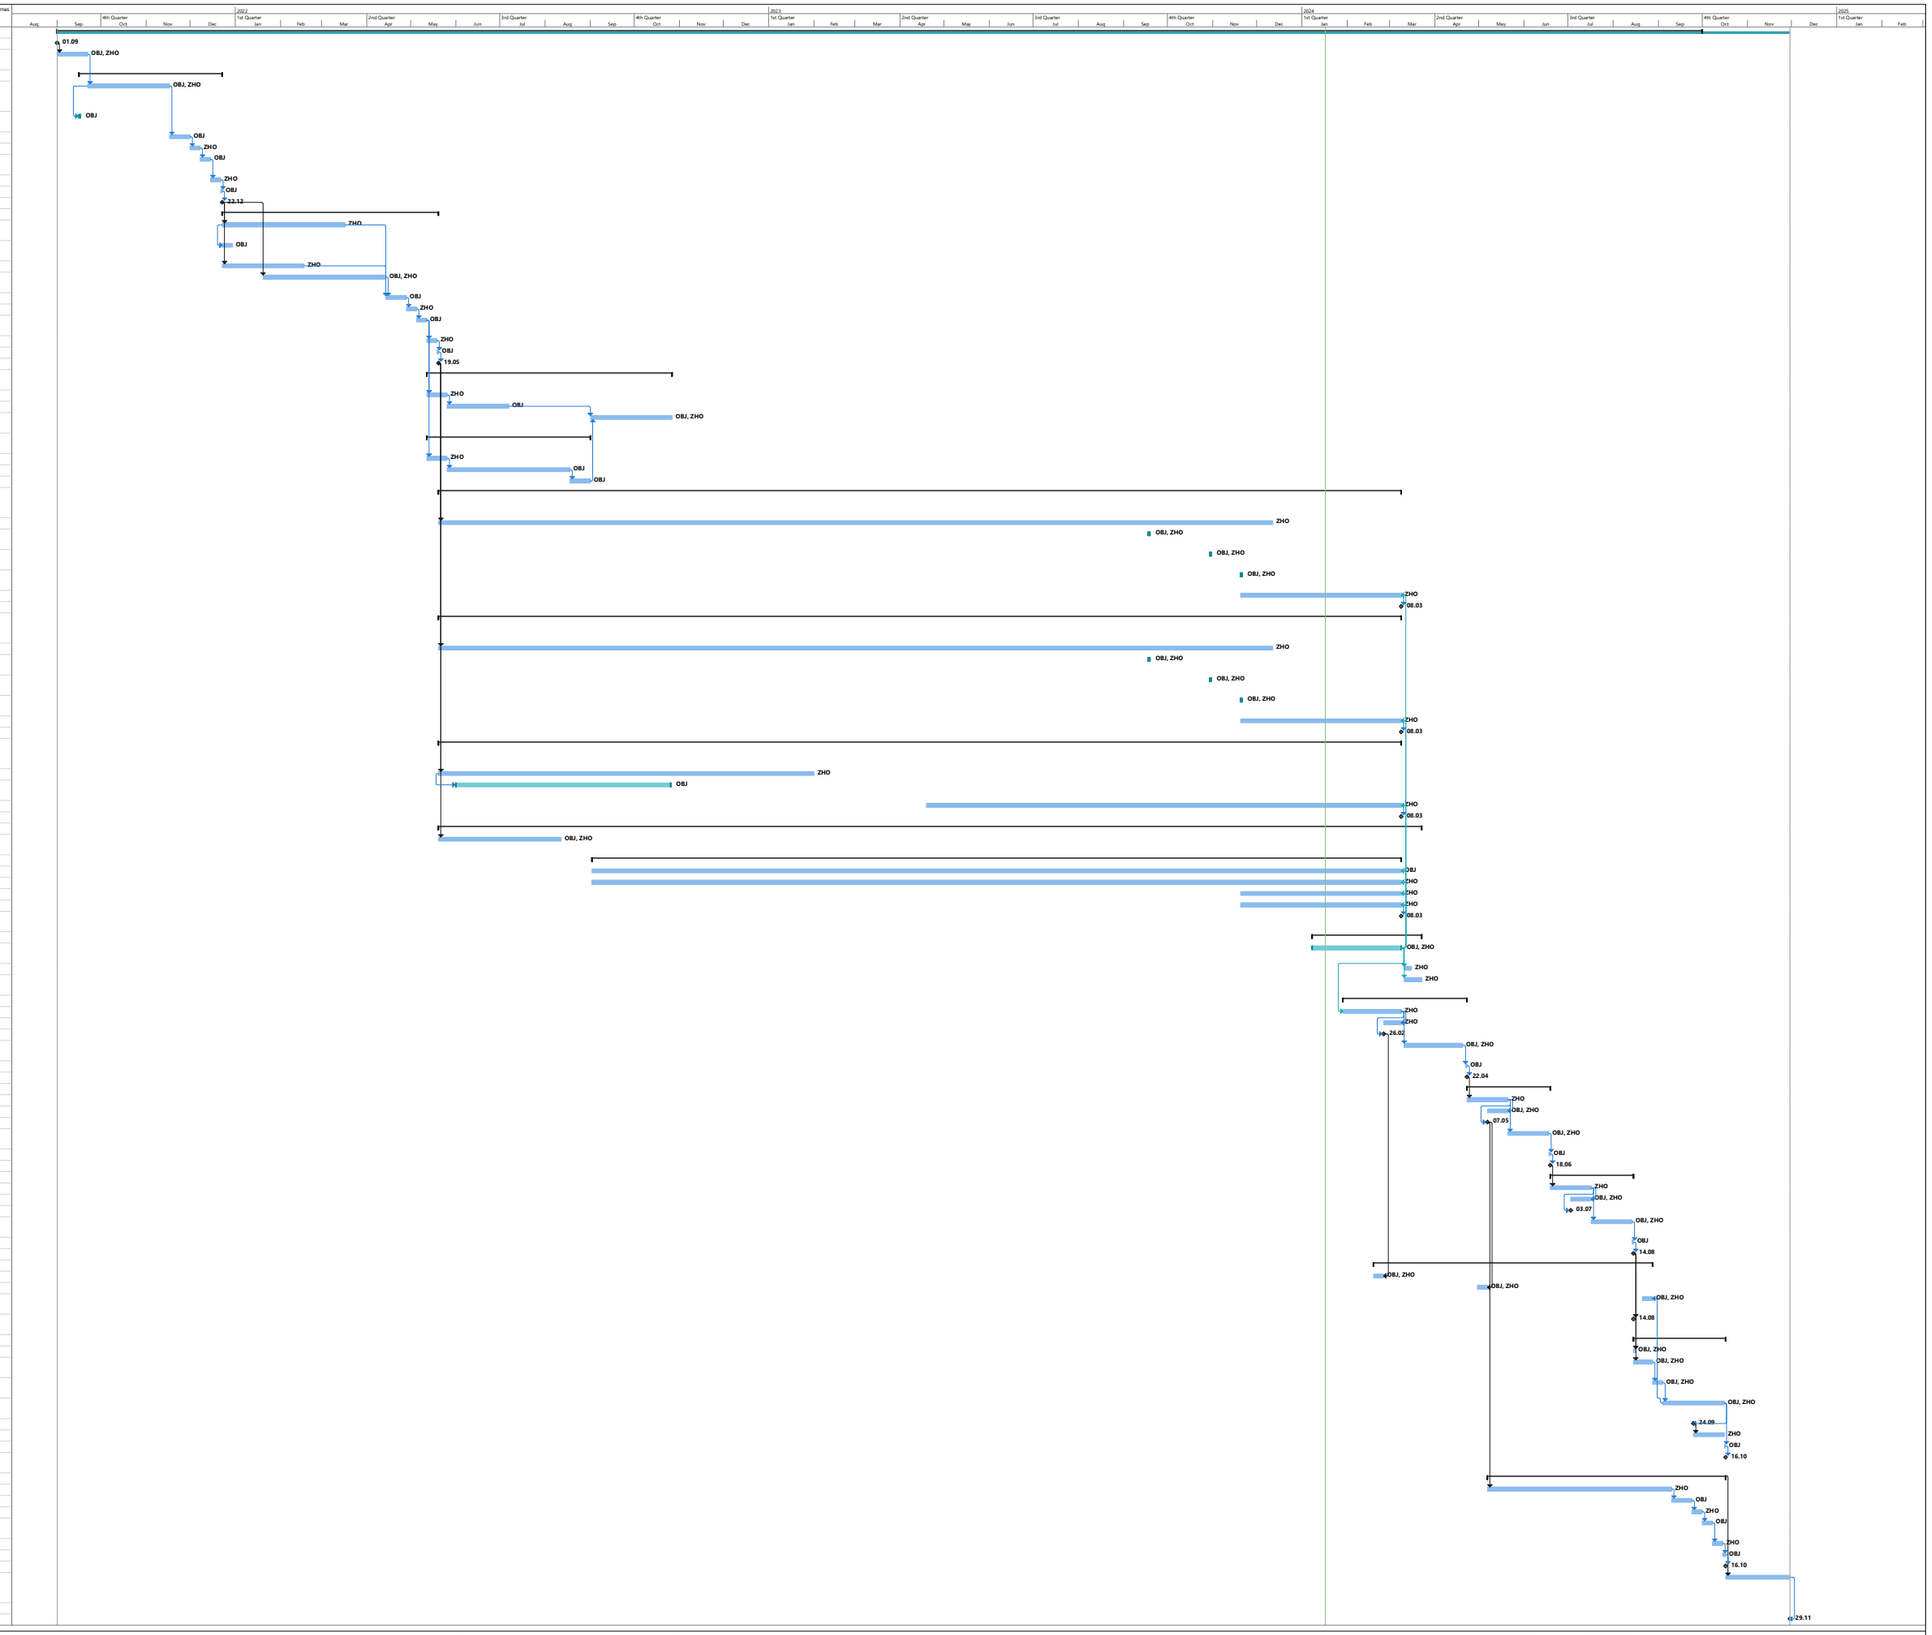

Project: Příloha č. 3 - Harmonog
Date: Wed 17.01.24

Task | Split | Milestone | Summary | Project Summary | Inactive Task | Inactive Milestone | Inactive Summary | Manual Task | Duration-only | Manual Summary Rollup | Manual Summary | Start-only | Finish-only | External Tasks | External Milestone | Deadline | Progress | Manual Progress
