42613 Oprava izolace nad zásobovacím tunelem - Etapy III-VI

ID	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	Předchůdci
0	**160122_hmg_Oprava HI zásobovacího tunelu- et. III-VI**	**267 d**	**1.6. 16**	**23.5. 17**	
1	1 Vzorkování kamene	14 d	1.6. 16	14.6. 16	
2	2 Dodávka kamene	78 d	15.6. 16	31.8. 16	1
3	**3 Realizace ETAP III-VI**	**168 d**	**25.8. 16**	**9.5. 17**	
4	3.1 Etapa VI	32 d	1.9. 16	2.10. 16	2
5	3.2 Etapa V	38 d	3.10. 16	9.11. 16	4
6	3.3 Etapa IV	35 d	1.3. 17	4.4. 17	
7	3.4 Etapa III	49 d	5.4. 17	23.5. 17	6

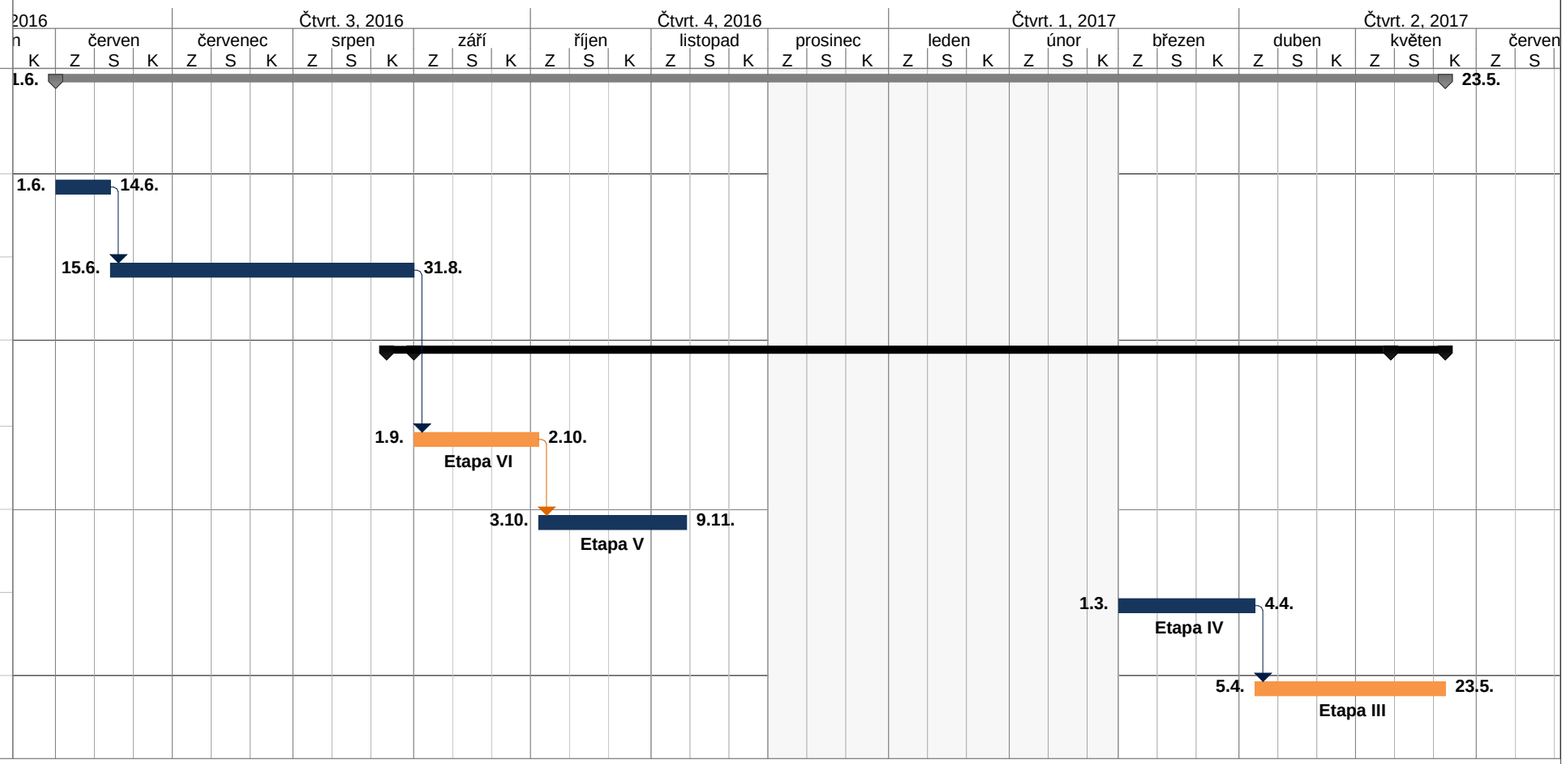

Název projektu:42613_Oprava izolace nad zásobovacím tunelem Autor harmonogramu:
Datum: 6.4. 16
