Revitalizace UMPRUM - 4.etapa, 1.fáze

MILNÍKY
INVESTOR
ÚŘAD + INŽENÝRSKÁ ČINNSOT
PROJEKTANT
INVESTOR + PROJEKTANT
SPECIALISTÉ INVESTORA

HARMONOGRAM PROJEKTOVÉ PŘÍPRAVY STAVBY - fáze DPS a realizace
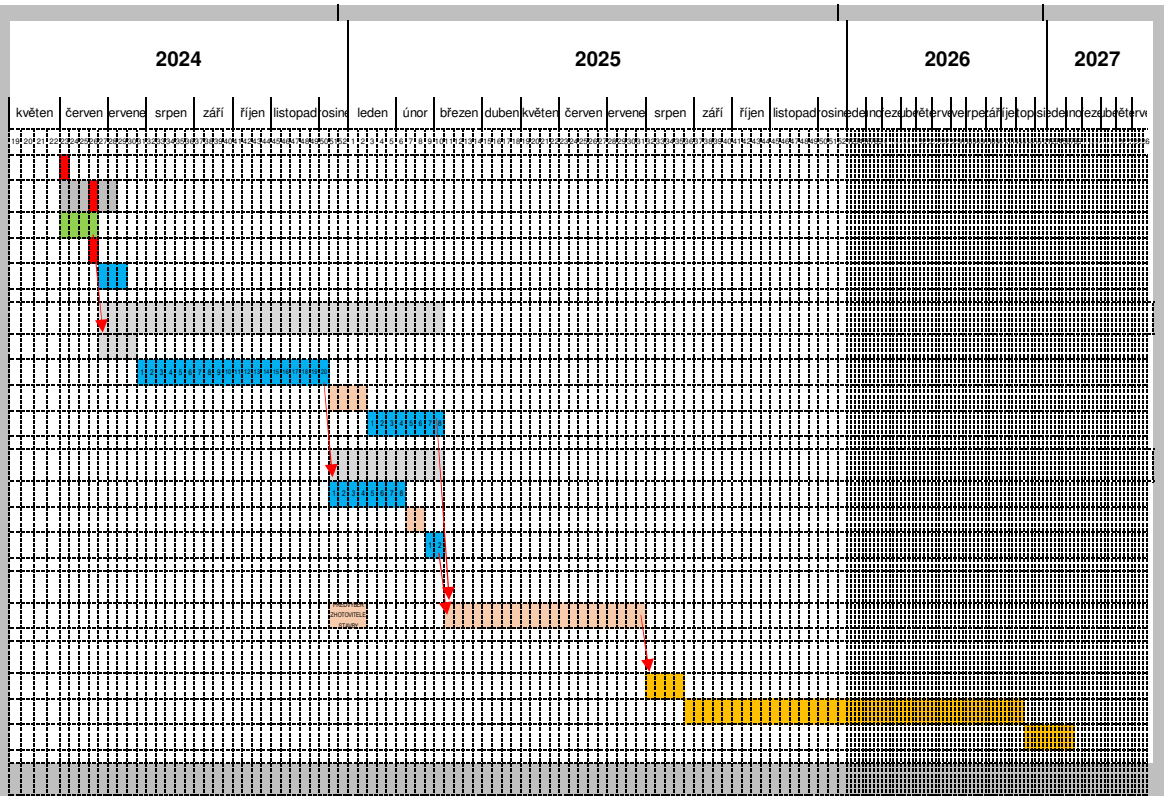
DEN VYDÁNÍ TOHOTO HARMONOGRAMU	**04.06.2024**
SMLUVNÍ UJEDNÁNÍ	
SMLUVNÍ JEDNÁNÍ	od 05.06.2024
SMLOUVA O DÍLO - dohoda - podpis	podpis do 30.6.2024
NAVAZUJÍCÍ SMLUVNÍ DOHODY UVNITŘ PROJEKTOVÉHO TÝMU	3 TÝDNY
DOKUMENACE PRO PROVEDENÍ STAVBY	
PŘÍPRAVA PROJEKČNÍHO TÝMU NA ZAHÁJENÍ PRACÍ	4 TÝDNY (zahájení nejdříve 1.8.)
HRUBOPIS DPS K PROJEDNÁNÍ S KLIENTEM	20 TÝDNŮ
PŘIPOMÍNKY OBJEDNATELE, PROJEDNÁNÍ PŘIPOMÍNEK A DOHODA O JEJICH ZAPRACOVÁNÍ	4 TÝDNY (PŘEDPOKLAD)
DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY - ČISTOPIS PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE	8 TÝDNŮ
SUPIS PRACÍ A DODÁVEK	
KONCEPT SPD K ODSOUHLASENÍ	8 TÝDNŮ
PŘIPOMÍNKY OBJEDNATELE, PROJEDNÁNÍ PŘIPOMÍNEK A DOHODA O JEJICH ZAPRACOVÁNÍ	2 TÝDNY (PŘEDPOKLAD)
SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK - ČISTOPIS PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE	2 TÝDNY
VÝBĚR ZHOTOVITELE STAVBY	
VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ PODLE ZÁKONA O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK	PŘEDPOKLAD 1+5 MĚSÍCŮ
REALIZACE STAVBY	**OD 1.8.2025**
PŘÍPRAVA REALIZACE STAVBY	1 MĚSÍC
REALIZACE STAVBY	15 MĚSÍCŮ
DOKONČENÍ STAVBY, ODSTRANĚNÍ VAD A NEDODĚLKŮ / KOLAUDACE A PŘEDÁNÍ STAVBY	3 MĚSÍCE
