Harmonogram stavby "NAVÝŠENÍ KAPACITY JESLÍ NA SÍDLIŠTI SVOBODY V PROSTĚJOVĚ"

Kód položky	Popis	MJ	Začátek	Konec	Délka trvání	Cena celk.	Množství	Stav
	NAVÝŠENÍ KAPACITY JESLÍ NA SÍDLIŠTI SVOBODY V PROSTĚJOVĚ		01.07.2024	31.10.2025	121,00	27 514 000,00	1,000	999
01	00 01 - Nový pavilon - VLAKNI (ZPOSOBILÉ VÝDAJE		01.07.2024	31.10.2025	121,00	13 175 000,00	1,000	999
01.1	00 01 - Demolice a bourání objektu		01.07.2024	31.07.2024	1,00	287 000,00	1,000	999
HSV	Práce a dodávky HSV		01.07.2024	31.07.2024	1,00	287 000,00	1,000	999
1	Zemní práce		01.07.2024	31.07.2024	0,86	240 000,00	1,000	999
3	Komunikace pojezdné		01.07.2024	31.07.2024	0,11	31 104,00	1,000	999
99	Přesun hmot a manipulace se suť		01.07.2024	31.07.2024	0,04	24 096,00	1,000	999
01.2	00 01 - Nadstavba a kompletní hlad		01.08.2024	31.10.2025	106,00	13 413 000,00	1,000	999
HSV	Práce a dodávky HSV		01.08.2024	15.10.2024	44,00	2 391 000,00	1,000	999
1	Zemní práce		01.08.2024	31.08.2024	1,00	1 000 000,00	1,000	999
2	Základy		01.08.2024	31.08.2024	1,00	322 000,00	1,000	999
3	Svislé a kompletní konstrukce		01.08.2024	30.09.2024	26,00	150 000,00	1,000	999
4	Vodorovné konstrukce		01.08.2024	30.09.2024	26,00	567 000,00	1,000	999
5	Komunikace pojezdné		01.08.2024	31.08.2024	4,70	166 000,00	1,000	999
6	Úpravy povrchu, podlahy a izolace bez úprav		01.08.2024	31.08.2024	44,00	1 000 000,00	1,000	999
8	Trubní vedení		01.08.2024	31.08.2024	1,00	12 000,00	1,000	999
30	Ocelové konstrukce a montáž ocelových staveb		01.08.2024	31.08.2024	1,10	12 321,21	1,000	999
46	Bourání konstrukcí		01.08.2024	31.08.2024	1,10	17 424,11	1,000	999
99	Přesun hmot a manipulace se suť		01.08.2024	31.08.2024	0,33	37 000,00	1,000	999
PSV	Práce a dodávky PSV		01.08.2024	31.08.2024	56,00	8 965 000,00	1,000	999
711	Izolace proti vlhkosti - střechy a plochy		01.08.2024	31.08.2024	4,00	167 000,00	1,000	999
712	Povlakové krytiny		01.08.2024	31.08.2024	4,00	1 000 000,00	1,000	999
713	Izolace tepelné		01.08.2024	31.08.2024	10,00	800 000,00	1,000	999
721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace		01.08.2024	31.08.2024	0,42	17 000,00	1,000	999
723	Zdravotechnika - vnitřní plynovod		01.08.2024	31.08.2024	0,84	35 000,00	1,000	999
762	Konstrukce tesařské		01.08.2024	31.08.2024	1,70	77 000,00	1,000	999
763	Konstrukce suché výstavby		01.08.2024	31.08.2024	17,00	468 000,00	1,000	999
764	Konstrukce klempířské		01.08.2024	31.08.2024	6,70	83 875,70	1,000	999
766	Konstrukce truhlářské		01.08.2024	31.08.2024	1,00	200 000,00	1,000	999
767	Konstrukce zámečnické		01.08.2024	31.10.2025	106,00	4 645 140,00	1,000	999
771	Podlahy z dlaždic		01.08.2024	31.08.2024	0,40	10 000,00	1,000	999
776	Podlahy povlakové		01.08.2024	31.08.2024	8,00	207 000,00	1,000	999
781	Dokončovací práce - obklady		01.08.2024	31.08.2024	2,00	109 114,00	1,000	999
783	Dokončovací práce - nátěry		01.08.2024	31.08.2024	1,00	50 000,00	1,000	999
784	Dokončovací práce - malby a tapety		01.08.2024	31.08.2024	2,00	30 000,00	1,000	999
786	Dokončovací práce - čalounické úpravy		01.08.2024	31.08.2024	16,00	701 601,00	1,000	999
789	Povrchová úprava ocelových konstrukcí a technologických zařízení		01.08.2024	31.08.2024	3,00	105 000,00	1,000	999
HZS	Hodinové zúčtovací sazby		01.08.2024	31.08.2024	3,00	200 000,00	1,000	999
01.3	00 01 - Elektro instalace		15.07.2024	31.10.2025	16,00	119 000,00	1,000	999
HSV	Práce a dodávky HSV		15.07.2024	31.07.2024	4,00	81 000,00	1,000	999
4	Vodorovné konstrukce		15.07.2024	31.07.2024	4,00	81 000,00	1,000	999
1	Zemní práce		15.07.2024	31.07.2024	4,00	19 000,00	1,000	999
4	Vodorovné konstrukce		15.07.2024	31.07.2024	0,71	39 015,00	1,000	999
8	Trubní vedení		15.07.2024	31.07.2024	0,33	8 812,00	1,000	999
721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace		15.07.2024	31.07.2024	2,00	50 675,07	1,000	999
21-M	Montáže sporáků		15.07.2024	31.07.2024	1,00	1 000,00	1,000	999
22	Montáže ostatních zařízení		15.07.2024	31.07.2024	1,00	20 000,00	1,000	999
23	Montáže potrubí		15.07.2024	31.07.2024	1,00	9 000,00	1,000	999
4	Vodorovné konstrukce		15.07.2024	31.07.2024	0,25	7 400,00	1,000	999
8	Trubní vedení		15.07.2024	31.07.2024	0,08	5 187,75	1,000	999
PSV	Práce a dodávky PSV		15.07.2024	31.07.2024	16,00	1 331 000,00	1,000	999
722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod		15.07.2024	31.07.2024	16,00	702 000,00	1,000	999
725	Zdravotechnika - zařízení pro předměty		15.07.2024	31.07.2024	1,00	100 000,00	1,000	999
998	Přesun hmot		15.07.2024	31.07.2024	1,00	19 000,00	1,000	999
725	Zdravotechnika - předstěnové instalace		15.07.2024	31.07.2024	1,00	50 000,00	1,000	999
34	HDC Přípojka		15.07.2024	31.07.2024	2,00	42 615,00	1,000	999
35	HDC - vodovací studna		15.07.2024	31.07.2024	3,00	124 575,00	1,000	999
36	HDC - vodovací šachta		15.07.2024	31.07.2024	2,00	115 575,00	1,000	999
01.4	00 01 - Vnitřní vodovod		01.08.2024	31.08.2024	5,00	307 000,00	1,000	999
HSV	Práce a dodávky HSV		01.08.2024	31.08.2024	1,00	67 000,00	1,000	999
713	Izolace tepelné		01.08.2024	31.08.2024	1,00	17 000,00	1,000	999
732	Zařízení výroباních, provozních médií		01.08.2024	31.08.2024	0,00	2 176,51	1,000	999
733	Zařízení výroباních, rozvodné potrubí		01.08.2024	31.08.2024	0,00	21 125,84	1,000	999
734	Zařízení výroباních, armatury		01.08.2024	31.08.2024	0,00	20 927,17	1,000	999
735	Zařízení výroباních, otopná tělesa		01.08.2024	31.08.2024	0,00	2 170,48	1,000	999
783	Dokončovací práce - nátěry		01.08.2024	31.08.2024	0,00	2 218,00	1,000	999
HZS	Hodinové zúčtovací sazby		01.08.2024	31.08.2024	2,00	50 000,00	1,000	999
01.5	00 01 - Kanalizačních		01.08.2024	31.08.2024	4,00	41 000,00	1,000	999
PSV	Práce a dodávky PSV		01.08.2024	31.08.2024	0,00	41 000,00	1,000	999
713	Izolace tepelné		01.08.2024	31.08.2024	0,01	500,00	1,000	999
721	Vnitřní kanalizace		01.08.2024	31.08.2024	0,00	0,00	1,000	999
721-A00	Demontáže přípojek		01.08.2024	31.08.2024	0,40	10 497,72	1,000	999
721-A01	Vnitřní kanalizace		01.08.2024	31.08.2024	0,40	29 502,28	1,000	999
721-A02	Kanalizační přípojka		01.08.2024	31.08.2024	0,11	2 000,00	1,000	999
01.6	00 01 - Mříže a kryciích (BoK)		01.07.2024	31.07.2024	0,00	0,00	1,000	999
01	Řídící systém		01.07.2024	31.07.2024	0,00	0,00	1,000	999
02	Palc instrumentace, nastavení		01.07.2024	31.07.2024	0,00	0,00	1,000	999
03	Montážní materiál		01.07.2024	31.07.2024	0,00	0,00	1,000	999
04	Elektromontážní práce		01.07.2024	31.07.2024	0,00	0,00	1,000	999
M01	Demontáže		01.07.2024	31.07.2024	0,00	0,00	1,000	999
01.7	00 01 - Elektroinstalace silnoprovud,hromosvod		01.07.2024	31.07.2024	0,00	0,00	1,000	999
01	Hromosvod		01.07.2024	31.07.2024	0,00	0,00	1,000	999
90	Hodiny k dílčím ani nelze (HZS)		01.07.2024	31.07.2024	0,00	0,00	1,000	999
01	Hromosvod		01.07.2024	31.07.2024	0,00	0,00	1,000	999
02	Ostatní materiál		01.07.2024	31.07.2024	0,00	0,00	1,000	999
03	Elektroinstalace		01.07.2024	31.07.2024	0,00	0,00	1,000	999
04	Mříže a přípravy		01.07.2024	31.07.2024	0,00	0,00	1,000	999
41	Úprava povrchu vnitřního		01.07.2024	31.07.2024	0,00	0,00	1,000	999
90	Hodiny k dílčím ani nelze (HZS)		01.07.2024	31.07.2024	0,00	0,00	1,000	999
97	Prvotní revize a ostatní bezpečnostní		01.07.2024	31.07.2024	0,00	0,00	1,000	999
98	Demontáže		01.07.2024	31.07.2024	0,00	0,00	1,000	999
04	VV - Ucelené sdružené(vnitřní)		01.07.2024	31.07.2024	0,00	0,00	1,000	999
90	Hodinové zúčtovací sazby (HZS)		01.07.2024	31.07.2024	0,00	0,00	1,000	999
D.OP	Dodatkové práce, dle Sb. - hodinové zúčtovací sazby (HZS)		01.07.2024	31.07.2024	0,00	0,00	1,000	999
M01	Demontáže		01.07.2024	31.07.2024	0,00	0,00	1,000	999
01	Hromosvod		01.07.2024	31.07.2024	0,00	0,00	1,000	999
01.8	00 01 - Bezpečnost		01.08.2024	31.08.2024	0,00	0,00	1,000	999
01.8.1	EZ - rozpočet 00 01		01.08.2024	31.08.2024	0,00	0,00	1,000	999
01	Elektrické zařízení		01.08.2024	31.08.2024	0,00	0,00	1,000	999
01.8.2	VKS rozpočet 00 01		01.08.2024	31.08.2024	0,00	0,00	1,000	999
01	Univerzální kabelový systém		01.08.2024	31.08.2024	0,00	0,00	1,000	999
01.8.4	EPS rozpočet 00 01		01.08.2024	31.08.2024	0,00	0,00	1,000	999
01.8.5	ZVS rozpočet 00 01		01.08.2024	31.08.2024	0,00	0,00	1,000	999
01.8.6	VRT rozpočet 00 01		01.08.2024	31.08.2024	0,00	0,00	1,000	999
01	Elektrické zařízení		01.08.2024	31.08.2024	0,00	0,00	1,000	999
01.8.7	MT rozpočet 00 01		01.08.2024	31.08.2024	0,00	0,00	1,000	999
01	Ostatní technické celky		01.08.2024	31.08.2024	0,00	0,00	1,000	999
02	Ostatní technické celky II		01.08.2024	31.08.2024	0,00	0,00	1,000	999
02	00 02 - Nadstavba - nový zděný/dřevěný pavilon B - NEPOSOBILÉ VÝDAJE		01.07.2024	31.10.2025	16,00	1 700 000,00	1,000	999
02.1	00 02 - Demolice a bourání		01.07.2024	31.07.2024	1,00	100 000,00	1,000	999
02.2	00 02 - Nadstavba a kompletní hlad		01.08.2024	31.10.2025	4,00	1 600 000,00	1,000	999
HSV	Práce a dodávky HSV		01.08.2024	31.08.2024	4,00	300 000,00	1,000	999
1	Zemní práce		01.08.2024	31.08.2024	0,11	2 000,00	1,000	999
2	Základy		01.08.2024	31.08.2024	0,17	5 901,27	1,000	999
3	Svislé a kompletní konstrukce		01.08.2024	31.08.2024	0,75	31 000,00	1,000	999
6	Úpravy povrchu, podlahy a izolace bez úprav		01.08.2024	31.08.2024	4,00	187 937,96	1,000	999
8	Trubní vedení		01.08.2024	31.08.2024	0,33	1 000,00	1,000	999
30	Ocelové konstrukce a montáž ocelových staveb		01.08.2024	31.08.2024	0,33	3 687,79	1,000	999
46	Bourání konstrukcí		01.08.2024	31.08.2024	0,33	5 217,21	1,000	999
99	Přesun hmot a manipulace se suť		01.08.2024	31.08.2024	0,33	18 000,00	1,000	999
PSV	Práce a dodávky PSV		01.08.2024	31.08.2024	4,00	800 000,00	1,000	999
711	Izolace proti vlhkosti - střechy a plochy		01.08.2024	31.08.2024	0,33	11 000,00	1,000	999
712	Povlakové krytiny		01.08.2024	31.08.2024	3,14	125 000,00	1,000	999
713	Izolace tepelné		01.08.2024	31.08.2024	0,33	26 000,00	1,000	999
721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace		01.08.2024	31.08.2024	0,42	17 000,00	1,000	999
723	Zdravotechnika - vnitřní plynovod		01.08.2024	31.08.2024	0,84	35 000,00	1,000	999
762	Konstrukce tesařské		01.08.2024	31.08.2024	1,70	77 000,00	1,000	999
763	Konstrukce suché výstavby		01.08.2024	31.08.2024	17,00	468 000,00	1,000	999
764	Konstrukce klempířské		01.08.2024	31.08.2024	6,70	83 875,70	1,000	999
766	Konstrukce truhlářské		01.08.2024	31.08.2024	1,00	200 000,00	1,000	999
767	Konstrukce zámečnické		01.08.2024	31.10.2025	106,00	4 645 140,00	1,000	999
771	Podlahy z dlaždic		01.08.2024	31.08.2024	0,40	10 000,00	1,000	999
776	Podlahy povlakové		01.08.2024	31.08.2024	8,00	207 000,00	1,000	999
781	Dokončovací práce - obklady		01.08.2024	31.08.2024	2,00	109 114,00	1,000	999
783	Dokončovací práce - nátěry		01.08.2024	31.08.2024	1,00	50 000,00	1,000	999
784	Dokončovací práce - malby a tapety		01.08.2024	31.08.2024	2,00	30 000,00	1,000	999
786	Dokončovací práce - čalounické úpravy		01.08.2024	31.08.2024	16,00	701 601,00	1,000	999
789	Povrchová úprava ocelových konstrukcí a technologických zařízení		01.08.2024	31.08.2024	3,00	105 000,00	1,000	999
HZS	Hodinové zúčtovací sazby		01.08.2024	31.08.2024	3,00	200 000,00	1,000	999
02.3	00 02 - Elektro instalace		15.07.2024	31.10.2025	16,00	119 000,00	1,000	999
HSV	Práce a dodávky HSV		15.07.2024	31.07.2024	4,00	81 000,00	1,000	999
4	Vodorovné konstrukce		15.07.2024	31.07.2024	4,00	81 000,00	1,000	999
1	Zemní práce		15.07.2024	31.07.2024	4,00	19 000,00	1,000	999
4	Vodorovné konstrukce		15.07.2024	31.07.2024	0,71	39 015,00	1,000	999
8	Trubní vedení		15.07.2024	31.07.2024	0,33	8 812,00	1,000	999
721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace		15.07.2024	31.07.2024	2,00	50 675,07	1,000	999
21-M	Montáže sporáků		15.07.2024	31.07.2024	1,00	1 000,00	1,000	999
22	Montáže ostatních zařízení		15.07.2024	31.07.2024	1,00	20 000,00	1,000	999
23	Montáže potrubí		15.07.2024	31.07.2024	1,00	9 000,00	1,000	999
4	Vodorovné konstrukce		15.07.2024	31.07.2024	0,25	7 400,00	1,000	999
8	Trubní vedení		15.07.2024	31.07.2024	0,08	5 187,75	1,000	999
PSV	Práce a dodávky PSV		15.07.2024	31.07.2024	16,00	1 331 000,00	1,000	999
722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod		15.07.2024	31.07.2024	16,00	702 000,00	1,000	999
725	Zdravotechnika - zařízení pro předměty		15.07.2024	31.07.2024	1,00	100 000,00	1,000	999
998	Přesun hmot		15.07.2024	31.07.2024	1,00	19 000,00	1,000	999
725	Zdravotechnika - předstěnové instalace		15.07.2024	31.07.2024	1,00	50 000,00	1,000	999
34	HDC Přípojka		15.07.2024	31.07.2024	2,00	42 615,00	1,000	999
35	HDC - vodovací studna		15.07.2024	31.07.2024	3,00	124 575,00	1,000	999
36	HDC - vodovací šachta		15.07.2024	31.07.2024	2,00	115 575,00	1,000	999
02.4	00 02 - Vnitřní vodovod		01.08.2024	31.08.2024	5,00	307 000,00	1,000	999
HSV	Práce a dodávky HSV		01.08.2024	31.08.2024	1,00	67 000,00	1,000	999
713	Izolace tepelné		01.08.2024	31.08.2024	1,00	17 000,00	1,000	999
732	Zařízení výroباních, provozních médií		01.08.2024	31.08.2024	0,00	2 176,51	1,000	999
733	Zařízení výroباních, rozvodné potrubí		01.08.2024	31.08.2024	0,00	21 125,84	1,000	999
734	Zařízení výroباních, armatury		01.08.2024	31.08.2024	0,00	20 927,17	1,000	999
735	Zařízení výroباních, otopná tělesa		01.08.2024	31.08.2024	0,00	2 170,48	1,000	999
783	Dokončovací práce - nátěry		01.08.2024	31.08.2024	0,00	2 218,00	1,000	999
HZS	Hodinové zúčtovací sazby		01.08.2024	31.08.2024	2,00	50 000,00	1,000	999
02.5	00 02 - Kanalizačních		01.08.2024	31.08.2024	4,00	41 000,00	1,000	999
PSV	Práce a dodávky PSV		01.08.2024	31.08.2024	0,00	41 000,00	1,000	999
713	Izolace tepelné		01.08.2024	31.08.2024	0,01	500,00	1,000	999
721	Vnitřní kanalizace		01.08.2024	31.08.2024	0,00	0,00	1,000	999
721-A00	Demontáže přípojek		01.08.2024	31.08.2024	0,40	10 497,72	1,000	999
721-A01	Vnitřní kanalizace		01.08.2024	31.08.2024	0,40	29 502,28	1,000	999
721-A02	Kanalizační přípojka		01.08.2024	31.08.2024	0,11	2 000,00	1,000	999
02.6	00 02 - Mříže a kryciích (BoK)		01.07.2024	31.07.2024	0,00	0,00	1,000	999
01	Řídící systém		01.07.2024	31.07.2024	0,00	0,00	1,000	999
02	Palc instrumentace, nastavení		01.07.2024	31.07.2024	0,00	0,00	1,000	999
03	Montážní materiál		01.07.2024	31.07.2024	0,00	0,00	1,000	999
04	Elektromontážní práce		01.07.2024	31.07.2024	0,00	0,00	1,000	999
M01	Demontáže		01.07.2024	31.07.2024	0,00	0,00	1,000	999
02.7	00 02 - Elektroinstalace silnoprovud,hromosvod		01.07.2024	31.07.2024	0,00	0,00	1,000	999
01	Hromosvod		01.07.2024	31.07.2024	0,00	0,00	1,000	999
90	Hodiny k dílčím ani nelze (HZS)		01.07.2024	31.07.2024	0,00	0,00	1,000	999
01	Hromosvod		01.07.2024	31.07.2024	0,00	0,00	1,000	999
02	Ostatní materiál		01.07.2024	31.07.2024	0,00	0,00	1,000	999
03	Elektroinstalace		01.07.2024	31.07.2024	0,00	0,00	1,000	999
04	Mříže a přípravy		01.07.2024	31.07.2024	0,00	0,00	1,000	999
41	Úprava povrchu vnitřního		01.07.2024	31.07.2024	0,00	0,00	1,000	999
90	Hodiny k dílčím ani nelze (HZS)		01.07.2024	31.07.2024	0,00	0,00	1,000	999
97	Prvotní revize a ostatní bezpečnostní		01.07.2024	31.07.2024	0,00	0,00	1,000	999
98	Demontáže		01.07.2024	31.07.2024	0,00	0,00	1,000	999
04	VV - Ucelené sdružené(vnitřní)		01.07.2024	31.07.2024	0,00	0,00	1,000	999
90	Hodinové zúčtovací sazby (HZS)		01.07.2024	31.07.2024	0,00	0,00	1,000	999
D.OP	Dodatkové práce, dle Sb. - hodinové zúčtovací sazby (HZS)		01.07.2024	31.07.2024	0,00	0,00	1,000	999
M01	Demontáže		01.07.2024	31.07.2024	0,00	0,00	1,000	999
01	Hromosvod		01.07.2024	31.07.2024	0,00	0,00	1,000	999
02.8	00 02 - Bezpečnost		01.08.2024	31.08.2024	0,00	0,00	1,000	999
02.8.1	EZ - rozpočet 00 02		01.08.2024	31.08.2024	0,00	0,00	1,000	999
01	Elektrické zařízení		01.08.2024	31.08.2024	0,00	0,00	1,000	999
02.8.2	VKS rozpočet 00 02		01.08.2024	31.08.2024	0,00	0,00	1,000	999
01	Univerzální kabelový systém		01.08.2024	31.08.2024	0,00	0,00	1,000	999
02.8.4	EPS rozpočet 00 02		01.08.2024	31.08.2024	0,00	0,00	1,000	999
02.8.5	ZVS rozpočet 00 02		01.08.2024	31.08.2024	0,00	0,00	1,000	999
02.8.6	VRT rozpočet 00 02		01.08.2024	31.08.2024	0,00	0,00	1,000	999
01	Elektrické zařízení		01.08.2024	31.08.2024	0,00	0,00	1,000	999
02.8.7	MT rozpočet 00 02		01.08.2024	31.08.2024	0,00	0,00	1,000	999
01	Ostatní technické celky		01.08.2024	31.08.2024	0,00	0,00	1,000	999
02	Ostatní technické celky II		01.08.2024	31.08.2024	0,00	0,00	1,000	999
03	00 03 - Nadstavba - nový zděný/dřevěný pavilon C - NEPOSOBILÉ VÝDAJE		01.08.2024	31.10.2025	16,00	1 700 000,00	1,000	999
03.1	00 03 - Demolice a bourání		01.08.2024	31.08.2024	1,00	100 000,00	1,000	999
03.2	00 03 - Nadstavba a kompletní hlad		01.08.2024	31.10.2025	4,00	1 600 000,00	1,000	999
HSV	Práce a dodávky HSV		01.08.2024	31.08.2024	4,00	300 000,00	1,000	999
1	Zemní práce		01.08.2024	31.08.2024	0,11	2 000,00	1,000	999
2	Základy		01.08.2024	31.08.2024	0,17	5 901,27	1,000	999
3	Svislé a kompletní konstrukce		01.08.2024	31.08.2024	0,75	31 000,00	1,000	999
6	Úpravy povrchu, podlahy a izolace bez úprav		01.08.2024	31.08.2024	4,00	187 937,96	1,000	999
8	Trubní vedení		01.08.2024	31.08.2024	0,33	1 000,00	1,000	999
30	Ocelové konstrukce a montáž ocelových staveb		01.08.2024	31.08.2024	0,33	3 687,79	1,000	999
46	Bourání konstrukcí		01.08.2024	31.08.2024	0,33	5 217,21	1,000	999
99	Přesun hmot a manipulace se suť		01.08.2024	31.08.2024	0,33	18 000,00	1,000	999
PSV	Práce a dodávky PSV		01.08.2024	31.08.2024	4,00	800 000,00	1,000	999
711	Izolace proti vlhkosti - střechy a plochy		01.08.2024	31.08.2024	0,33	11 000,00	1,000	999
712	Povlakové krytiny		01.08.2024	31.08.2024	3,14	125 000,00	1,000	999
762	Konstrukce tesařské		01.08.2024	31.08.2024	0,33	26 000,00	1,000	999
767	Konstrukce zámečnické		01.08.2024	31.08.2024	0,75	30 000,00	1,000	999
771	Podlahy z dlaždic		01.08.2024	31.08.2024	0,01	500,00	1,000	999
776	Podlahy povlakové		01.08.2024	31.08.2024	2,21	60 000,00	1,000	999
781	Dokončovací práce - obklady		01.08.2024	31.08.2024	1,00	15 000,00	1,000	999
783	Dokončovací práce - nátěry		01.08.2024	31.08.2024	0,25	8 000,00	1,000	999
784	Dokončovací práce - malby a tapety		01.08.2024	31.08.2024	0,50	5 000,00	1,000	999
786	Povrchová úprava ocelových konstrukcí a technologických zařízení		01.08.2024	31.08.2024	1,23	4 000,00	1,000	999
HZS	Hodinové zúčtovací sazby		01.08.2024	31.08.2024	1,23	10 000,00	1,000	999

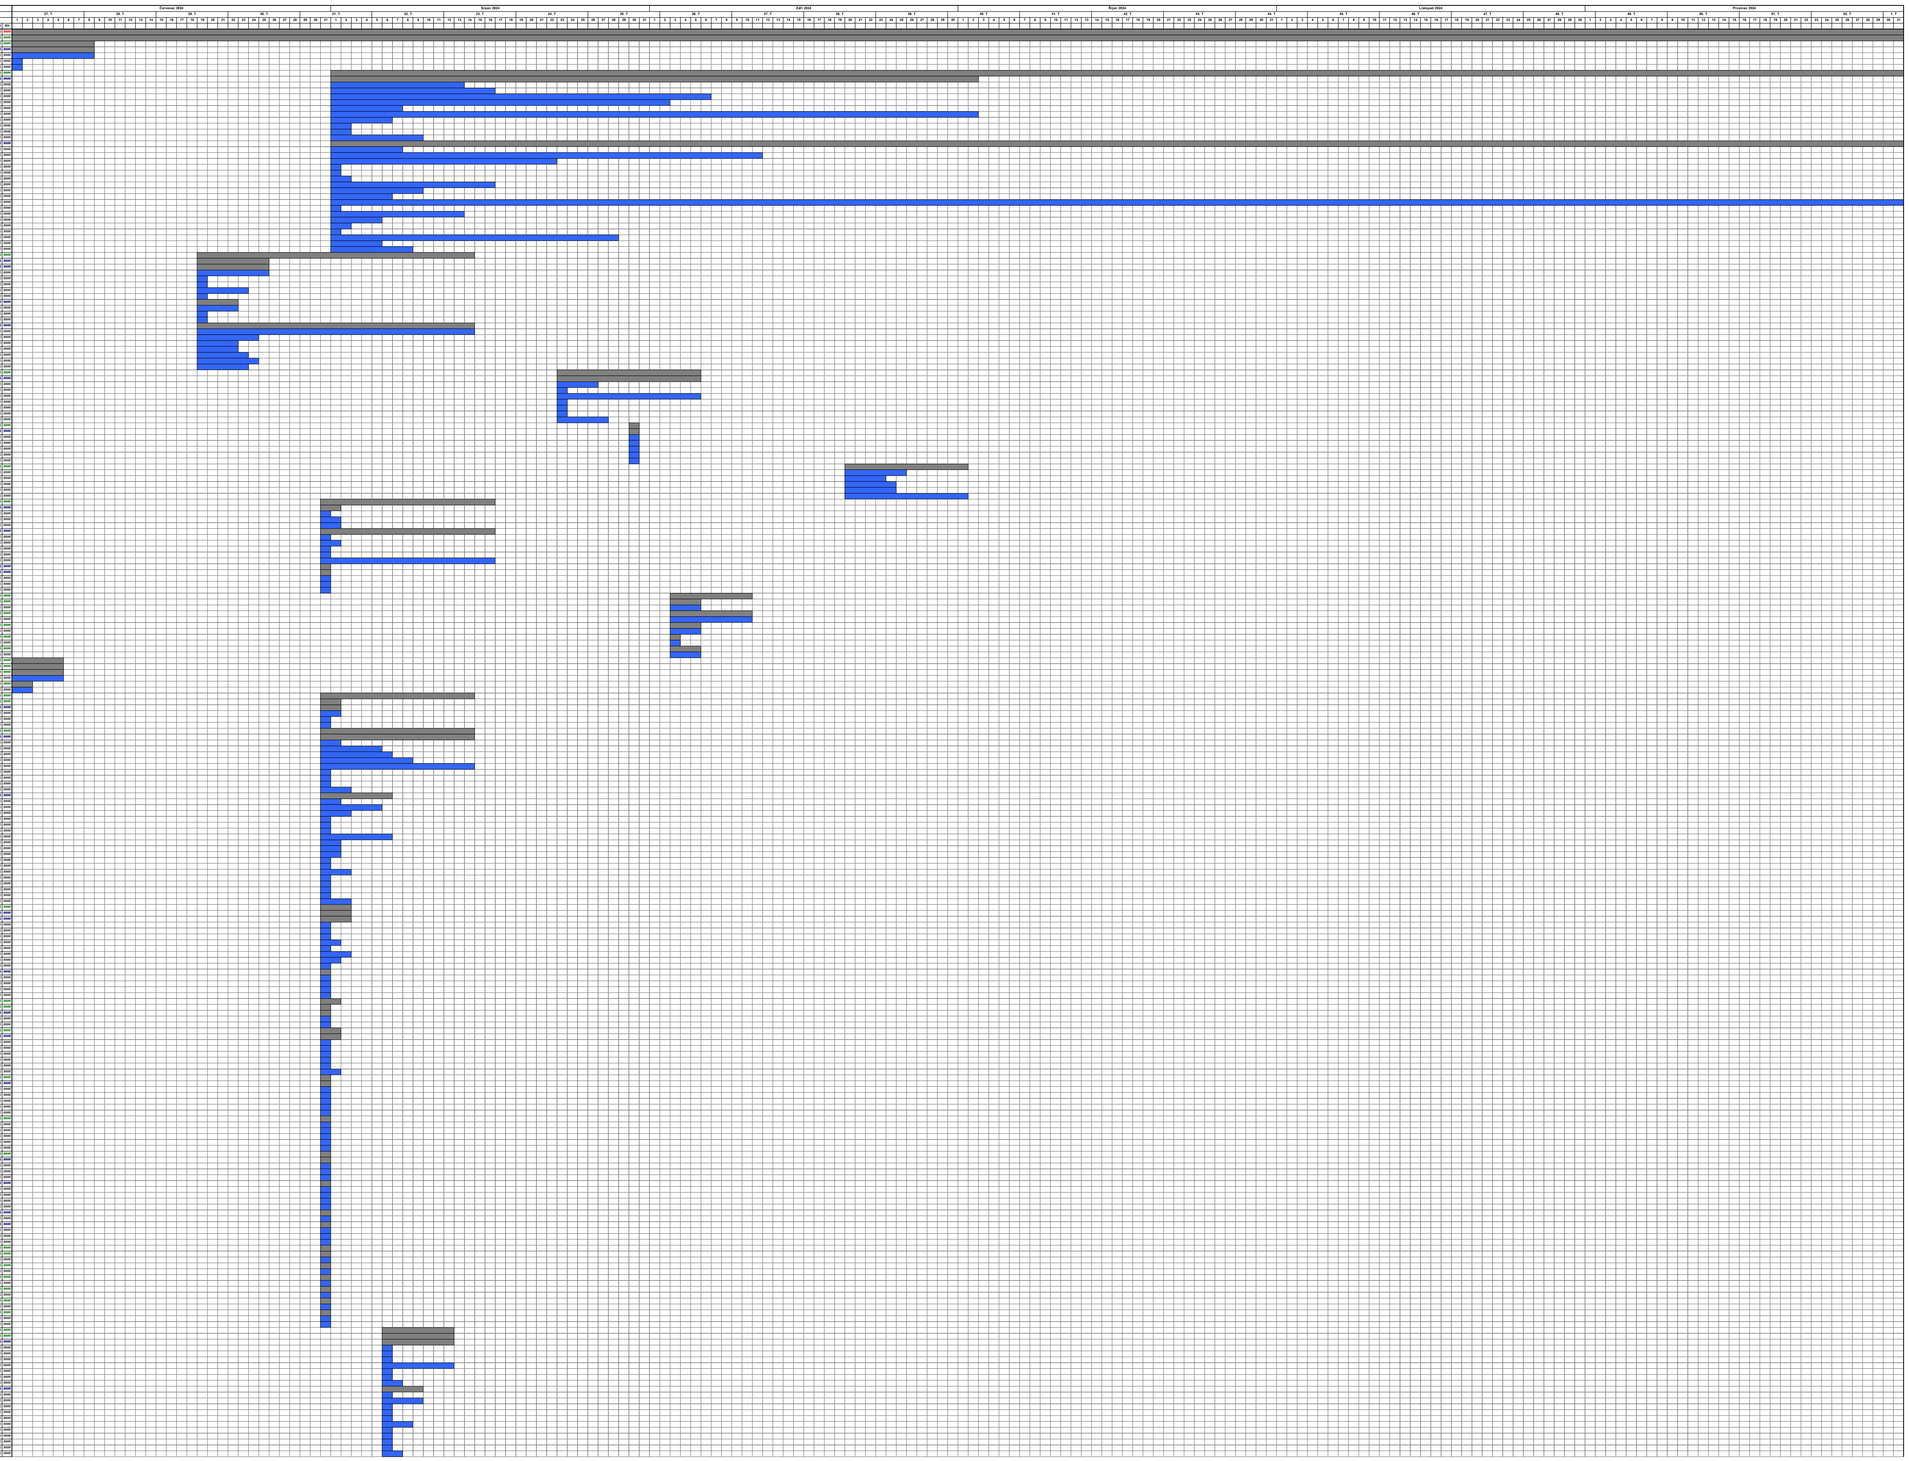

03.7	03.10 - Zdravotní instalace	28.10.2025	28.10.2025	1,14	137 388,14	1,500,000
03D	**Práce a dodávky DSV**	28.10.2025	28.10.2025	1,14	137 388,14	1,500,000
001	**Zdravotnictví**	28.10.2025	28.10.2025	1,14	30 860,86	1,500,000
1	Demontáž	28.10.2025	28.10.2025	0,13	17 283,17	1,500,000
4	Instalace ve konstrukci	28.10.2025	28.10.2025	0,12	1 596,40	1,500,000
101	Zdravotechnika - montáž kanalizace	28.10.2025	28.10.2025	0,56	2 596,40	1,500,000
102	Zdravotechnika - montáž vodovodu	28.10.2025	28.10.2025	0,29	22 169,10	1,500,000
103	Zdravotechnika - montáž zařizovacích předmětů	28.10.2025	28.10.2025	0,14	2 695,79	1,500,000
002	**Rekonstrukce bytu**	28.10.2025	28.10.2025	0,88	34 164,39	1,500,000
1	Demontáž	28.10.2025	28.10.2025	0,60	26 968,70	1,500,000
4	Instalace ve konstrukci	28.10.2025	28.10.2025	0,05	1 595,69	1,500,000
8	Tvarové vrtání	28.10.2025	28.10.2025	0,10	4 215,80	1,500,000
99	Přesun hmot	28.10.2025	28.10.2025	0,08	1 384,20	1,500,000
03.8	03.11 - Vnitřní vodovod - zvýšení	28.10.2025	28.10.2025	0,08	2 976,08	1,500,000
03.1.1	03.12 - Kanalizace CP	28.10.2025	28.10.2025	0,08	2 976,08	1,500,000
03D	**Práce a dodávky DSV**	28.10.2025	28.10.2025	0,08	2 976,08	1,500,000
102	Zařízení vytápění - navrácení zvětšení	28.10.2025	28.10.2025	0,00	150,00	1,500,000
106	Zařízení vytápění - otvorů dílčí	28.10.2025	28.10.2025	0,06	2 520,08	1,500,000
03.1.2	03.13 - Montáž CP	28.10.2025	28.10.2025	1,46	101 551,41	1,500,000
03D	**Práce a dodávky DSV**	28.10.2025	28.10.2025	1,46	101 551,41	1,500,000
102	Zařízení vytápění - navrácení zvětšení	28.10.2025	28.10.2025	0,46	14 400,46	1,500,000
104	Zařízení vytápění - armatury	28.10.2025	28.10.2025	0,26	17 606,14	1,500,000
106	Zařízení vytápění - otvorů dílčí	28.10.2025	28.10.2025	0,45	19 615,79	1,500,000
HZS	Hodinová zúčtovací sazba	28.10.2025	28.10.2025	1,40	50 028,00	1,500,000
03.4	03.31 - Elektroinstalace	28.10.2025	28.10.2025	0,13	19 516,87	1,500,000
03D	**Práce a dodávky PSV**	28.10.2025	28.10.2025	0,13	19 516,87	1,500,000
741.A01	Montáž rozvodnic	28.10.2025	28.10.2025	0,13	4 500,00	1,500,000
741.A02	Montáž přístrojů	28.10.2025	28.10.2025	0,03	1 175,00	1,500,000
741.A03	Ostatní	28.10.2025	28.10.2025	0,14	3 810,00	1,500,000
03.5	03.41 - Měření a regulace (MaR)	28.10.2025	28.10.2025	0,00	0,00	1,500,000
001	Elektromontáže	28.10.2025	28.10.2025	0,00	0,00	1,500,000
02	Pomocný materiál - kabelážní	28.10.2025	28.10.2025	0,00	0,00	1,500,000
03	Montážní materiál	28.10.2025	28.10.2025	0,00	0,00	1,500,000
04	Elektromontážní práce	28.10.2025	28.10.2025	0,00	0,00	1,500,000
05	Doklady	28.10.2025	28.10.2025	0,00	0,00	1,500,000
03.6	03.51 - Elektroinstalace silnoproud,hromosvod	28.10.2025	28.10.2025	0,00	0,00	1,500,000
001	**Hromosvod**	28.10.2025	28.10.2025	0,00	0,00	1,500,000
1	Montáž jímacích soustav (HZS)	28.10.2025	28.10.2025	0,00	0,00	1,500,000
003	Elektromontáže	28.10.2025	28.10.2025	0,00	0,00	1,500,000
02	Ostatní materiál	28.10.2025	28.10.2025	0,00	0,00	1,500,000
03	**Elektroinstalace**	28.10.2025	28.10.2025	0,00	0,00	1,500,000
04	Silový a přípojný	28.10.2025	28.10.2025	0,00	0,00	1,500,000
07	Úprava pracovního místa	28.10.2025	28.10.2025	0,00	0,00	1,500,000
10	Montáž zařízení do rozvodů (HZS)	28.10.2025	28.10.2025	0,00	0,00	1,500,000
11	Montáž zařízení do ostatních konstrukcí (HZS)	28.10.2025	28.10.2025	0,00	0,00	1,500,000
003	Elektromontáže	28.10.2025	28.10.2025	0,00	0,00	1,500,000
04	**Přípojka zvonku**	28.10.2025	28.10.2025	0,00	0,00	1,500,000
10	Montáž zařízení do rozvodů (HZS)	28.10.2025	28.10.2025	0,00	0,00	1,500,000
003	Elektromontáže	28.10.2025	28.10.2025	0,00	0,00	1,500,000
04	Ostatní materiál	28.10.2025	28.10.2025	0,00	0,00	1,500,000
05	Ostatní materiál	28.10.2025	28.10.2025	0,00	0,00	1,500,000
06	**Montáž a dodávka hromobitky**	28.10.2025	28.10.2025	0,00	0,00	1,500,000
003	Elektromontáže	28.10.2025	28.10.2025	0,00	0,00	1,500,000
06	**R.O.I. zkušebních - revizáčka**	28.10.2025	28.10.2025	0,00	0,00	1,500,000
003	Elektromontáže	28.10.2025	28.10.2025	0,00	0,00	1,500,000
03	**Rozvaděč RX**	28.10.2025	28.10.2025	0,00	0,00	1,500,000
03.7	**Vzduchotechnika**	28.10.2025	28.10.2025	0,00	0,00	1,500,000
03.7.1	03.12 - Kanalizace	28.10.2025	28.10.2025	0,03	600,00	1,500,000
03.7.1	03Ta-nepočítat SSKI	28.10.2025	28.10.2025	0,03	600,00	1,500,000
01	Papírnice a obsluha a hořáka signálnice - A	28.10.2025	28.10.2025	0,03	600,00	1,500,000
03	Papírnice a obsluha/ovl.a hořáka a signálnice - B	28.10.2025	28.10.2025	0,00	0,00	1,500,000
03.7.2	03.7_nepočítat SSKI	28.10.2025	28.10.2025	0,00	0,00	1,500,000
03.7.2	03Ok-nepočítat SSKI	28.10.2025	28.10.2025	0,00	0,00	1,500,000
03.7.2	03K3-nepočítat SSKI	28.10.2025	28.10.2025	0,00	0,00	1,500,000
04	Ovládání kanální kuchlin	28.10.2025	28.10.2025	0,00	0,00	1,500,000
03.7.4	03Ta-nepočítat SSKI	28.10.2025	28.10.2025	0,00	0,00	1,500,000
05	Spotřeba tepelné energie	28.10.2025	28.10.2025	0,00	0,00	1,500,000
03.7.5	UMS_nepočítat SSKI	28.10.2025	28.10.2025	0,00	0,00	1,500,000
03.7.6	03Ok-nepočítat SSKI	28.10.2025	28.10.2025	0,00	0,00	1,500,000
03.7.8	03K7-nepočítat SSKI	28.10.2025	28.10.2025	0,00	0,00	1,500,000
07	Ovládání kuchyňské - A	28.10.2025	28.10.2025	0,00	0,00	1,500,000
08	Ovládání kuchyňské 2 kapy - B	28.10.2025	28.10.2025	0,00	0,00	1,500,000
06	03.00 - Zpracování - VÝOLAJÍŘ (POSDBLE VYDAJE	21.10.2025	31.10.2025	1,46	228 415,23	1,500,000
03D	**Práce a dodávky DSV**	23.10.2025	31.10.2025	1,00	228 371,43	1,500,000
1	Demontáž	23.10.2025	31.10.2025	0,13	7 016,30	1,500,000
2	Bourání	23.10.2025	31.10.2025	0,41	21 916,30	1,500,000
3	Vrtání a prostupů konstrukce	23.10.2025	31.10.2025	1,41	57 464,00	1,500,000
5	Komunikace pojezdu	23.10.2025	31.10.2025	0,20	9 500,80	1,500,000
98	Manipulační poplatky	23.10.2025	31.10.2025	1,00	90 973,64	1,500,000
99	Přesun hmot a manipulace se suť	23.10.2025	31.10.2025	1,46	70 161,41	1,500,000
07	03.01 - Zpracování - VÝOLAJÍŘ (POSDBLE VYDAJE	11.10.2025	31.10.2025	4,36	179 776,74	1,500,000
03D	**Montážní plošina**	23.10.2025	31.10.2025	0,00	1 500,00	1,500,000
07	03.01 - Zpracování - VÝOLAJÍŘ (POSDBLE VYDAJE	11.10.2025	31.10.2025	4,36	154 747,90	1,500,000
03D	**DSV**	13.10.2025	31.10.2025	4,35	384 781,90	1,500,000
11	Demontáž - příprava a přikládání prkna	11.10.2025	31.10.2025	1,60	60 600,37	1,500,000
1	Demontáž	11.10.2025	31.10.2025	0,09	3 580,70	1,500,000
3	Komunikace pojezdu	11.10.2025	31.10.2025	2,25	93 863,30	1,500,000
4	Vrtání a prostupů konstrukce a nosných ocelí	11.10.2025	31.10.2025	0,21	8 716,30	1,500,000
5	Ostatní konstrukce a práce bourání	11.10.2025	31.10.2025	0,27	10 916,30	1,500,000
99	Přesun hmot a manipulace se suť	11.10.2025	31.10.2025	4,35	178 776,74	1,500,000
08	03.17 - Stavba lešení - VÝOLAJÍŘ (POSDBLE VYDAJE	14.11.2025	17.11.2025	4,34	317 676,00	1,500,000
01	Lešení/ Solit	14.11.2025	17.11.2025	0,00	0,00	1,500,000
02	Montáž prvku	14.11.2025	17.11.2025	1,48	108 000,00	1,500,000
03	Demontáž prvku	14.11.2025	17.11.2025	1,48	108 000,00	1,500,000
04	Doplnění	14.11.2025	17.11.2025	2,37	90 600,00	1,500,000
09	03.30 - Spolek zpravy - NEPOSDBLE VYDAJE - nainstalo	17.11.2025	17.11.2025	10,45	567 356,31	1,500,000
01	Příprava ploch	17.11.2025	17.11.2025	0,24	10 600,00	1,500,000
02	Hlavní zednik	17.11.2025	17.11.2025	3,35	135 372,00	1,500,000
03	Goodbs zhotov	17.11.2025	17.11.2025	1,43	90 465,40	1,500,000
04	Zednické práce	17.11.2025	17.11.2025	1,43	90 465,40	1,500,000
05	Zdravotní a vysoká tech a U-nam	17.11.2025	17.11.2025	10,45	240 341,30	1,500,000
06	Krytinové boxs	17.11.2025	17.11.2025	4,32	195 576,10	1,500,000
07	Pavoz s bec-ob	17.11.2025	17.11.2025	2,05	83 880,00	1,500,000
10	Instaláž rozvodnicové a ostatní rámový - NEPOSDBLE VYDAJE	27.07.2026	27.07.2026	14,27	1 000 000,00	1,500,000
100	Ostatní montáže	27.07.2026	27.07.2026	0,00	0,00	1,500,000
103	Kontrola & Zaujetí Objednání nabídky a VRN	27.07.2026	27.07.2026	0,00	0,00	1,500,000
104	Montážní plošina	27.07.2026	27.07.2026	12,27	860 000,00	1,500,000
107	Ostatní nákupy	27.07.2026	27.07.2026	12,27	860 000,00	1,500,000
10.1	Instaláž rozvodnicové nástavby	27.07.2026	27.07.2026	14,27	500 000,00	1,500,000
100b	Instaláž rozvodnicové nástavby	27.07.2026	27.07.2026	14,27	500 000,00	1,500,000

Ing. Jiří Rozehnal
Digitálně podepsal Ing. Jiří Rozehnal
Datum: 2024.08.01 14:44:39 +02'00'

Ing. Jan Všetička
Digitálně podepsal Ing. Jan Všetička
Datum: 2024.08.01 12:58:53 +02'00'
