Příloha č.1: Časový harmonogram "Brno, Sportovní I - rekonstrukce kanalizace, I. etapa"

Aktualizace ze dne 06.06. 2024

SO	NÁZEV	ZAHÁJENÍ SO	UKOČENÍ SO	
SO 310.1	KANALIZACE - STOKA Š7604S0 - Š33066	07.11.2022	28.07.2024	20 586 598
	Oprava propadlého úseku	08.01.2024	25.02.2024	
	Zatažení a montáž potrubí (dle upřesnění PDJ) + betonáž mezikruží	18.03.2024	07.07.2024	
	Stavební část šachty / likvidace	08.07.2024	28.07.2024	
SO 310.2	KANALIZACE - STOKA Š33066 -Š759065	05.09.2022	25.02.2024	17 417 999
SO 310.3	KANALIZACE - STOKA Š759065 - Š32731	19.09.2022	28.04.2024	21 807 970
	Stavební část šachty / likvidace	26.02.2024	28.04.2024	
SO 310.4	KANALIZACE - STOKA Š32731 - Š33084	17.10.2022	28.07.2024	25 837 891
	Zatažení a montáž potrubí + betonáž mezikruží	19.02.2024	09.06.2024	
	Stavební část šachty / likvidace	10.06.2024	21.07.2024	
	Obnova komunikací	22.07.2024	04.08.2024	
SO 310.5	KANALIZACE - STOKA Š33084- Š32615	03.01.2023	28.07.2024	20 078 739
	Stavební část šachty / likvidace	10.06.2024	28.07.2024	
SO 310.6	KANALIZACE - STOKA Š32615 -Š33294	20.02.2023	23.06.2024	27 904 764
	Rozšíření šachty 33294	25.03.2024	21.04.2024	
	Zatažení a montáž potrubí + betonáž mezikruží	13.10.2023	05.05.2024	
	Stavební část šachty / likvidace	06.05.2024	23.06.2024	
SO 310.7	KANALIZACE - STOKA Š33294 - Š27420	03.04.2023	01.09.2024	33 837 687
	Zatažení a montáž potrubí (vč. VCP podkl. beton)	29.08.2023	31.03.2024	
	Betonáž mezikruží (vyjma podkl. betonu)	30.10.2023	07.04.2024	
	Stavební část šachty Š6A	13.11.2023	03.03.2024	
	Zmáhání stoky Š6B - Š7 (6 týdnů)	08.04.2024	14.07.2024	
	Zatažení a montáž potrubí + betonáž mezikruží (3 týdny)	15.07.2024	04.08.2024	
	Stavební část šachty Š6B (2 týdny)	05.08.2024	18.08.2024	
	Likvidace Š6C (1 týden)	12.08.2024	18.08.2024	
	Úprava Š7 + zprovoznění kmenové stoky (1 týden)	19.08.2024	25.08.2024	
	Odstranění provizorní panelové komunikace	26.08.2024	01.09.2024	
SO 810	NÁHRADNÍ VÝSADBA ZELENĚ			49 626
91	ostatní náklady (Š7604S0 - Š33066)	07.11.2022	18.08.2024	1 049 569
92	ostatní náklady (Š33066 -Š759065)	22.08.2022	25.02.2024	892 272
93	ostatní náklady (Š759065 - Š32731)	22.08.2022	28.04.2024	1 138 689
94	ostatní náklady (Š32731 - Š33084)	17.10.2022	28.07.2024	1 323 520
95	ostatní náklady (Š33084- Š32615)	03.01.2023	28.07.2024	974 183
96	ostatní náklady (Š32615 -Š33294)	20.02.2023	28.07.2024	1 425 142
97	ostatní náklady (Š33294 - Š27420)	03.04.2023	01.09.2024	1 720 155
				176 044 804

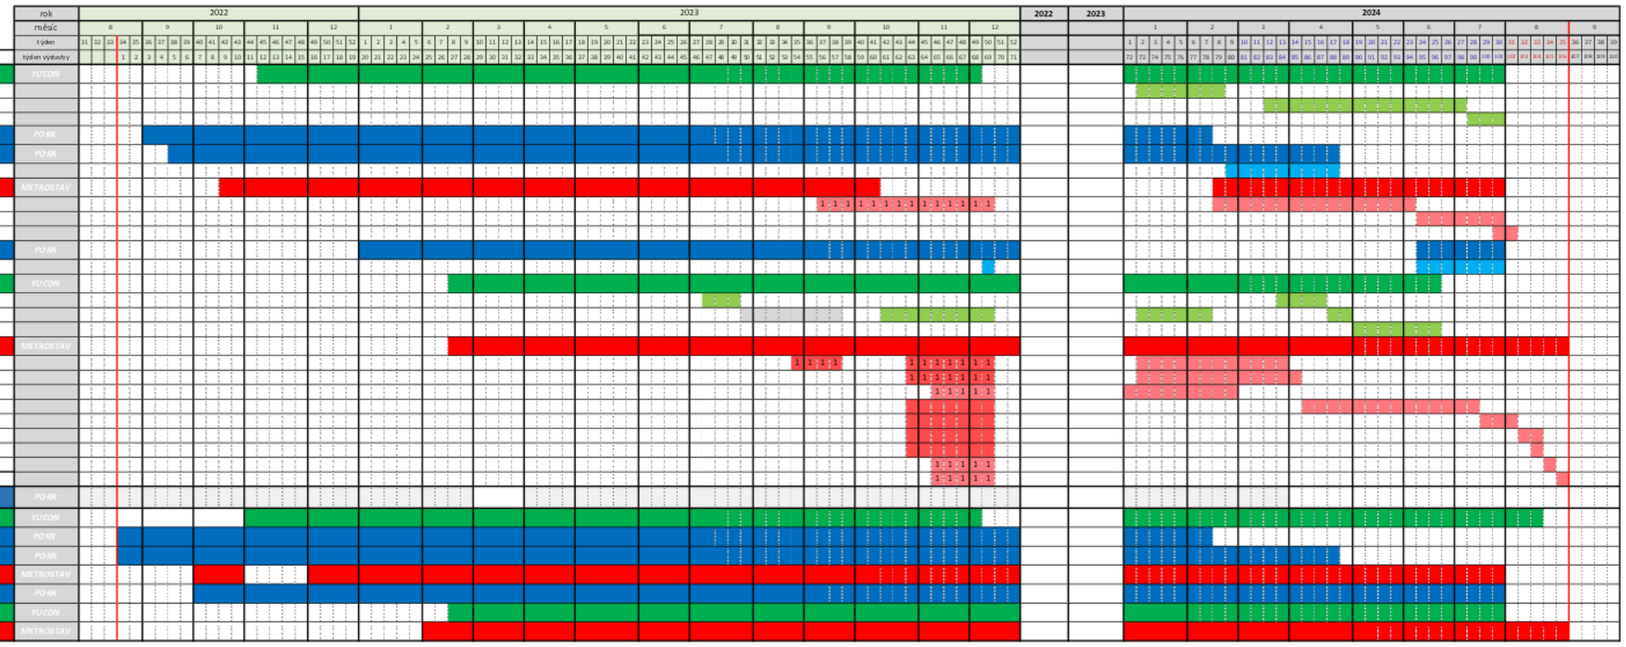

FINANČNÍ PLNĚNÍ		
Cena dle SOD včetně dodatku č.1 až 4 celkem bez DPH	201 297 499,97	

rok	2022	2023	2024								
měsíc			1	2	3	4	5	6	7	8	9
tis. Kč	23 670,9	118 571,6	4 009,8	3 309,4	11 241,5	3 497,2	8 722,8	9 500,0	9 200,0	8 800,0	774,3
											201 297,5

zahájení 22.8.2022

ukončení dle D č.4 28.7.2024

aktuální ukončení 1.9.2024

[redacted]

Zahájení	Ukončení	Ukončení
21.08.2022	28.07.2024	01.09.2024
Lhůta výstavby:	101 týdnů	106 týdnů

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]
