Aktualizace Harmonogram stavby od 23.8.2024 : „ÚP ČR Olomouc - rekonstrukce a přístavba budovy včetně dopravního napojení, tř. Kosmonautů 1085/6"

ID	Režim úkolu	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení
1		**Úřad práce ČR - Olomouc**	**633 dny**	**08.04. 24**	**31.12. 25**
2		**Převzetí staveniště**	0 dny	08.04. 24	08.04. 24
3		Stavební objekty	**633 dny**	**08.04. 24**	**31.12. 25**
4		**IO 01 Příprava území a přeložky**	206 dny	08.04. 24	30.10. 24
5		**IO 02 Zpevněné plochy a komunikace**	100 dny	01.08. 25	08.11. 25
6		**IO 03 Venkovní vodovod**	66 dny	15.07. 24	18.09. 24
7		**IO 04 Venkovní kanalizace**	322 dny	07.07. 24	24.05. 25
8		**IO 06 Venkovní rozvody VO**	60 dny	12.07. 25	09.09. 25
9		**IO 08 Sadové úpravy**	60 dny	11.09. 25	09.11. 25
10		**SO 01 Rekonstrukce budovy ÚP**	**633 dny**	**08.04. 24**	**31.12. 25**
11		**Stavebně - technické řešení**	**605 dny**	**22.04. 24**	**17.12. 25**
12		Zemní práce a základy	111 dny	18.03. 25	06.07. 25
13		Svislé a vodorovné konstrukce	260 dny	31.08. 24	17.05. 25
14		Závěsná fasáda	210 dny	21.11. 24	18.06. 25
15		Úpravy povrchů -podlahy, osazování zárubní	170 dny	09.03. 25	25.08. 25
16		Úprava povrchů vnitřní	250 dny	30.10. 24	06.07. 25
17		Úprava povrchů vnějších	120 dny	08.05. 25	04.09. 25
18		Lešení a stavební výtahy	348 dny	22.04. 24	04.04. 25
19		Zastřešení	80 dny	04.10. 24	22.12. 24
20		Sádrokartonové k-ce	210 dny	17.02. 25	14.09. 25
21		Konstrukce klempířské	104 dny	23.12. 24	05.04. 25
22		Konstrukce truhlářské	90 dny	04.09. 25	02.12. 25
23		Konstrukce zámečnické	117 dny	07.07. 25	21.10. 25
24		Konstrukce hliníkové	142 dny	19.06. 25	07.11. 25
25		Ostatní prvky	90 dny	07.07. 25	04.10. 25
26		Podlahy z dlaždic, povlakové, lité	190 dny	26.02. 25	03.09. 25
27		Dokončovací práce obklady, nátěry, malby	150 dny	21.07. 25	17.12. 25
28		Hrubé bourací práce	361 dny	22.04. 24	17.04. 25
29		Vytápění	363 dny	28.11. 24	25.11. 25
30		Zravotechnika	240 dny	28.11. 24	25.07. 25
31		Vzduchotechnika	280 dny	28.11. 24	03.09. 25
32		Elektroinstalace	223 dny	28.11. 24	30.11. 25
33		Měření a regulace	372 dny	13.12. 24	19.12. 25
34		Zařízení chlazení	222 dny	13.12. 24	22.07. 25
35		Vedlejší rozpočtové náklady SO 01	633 dny	08.04. 24	31.12. 25
36		**SO 02 Přístavba budoby ÚP**	**633 dny**	**08.04. 24**	**31.12. 25**
37		**Stavebně-technické řešení**	**515 dny**	**12.07. 24**	**08.12. 25**
38		Zemní práce, základy, piloty	192 dny	12.07. 24	19.01. 25
39		Svislé a vodorovné konstrukce	267 dny	26.08. 24	19.05. 25
40		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	150 dny	13.05. 25	09.10. 25
41		Úprava povrchů vnitřních	78 dny	14.03. 25	30.05. 25
42		Úprava povrchů vnějších	129 dny	03.04. 25	09.08. 25
43		Lešení	148 dny	03.04. 25	28.08. 25
44		Zastřešení	75 dny	14.03. 25	27.05. 25
45		Sádrokartonové podhledy	118 dny	06.05. 25	06.11. 25
46		Konstrukce klempířské	90 dny	28.05. 25	25.08. 25
47		Konstrukce truhlářské	60 dny	08.09. 25	06.11. 25
48		Konstrukce zámečnické	75 dny	07.09. 25	20.11. 25
49		Konstrukce hliníkové	120 dny	03.04. 25	31.07. 25
50		Ostatní prvky	60 dny	08.10. 25	06.12. 25
51		Podlahy z dlaždic, povlakové	60 dny	20.09. 25	18.11. 25
52		Dokončovací práce - obklady, nátěry, malby	80 dny	20.09. 25	08.12. 25
53		Vytápění	179 dny	13.01. 25	15.11. 25
54		Zdravotechnika	130 dny	25.10. 24	14.11. 25
55		Vzduchotechnika	161 dny	01.02. 25	15.11. 25
56		Elektroinstalace	130 dny	25.10. 24	14.10. 25
57		Měření a regulace	256 dny	01.02. 25	14.10. 25
58		Zařízení chlazení	153 dny	13.02. 25	15.07. 25
59		Vedlejší rozpočtové náklady SO 02	633 dny	08.04. 24	31.12. 25
60		**Dokončení a předání stavby**	0 dny	31.12. 25	31.12. 25
61		Předání dokumentace	0 dny	31.12. 25	31.12. 25

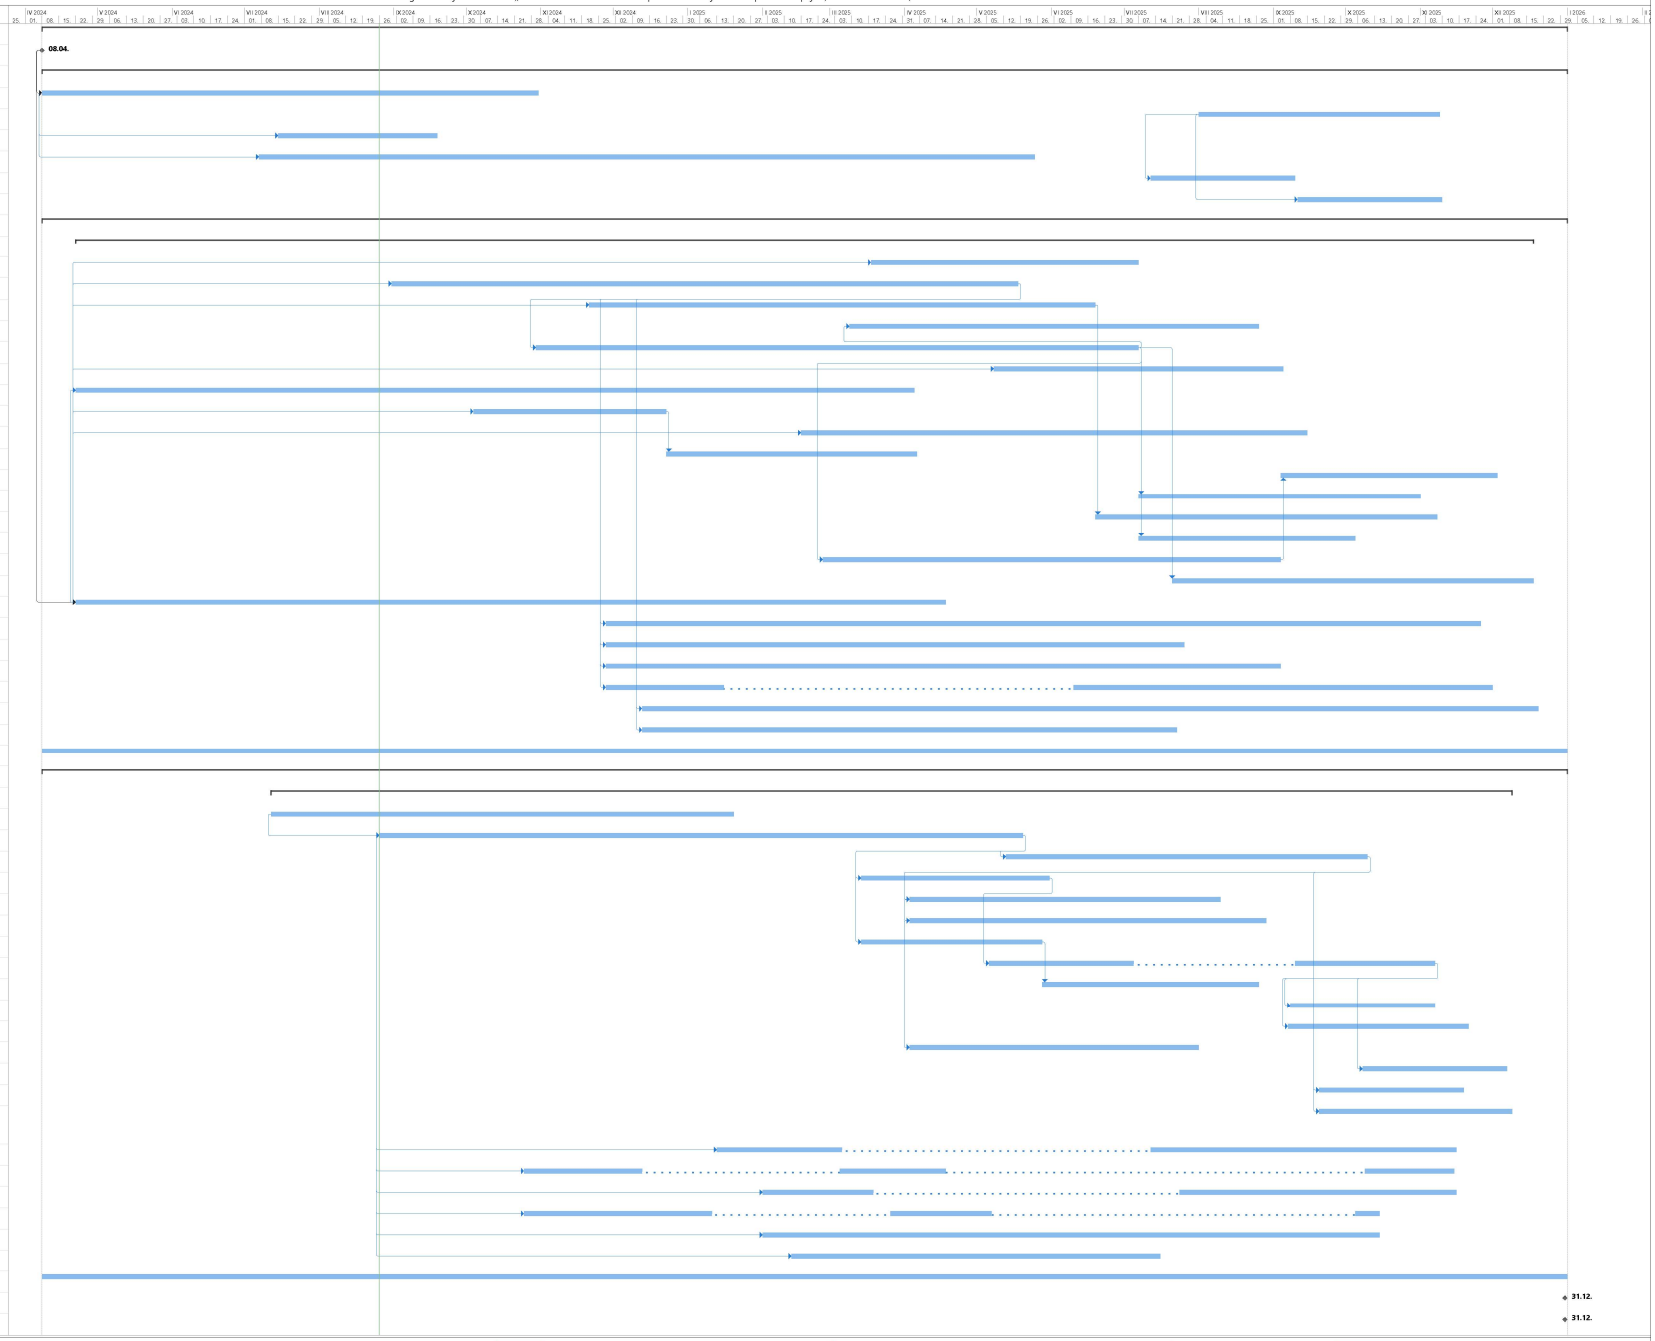

Projekt: ÚP ČR Olomouc
Datum: 26.08. 24

Úkol | Mílník | Souhrn projektu | Neaktivní mílník | Ruční úkol | Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu | Pouze zahájení | Vnější úkoly | Konečný termín | Průběh ručně zadaného úkolu
Rozdělení | Souhrnný | Neaktivní úkol | Neaktivní souhrn | Pouze s dobou trvání | Ruční souhrn | Pouze s datem dokončení | Vnější mílník | Průběh

VW Wachal a.s

ID		Režim úkolu	Název úkolu	Čtvrt. 2, 2024 IV	V	VI	Čtvrt. 3, 2024 VII	VIII	IX	Čtvrt. 4, 2024 X	XI	XII	Čtvrt. 1, 2025 I	II	III	Čtvrt. 2, 2025 IV	V	VI	Čtvrt. 3, 2025 VII	VIII	IX	Čtvrt. 4, 2025 X	XI	XII	Čtvrt. 1, 2026 I	II	III	Čtvrt. 2, 2026 IV	V	VI	Čtvrt. 3, 2026 VII	VIII	IX	Čtvrt. 4, 2026 X	XI	XII	Čtvrt
1			**Úřad práce ČR - Olomouc**	1 061 965,67 Kč	2 264 131,31 Kč	2 191 094,82 Kč	3 831 103,61 Kč	5 102 663,64 Kč	6 907 666,99 Kč	7 841 320,96 Kč	9 137 456,49 Kč	14 799 523,58 Kč	13 941 596,76 Kč	12 983 088,83 Kč	17 927 417,36 Kč	19 863 176,77 Kč	19 399 085,38 Kč	16 230 426,52 Kč	17 363 728,95 Kč	16 100 674,58 Kč	13 536 227,90 Kč	13 712 808,65 Kč	6 841 322,32 Kč	785 254,98 Kč													
2			Převzetí staveniště																																		
			Převzetí staveniště																																		
3			**Stavební objekty**	1 061 965,67 Kč	2 264 131,31 Kč	2 191 094,82 Kč	3 831 103,61 Kč	5 102 663,64 Kč	6 907 666,99 Kč	7 841 320,96 Kč	9 137 456,49 Kč	14 799 523,58 Kč	13 941 596,76 Kč	12 983 088,83 Kč	17 927 417,36 Kč	19 863 176,77 Kč	19 399 085,38 Kč	16 230 426,52 Kč	17 363 728,95 Kč	16 100 674,58 Kč	13 536 227,90 Kč	13 712 808,65 Kč	6 841 322,32 Kč	785 254,98 Kč													
4			IO 01 Příprava území a přeložky	464 453,16 Kč	626 002,09 Kč	605 808,47 Kč	626 002,09 Kč	626 002,09 Kč	605 808,47 Kč	605 808,47 Kč																											
5			IO 02 Zpevněné plochy a komunikace																	1 686 686,86 Kč	1 632 277,61 Kč	1 686 686,86 Kč	435 274,03 Kč														
6			IO 03 Venkovní vodovod				427 727,89 Kč	779 974,40 Kč	452 888,36 Kč																												
7			IO 04 Venkovní kanalizace				290 630,32 Kč	360 381,60 Kč	348 756,39 Kč	360 381,60 Kč	348 756,39 Kč	360 381,60 Kč	360 381,60 Kč	325 505,96 Kč	360 381,60 Kč	348 756,39 Kč	279 005,11 Kč																				
8			IO 06 Venkovní rozvody VO																119 286,08 Kč	184 893,43 Kč	53 678,74 Kč																
9			IO 08 Sadové úpravy																		643 517,81 Kč	997 452,60 Kč	289 583,01 Kč														
10			**SO 01 Rekonstrukce budovy ÚP**	513 075,08 Kč	1 524 322,25 Kč	1 475 150,57 Kč	1 524 322,25 Kč	1 553 437,61 Kč	2 348 611,27 Kč	3 526 492,81 Kč	5 242 888,36 Kč	10 775 136,51 Kč	10 282 477,39 Kč	9 727 210,14 Kč	13 566 394,98 Kč	12 760 479,74 Kč	12 232 374,49 Kč	11 380 816,00 Kč	12 283 146,68 Kč	11 661 867,50 Kč	7 894 272,63 Kč	6 807 467,54 Kč	3 643 808,61 Kč	462 867,12 Kč													
11			**Stavebně - technické řešení**	34 623,09 Kč	119 257,32 Kč	115 410,31 Kč	119 257,32 Kč	148 372,68 Kč	988 871,01 Kč	2 121 427,88 Kč	3 538 644,65 Kč	5 447 265,35 Kč	4 725 382,71 Kč	4 707 898,81 Kč	8 009 300,30 Kč	7 906 374,89 Kč	7 924 171,36 Kč	7 211 587,16 Kč	8 229 424,96 Kč	8 401 115,84 Kč	5 851 973,45 Kč	4 824 911,26 Kč	1 815 309,07 Kč	271 499,34 Kč													
12			Zemní práce a základy												54 582,88 Kč	116 963,32 Kč	120 862,10 Kč	116 963,32 Kč	23 392,66 Kč																	
13			Svislé a vodorovné konstrukce					29 115,36 Kč	873 460,70 Kč	902 576,06 Kč	873 460,70 Kč	902 576,06 Kč	902 576,06 Kč	815 229,99 Kč	902 576,06 Kč	873 460,70 Kč	494 961,07 Kč																				
14			Závěsná fasáda								1 009 345,88 Kč	3 128 972,24 Kč	3 128 972,24 Kč	2 826 168,47 Kč	3 128 972,24 Kč	3 028 037,65 Kč	3 128 972,24 Kč	1 816 822,59 Kč																				
15			Úpravy povrchů -podlahy, osazování zárubní												979 056,18 Kč	1 277 029,79 Kč	1 319 597,45 Kč	1 277 029,79 Kč	1 319 597,45 Kč	1 064 191,50 Kč																	
16			Úprava povrchů vnitřní							26 010,62 Kč	390 159,32 Kč	403 164,63 Kč	403 164,63 Kč	364 148,70 Kč	403 164,63 Kč	390 159,32 Kč	403 164,63 Kč	390 159,32 Kč	78 031,86 Kč																			
17			Úprava povrchů vnějších														206 335,34 Kč	257 919,18 Kč	266 516,48 Kč	266 516,48 Kč	34 389,22 Kč																
18			Lešení a stavební výtahy	34 623,09 Kč	119 257,32 Kč	115 410,31 Kč	119 257,32 Kč	119 257,32 Kč	115 410,31 Kč	119 257,32 Kč	115 410,31 Kč	119 257,32 Kč	119 257,32 Kč	107 716,29 Kč	119 257,32 Kč	15 388,04 Kč																					
19			Zastřešení							1 073 583,88 Kč	1 150 268,44 Kč	843 530,19 Kč																									
20			Sádrokartonové k-ce											296 056,42 Kč	764 812,41 Kč	740 141,04 Kč	764 812,41 Kč	740 141,04 Kč	764 812,41 Kč	764 812,41 Kč	345 399,15 Kč																
21			Konstrukce klempířské									49 764,91 Kč	171 412,46 Kč	154 824,15 Kč	171 412,46 Kč	27 647,17 Kč																					
22			Konstrukce truhlářské																		663 789,01 Kč	762 128,12 Kč	737 543,35 Kč	49 169,56 Kč													
23			Kontrukce zámečnické																411 073,90 Kč	509 731,64 Kč	493 288,68 Kč	509 731,64 Kč															
24			Konstrukce hliníkové															1 175 004,06 Kč	3 035 427,16 Kč	3 035 427,16 Kč	2 937 510,15 Kč	3 035 427,16 Kč	685 419,04 Kč													
25			Ostaní prvky																701 246,47 Kč	869 545,63 Kč	841 495,77 Kč	112 199,44 Kč															
26			Podlahy z dlaždic, povlakové, lité											143 754,79 Kč	1 485 466,12 Kč	1 437 547,86 Kč	1 485 466,12 Kč	1 437 547,86 Kč	1 485 466,12 Kč	1 485 466,12 Kč	143 754,79 Kč																
27			Dokončovací práce obklady, nátěry, malby																143 860,45 Kč	405 424,90 Kč	392 346,68 Kč	405 424,90 Kč	392 346,68 Kč	222 329,78 Kč													
28			Hrubé bourací práce	362 581,42 Kč	1 248 891,55 Kč	1 208 604,73 Kč	1 248 891,55 Kč	1 248 891,55 Kč	1 208 604,73 Kč	1 248 891,55 Kč	1 208 604,73 Kč	1 248 891,55 Kč	1 248 891,55 Kč	1 128 031,08 Kč	1 248 891,55 Kč	684 876,01 Kč																					
29			Vytápění								54 061,99 Kč	558 640,53 Kč	558 640,53 Kč	504 578,55 Kč	558 640,53 Kč	540 619,87 Kč	558 640,53 Kč	540 619,87 Kč	558 640,53 Kč	558 640,53 Kč	540 619,87 Kč	558 640,53 Kč	450 516,56 Kč														
30			Zravotechnika								49 617,40 Kč	512 713,14 Kč	512 713,14 Kč	463 095,74 Kč	512 713,14 Kč	496 174,01 Kč	512 713,14 Kč	496 174,01 Kč	413 478,34 Kč																	
31			Vzduchotechnika								123 696,33 Kč	1 278 195,38 Kč	1 278 195,38 Kč	1 154 499,05 Kč	1 278 195,38 Kč	1 236 963,27 Kč	1 278 195,38 Kč	1 236 963,27 Kč	1 278 195,38 Kč	1 278 195,38 Kč	123 696,33 Kč																
32			Elektroinstalace								117 127,73 Kč	1 210 319,93 Kč	1 210 319,93 Kč	1 093 192,19 Kč	1 210 319,93 Kč	1 171 277,35 Kč	1 210 319,93 Kč	1 171 277,35 Kč	1 210 319,93 Kč	1 210 319,93 Kč	1 171 277,35 Kč	1 210 319,93 Kč	1 171 277,35 Kč														
33			Měření a regulace									35 194,40 Kč	57 422,44 Kč	51 865,43 Kč	57 422,44 Kč	55 570,10 Kč	57 422,44 Kč	55 570,10 Kč	57 422,44 Kč	57 422,44 Kč	55 570,10 Kč	57 422,44 Kč	55 570,10 Kč	35 194,40 Kč													
34			Zařízení chlazení									327 742,85 Kč	534 738,33 Kč	482 989,46 Kč	534 738,33 Kč	517 488,71 Kč	534 738,33 Kč	517 488,71 Kč	379 491,72 Kč																	
35			Vedlejší rozpočtové náklady SO 01	115 870,57 Kč	156 173,38 Kč	151 135,53 Kč	156 173,38 Kč	156 173,38 Kč	151 135,53 Kč	156 173,38 Kč	151 135,53 Kč	156 173,38 Kč	156 173,38 Kč	141 059,83 Kč	156 173,38 Kč	151 135,53 Kč	156 173,38 Kč	151 135,53 Kč	156 173,38 Kč	156 173,38 Kč	151 135,53 Kč	156 173,38 Kč	151 135,53 Kč	156 173,38 Kč													
36			**SO 02 Přístavba budoby ÚP**	84 437,43 Kč	113 806,97 Kč	110 135,78 Kč	962 421,06 Kč	1 782 867,94 Kč	3 151 602,50 Kč	3 348 638,08 Kč	3 545 811,74 Kč	3 664 005,47 Kč	3 298 737,77 Kč	2 930 372,73 Kč	4 000 640,78 Kč	6 753 940,64 Kč	6 887 705,78 Kč	4 849 610,52 Kč	4 961 296,19 Kč	2 567 226,79 Kč	3 312 481,11 Kč	4 221 201,65 Kč	2 472 656,67 Kč	322 387,86 Kč													
37			**Stavebně-technické řešení**				848 614,09 Kč	1 669 060,97 Kč	3 041 466,72 Kč	3 142 848,95 Kč	3 041 466,72 Kč	3 142 848,95 Kč	2 633 680,49 Kč	1 650 642,55 Kč	2 542 305,36 Kč	5 342 648,30 Kč	5 429 370,36 Kč	3 438 318,18 Kč	3 552 928,79 Kč	1 205 704,42 Kč	1 994 878,82 Kč	3 110 128,86 Kč	1 983 029,21 Kč	208 580,89 Kč													
38			Zemní práce, základy, piloty				848 614,09 Kč	1 315 351,85 Kč	1 272 921,14 Kč	1 315 351,85 Kč	1 272 921,14 Kč	1 315 351,85 Kč	806 183,39 Kč																							
39			Svislé a vodorovné konstrukce					353 709,12 Kč	1 768 545,58 Kč	1 827 497,10 Kč	1 768 545,58 Kč	1 827 497,10 Kč	1 827 497,10 Kč	1 650 642,55 Kč	1 827 497,10 Kč	1 768 545,58 Kč	1 120 078,87 Kč																				
40			Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní														460 281,97 Kč	726 761,00 Kč	750 986,36 Kč	750 986,36 Kč	726 761,00 Kč	218 028,30 Kč														
41			Úprava povrchů vnitřních												288 455,54 Kč	480 759,23 Kč	480 759,23 Kč																				
42			Úprava povrchů vnějších													769 502,19 Kč	851 948,85 Kč	824 466,63 Kč	851 948,85 Kč	247 339,99 Kč																	
43			Lešení													56 246,63 Kč	62 273,06 Kč	60 264,25 Kč	62 273,06 Kč	56 246,63 Kč																	
44			Zastřešení												426 352,72 Kč	710 587,87 Kč	639 529,08 Kč																				
45			Sádrokartonové podhledy														82 163,59 Kč	94 804,14 Kč	97 964,28 Kč	97 964,28 Kč	94 804,14 Kč	97 964,28 Kč	18 960,83 Kč														
46			Konstrukce klempířské														8 506,75 Kč	63 800,59 Kč	65 927,28 Kč	53 167,16 Kč																	
47			Konstrukce truhlářské																		213 105,37 Kč	287 228,97 Kč	55 592,70 Kč														
48			Konstrukce zámečnické																		372 832,53 Kč	481 575,35 Kč	310 693,77 Kč														
49			Konstrukce hliníkové													1 557 006,80 Kč	1 723 828,96 Kč	1 668 221,57 Kč	1 723 828,96 Kč																		
50			Ostatní prvky																			370 000,24 Kč	462 500,30 Kč	92 500,06 Kč													
51			Podlahy z dlaždic, povlakové																		427 764,63 Kč	1 205 518,49 Kč	699 978,48 Kč														
52			Dokončovací práce - obklady, nátěry, malby																		159 611,15 Kč	449 813,23 Kč	435 303,13 Kč	116 080,83 Kč													
53			Vytápění										143 900,76 Kč	212 064,28 Kč	234 785,45 Kč	227 211,73 Kč	234 785,45 Kč	227 211,73 Kč	234 785,45 Kč	234 785,45 Kč	227 211,73 Kč	234 785,45 Kč	113 605,86 Kč														
54			Zdravotechnika							22 796,56 Kč	97 699,55 Kč	100 956,20 Kč	100 956,20 Kč	91 186,25 Kč	100 956,20 Kč	97 699,55 Kč	100 956,20 Kč	97 699,55 Kč	100 956,20 Kč	100 956,20 Kč	97 699,55 Kč	100 956,20 Kč	45 593,12 Kč														
55			Vzduchotechnika											411 213,04 Kč	455 271,58 Kč	440 585,40 Kč	455 271,58 Kč	440 585,40 Kč	455 271,58 Kč	455 271,58 Kč	440 585,40 Kč	455 271,58 Kč	220 292,70 Kč														
56			Elektroinstalace							69 185,60 Kč	296 509,69 Kč	306 393,35 Kč	306 393,35 Kč	276 742,38 Kč	306 393,35 Kč	296 509,69 Kč	306 393,35 Kč	296 509,69 Kč	306 393,35 Kč	306 393,35 Kč	296 509,69 Kč	138 371,19 Kč														
57			Měření a regulace											135 762,80 Kč	150 308,82 Kč	145 460,14 Kč	150 308,82 Kč	145 460,14 Kč	150 308,82 Kč	150 308,82 Kč	145 460,14 Kč	67 881,40 Kč														
58			Zařízení chlazení											49 968,03 Kč	96 813,05 Kč	93 690,05 Kč	96 813,05 Kč	93 690,05 Kč	46 845,03 Kč																	
59			Vedlejší rozpočtoví náklady SO 02	84 437,43 Kč	113 806,97 Kč	110 135,78 Kč	113 806,97 Kč	113 806,97 Kč	110 135,78 Kč	113 806,97 Kč	110 135,78 Kč	113 806,97 Kč	113 806,97 Kč	102 793,40 Kč	113 806,97 Kč	110 135,78 Kč	113 806,97 Kč	110 135,78 Kč	113 806,97 Kč	113 806,97 Kč	110 135,78 Kč	113 806,97 Kč	110 135,78 Kč	113 806,97 Kč													
60			Dokončení a předání stavby																																		
61			Předání dokumentace																																		
