ID	Task Name	Duration	Start	Finish
1				
2	**MŠ Sobín**	**330 days**	**Mon 03.02.25**	**Mon 29.12.25**
3	Skrývka ornice	3 days	Mon 03.02.25	Wed 05.02.25
4	Výkop základů	18 days	Thu 06.02.25	Sun 23.02.25
5	Zemní část hromosvodu	7 days	Mon 24.02.25	Sun 02.03.25
6	Základové pasy	28 days	Mon 24.02.25	Sun 23.03.25
7	Rozvody ZTI pod ZD	14 days	Mon 24.03.25	Sun 06.04.25
8	Rozvdoy EI pod ZD	2 days	Mon 24.03.25	Tue 25.03.25
9	Základová deska	21 days	Mon 07.04.25	Sun 27.04.25
10	Hydroizolace	14 days	Mon 28.04.25	Sun 11.05.25
11	Nosné zdivo	35 days	Mon 12.05.25	Sun 15.06.25
12	ŽB konstrukce stropu	28 days	Mon 16.06.25	Sun 13.07.25
13	Vyzdívky atik	14 days	Mon 14.07.25	Sun 27.07.25
14	Sřešní skladba	35 days	Mon 28.07.25	Sun 31.08.25
15	Vyzdívky příček	21 days	Mon 14.07.25	Sun 03.08.25
16	Rozvody EI	28 days	Mon 04.08.25	Sun 31.08.25
17	Rozvody ZTI	28 days	Mon 04.08.25	Sun 31.08.25
18	Vnitřní omítky	21 days	Mon 01.09.25	Sun 21.09.25
19	Rozvody vytápění	14 days	Mon 22.09.25	Sun 05.10.25
20	Betonové podlahy	7 days	Mon 06.10.25	Sun 12.10.25
21	Obklady a dlažby	28 days	Mon 13.10.25	Sun 09.11.25
22	Kompletace EI	21 days	Mon 03.11.25	Sun 23.11.25
23	Kompletace ZTI	21 days	Mon 03.11.25	Sun 23.11.25
24	Kompletace ÚT	21 days	Mon 03.11.25	Sun 23.11.25
25	Montáž PVC podlah	14 days	Mon 24.11.25	Sun 07.12.25
26	Montáž vnitřních dveří	7 days	Mon 08.12.25	Sun 14.12.25
27	Malby	14 days	Mon 08.12.25	Sun 21.12.25
28	Úklid	5 days	Mon 22.12.25	Fri 26.12.25
29	Montáž výplní otvorů	14 days	Mon 28.07.25	Sun 10.08.25
30	Fasáda	49 days	Mon 11.08.25	Sun 28.09.25
31	Areálové rozvody kanalizace	42 days	Mon 28.07.25	Sun 07.09.25
32	Geotermální vrty	21 days	Mon 08.09.25	Sun 28.09.25
33	Komunikace	21 days	Mon 29.09.25	Sun 19.10.25
34	Zahradní domek	35 days	Mon 29.09.25	Sun 02.11.25
35	Zahradní vybavení	14 days	Mon 20.10.25	Sun 02.11.25
36	Sadové úpravy + zelená střecha	14 days	Mon 03.11.25	Sun 16.11.25
37	Oplocení	35 days	Mon 17.11.25	Sun 21.12.25
38	Předání díla	3 days	Sat 27.12.25	Mon 29.12.25

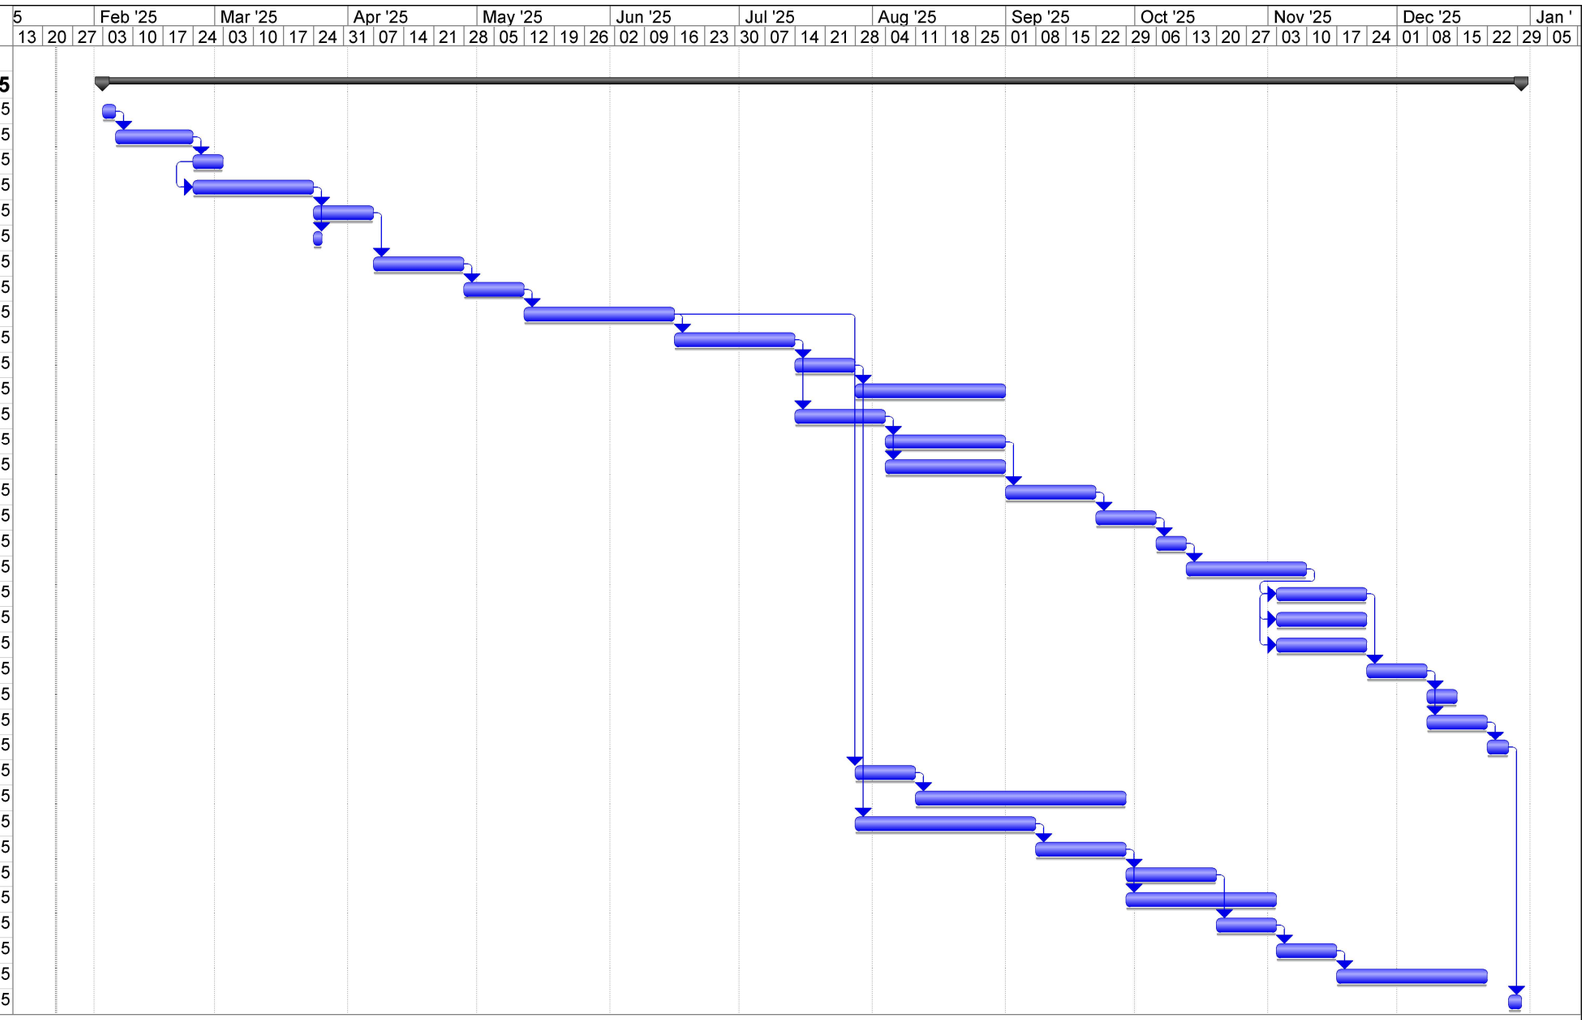

Project: HMG Sobín
Date: Thu 23.01.25

Task | Progress | Summary | External Tasks | Deadline
Split | Milestone | Project Summary | External Milestone
