ČASOVÝ HARMONOGRAM

Název oddílu	Začátek	Konec	Rezerva od	Rezerva do
Celková doba realizace	**15.7.2024**	**7.5.2024**		
Převzetí staveniště	15.7.2024	15.7.2024		
Příprava stavebniště a vybudování ZS	16.7.2024	18.7.2024	16.7.2024	28.7.2024
Zemní práce a zakládání	29.7.2024	10.10.2024	29.7.2024	14.10.2024
Hrubé stavební práce	15.10.2024	21.4.2025	15.10.2025	30.4.2025
Finální stavební práce	21.4.2025	21.5.2025	21.4.2025	31.5.2025
Realizace přípojek a rozvodů, TZB, El a technologie	17.3.2025	12.5.2025	17.3.2025	25.5.2025
Dokončovací práce	31.5.2025	30.6.2025	31.5.2025	30.7.2025
Zpevněné plochy	1.6.2025	22.7.2025	1.6.2025	30.7.2025
Předání díla	31.7.2025	31.7.2025		

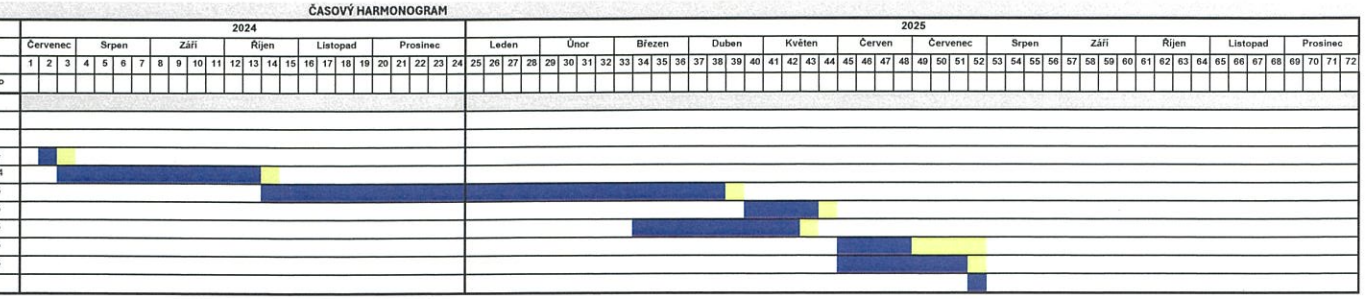

* termín předání a převzetí díla je orientační a může se měnit na základě termínu podpisu smlouvy

Doba realizace

Doba rezervy
