[redacted]

LANEX Olomouc s.r.o.	Tiskopis	Strana: 1/1
		Zpracoval: [redacted]
	Harmonogram prací	Datum: 18. 2. 2025

Název akce : **rok 2025**

„Stavební úpravy MěÚ Šumperk, Jesenická 31“

časový plán úkolů, termín splnění úkolů

03/2025 | 04/2025 | 05/2025 | 06/2025 | 07/2025 | 08/2025 | 09/2025 | 10/2025

čís.	popis úkolu	týden plán	týden skut
1.	Předání a převzetí staveniště 20.3.2025		
2.	1. etapa (výměna oken kanceláře v 1. NP vč. souvisejících prací) 10.4.2025 – 13.4.2025		
3.	2. etapa (výměna oken ve 2. NP vč. souvisejících prací) 14.4.2025 – 30.4.2025		
4.	3. etapa (výměna oken ve 3. NP vč. souvisejících prací) 19.5.2025 – 1.6.2025		
5.	4. etapa (veškeré práce ve 4. NP) 9.6.2025 – 29.6.2025		
6.	Zastiňující technika		
7.	KZS - ETICS		
8.	Klempířské konstrukce		
9.	Zámečnické konstrukce		
10.	Ostatní stavební práce		
11.	Dokončovací práce - malby, úklid		
12.	Předání stavby 29.8.2025		
13.			

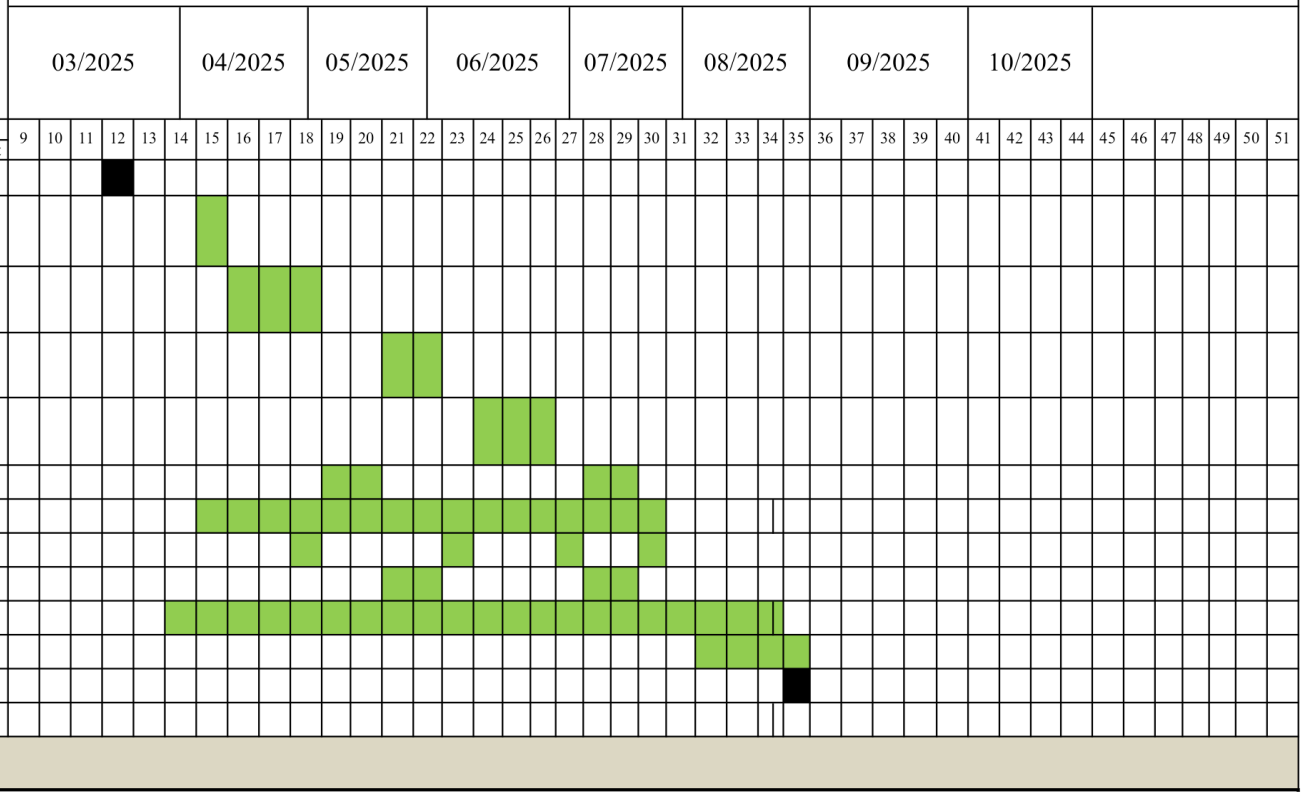

Legenda:

- jednou naplánovaná událost
- 2 znovu naplánovaná událost
- číslo udává pořadí změny
- dokončená událost
- doba trvání mezi plánovanými událostmi
- předpokládaný skluz
- skutečný skluz

[redacted]

Poznámka: Termíny uvedené v harmonogramu jsou orientační a závislé na vhodných klimatických podmínkách.
