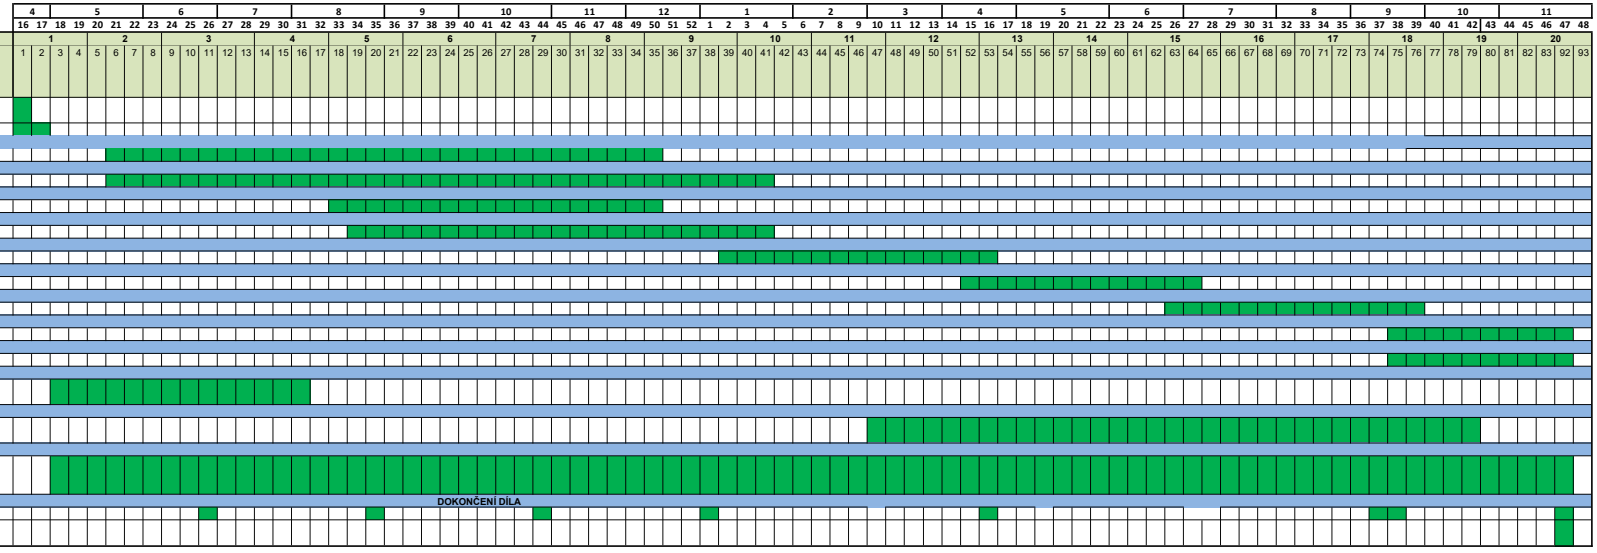ID	Název: Rehabilitační ústav Hrabyně - rekonstrukce a zateplení lůžkové části		zahájení	dokončení	Měsíc / Týden	
I.	PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ STAVENIŠTĚ - ZAHÁJENÍ PROVÁDĚNÍ DÍLA				1	týdnů
II.	ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ				2	týdnů
	SO 01 Rekonstrukce lůžkové části RÚ 1. PP C	2.1 etapa (milník 2.1)	13.05.2024	17.12.2024	30	týdnů
	SO 02 Rekonstrukce lůžkové části RÚ 1. NP C	2.2 etapa (milník 2.2)	13.05.2024	24.01.2025	36	týdnů
	SO 01 Rekonstrukce lůžkové části RÚ_1. PP B	3 etapa (milník 3)	12.08.2024	17.12.2024	18	týdnů
	SO 02 Rekonstrukce lůžkové části RÚ 1. NP B	4 etapa (milník 4)	19.08.2024	24.01.2025	23	týdnů
	SO 03 Rekonstrukce lůžkové části RÚ_2. NP B+C	5. etapa	06.01.2025	20.04.2025	15	týdnů
	SO 04 Rekonstrukce lůžkové části RÚ 3.NP B+C	6. etapa	07.04.2025	06.07.2025	13	týdnů
	SO 05 Rekonstrukce lůžkové části RÚ 4.NP B,C	7. etapa	16.06.2025	28.09.2025	14	týdnů
	SO 06 Rekonstrukce lůžkové části RÚ _ 5.NP B,C	8. etapa	15.09.2025	21.11.2025	10	týdnů
	SO 07 Rekonstrukce lůžkové části RÚ 6.NP	9. etapa	15.09.2025	21.11.2025	10	týdnů
	SO 08 Rekonstrukce lůžkové části RÚ_ PŘEMÍSTĚNÍ ERGOTERAPIE	1. etapa (milník 1)	01.05.2024	31.07.2024	14	týdnů
	SO 09 Rekonstrukce lůžkové části RÚ_ ZATEPLENÍ OBJEKTU B+C_ vč. střechy a rekonstrukce balkónů		03.03.2025	14.09.2025	33	týdnů
	SO 10 Rekonstrukce lůžkové části RÚ_SPECIALISTÉ SO 10a Rekonstrukce lůžkové části RÚ_ REKONSTRUKCE B+C		01.05.2024	21.11.2025	82	týdnů
	FINÁLNÍ ÚKLID				7	týdnů
	PŘEJÍMACÍ ŘÍZENÍ, ODSTRANĚNÍ VAD A NEDODĚLKŮ, PŘEDÁNÍ DÍLA				4	týdnů
