I. Smluvní strany

Objednatel:	**Fakultní nemocnice Ostrava (právní nástupce Rehabilitačního ústavu Hrabyně, s IČ 00601233)**
Sídlo:	17. listopadu 1790/5, 708 52 Ostrava-Poruba
Zastoupený:	MUDr. Jiřím Havrlantem, MHA, ředitelem

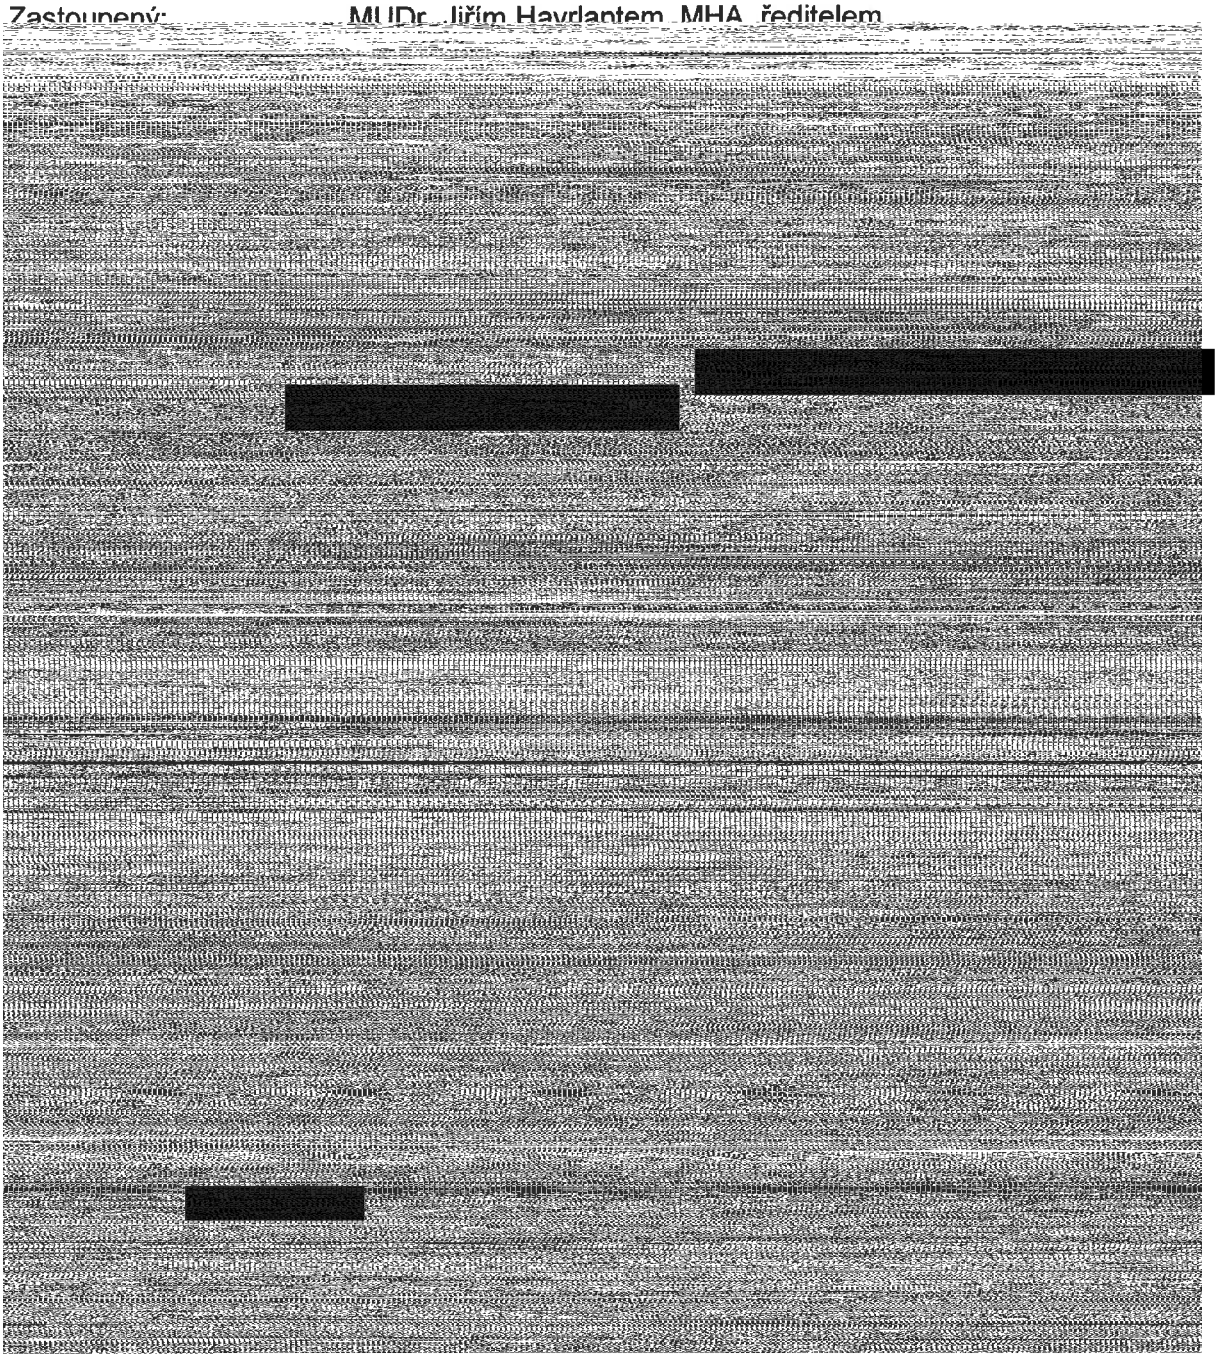

Důvod vícepráce / méněpráce:
Platí splnění podmínek dle § 222 odst. 7, tzn., že:
a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám,
b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší,
c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší.

odstavec 4, § 222 ☐	odstavec 5, § 222 ☐	odstavec 6, § 222 ☐	odstavec 7, § 222 ☒

Cena méněprací bez DPH:	**Cena víceprací bez DPH:**
-2 160 295,97 Kč	**2 160 273,31 Kč**
Výsledná cena změn bez DPH:	
	-22,66 Kč
	Výsledná celková cena změny DPH
	-4,76
	Výsledná celková cena změny vč. DPH
	-27,42

Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

Nemá vliv na sjednanou lhůtu pro dokončení díla.

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Oznámení vydává: Fakultní nemocnice Ostrava

Datum:

[redacted]

odbor přípravy a realizace investic

[redacted]

vedoucí odboru přípravy a realizace investic

[redacted]

Ing. Marek Veselý
náměstek ředitele pro techniku a provoz

Podpis zmocněnce zhotovitele:

Datum:

[redacted]

Stanovisko TDI:

Datum:

Podpis TDI:

[redacted]

Stanovisko projektanta stavby:

Podpis projektanta stavby:

[redacted]

Seznam přiložených dokladů:

1. Položkový rozpočet víceprací /méněprací

Změnový list č. 02

Identifikační údaje akce	
Název	**„Nástavba lůžkového oddělení L8“**
SoD ev.č. DZ 24015418/OVA	
Objednatel:	
Název	Fakultní nemocnice Ostrava
Adresa	17. listopadu 1790/5, Ostrava - Poruba, 708 52
Zhotovitel	
Název	Metrostav DIZ s.r.o.
Adresa	Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8
Oznámení vystavil:	
[redacted]	
Navrhované změny akce	
Záměna skladby střešní konstrukce	
Zdůvodnění navrhovaných změn	
Změnový list řeší záměnu skladby střešní konstrukce. **Původně navržená skladby střechy dle PD, tvořená z dřevěných krovi 220/110 uložených na ocelové konstrukci, celoplošně překryta dřevným bednění z OSB desek, hydroizolacčním pásem a tepelnou izolací z min. vlny tl. 240 mm byla nahrazena PIR střešními panely typu KS NR IPN 150.** **Vrchní izolační vrstava z PVC folie a separační textilie zůstává bez změny, a bude položena na novou konstrukci – PIR panely.** **Touto záměnou bylo docíleno urychlení výstavby, uzavření nástavby L8, a stím spojené provádění vnitřních konstrukcí.** **Touto záměnou také dochází ke zlepšení tepelně izolačních vlastností střechy na 0,15 W/m2.K.** **Touto záměnou také dochází k umístění části FVE elektrárny (panelů), jež je součástí předmětné stavby, na střechu nové nástavby L8 bez nutnosti využívání ostatních střech areálu RÚ Hrabyně a zásahu do jejich hydroizolačních vlastností.** **Tato záměna snižuje celkovou cenu díla.**	

Odkazy na specifikaci:	
na výkresy:	
na rozpočtové podklady:	
na jinou část smlouvy:	

Důvod vícepráce / méněpráce: **Platí splnění podmínek dle § 222 odst. 7, tzn., že:** **a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám,** **b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší,** **c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší.**			
odstavec 4, § 222 ☐	odstavec 5, § 222 ☐	odstavec 6, § 222 ☐	odstavec 7, § 222 ☒
Cena méněprací bez DPH:		**Cena víceprací bez DPH:**	
-3 544 215,83 Kč		**3 485 052,00 Kč**	
Výsledná cena změn bez DPH:			
		-59 163,83 Kč	
		Výsledná celková cena změny DPH	
		-12 424,40	
		Výsledná celková cena změny vč. DPH	
		-71 588,23	
Nově sjednaná lhůta dokončení díla:			
Nemá vliv na sjednanou lhůtu pro dokončení díla.			
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.			

Oznámení vydává: Fakultní nemocnice Ostrava

Datum:

[redacted]

odbor přípravy a realizace investic

[redacted]

vedoucí odboru přípravy a realizace investic

[redacted]

Ing. Marek Veselý
náměstek ředitele pro techniku a provoz

Podpis zmocněnce zhotovitele:

Datum:

[redacted]

Stanovisko TDI:

Datum:

Podpis TDI:

[redacted]

Stanovisko projektanta stavby:

Podpis projektanta stavby:

[redacted]

Seznam přiložených dokladů:

1. Položkový rozpočet víceprací /méněprací

Změnový list č. 03

Identifikační údaje akce	
Název	**„Nástavba lůžkového oddělení L8“**
SoD ev.č. DZ 24015418/OVA	
Objednatel:	
Název	Fakultní nemocnice Ostrava
Adresa	17. listopadu 1790/5, Ostrava - Poruba, 708 52
Zhotovitel	
Název	Metrostav DIZ s.r.o.
Adresa	Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8
Oznámení vystavil:	
[redacted]	

Navrhované změny akce

Změna ŽB věnce nástavby

Zdůvodnění navrhovaných změn

Změnový list řeší změnu velikosti a vyztužení ŽB věnce, který tvoří ztužující konstrukci nástavby L8.

Původně, dle PD, navržený ŽB věnec rozměrů 270x250 mm nedosahoval požadované únosnosti, a z toho důvodu byl staticky přepočítán a navrhnut ŽB věnec nových parametrů. Rozměr nově navrženého ŽB věnce v jižní části nástavby L8 je 450x550mm, v severní části nástavby L8 pak činí 375x550mm.

Nezbytnou součástí je také projekt vyztužení věnce, které původní PD neobsahovala, a novým statickým výpočetem dochází ke změně typu vyztužení.

Dále pak součástí ZL je navýšené množství tepelné izolace věnce v závisloti na změně výšky ŽB vence.

Odkazy na specifikaci:	
na výkresy:	
na rozpočtové podklady:	
na jinou část smlouvy:	

Důvod vícepráce / méněpráce:

Jedná se o nezbytné práce pro zajištění realizace dle účelu smlouvy, které vznikly v důsledků okolností, které zadavatel jednající s náležitou péči nemohl předvídat. Současně tyto práce nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

odstavec 4, § 222 ☐	odstavec 5, § 222 ☐	odstavec 6, § 222 ☒	odstavec 7, § 222 ☐

Cena méněprací bez DPH:	**Cena víceprací bez DPH:**
-201 634,46 Kč	**382 767,67 Kč**
Výsledná cena změn bez DPH:	
	181 133,21 Kč
	Výsledná celková cena změny DPH
	38 037,97
	Výsledná celková cena změny vč. DPH
	219 171,18
Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
Nemá vliv na sjednanou lhůtu pro dokončení díla.	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.	

Oznámení vydává: Fakultní nemocnice Ostrava

Datum:

[redacted]

odbor přípravy a realizace investic

[redacted]

vedoucí odboru přípravy a realizace investic

[redacted]

Ing. Marek Veselý
náměstek ředitele pro techniku a provoz

Podpis zmocněnce zhotovitele:

Datum:

[redacted]

Stanovisko TDI: Datum:	**Podpis TDI:** [redacted]
Stanovisko projektanta stavby:	**Podpis projektanta stavby:** [redacted]

Seznam přiložených dokladů:

1. Položkový rozpočet víceprací /méněprací

Změnový list č. 04

Identifikační údaje akce	
Název	**„Nástavba lůžkového oddělení L8“**
SoD ev.č. DZ 24015418/OVA	
Objednatel:	
Název	Fakultní nemocnice Ostrava
Adresa	17. listopadu 1790/5, Ostrava - Poruba, 708 52
Zhotovitel	
Název	Metrostav DIZ s.r.o.
Adresa	Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8
Oznámení vystavil:	
[redacted]	
Navrhované změny akce	
Změna protipožárního podhledu	
Zdůvodnění navrhovaných změn	

Změnový list řeší změnu typu protipožárního podhledu nástavby L8, který chrání skladbu střechy a ocelovou nosnou konstruci „ze spod“.

Dle PD navržený protipožární podhled typu – SDK 1x protipožární deska tl. 12,5mm zavěšená na ocelou konstrukci bez izolace, nesplňuje aktuální požadavek schváleného PBŘ z dubna 2024 na požární odolnost EI30 DP1 a aktuální předpisy dle ČSN 73 08202 ed.2, ČSN 73 0835 ed.2 a požadavky na odolnost stavebních konstrukcí § 18 vyhlášky č. 23/2008 Sb.

Nově dochází k instalci protipožárního podhledu typu D116 – SDK 2x protipožární deska tl. 12,5mm na UA profily po 50cm + závěsy Nonius, který splňuje veškeré požadavky PBŘ a ČSN na protipožární odolnost. Z důvodu optimalizace střešní skladby, viz ZL02, také dochází ke změně rozteče nosných prvků pro kotvení podhledu.

Odkazy na specifikaci:	
na výkresy:	
na rozpočtové podklady:	
na jinou část smlouvy:	

Důvod vícepráce / méněpráce: **Jedná se o nezbytné práce pro zajištění realizace dle účelu smlouvy, které vznikly v důsledků okolností, které zadavatel jednající s náležitou péči nemohl předvídat. Současně tyto práce nemění celkovou povahu veřejné zakázky.**			
odstavec 4, § 222 ☐	odstavec 5, § 222 ☐	odstavec 6, § 222 ☒	odstavec 7, § 222 ☐
Cena méněprací bez DPH:		**Cena víceprací bez DPH:**	
-880 177,30 Kč		**2 235 497,04 Kč**	
Výsledná cena změn bez DPH:			
		1 355 319,74 Kč	
		Výsledná celková cena změny DPH	
		284 617,15	
		Výsledná celková cena změny vč. DPH	
		1 639 936,89	
Nově sjednaná lhůta dokončení díla:			
Nemá vliv na sjednanou lhůtu pro dokončení díla.			
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.			

Oznámení vydává: Fakultní nemocnice Ostrava

Datum:

[redacted]

odbor přípravy a realizace investic

[redacted]

vedoucí odboru přípravy a realizace investic

[redacted]...

Ing. Marek Veselý

náměstek ředitele pro techniku a provoz

Podpis zmocněnce zhotovitele: Datum:	[redacted]
Stanovisko TDI: Datum:	**Podpis TDI:** [redacted]
Stanovisko projektanta stavby:	**Podpis projektanta stavby:** [redacted]

Seznam přiložených dokladů:

1. Položkový rozpočet víceprací /méněprací

Změnový list č. 05

Identifikační údaje akce	
Název	**„Nástavba lůžkového oddělení L8“**
SoD ev.č. DZ 24015418/OVA	
Objednatel:	
Název	Fakultní nemocnice Ostrava
Adresa	17. listopadu 1790/5, Ostrava - Poruba, 708 52
Zhotovitel	
Název	Metrostav DIZ s.r.o.
Adresa	Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8
Oznámení vystavil:	
[redacted]	
Navrhované změny akce	
Provedení KZS pro části objektu L7+L8	
Zdůvodnění navrhovaných změn	
Změnový list řeší provedení nové tepelné izolace (KZS) na jižní části objektu nástaveb oddělení L7 a L8. **Nástavby oddělení L7 a L8 jsou provedeny na stávajícím objektu RÚ Hrabyně cca ze 70. let minulého století. Nástavba L7 byla provedena v roce 2019, nástavba L8 je aktuálně prováděna. Obvodové nosné konstrukce nástaveb jsou provedeny z tepeleně izolačního zdiva YTONG lamda.** **Avšak z důvodu velkého množství instalcí ÚT, ZTI a Ele vedeného v obvodovém tepelně izolačním zdivu, které narušují jeho vlastnosti, bylo po dohodě s investorem (FN Ostrava), technickým dozorem stavby (p. Jochim) a zhotovitelem (Metrostav DIZ s.r.o) rozhodnuto o doteplení této části objetku, tak aby bylo zamezeno vzniku teplených mostů.** **Nové KZS bude provedeno z minerální vlny s podélnou orientací vláken tl. 100 mm a práce obnáší také provedení nových klempířských konstrukcí vnějších výplní otvorů.**	

Odkazy na specifikaci:	
na výkresy:	
na rozpočtové podklady:	
na jinou část smlouvy:	

Důvod vícepráce / méněpráce:

Změna závazku v důsledku více/méněprací a dodávek nemění celkovou povahu veřejné zakázky a její hodnota je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a zároveň nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce.

odstavec 4, § 222 ☒	odstavec 5, § 222 ☐	odstavec 6, § 222 ☐	odstavec 7, § 222 ☐

Cena méněprací bez DPH:	**Cena víceprací bez DPH:**
-145 437,10 Kč	**1 063 885,97 Kč**
Výsledná cena změn bez DPH:	
	918 448,87 Kč
	Výsledná celková cena změny DPH
	192 874,26
	Výsledná celková cena změny vč. DPH
	1 111 323,13
Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
Nemá vliv na sjednanou lhůtu pro dokončení díla.	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.	

Oznámení vydává: Fakultní nemocnice Ostrava

Datum:

[redacted]

odbor přípravy a realizace inv[redacted]

[redacted]

vedoucí odboru přípravy a realizace investic

[redacted]

Ing. Marek Veselý
náměstek ředitele pro techniku a provoz

Podpis zmocněnce zhotovitele:

Datum:

[redacted]

Stanovisko TDI: Datum:	[redacted]
Stanovisko projektanta stavby:	**Podpis projektanta stavby:** [redacted]

Seznam přiložených dokladů:

1. Položkový rozpočet víceprací /méněprací

Změnový list č. 06

Identifikační údaje akce	
Název	**„Nástavba lůžkového oddělení L8“**
SoD ev.č. DZ 24015418/OVA	
Objednatel:	
Název	Fakultní nemocnice Ostrava
Adresa	17. listopadu 1790/5, Ostrava - Poruba, 708 52
Zhotovitel	
Název	Metrostav DIZ s.r.o.
Adresa	Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8
Oznámení vystavil:	
[redacted]	
Navrhované změny akce	
Změna rolet na venkovní žaluzie	
Zdůvodnění navrhovaných změn	
Změnový list řeší změnu stínění vnějších obvodových výplní z dle PD navržených předokenních rolet na venkovní lamelové žaluzie. **Z důvodu vizuálního sladění nové nástavby L8 s již provedenou nástavbou L7 bylo investorem rozhodnuto o použití venkonvích lamelových žaluzií, které jsou taktéž použity o patro níže – na nástavbě L7.**	

Odkazy na	**specifikaci:**	
	na výkresy:	
	na rozpočtové podklady:	
	na jinou část smlouvy:	

Důvod vícepráce / méněpráce:

Změna závazku v důsledku více/méněprací a dodávek nemění celkovou povahu veřejné zakázky a její hodnota je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a zároveň nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce.

.

odstavec 4, § 222 ☒	odstavec 5, § 222 ☐	odstavec 6, § 222 ☐	odstavec 7, § 222 ☐
Cena méněprací bez DPH:		**Cena víceprací bez DPH:**	
-562 287,50 Kč		**886 129,05 Kč**	
Výsledná cena změn bez DPH:			
		323 841,55 Kč	
		Výsledná celková cena změny DPH	
		68 006,73	
		Výsledná celková cena změny vč. DPH	
		391 848,28	
Nově sjednaná lhůta dokončení díla:			
Nemá vliv na sjednanou lhůtu pro dokončení díla.			
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.			

Oznámení vydává: Fakultní nemocnice Ostrava

Datum:

[redacted]

odbor přípravy a realizace investic

[redacted]

vedoucí odboru přípravy a realizace investic

[redacted]

Ing. Marek Veselý
náměstek ředitele pro techniku a provoz

Podpis zmocněnce zhotovitele:

Datum:

[redacted]

Stanovisko TDI: Datum:	**Podpis** [redacted]
Stanovisko projektanta stavby:	**Podpis projektanta stavby:** [redacted]

Seznam přiložených dokladů:

1. Položkový rozpočet víceprací /méněprací

Změnový list č. 07

Identifikační údaje akce	
Název	**„Nástavba lůžkového oddělení L8“**
SoD ev.č. DZ 24015418/OVA	
Objednatel:	
Název	Fakultní nemocnice Ostrava
Adresa	17. listopadu 1790/5, Ostrava - Poruba, 708 52
Zhotovitel	
Název	Metrostav DIZ s.r.o.
Adresa	Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8
Oznámení vystavil:	
[redacted]	
Navrhované změny akce	
Změny v provádění vnějších výplní	
Zdůvodnění navrhovaných změn	

Změnový list řeší změny na vnějších venkovní výplní.

Vnější výplně označené A010 v počtu 3ks, byly dle PD navrženy tvarově jako kulaté. Z technických důvodů však nelze navržené řešení realizovat a bylo tedy rozhodnuto o obdelníkovém tvarovém provedení. rozhnodnutí investora jsou tyto výplně nově provedeny tvarově jako obdelníkové. Touto změnou dochází k úspoře finančních nákladů.

Vnější výplně označené A006 v počtu 1ks nebude provedeno, neboť by plášť budovy jednak značně vizuálně poškodilo a narušovalo by i celistvost a tepelně izolační vlastnosti fasády.

Vnější výplně označené L04 v počtu 4ks musí splňovat parametry dle aktualizovaného a schváleného PBŘ z dubna 2024. Z tohoto důvodu byla provedena změna 2ks výplní z plastových otvíravých na hlinikové pevné s požární odolností EI60. Další 2ks výplní, navazující na výplně s požární odolností, byly provedeny z důvodu materiálového sjednocení jako hlinikové otevíravé.

Pro vnější výplně označené D05-hliníkové dveře na požarní schodiště byl z důvodu bezpečnosti provozu doplněn elektromagnet napojený na EPS, který dveře drží zavřené a není možno je bez vyhlášení požárního poplachu otevřít.

Odkazy na specifikaci:	
na výkresy:	
na rozpočtové podklady:	
na jinou část smlouvy:	

Důvod vícepráce / méněpráce: **Jedná se o nezbytné práce pro zajištění realizace dle účelu smlouvy, které vznikly v důsledků okolností, které zadavatel jednající s náležitou péči nemohl předvídat. Současně tyto práce nemění celkovou povahu veřejné zakázky.**			
odstavec 4, § 222 ☐	odstavec 5, § 222 ☐	odstavec 6, § 222 ☒	odstavec 7, § 222 ☐
Cena méněprací bez DPH:		**Cena víceprací bez DPH:**	
-222 750,23 Kč		**245 322,05 Kč**	
Výsledná cena změn bez DPH:			
		22 571,82 Kč	
		Výsledná celková cena změny DPH	
		4 740,08	
		Výsledná celková cena změny vč. DPH	
		27 311,90	
Nově sjednaná lhůta dokončení díla:			
Nemá vliv na sjednanou lhůtu pro dokončení díla.			
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.			

Oznámení vydává: Fakultní nemocnice Ostrava

Datum:

[redacted]

odbor přípravy a realizace investic

[redacted]

vedoucí odboru přípravy a realizace investic

[redacted]

Ing. Marek Veselý
náměstek ředitele pro techniku a provoz

Podpis zmocněnce zhotovitele:

Datum:

[redacted]

Stanovisko TDI:

Datum:

Podpis TDI:

[redacted]

Stanovisko projektanta stavby:

Podpis projektanta stavby:

[redacted]

Seznam přiložených dokladů:

1. Položkový rozpočet víceprací /méněprací

Změnový list č. 08

Identifikační údaje akce	
Název	**„Nástavba lůžkového oddělení L8“**
SoD ev.č. DZ 24015418/OVA	
Objednatel:	
Název	Fakultní nemocnice Ostrava
Adresa	17. listopadu 1790/5, Ostrava - Poruba, 708 52
Zhotovitel	
Název	Metrostav DIZ s.r.o.
Adresa	Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8
Oznámení vystavil:	
[redacted]	
Navrhované změny akce	
Změny v provádění HSV prací	
Zdůvodnění navrhovaných změn	

Změnový list řeší drobné změny oproti PD či rozpočtu, které nastaly z nepředvídatelných důvodu při realizaci díla.

Z důvodu neprovedené izolace v místě vzduchotechnické jednotky ze samolepících asfaltových pasů tvořící parotěsnou vrstvu nad nástavbou L7, a jenž měla tvořit provizorní izolaci po demontáži části střešní konstrukce při realizaci nástavby L8, bylo nutné provedení dodatečného zabezpečení proti zatačení srážkové vody.

Z důvodu dodatečného zabezpečení proti zatečení srážkové vody při realizaci nástavby L8 bylo provedno 13ks provizorních vtoků na stávající instalované prostupy.

Z důvodu přesahu nově prováděného KZS do ocelové konstrukce únikového schodiště, byly přechody mezi KZS a ocelovým únikových schodištěm doplněny o dilatčační lišty z TiZn plechu.

Z důvodu kolize původního KZS v místě prováděné nástavby L8 bylo provedeno menší množství demontáž KZS.

Odkazy na specifikaci:	
na výkresy:	
na rozpočtové podklady:	
na jinou část smlouvy:	

Důvod vícepráce / méněpráce:
Jedná se o nezbytné práce pro zajištění realizace dle účelu smlouvy, které vznikly v důsledků okolností, které zadavatel jednající s náležitou péči nemohl předvídat. Současně tyto práce nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

odstavec 4, § 222 ☐	odstavec 5, § 222 ☐	odstavec 6, § 222 ☒	odstavec 7, § 222 ☐

Cena méněprací bez DPH:	**Cena víceprací bez DPH:**
0,00 Kč	**70 037,69 Kč**
Výsledná cena změn bez DPH:	
	70 037,69 Kč
	Výsledná celková cena změny DPH
	14 707,91
	Výsledná celková cena změny vč. DPH
	84 745,60

Nově sjednaná lhůta dokončení díla:
Nemá vliv na sjednanou lhůtu pro dokončení díla.
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Oznámení vydává: Fakultní nemocnice Ostrava

Datum:

[redacted]

odbor přípravy a realizace investic

[redacted]

vedoucí odboru přípravy a realizace investic

[redacted]

Ing. Marek Veselý

náměstek ředitele pro techniku a provoz

Podpis zmocněnce zhotovitele:

Datum:

[redacted]

Stanovisko TDI: Datum:	**Podpis TDI:** [redacted]
Stanovisko projektanta stavby:	**Podpis projektanta stavby:** [redacted]

Seznam přiložených dokladů:

1. Položkový rozpočet víceprací /méněprací
