Harmonogram stavby: 25070 Stavební úpravy Masarykovy veřejné knihovny Vsetín pobočka Rokytnice čp. 413

Zhotovitel : OBA-MONT s.r.o.
266
75612 Lačnov

Číslo	Název	Začátek činnosti	Konec činnosti	Počet prac. dní
25070	**Stavební úpravy Masarykovy veřejné knihovny Vsetín pobočka Rokytnice čp. 413**	**20.04.2026**	**06.11.2026**	**201**
SO 01	***Bourací práce + příprava***	***20.04.2026***	***15.06.2026***	***57***
1	*rozpočet*	*20.04.2026*	*15.06.2026*	*57*
1	Zemní práce	20.04.2026	03.06.2026	45
3	Svislé a kompletní konstrukce	04.05.2026	08.05.2026	5
6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	20.04.2026	03.06.2026	45
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	27.04.2026	15.06.2026	50
997	Doprava suti a vybouraných hmot	27.04.2026	15.06.2026	50
998	Přesun hmot	27.04.2026	15.06.2026	50
HZS	Hodinové zúčtovací sazby	20.04.2026	03.06.2026	45
711	Izolace proti vodě	11.05.2026	15.05.2026	5
713	Izolace tepelné	11.05.2026	11.05.2026	1
751	Vzduchotechnika	12.05.2026	13.05.2026	2
763	Konstrukce klempířské	27.04.2026	01.05.2026	5
766	Konstrukce truhlářské, okna a dveře	27.04.2026	01.05.2026	5
767	Konstrukce zámečnické	27.04.2026	01.05.2026	5
772	Kamenné dlažby	25.05.2026	03.06.2026	10
776	Povlakové krytiny	25.05.2026	03.06.2026	10
SO 02	***Architektonicko stavební řešení***	***20.04.2026***	***06.11.2026***	***201***
1	*rozpočet*	*20.04.2026*	*06.11.2026*	*201*
1	Zemní práce	04.05.2026	11.05.2026	8
16	Přemístění výkopku	04.05.2026	15.05.2026	12
2	Zakládání	15.05.2026	02.06.2026	19
3	Svislé a kompletní konstrukce	01.06.2026	26.06.2026	26
4	Vodorovné konstrukce	01.06.2026	07.06.2026	7
6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	29.06.2026	31.07.2026	33
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	20.04.2026	06.11.2026	201
998	Přesun hmot	20.04.2026	06.11.2026	201
HZS	Hodinové zúčtovací sazby	20.04.2026	06.11.2026	201
711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	15.06.2026	30.06.2026	16
713	Izolace tepelné	08.06.2026	30.06.2026	23
763	Konstrukce suché výstavby	15.05.2026	30.06.2026	47
764	Konstrukce klempířské	15.06.2026	19.06.2026	5
766	Konstrukce truhlářské, okna a dveře	15.05.2026	15.08.2026	93
767	Konstrukce zámečnické	15.05.2026	15.08.2026	93
771	Podlahy z dlaždic a obklady	13.07.2026	24.07.2026	12
772	Kamenné dlažby	13.07.2026	31.07.2026	19
773	Podlahy z litého teraca	13.07.2026	31.07.2026	19
775	Podlahy skládané	03.08.2026	16.08.2026	14
781	Obklady keramické	06.07.2026	24.07.2026	19
783	Nátěry	27.07.2026	31.07.2026	5
784	Dokončovací práce - malby a tapety	27.07.2026	07.08.2026	12
786	Dokončovací práce - čalounické úpravy	07.08.2026	28.08.2026	22
SO 03	***Zdravotně technická instalace***	***01.06.2026***	***30.08.2026***	***91***
1	*rozpočet*	*01.06.2026*	*30.08.2026*	*91*
3	Svislé a kompletní konstrukce	13.07.2026	14.07.2026	2
997	Doprava suti a vybouraných hmot	15.06.2026	16.06.2026	2
HZS	Hodinové zúčtovací sazby	01.06.2026	30.08.2026	91
721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	15.06.2026	30.06.2026	16
722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod	15.06.2026	30.06.2026	16
725	Zdravotechnika - zařizovací předměty	03.08.2026	16.08.2026	14
726	Zdravotechnika - předstěnové instalace	27.07.2026	31.07.2026	5
751	Vzduchotechnika	27.07.2026	31.07.2026	5
767	Konstrukce zámečnické	15.06.2026	30.06.2026	16
SO 04	***Vytápění***	***01.06.2026***	***30.08.2026***	***91***
1	*rozpočet*	*01.06.2026*	*30.08.2026*	*91*
997	Doprava suti a vybouraných hmot	15.06.2026	16.06.2026	2
HZS	Hodinové zúčtovací sazby	01.06.2026	30.08.2026	91
733	Ústřední vytápění - rozvodné potrubí	15.06.2026	30.06.2026	16
734	Ústřední vytápění - armatury	15.06.2026	30.06.2026	16
735	Ústřední vytápění - otopná tělesa	17.08.2026	24.08.2026	8
783	Dokončovací práce - nátěry	15.06.2026	30.06.2026	16
SO 05	***Silnoproud***	***01.06.2026***	***31.10.2026***	***153***
1	*rozpočet*	*01.06.2026*	*31.10.2026*	*153*
46-M	Zemní práce při extr.mont.pracích	15.06.2026	22.06.2026	8
997	Doprava suti a vybouraných hmot	13.07.2026	14.07.2026	2
D26	PODLAHOVÉ KRABICE PRO HRANATÉ VESTAVNÉ JEDNOTKY	21.07.2026	31.07.2026	11
D27	Elektromontáže	15.06.2026	15.07.2026	31
D1	Dodávky	01.08.2026	31.10.2026	92
D11	Rozvaděče	17.08.2026	30.08.2026	14
HZS	Hodinové zúčtovací sazby	01.06.2026	31.10.2026	153
741	Elektroinstalace - silnoproud	01.06.2026	31.10.2026	153
76	Ostatní náklady	01.06.2026	31.10.2026	153
SO 06	***Slaboproud***	***01.06.2026***	***31.10.2026***	***153***
1	*rozpočet*	*01.06.2026*	*31.10.2026*	*153*
997	Doprava suti a vybouraných hmot	13.07.2026	14.07.2026	2
D9	Elektromontáže	15.06.2026	30.06.2026	16
D1	Dodávky	12.10.2026	31.10.2026	20
D31	Videotelefon	24.10.2026	31.10.2026	8
HZS	Hodinové zúčtovací sazby	01.06.2026	31.10.2026	153
742	Elektroinstalace - slaboproud	01.06.2026	31.10.2026	153
76	Ostatní náklady	01.06.2026	31.10.2026	153
SO 07	***VZT***	***01.07.2026***	***30.09.2026***	***92***
1	*rozpočet*	*01.07.2026*	*30.09.2026*	*92*
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	22.08.2026	30.09.2026	40
998	Přesun hmot	01.07.2026	30.09.2026	92
D1	EF1– Odvod vzduchu z sociálního zařízení 2np	15.07.2026	31.07.2026	17
D2	AHU1 – Větrání víceúčelového sálu 2np	01.08.2026	22.08.2026	22
D3	Ostatní	22.08.2026	30.09.2026	40
HZS	Hodinové zúčtovací sazby	01.07.2026	30.09.2026	92
SO 08	***Vybavení sociálních zařízení***	***01.10.2026***	***06.11.2026***	***37***
1	*rozpočet*	*01.10.2026*	*06.11.2026*	*37*
725	Zdravotechnika - zařizovací předměty	01.10.2026	06.11.2026	37
SO 09	***VRN***	***20.04.2026***	***06.11.2026***	***201***
1	*rozpočet*	*20.04.2026*	*06.11.2026*	*201*
VRN1	Průzkumné, zeměměřičské a projektové práce	20.04.2026	06.11.2026	201
VRN3	Zařízení staveniště	20.04.2026	06.11.2026	201
VRN4	Inženýrská činnost	20.04.2026	06.11.2026	201
VRN7	Provozní vlivy	20.04.2026	06.11.2026	201
VRN9	Ostatní náklady	20.04.2026	06.11.2026	201
	Cena za měsíc			
	Cena celkem			

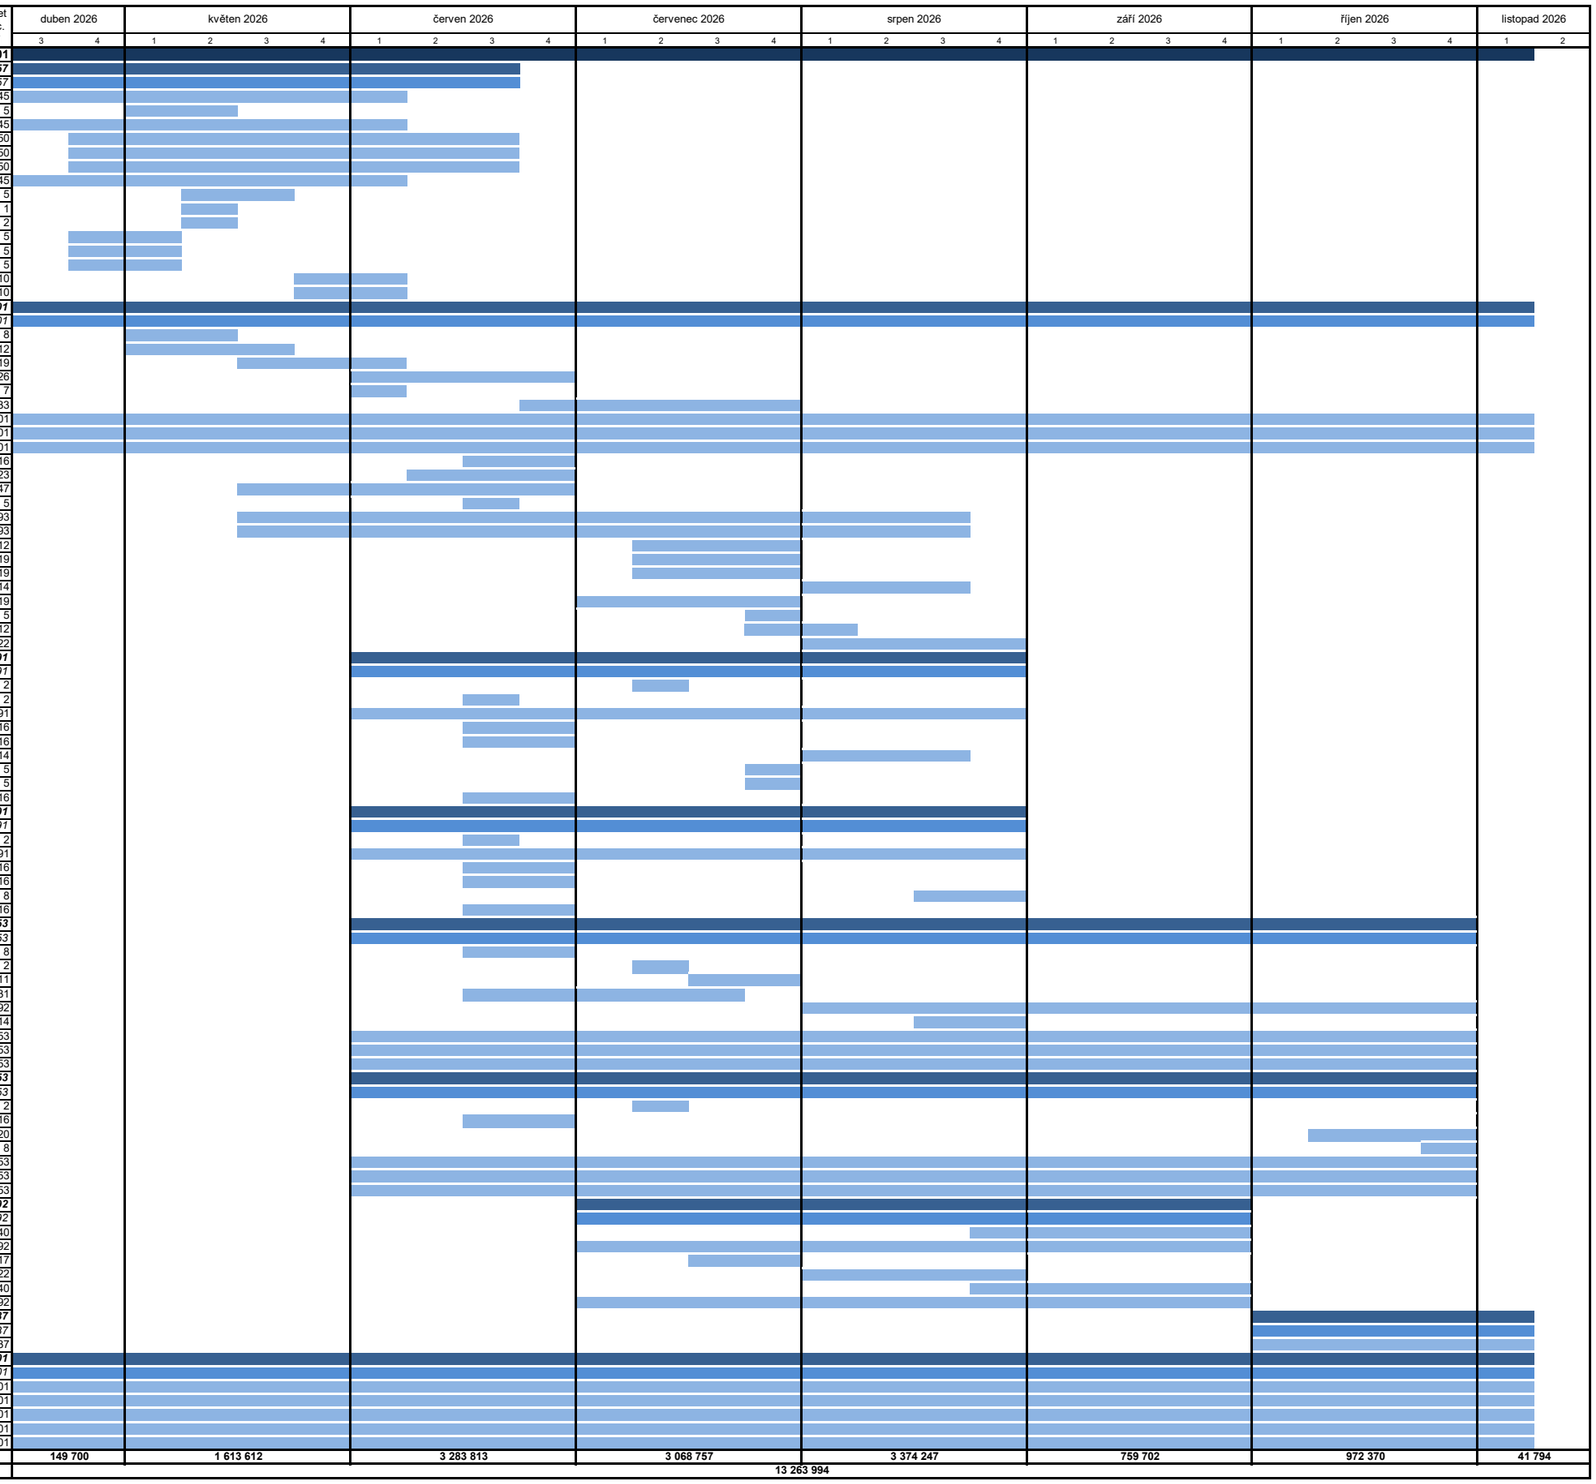

Cena za měsíc	**149 700**	**1 613 612**	**3 283 813**	**3 068 757**	**3 374 247**	**759 702**	**972 370**	**41 794**
Cena celkem	**13 263 994**							
