D o d a t e k č . 2

ke smlouvě o dílo na provedení stavby „III/40618 Telč, ul. Radkovská (část město Telč)“ uzavřené dne 30.04.2024

I. SMLUVNÍ STRANY

I.1. Objednatel: **Město Telč**
Se sídlem: Náměstí Zachariáše z Hradce 10, 588 56 Telč
Zastoupené: Mgr. Vladimírem Brtníkem – starostou města
IČO: 00286745
DIČ: CZ00286745
Peněžní ústav: [redacted]
Číslo účtu:

I.2. Zhotovitel: IMOS Brno, a.s.
Se sídlem: Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno
Zápis v OR: B 2211 vedený Krajským soudem v Brně
Zastoupený: Ing. Robertem Suchánkem, předsedou představenstva
IČO: 253 22 257
DIČ: CZ25322257
Peněžní ústav: [redacted]
Číslo účtu:

Na základě dohody obou smluvních stran se tímto mění závazek ze smlouvy o dílo na veřejnou zakázku **III/40618 Telč, ul. Radkovská (část město Telč)**.

Změny řešené tímto dodatkem byly odsouhlaseny zástupcem/zástupci objednatele, autorského dozoru objednatele a technického dozoru objednatele. Jejich úplný rozsah je dán změnovým listem s odsouhlasenými položkovými rozpočty, které tvoří nedílnou součást tohoto dodatku.

V souladu s odst. II.11. a uzavřené smlouvy o dílo a na základě dohody obou smluvních stran se tímto mění článek IV.1. uzavřené smlouvy o dílo takto:

IV.1. Cena díla je sjednaná na rozsah daný touto smlouvou o dílo jako cena nejvýše přípustná, platná po celou dobu výstavby, s výjimkou případů stanovených v této smlouvě o dílo. Je vyjádřena oceněním technických jednotek jednotkovými cenami v členění dle předaného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb.

Položkový rozpočet (zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb) předložil zhotovitel současně s nabídkou. Jsou v něm uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací, dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro objednatelem vymezené množství. Nabídnutá cena díla je považovaná za cenu díla na celý rozsah zadání veřejné zakázky v rozsahu položkového rozpočtu.

Celková cena díla se tímto dodatkem č. 2 upravuje, dle uzavřeného změnového listu č. 1, který tvoří přílohu tohoto dodatku č. 2. Tento dodatek rovněž mění položkový rozpočet (zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb) v souladu s uzavřeným změnovým listem č. 1

Smluvní cena činí:

Cena bez DPH:	**14 450 162,49 Kč**
DPH (21%):	**3 034 534,12 Kč**
Cena s DPH:	**17 484 696,61Kč**

Cena dle SOD a dodatku č.2:

Cena celkem bez DPH :	**15 773 640,61 Kč**
DPH(21%):	**3 312 464,53 Kč**
Cena s DPH:	**19 086 105,14 Kč**

II.

- Ostatní ustanovení uzavřené smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.
- Tento dodatek č.2 je nedílnou součástí smlouvy o dílo na provedení stavby „III/40618 Telč, ul. Radkovská (část město Telč)“ uzavřené dne 22.11.2024.
- Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek bude uzavřen v elektronické podobě a podepsána uznávanými nebo kvalifikovanými elektronickými podpisy dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce. V takovém případě se již nevyhotovují listinné stejnopisy.
- Smluvní strany souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 2 v celém rozsahu v Registru smluv a na Profilu zadavatele.
- Dodatek č. 2 byl schválen Radou města Telče dne 29. 4. 2026.
- Nedílnou součást tohoto dodatku č. 2 tvoří přílohy:
    - Změnový list č. 1

V Telči dne: V dne:

…… ……

Objednatel **Zhotovitel**

Krycí list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby : III/40618 Telč, ul. Radkovská Název stavebního objektu/provozního souboru(SO/PS): SO 102.1, SO 103.1.001, SO 103.1.004, SO 103.1.006, SO 301.3, SO 351.1, SO 103.1.007, SO 103.2.003, SO 451	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS SO 102.1, SO 103.1 (001, 004, 006), SO 301.3, SO 351.1, SO 103.1.007, SO 103.2.003, SO 451	Číslo změny stavby 01

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 30.4.2024 (dále jen Smlouva):
Objednatel: Město Telč
Zhotovitel: IMOS Brno, a.s.

Obsah:

Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS, Rozpis ocenění změn položek - počet stran A4	
Soupis prací - počet stran A4	
Další doklady nezbytné pro popis, řádné zdůvodnění, dokladování a ocenění změn - počet stran A4	

Iniciátor změny: ☐ zhotovitel ☐ objednatel ☐ projektant ☐ .....

Zdůvodnění a popis změny:

[redacted]

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
[redacted]		

Vyjádření - souhlas se změnou:

Pojektant (autorský dozor)	jméno	datum	podpis
Zástupce Investora	jméno	datum	podpis
Objednatel	jméno	datum	podpis
Správce stavby	jméno	datum	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny výše a v přiložené Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby.Tento Evidenční list změny stavby představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Zhotovitel	jméno [redacted]	datum	podpis

Evidenční list změny stavby

Evidenční číslo a název Stavby:	Číslo SO/PS /	Číslo ZBV:
III/40618 Telč, ul. Radkovská	/ číslo Změny SO/PS:	
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):		
SO 102.1 Místní komunikace	**SO 102.1**	**01.1**
Číslo a název podobjektu/rozpočtu:	**01**	
SO 102.1 Místní komunikace		

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 30. 4. 2024 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Kraj Vysočina a město Telč

Zhotovitel: IMOS Brno, a.s.

Popis Změny:

SO 102.1 Místní komunikace - spády, vpusti, septik

V rámci změn na stavebním objektu SO 102 byla provedena změna příčných a podélných spádů, přidání 2 x UV, vybudování nové přípojky splaškové kanalizace z čp 530. V rámci sanací byla provedena výměna materiálu, za materiál použitý na objektu SO 101 – DK 0-200.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
[redacted]		

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno	datum	podpis
Technický dozor investora	jméno	datum	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny výše a v přiložené Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel	jméno	datum	podpis
Zhotovitel	jméno [redacted]	datum	podpis

ZBV č. 01.1 Místní komunikace - spády, vpusti, septik

Stavba: 21007, město III/40618 Telč, ul. Radkovská, PD

Objekt: SO102, Místní komunikace

Rozpočet: SO102.1, Místní komunikace

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: IMOS Brno,a.s.

Rozpočet:

Základní cena: [redacted]

Cena - celkem:

DPH:

Cena s daní:

Z toho rozhod.hmoty:

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek:

Náklad na měrnou jedn.:

ZBV - celkem:

Cena - celkem: [redacted]

DPH:

Cena s daní:

Vypracoval zadání:

Datum zadání:

ZBV vypracoval:

Datum vypracování ZBV 02.03.2026

Položky ZBV č. 01.1

Stavba: 21007, město III/40618 Telč, ul. Radkovská, PD
Objekt: SO102, Místní komunikace
Rozpočet: SO102.1, Místní komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem

[redacted]

Položky ZBV č. 01.1

Stavba: 21007, město III/40618 Telč, ul. Radkovská, PD
Objekt: SO102, Místní komunikace
Rozpočet: SO102.1, Místní komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
[redacted]							

Položky ZBV č. 01.1

Stavba: 21007, město III/40618 Telč, ul. Radkovská, PD
Objekt: SO102, Místní komunikace
Rozpočet: SO102.1, Místní komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
[redacted]							

Evidenční list změny stavby

Evidenční číslo a název Stavby: **III/40618 Telč, ul. Radkovská** Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): **SO 103.1.001 - Chodníky SFDI** Číslo a název podobjektu/rozpočtu: **SO 103.1.001 - Chodníky SFDI**	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: **SO 103.1.001** **01**	Číslo ZBV: **01.2**

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 30. 4. 2024 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Kraj Vysočina a město Telč

Zhotovitel: IMOS Brno, a.s.

Popis Změny:

SO 103.1.001 Chodníky SFDI - dodláždnění k patě domu, hydroizolace spodní stavby

Změna chodníků + odvodnění u domu čp 214

Z důvodu požadavku změny stavby, doplnění odvodnění u obytného domu. Po provedení obrub a podkladních štěrkových vrstev bylo rozhodnuto, že přes stavbu půjde přeložka VN a následně bude provedeno odvodnění domu viz samostatný návrh. V rámci změn se jedná o odstranění vrstvy ŠD a obrub, ruční obkopání domu (blízkost kabelů cetin + egd). Pokládka drenáže, nopová folie, zásyp a geotextilie. Dále byl chodník prodloužen až ke zdi předmětného domu.

Vjezd do sídliště v km 0,166

Z důvodu nevhodného podkladu pláně bylo rozhodnuto, že sanace byla provedena z DK 0-200, jako hlavní trasa.

Změna obrub na hlavní trase

Z důvodu změn ploch přiléhajících k SO 101 (parkoviště, sjezdy,…) bylo provedeno několik změn již položených obrub. Dále byla provedena oprava kamenných obrub v zálivu MK v sídlišti.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
[redacted]		

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno	datum	podpis
Technický dozor investora	jméno	datum	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny výše a v přiložené Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel	jméno		datum	podpis
Zhotovitel	jméno	[redacted]	datum	podpis

ZBV č. 01.2 Chodníky SFDI - dodláždnění k patě domu, hydroizolace spodní

Stavba: 21007, město III/40618 Telč, ul. Radkovská, PD

Objekt: SO103.1, Parkoviště, chodníky a vjezdy - 1. Část v km 0,009 - 0,242

Rozpočet: 001, Chodníky SFDI

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: IMOS Brno,a.s.

Rozpočet:

Základní cena: [redacted]

Cena - celkem:

DPH:

Cena s daní:

Z toho rozhod.hmoty:

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek:

Náklad na měrnou jedn.:

ZBV - celkem:

Cena - celkem: [redacted]

DPH:

Cena s daní:

Vypracoval zadání:

Datum zadání:

ZBV vypracoval:

Datum vypracování ZBV 03.03.2026

Položky ZBV č. 01.2

Stavba: 21007, město III/40618 Telč, ul. Radkovská, PD
Objekt: SO103.1, Parkoviště, chodníky a vjezdy - 1. Část v km 0,009 - 0,242
Rozpočet: 001, Chodníky SFDI

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
[redacted]							

Položky ZBV č. 01.2

Stavba: 21007, město III/40618 Telč, ul. Radkovská, PD
Objekt: SO103.1, Parkoviště, chodníky a vjezdy - 1. Část v km 0,009 - 0,242
Rozpočet: 001, Chodníky SFDI

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
[redacted]							

Položky ZBV č. 01.2

Stavba: 21007, město III/40618 Telč, ul. Radkovská, PD
Objekt: SO103.1, Parkoviště, chodníky a vjezdy - 1. Část v km 0,009 - 0,242
Rozpočet: 001, Chodníky SFDI

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
[redacted]							

Položky ZBV č. 01.2

Stavba: 21007, město III/40618 Telč, ul. Radkovská, PD
Objekt: SO103.1, Parkoviště, chodníky a vjezdy - 1. Část v km 0,009 - 0,242
Rozpočet: 001, Chodníky SFDI

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
[redacted]							

Evidenční list změny stavby

Evidenční číslo a název Stavby:	Číslo SO/PS /	Číslo ZBV:
III/40618 Telč, ul. Radkovská Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): **SO 103.1.004 - Vjezdy Město** Číslo a název podobjektu/rozpočtu: **SO 103.1.004 - Vjezdy Město**	/ číslo Změny SO/PS: **SO 103.1.004** **01**	**01.3**

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 30. 4. 2024 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Kraj Vysočina a město Telč

Zhotovitel: IMOS Brno, a.s.

Popis Změny:

SO 103.1.004 Vjezdy Město - dodláždění vjezdu a chodníku před STK

<u>Vjezdy + chodník STK</u>

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
[redacted]		

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno	datum	podpis
Technický dozor investora	jméno	datum	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny výše a v přiložené Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel	jméno		datum	podpis
Zhotovitel	jméno	[redacted]	datum	podpis

ZBV č. 01.3 Vjezdy Město - dodláždění vjezdu a chodníku před STK

Stavba: 21007, město III/40618 Telč, ul. Radkovská, PD

Objekt: SO103.1, Parkoviště, chodníky a vjezdy - 1. Část v km 0,009 - 0,242

Rozpočet: 004, Vjezdy Město

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: IMOS Brno,a.s.

Rozpočet:

Základní cena: [redacted]

Cena - celkem:

DPH:

Cena s daní:

Z toho rozhod.hmoty:

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek:

Náklad na měrnou jedn.:

ZBV - celkem:

Cena - celkem: [redacted]

DPH:

Cena s daní:

Vypracoval zadání:

Datum zadání:

ZBV vypracoval:

Datum vypracování ZBV 03.03.2026

Položky ZBV č. 01.3

Stavba: 21007, město III/40618 Telč, ul. Radkovská, PD
Objekt: SO103.1, Parkoviště, chodníky a vjezdy - 1. Část v km 0,009 - 0,242
Rozpočet: 004, Vjezdy Město

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
[redacted]							

Položky ZBV č. 01.3

Stavba: 21007, město III/40618 Telč, ul. Radkovská, PD
Objekt: SO103.1, Parkoviště, chodníky a vjezdy - 1. Část v km 0,009 - 0,242
Rozpočet: 004, Vjezdy Město

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem

Položky ZBV č. 01.3

Stavba: 21007, město III/40618 Telč, ul. Radkovská, PD
Objekt: SO103.1, Parkoviště, chodníky a vjezdy - 1. Část v km 0,009 - 0,242
Rozpočet: 004, Vjezdy Město

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
[redacted]							

Položky ZBV č. 01.3

Stavba: 21007, město III/40618 Telč, ul. Radkovská, PD
Objekt: SO103.1, Parkoviště, chodníky a vjezdy - 1. Část v km 0,009 - 0,242
Rozpočet: 004, Vjezdy Město

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
[redacted]							

Položky ZBV č. 01.3

Stavba: 21007, město III/40618 Telč, ul. Radkovská, PD
Objekt: SO103.1, Parkoviště, chodníky a vjezdy - 1. Část v km 0,009 - 0,242
Rozpočet: 004, Vjezdy Město

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
[redacted]							

Položky ZBV č. 01.3

Stavba: 21007, město III/40618 Telč, ul. Radkovská, PD
Objekt: SO103.1, Parkoviště, chodníky a vjezdy - 1. Část v km 0,009 - 0,242
Rozpočet: 004, Vjezdy Město

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
[redacted]							

Evidenční list změny stavby

Evidenční číslo a název Stavby:	Číslo SO/PS /	Číslo ZBV:
III/40618 Telč, ul. Radkovská Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): **SO 103.1.006 - Parkoviště Město** Číslo a název podobjektu/rozpočtu: **SO 103.1.006 - Parkoviště Město**	/ číslo Změny SO/PS: **SO 103.1.006** **01**	**01.4**

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 30. 4. 2024 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Kraj Vysočina a město Telč

Zhotovitel: IMOS Brno, a.s.

Popis Změny:

SO 103.1.006 Parkoviště Město - rozšíření ploch parkingu

Jedná se o soupis změn na základě geodetického zaměření skutečně provedených prací.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
[redacted]		

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno	datum	podpis
Technický dozor investora	jméno	datum	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny výše a v přiložené Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel	jméno		datum	podpis
Zhotovitel	jméno	[redacted]	datum	podpis

ZBV č. 01.4 Parkoviště Město - rozšíření ploch parkingu

Stavba: 21007, město III/40618 Telč, ul. Radkovská, PD

Objekt: SO103.1, Parkoviště, chodníky a vjezdy - 1. Část v km 0,009 - 0,242

Rozpočet: 006, Parkoviště Město

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: IMOS Brno,a.s.

Rozpočet:

Základní cena: [redacted]

Cena - celkem:

DPH:

Cena s daní:

Z toho rozhod.hmoty:

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek:

Náklad na měrnou jedn.:

ZBV - celkem:

Cena - celkem: [redacted]

DPH:

Cena s daní:

Vypracoval zadání:

Datum zadání:

ZBV vypracoval:

Datum vypracování ZBV 03.03.2026

Položky ZBV č. 01.4

Stavba: 21007, město III/40618 Telč, ul. Radkovská, PD
Objekt: SO103.1, Parkoviště, chodníky a vjezdy - 1. Část v km 0,009 - 0,242
Rozpočet: 006, Parkoviště Město

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
[redacted]							

Položky ZBV č. 01.4

Stavba: 21007, město III/40618 Telč, ul. Radkovská, PD
Objekt: SO103.1, Parkoviště, chodníky a vjezdy - 1. Část v km 0,009 - 0,242
Rozpočet: 006, Parkoviště Město

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
[redacted]							

Položky ZBV č. 01.4

Stavba: 21007, město III/40618 Telč, ul. Radkovská, PD
Objekt: SO103.1, Parkoviště, chodníky a vjezdy - 1. Část v km 0,009 - 0,242
Rozpočet: 006, Parkoviště Město

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
[redacted]							

Položky ZBV č. 01.4

Stavba: 21007, město III/40618 Telč, ul. Radkovská, PD
Objekt: SO103.1, Parkoviště, chodníky a vjezdy - 1. Část v km 0,009 - 0,242
Rozpočet: 006, Parkoviště Město

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
[redacted]							

Evidenční list změny stavby

Evidenční číslo a název Stavby: **III/40618 Telč, ul. Radkovská** Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): **SO 301.3 - Dešťová kanalizace - úsek 3** Číslo a název podobjektu/rozpočtu: **SO 301.3 - Dešťová kanalizace - úsek 3**	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: **SO 301.3** **01.1**	Číslo ZBV: **01.5**

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 30. 4. 2024 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Kraj Vysočina a město Telč

Zhotovitel: IMOS Brno, a.s.

Popis Změny:

SO 301.3 - Dešťová kanalizace - úsek 3 (kolize přivadeč)

Kanalizace

Změna a prodloužení trasy kanalizace z důvodu kolize s vodovodem. Je nutné provést napojení stávajících dešťových svodů, přemístění šachty.

Přípojky dešťové kanalizace

Do nově budované kanalizace SO 301 byli v úseku 0,090-0,180 zaústěné nově nalezené přípojky dešťové kanalizace ze stávajících nemovitostí (nalezené zaústění z rušené kanalizace).

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
[redacted]		

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno	datum	podpis
Technický dozor investora	jméno	datum	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny výše a v přiložené Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel	jméno	datum	podpis
Zhotovitel	jméno [redacted]	datum	podpis

ZBV č. 01.5 Dešťová kanalizace - úsek 3 (kolize přivadeč)

Stavba: 21007, město III/40618 Telč, ul. Radkovská, PD

Objekt: SO301, Dešťová kanalizace

Rozpočet: SO301.3, Dešťová kanalizace - úsek 3

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: IMOS Brno,a.s.

Rozpočet:

Základní cena: [redacted]

Cena - celkem:

DPH:

Cena s daní:

Z toho rozhod.hmoty:

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek:

Náklad na měrnou jedn.:

ZBV - celkem:

Cena - celkem: [redacted]

DPH:

Cena s daní:

Vypracoval zadání:

Datum zadání:

ZBV vypracoval:

Datum vypracování ZBV 03.03.2026

Položky ZBV č. 01.5

Stavba: 21007, město III/40618 Telč, ul. Radkovská, PD
Objekt: SO301, Dešťová kanalizace
Rozpočet: SO301.3, Dešťová kanalizace - úsek 3

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
[redacted]							

Položky ZBV č. 01.5

Stavba: 21007, město III/40618 Telč, ul. Radkovská, PD
Objekt: SO301, Dešťová kanalizace
Rozpočet: SO301.3, Dešťová kanalizace - úsek 3

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
[redacted]							

Položky ZBV č. 01.5

Stavba: 21007, město III/40618 Telč, ul. Radkovská, PD
Objekt: SO301, Dešťová kanalizace
Rozpočet: SO301.3, Dešťová kanalizace - úsek 3

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
[redacted]							

Položky ZBV č. 01.5

Stavba: 21007, město III/40618 Telč, ul. Radkovská, PD
Objekt: SO301, Dešťová kanalizace
Rozpočet: SO301.3, Dešťová kanalizace - úsek 3

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
[redacted]							

Evidenční list změny stavby

Evidenční číslo a název Stavby:	Číslo SO/PS /	Číslo ZBV:
III/40618 Telč, ul. Radkovská	/ číslo Změny SO/PS:	
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):		
SO 301.3 - Dešťová kanalizace - úsek 3	**SO 301.3**	**01.6**
Číslo a název podobjektu/rozpočtu:	**01.2**	
SO 301.3 - Dešťová kanalizace - úsek 3		

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 30. 4. 2024 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Kraj Vysočina a město Telč

Zhotovitel: IMOS Brno, a.s.

Popis Změny:

SO 301.3 - Dešťová kanalizace - napojení dešťových svodů STK

Kanalizace STK

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
[redacted]		

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno	datum	podpis
Technický dozor investora	jméno	datum	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny výše a v přiložené Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel	jméno		datum	podpis
Zhotovitel	jméno	[redacted]	datum	podpis

ZBV č. 01.6 Dešťová kanalizace - napojení dešťových svodů STK

Stavba: 21007, město III/40618 Telč, ul. Radkovská, PD

Objekt: SO301, Dešťová kanalizace

Rozpočet: SO301.3, Dešťová kanalizace - úsek 3

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: IMOS Brno,a.s.

Rozpočet:

Základní cena: [redacted]

Cena - celkem:

DPH:

Cena s daní:

Z toho rozhod.hmoty:

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek:

Náklad na měrnou jedn.:

ZBV - celkem:

Cena - celkem: [redacted]

DPH:

Cena s daní:

Vypracoval zadání:

Datum zadání:

ZBV vypracoval:

Datum vypracování ZBV 03.03.2026

Položky ZBV č. 01.6

Stavba: 21007, město III/40618 Telč, ul. Radkovská, PD
Objekt: SO301, Dešťová kanalizace
Rozpočet: SO301.3, Dešťová kanalizace - úsek 3

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
[redacted]							

Položky ZBV č. 01.6

Stavba: 21007, město III/40618 Telč, ul. Radkovská, PD
Objekt: SO301, Dešťová kanalizace
Rozpočet: SO301.3, Dešťová kanalizace - úsek 3

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
[redacted]							

Položky ZBV č. 01.6

Stavba: 21007, město III/40618 Telč, ul. Radkovská, PD
Objekt: SO301, Dešťová kanalizace
Rozpočet: SO301.3, Dešťová kanalizace - úsek 3

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
[redacted]							

Evidenční list změny stavby

Evidenční číslo a název Stavby:	Číslo SO/PS /	Číslo ZBV:
III/40618 Telč, ul. Radkovská Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): **SO 351.1 - Přeložka vodovodu vč. přípojek - úsek 1** Číslo a název podobjektu/rozpočtu: **SO 351.1 - Přeložka vodovodu vč. přípojek - úsek 1**	/ číslo Změny SO/PS: **SO 351.1** **01**	**01.7**

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 30. 4. 2024 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Kraj Vysočina a město Telč

Zhotovitel: IMOS Brno, a.s.

Popis Změny:

SO 351.1 - Přeložka vodovodu vč. přípojek - úsek 1

Trasa vodovodu, propoje

Vzhledem k blízkosti inženýrských sítí (plynovod STL, sdělovací kabely) bylo rozhodnuto o změně navržené trasy vodovodu SO 351.1, který byl umístěn vedle vodovodního přivaděče (staničení km 0,190 – 0,280. Dále zůstává trasa beze změny.

Při realizaci napojení nové přeložky vodovodu na stávají vodovodu bylo nutno doplnit potrubí o spojky, příruby a tvarovky (napojení na jiný tvar, či materiál, než-li bylo předpokládáno PD, dočasný suchovod).

Vzhledem k velmi komplikovanému napojení bylo nutné vykopat velké „startovací jámy“. V jednom případě byl vodovod umístěn pod stávající betonové potrubí splaškové kanalizace (viz fotodokumentace).

Další změna nastala v kubatuře a materiálů zásypů. Vzhledem ke skutečnosti, že většina dosavadního vodovodu vede v komunikaci (silnice, chodník), bylo nutné změnit materiál zásypů ze zeminy na materiál nakupovaný.

Další vícepráce vznikly při samotných propojích. Opět vzhledem ke komplikacích na propojích z důvodů jednotlivých okruhů vodovodů muselo být provedeno více propojení, nežli bylo uvažováno PD. S tím souvisí vícenáklady spojenou s odstávkami, nočními montážními pracemi, vypuštění velkého množství vody, to samé i z důvodu odkalení. Dále bylo nutné použít i více materiálu pro propoje spojky, tvarovky)

Všechny odstávky musely z důvodu zásobení vodou probíhat v noci za velmi krátký časový úsek (velký počet montérů).

V rámci napojení stávajících přípojek bylo provedeno několik přípojek navíc – požadavek provozovatele.

V rámci měně prací je uvažováno s kratší délkou potrubí a provozovatelem odmítnutých chrániček potrubí přes komunikaci (změna trasy), neprovádění protlaku pod silnicí Hradecká.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
[redacted]		

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno	datum	podpis
Technický dozor investora	jméno	datum	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny výše a v přiložené Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel	jméno		datum	podpis
Zhotovitel	jméno	[redacted]	datum	podpis

ZBV č. 01.7 Přeložka vodovodu vč. přípojek - úsek 1

Stavba: 21007, město III/40618 Telč, ul. Radkovská, PD

Objekt: SO351, Přeložka vodovodu vč. přípojek

Rozpočet: SO351.1, Přeložka vodovodu vč. přípojek - úsek 1

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: IMOS Brno,a.s.

Rozpočet:

Základní cena: [redacted]

Cena - celkem:

DPH:

Cena s daní:

Z toho rozhod.hmoty:

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek:

Náklad na měrnou jedn.:

ZBV - celkem:

Cena - celkem: [redacted]

DPH:

Cena s daní:

Vypracoval zadání:

Datum zadání:

ZBV vypracoval:

Datum vypracování ZBV 03.03.2026

Položky ZBV č. 01.7

Stavba: 21007, město III/40618 Telč, ul. Radkovská, PD
Objekt: SO351, Přeložka vodovodu vč. přípojek
Rozpočet: SO351.1, Přeložka vodovodu vč. přípojek - úsek 1

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
[redacted]							

Položky ZBV č. 01.7

Stavba: 21007, město III/40618 Telč, ul. Radkovská, PD
Objekt: SO351, Přeložka vodovodu vč. přípojek
Rozpočet: SO351.1, Přeložka vodovodu vč. přípojek - úsek 1

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
[redacted]							

Položky ZBV č. 01.7

Stavba: 21007, město III/40618 Telč, ul. Radkovská, PD
Objekt: SO351, Přeložka vodovodu vč. přípojek
Rozpočet: SO351.1, Přeložka vodovodu vč. přípojek - úsek 1

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
[redacted]							

Položky ZBV č. 01.7

Stavba: 21007, město III/40618 Telč, ul. Radkovská, PD
Objekt: SO351, Přeložka vodovodu vč. přípojek
Rozpočet: SO351.1, Přeložka vodovodu vč. přípojek - úsek 1

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
[redacted]							

Položky ZBV č. 01.7

Stavba: 21007, město III/40618 Telč, ul. Radkovská, PD
Objekt: SO351, Přeložka vodovodu vč. přípojek
Rozpočet: SO351.1, Přeložka vodovodu vč. přípojek - úsek 1

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
[redacted]							

Evidenční list změny stavby

Evidenční číslo a název Stavby:	Číslo SO/PS /	Číslo ZBV:
III/40618 Telč, ul. Radkovská Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): **SO 103.1.007 - Asfaltové vjezdy Město** Číslo a název podobjektu/rozpočtu: **SO 103.1.007 - Asfaltové vjezdy Město**	/ číslo Změny SO/PS: **SO 103.1.007** **01**	**01.8**

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 30. 4. 2024 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Kraj Vysočina a město Telč

Zhotovitel: IMOS Brno, a.s.

Popis Změny:

SO 103.1.007 Asfaltové vjezdy Město

Jedná se o soupis změn na základě geodetického zaměření skutečně provedených prací.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
[redacted]		

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno	datum	podpis
Technický dozor investora	jméno	datum	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny výše a v přiložené Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel	jméno		datum	podpis
Zhotovitel	jméno	[redacted]	datum	podpis

ZBV č. 01.8 Asfaltové vjezdy Město

Stavba: 21007, město III/40618 Telč, ul. Radkovská, PD

Objekt: SO103.1, Parkoviště, chodníky a vjezdy - 1. Část v km 0,009 - 0,242

Rozpočet: 007, Asfaltové vjezdy Město

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: IMOS Brno,a.s.

Rozpočet:

Základní cena: [redacted]

Cena - celkem:

DPH:

Cena s daní:

Z toho rozhod.hmoty:

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek:

Náklad na měrnou jedn.:

ZBV - celkem:

Cena - celkem: [redacted]

DPH:

Cena s daní:

Vypracoval zadání:

Datum zadání:

ZBV vypracoval:

Datum vypracování ZBV 11.03.2026

Položky ZBV č. 01.8

Stavba: 21007, město III/40618 Telč, ul. Radkovská, PD
Objekt: SO103.1, Parkoviště, chodníky a vjezdy - 1. Část v km 0,009 - 0,242
Rozpočet: 007, Asfaltové vjezdy Město

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
[redacted]							

Položky ZBV č. 01.8

Stavba: 21007, město III/40618 Telč, ul. Radkovská, PD
Objekt: SO103.1, Parkoviště, chodníky a vjezdy - 1. Část v km 0,009 - 0,242
Rozpočet: 007, Asfaltové vjezdy Město

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
[redacted]							

Evidenční list změny stavby

Evidenční číslo a název Stavby:	Číslo SO/PS /	Číslo ZBV:
III/40618 Telč, ul. Radkovská Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): **SO 103.2.003 - Asfaltové vjezdy Město** Číslo a název podobjektu/rozpočtu: **SO 103.2.003 - Asfaltové vjezdy Město**	/ číslo Změny SO/PS: **SO 103.2.003** **01**	**01.9**

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 30. 4. 2024 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Kraj Vysočina a město Telč

Zhotovitel: IMOS Brno, a.s.

Popis Změny:

SO 103.2.003 Asfaltové vjezdy Město

Jedná se o soupis změn na základě geodetického zaměření skutečně provedených prací.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
[redacted]		

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno	datum	podpis
Technický dozor investora	jméno	datum	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny výše a v přiložené Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel	jméno		datum	podpis
Zhotovitel	jméno	[redacted]	datum	podpis

ZBV č. 01.9 Asfaltové vjezdy Město

Stavba: 21007, město III/40618 Telč, ul. Radkovská, PD

Objekt: SO103.2, Parkoviště, chodníky a vjezdy - 2. Část v km 0,304 - 0,380

Rozpočet: 003, Asfaltové vjezdy Město

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: IMOS Brno,a.s.

Rozpočet:

Základní cena: [redacted]

Cena - celkem:

DPH:

Cena s daní:

Z toho rozhod.hmoty:

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek:

Náklad na měrnou jedn.:

ZBV - celkem:

Cena - celkem: [redacted]

DPH:

Cena s daní:

Vypracoval zadání:

Datum zadání:

ZBV vypracoval:

Datum vypracování ZBV 11.03.2026

Položky ZBV č. 01.9

Stavba: 21007, město III/40618 Telč, ul. Radkovská, PD
Objekt: SO103.2, Parkoviště, chodníky a vjezdy - 2. Část v km 0,304 - 0,380
Rozpočet: 003, Asfaltové vjezdy Město

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
[redacted]							

Položky ZBV č. 01.9

Stavba: 21007, město III/40618 Telč, ul. Radkovská, PD
Objekt: SO103.2, Parkoviště, chodníky a vjezdy - 2. Část v km 0,304 - 0,380
Rozpočet: 003, Asfaltové vjezdy Město

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
[redacted]							

Evidenční list změny stavby

Evidenční číslo a název Stavby:	Číslo SO/PS /	Číslo ZBV:
III/40618 Telč, ul. Radkovská	/ číslo Změny SO/PS:	
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):		
SO 451 - Veřejné osvětlení	**SO 451**	**01.10**
Číslo a název podobjektu/rozpočtu:	**01**	
SO 451 - Veřejné osvětlení		

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 30. 4. 2024 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Kraj Vysočina a město Telč

Zhotovitel: IMOS Brno, a.s.

Popis Změny:

SO 451 Veřejné osvětlení

Jedná se o soupis změn na základě skutečně provedených prací.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
[redacted]		

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno	datum	podpis
Technický dozor investora	jméno	datum	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny výše a v přiložené Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel	jméno		datum	podpis
Zhotovitel	jméno	[redacted]	datum	podpis

ZBV č. 01.10 Veřejné osvětlení

Stavba: 21007, město III/40618 Telč, ul. Radkovská, PD

Objekt: SO451, Veřejné osvětlení

Rozpočet: SO451, Veřejné osvětlení

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: IMOS Brno,a.s.

Rozpočet:

Základní cena:

Cena - celkem:

DPH:

Cena s daní:

Z toho rozhod.hmoty:

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek:

Náklad na měrnou jedn.:

[redacted]

ZBV - celkem:

Cena - celkem:

DPH:

Cena s daní:

[redacted]

Vypracoval zadání:

Datum zadání:

ZBV vypracoval:

Datum vypracování ZBV 11.03.2026

Položky ZBV č. 01.10

Stavba: 21007, město III/40618 Telč, ul. Radkovská, PD
Objekt: SO451, Veřejné osvětlení
Rozpočet: SO451, Veřejné osvětlení

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
[redacted]							

Položky ZBV č. 01.10

Stavba: 21007, město III/40618 Telč, ul. Radkovská, PD
Objekt: SO451, Veřejné osvětlení
Rozpočet: SO451, Veřejné osvětlení

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem

Položky ZBV č. 01.10

Stavba: 21007, město III/40618 Telč, ul. Radkovská, PD
Objekt: SO451, Veřejné osvětlení
Rozpočet: SO451, Veřejné osvětlení

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
[redacted]							

Položky ZBV č. 01.10

Stavba: 21007, město III/40618 Telč, ul. Radkovská, PD
Objekt: SO451, Veřejné osvětlení
Rozpočet: SO451, Veřejné osvětlení

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
[redacted]							

HILDEBRANT CZ s.r.o.
Ing. Jaroslav Kohout
Lublaňská 267/12
120 00 Praha 2, Vinohrady

Váš dopis zn.:	Ze dne:	Naše značka:	Vyřizuje:	Tel./E-mail	Místo, datum
		JH/2024-122	[redacted]		Habrovany 08.11.2024

Stavba: III/40618 Telč, ul. Radkovská

Věc: **Vyjádření geotechnika k zemním pracím na kanalizaci**

Na základě požadavku zástupce zhotovitele výše uvedené stavby Ing. Kohouta byla provedena kontrola zemních prací na kanalizaci. Na úseku kolem šachty Š5 cca v km 0,155-0,180 a v km Š5-Š12 (dl. 13 m) byla zastižena skalní hornina – zvětralý migmatit viz obr. 1.

Obr. 1 Snímek výkopu z odkopu pro kanalizaci.

Těžba je možná jen za pomoci těžkého bagru se skalní lžící, lze využít také hydraulického kladiva. Migmatity se vyskytují relativně mělce pod úrovní terénu cca v hl. do 1,5 m p.t. Tyto velmi pevné horniny je již nutno zařadit do II. a II. tř. těžitelnosti. Vzhledem k vyšší míře zvětrání a vzdálenosti diskontinuit do 150 mm je však lze zařadit pouze do II. tř. těžitelnosti dle ČSN 73 6133.

Objem horniny bude geodeticky zaměřen. Pro další konzultace jsem plně k dispozici.

S pozdravem

[redacted]

geotechnik specialista,
inženýrský geolog a hydro

[redacted]

[redacted]

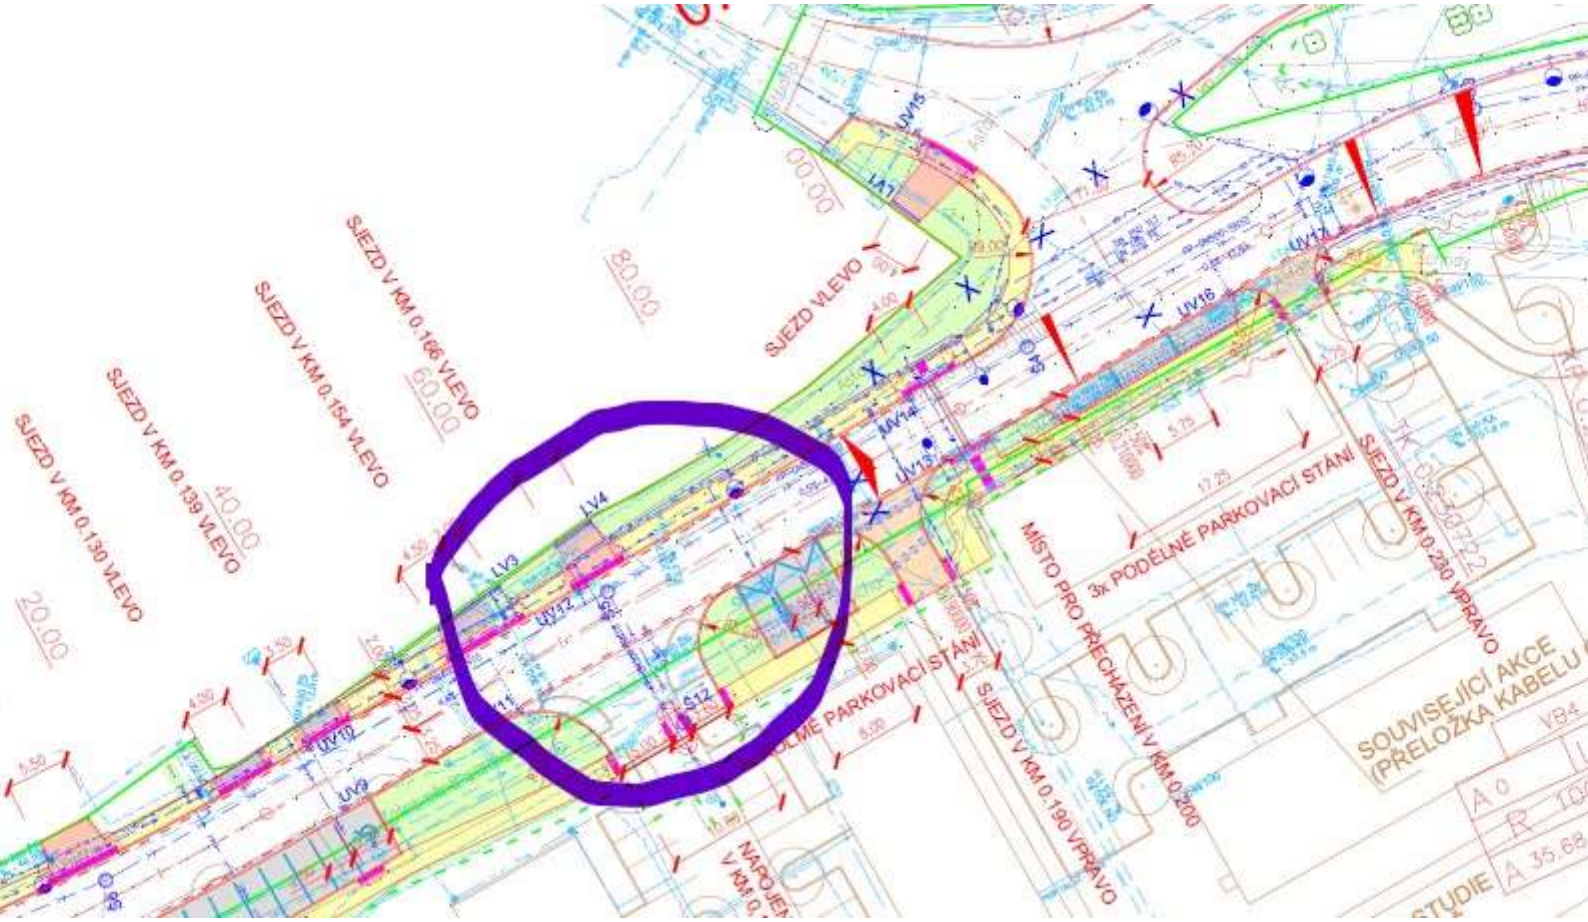
SJEZD V KM 0,166 V LEVO
SJEZD V KM 0,154 V LEVO
SJEZD V KM 0,139 V LEVO
SJEZD V KM 0,130 V LEVO
SJEZD V LEVO
3x PODÉLNÉ PARKOVACÍ STÁNÍ
MÍSTO PRO PŘECHÁZENÍ V KM 0,200
SJEZD V KM 0,190 V PRAVO
SJEZD V KM 0,230 V PRAVO
SOUVISEJÍCÍ AKCE
(PŘELOŽKA KABELU
LV3
LV4
UV12
UV13
UV14
UV15
UV16
UV17
S12
LA1
20.00
40.00
60.00
80.00
00.00

Vyjádření AD k vícepracím dne 12.12.2024

Doplněna odpověď zhotovitele 12.12.2024

Odpověď AD 13.12.2024

ZBV01_TELČ_KRAJ

- **SO101 Komunikace III/40618**
  - Doložit chybějící protokoly statických zkoušek na pláni u etapy 1a doložím
    Bez připomínek
  - Doložit chybějící protokoly statických zkoušek na pláni u etapy 1b před povodněmi doložim
    Bez připomínek
  - Nová Pol. 58344229 ÚRS (štěrkodrť frakce 0/125) nemůže být nárokována. V rámci rozpočtu PDPS je nákup, natěžení a dovoz vhodného materiálu do aktivní zóny obsažen v pol. 125738a sanováno lomovým kamenivem 0-200, kalkulant použil nákup největší frakce ŠD (v urs je to frakce 0-125). Po stejné připomínce TDI byla proveena oprava položkou OTSKP
    Nesouhlasíme s novou pol. 21451, v rámci rozpočtu pol. 171303 zahrnuje provedení vč. výběru vhodného materiálu. Nákup a dovoz vhodného materiálu je součástí pol. 125738.a. **Může být nárokován pouze rozdíl ceny za nákup mezi jednotlivými frakcemi 0/125, která je uvažována v rozpočtu a frakcí 0/200 navrženou geotechnikem.** V projektu je uvedeno že bude použita do sanací např. frakce 0/125. Větší frakci by nám v projektu nedovolili použít v ochranných pásmech inženýrských sítí jednotliví správci.
  - Doplnění chybějícího vhodného materiálu do vrstvy recyklace za studena pol. 567554 je součástí položky. Nelze nárokovat v pol. 45157. Dále je to uvedeno také v technické zprávě. Máte pravdu po dohodě s TDI již aktuální verzi odstraněno
    Bez připomínek
  - Vzhledem k větší hloubce sanací a nevhodnému podloží předpokládám že nebyly realizovány pol. 12841, 12843, 12891 a 12893 bude zohledněno po dokončení kompletní SO 101 v příštím roce
    Ano, počkáme co nás bude čekat v dalších etapách, jinak odstraníme
    Bez připomínek

- **SO182 Úprava objízdné komunikace**
  - Doložit výpočet u poplatků za skládku (17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI) v nové verzi upraveno
    Bez připomínek
  - ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM hodnota za vícepráce by měla být 96,59*0,1=9,659 m3 (uvedeno 11,591 jak bylo spočítáno?) zjistím a upravíme ve final verzi
    Bude zkontrolováno po doložení

- ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO hodnota za vícepráce by měla být 96,59*0,2*1,17=22,602m3 (uvedeno 290,202 jak bylo spočítáno?) zde uvažováno s odstraněním sanací výhyben– navýšení kubatur ŠD popíši v následné/ finální verzi verzi
  Bez připomínek
- ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I
  výpočet? tl. vrstvy? Jedná se o výkop pro sanace výhyben– výpočet vychází ze zaměření geodeta, v návrhu jsem zapomě přiložit geodet zaměření, ve finální verzi bude zasláno. Omlouvám se
  Bez připomínek

- **SO301 Dešťová kanalizace**

- U položek zemních prací uvést výpočet množství (není poznat, jestli je větší množství z důvodu délky kanalizace, šířky rýhy nebo hloubky kanalizace, jedná se o velký nárůst oproti projektu) jedná se o výkopy které vznikly při výškových kolizích kanalizace s ostatními IS + přeložkami (plyn, vodovod, cetin …) a pro přidané šachty šachty (doloženo geodet zaměřením)
  Doložený výpočet některých výkopů víceprací se překrývá s napočítanými výkopy v PDPS za hloubení rýh pro novou kanalizaci a vodovod

  2*3*2,5 "Šachta Š17" kolize s plynovodem nová – 15m3
  Odečet rýhy kanalizace 2,3m (dl.)*1,5m (hl.)*1,3m (š.)=4,48m3
  Celkem=15-4,48=10,52m3

  4*4*5,5 "Šachta Š18" nová - 88m3
  Odečet rýhy vodovodu DN 100 - 4,0m (dl.)*1,30(hl.)*0,6m(š.)=3,12m3
  Celkem=88-3,12=84,88m3

  2*2*1,5 "Šachta původní kanalizace" – 6m3
  Celkem=6m3

  9*2*1,2 "prodloužení kanalizace, napojení sídliště" – 21,60m3
  Odečet rýhy vodovodu DN100 – 2,0m (dl.)*1,20(hl.)*0,6m(š.)=1,44m3
  Odečet rýhy vodovodu DN250 – 2,0m (dl.)*1,20(hl.)*1,0m(š.)=2,40m3
  Odečet rýhy kanalizace 2,0m (dl.)*1,2m (hl.)*1,3m (š.)=3,12m3
  Celkem=21,6-1,44-2,40-3,12=14,64m3

  5*11*3 výšková kolize s vodovodem – 165m3
  Odečet rýhy kanalizace 5,0m (dl.)*2,75m (hl.)*1,3m (š.)=17,87m3
  Odečet rýhy vodovodu DN100 – 5,0m (dl.)*1,30(hl.)*0,6m(š.)=3,90m3
  Odečet rýhy vodovodu DN250 – 5,0m (dl.)*1,30(hl.)*1,0m(š.)=6,50m3
  Celkem=165-17,87-3,90-6,50=136,73m3

3*4,5*2,5 výšková kolize s vodovodem – 33,75m3
Odečet rýhy kanalizace 3,0m (dl.)*2,68m (hl.)*1,3m (š.)=10,45m3
Celkem=33,75-10,45=23,30m3

3*6*2,5 výšková kolize s teplovodem – 45,00m3
Odečet rýhy kanalizace 3,0m (dl.)*2,90m (hl.)*1,3m (š.)=11,31m3
Odečet rýhy vodovodu DN100 – 6,0m (dl.)*1,30(hl.)*0,6m(š.)=4,68m3
Celkem=45,00-11,31-4,68=29,01m3

35*5*1,5 přípojky k nemovitostem – 26,25
Celkem=26,25m3

CELKOVÉ MNOŽSTVÍ = 10,52+84,88+6+14,64+136,73+23,30+29,01+26,25=331,33m3

- HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II uvést výpočet a doložit geodetické zaměření
  ano bude zasláno)
  Bude zkontrolováno po doložení
- ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ V AKTIV ZÓNĚ SE ZHUT DO 100% PS předpokládám že se jedná o zasypanou rýhu po neprovedené trase Š5-Š12. Posun sítě o 3 m mimo plánovanou trasu byl z důvodu vodovodu DN250? Aktivní zóna by měla být v objektu SO 102
  jednalo se o zásyp montážních jam po kolizi, po jednání s tdi změněno na zásyp z nakupovaného materiálu – tak to bylo i skutečně provedeno, jedná se o chybu přípraváře)
  Bez připomínek
- VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 20KM Aktivní zóna by měla být v objektu SO 102
  viz výše
  Bez připomínek
- VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 400MM KANALIZAČ v jakém místě byla kanalizace odstraněna? Jednalo se o kanalizaci, která nebyla v podkladech VAS?
  Jedná se o kanalizaci v trase nového kanálu, zjistím zda-li byla v podkladech VAS, nicméně ve staveništi bylo tolik starých dlouhodobě nepoužívaných kanalizací (o kterých nikdo nevěděl), že sám nevím.
  Dle zaměření rušené kanalizace od geodeta se jedná o kanalizaci, kterou jsme měli v podkladech od VAS a její odstranění je součástí objektu SO351. Odstranění stávající dešťové kanalizace je napočítána v objektu nového vodovodu SO351, protože sní byl v kolizi.
- Vypnutí kabelu VN, vč. dozoru a zabezpečení kabelu – je součástí pol. 02730 v SO 000.1
  zde si nárokujeme vypnutí soustavy VN v místě realizace nové revizní šachty Š17, při kalkulaci nabídky jsme předpokládali, že VN bude vypnuté (dle zadání měla proběhnout souběžná realizace vyvolané akce), nicméně Egd akci zrušilo (následně s časovým odstupem 2 měsíců stejně nakonec realizovalo). Nicméně se nám to časově „nepotkalo“. Dokládáme fakturou od smluvního partnera egd.
  Bez připomínek

- Montážní práce VAS při opravách vodovodu z důvodu výškové kolize – o jaké místa se jednalo?
  Stávající vodovod byl ve velice špatném technickém stavu a litinové potrubí i při pouhém obnažení prasklo. Jelikož vodovod byl funkční musel být opraven.(následně po realizaci kanalizace proběhla výměna i tohoto vodovodu SO 351.1, nicméně v průběhu realizace kanalizace musel být funkční) Sám provozovatel neznal přesnou polohu tohoto starého vodovodu – stejně tak i vodovodu DN 250, kdy jsme nakonec museli vést obě vedení jinou trasou. Cenu dokládáme fa VAS
  Bez připomínek
- Přepojení kabelu VO, kolize s vedením – veřejné osvětlení se buduje nové, jednalo se o provizorní přepojení?
  kolize s kanalizací, nové vedení VO se realizovalo až po realizaci kanalizace, dokládáme fa od spol SETO (prováděli výměnu VN)
  Bez připomínek
- Napojení nemovitostí na dešťovou kanalizaci – co práce zahrnovaly?
  Projekt neuvažoval s přepojením nemovitostí do nové dešťové kanalizace (etapa 1a). Při realizace kanalizace jsme odstraňovali starou dešťovou kanalizaci a nalezené přípojky byli následně dohledány, opraveny a přes odbočky napojeny do nové kanalizace. Tento požadavek vznikl až v průběhu realizace – neuvažováno při cenotvorbě nabídky, proto níž uvažované odbočky 5 ks atd
  Bez připomínek
  -Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení
  -Hloubení zapažených rýh šířky do 2000 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně **Proč jsou tyto práce naceněny dle ÚRS 2024 a ne dle OTSKP2024?**

  Jednalo se o vyčíslení nadprůměrné četnosti IS v rámci stavby (zřejmé z fotodokumentací), obnažování starého litinového vodovod potrubí, teplovodu atd. Výkopy byli prováděny ručně u IS i u napojení nemovitostí do nové kanalizace.
  Práce jsou naceněny v položkách URS. Protože ceník OTSKP s tímto členěním neuvažuje a také z důvodu, že VCP pro město musí být provedeno v urs (dle SOD)
  Ano máte pravdu v OTSKP se výkopy nedělí na ruční nebo strojní vše je pod jednou položkou, také je součástí pažení výkopu a ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení a ve stísněných prostorech. Za mě byl vysoutěžený rozpočet v OTSKP a pokud jsou zmíněné práce součástí některé z položek rozpočtu tak nelze rozporovat že je rozdíl v OTSKP a URS. Tak by pak bylo možné nahlížet v dalších případech jako je třeba pažení, v URS je zvlášť položkou a v OTSKP je automaticky součástí položky pro výkop. Odsouhlasení těchto víceprací je na investorech Města Telč a Kraji Vysočina podle toho, co mají v SOD.
- Montáž odboček na kanalizačním potrubí z PP trub korugovaných DN 400 – odbočky jsou dle pol. 87446 a pol. 87457 součástí těchto položek

- Odbočka kanalizace PP korugované 45° DN 400/150– odbočky jsou dle pol. 87446 a pol. 87457 součástí těchto položek
  Projekt neuvažoval s přepojením nemovitostí do nové dešťové kanalizace (etapa 1a). Při realizace kanalizace jsme odstraňovali starou dešťovou kanalizaci a nalezené přípojky byli následně dohledány, opraveny a přes odbočky napojeny do nové kanalizace. Tento požadavek vznikl až v průběhu realizace – neuvažováno při cenotvorbě nabídky, proto níž uvažované odbočky 5 ks atd
  Bez připomínek

- **SO351.4 Přeložka vodovodu vč. přípojek – úsek 4**
  Bez připomínek

Vyjádření AD k vícepracím dne 12.12.2024

Doplněna odpověď zhotovitele 12.12.2024

Odpověď AD 13.12.2024, doplnění AD 8.1.2026

ZBV01_TELČ_KRAJ

- **SO101 Komunikace III/40618**
  - Doložit chybějící protokoly statických zkoušek na pláni u etapy 1a doložím
    Bez připomínek
  - Doložit chybějící protokoly statických zkoušek na pláni u etapy 1b před povodněmi doložim
    Bez připomínek
  - Nová Pol. 58344229 ÚRS (štěrkodrť frakce 0/125) nemůže být nárokována. V rámci rozpočtu PDPS je nákup, natěžení a dovoz vhodného materiálu do aktivní zóny obsažen v pol. 125738a sanováno lomovým kamenivem 0-200, kalkulant použil nákup největší frakce ŠD (v urs je to frakce 0-125). Po stejné připomínce TDI byla proveena oprava položkou OTSKP
    Nesouhlasíme s novou pol. 21451, v rámci rozpočtu pol. 171303 zahrnuje provedení vč. výběru vhodného materiálu. Nákup a dovoz vhodného materiálu je součástí pol. 125738.a. **Může být nárokován pouze rozdíl ceny za nákup mezi jednotlivými frakcemi 0/125, která je uvažována v rozpočtu a frakcí 0/200 navrženou geotechnikem.** V projektu je uvedeno že bude použita do sanací např. frakce 0/125. Větší frakci by nám v projektu nedovolili použít v ochranných pásmech inženýrských sítí jednotliví správci.
  - Doplnění chybějícího vhodného materiálu do vrstvy recyklace za studena pol. 567554 je součástí položky. Nelze nárokovat v pol. 45157. Dále je to uvedeno také v technické zprávě. Máte pravdu po dohodě s TDI již aktuální verzi odstraněno
    Bez připomínek
  - Vzhledem k větší hloubce sanací a nevhodnému podloží předpokládám že nebyly realizovány pol. 12841, 12843, 12891 a 12893 bude zohledněno po dokončení kompletní SO 101 v příštím roce
    Ano, počkáme co nás bude čekat v dalších etapách, jinak odstraníme
    Bez připomínek

- **SO182 Úprava objízdné komunikace**
  - Doložit výpočet u poplatků za skládku (17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI) v nové verzi upraveno
    Bez připomínek
  - ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM hodnota za vícepráce by měla být 96,59*0,1=9,659 m3 (uvedeno 11,591 jak bylo spočítáno?) zjistím a upravíme ve final verzi
    Bude zkontrolováno po doložení

- ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO hodnota za vícepráce by měla být 96,59*0,2*1,17=22,602m3 (uvedeno 290,202 jak bylo spočítáno?) zde uvažováno s odstraněním sanací výhyben– navýšení kubatur ŠD popíši v následné/ finální verzi verzi
  Bez připomínek
- ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I
  výpočet? tl. vrstvy? Jedná se o výkop pro sanace výhyben– výpočet vychází ze zaměření geodeta, v návrhu jsem zapomě přiložit geodet zaměření, ve finální verzi bude zasláno. Omlouvám se
  Bez připomínek

- **SO301 Dešťová kanalizace**

- U položek zemních prací uvést výpočet množství (není poznat, jestli je větší množství z důvodu délky kanalizace, šířky rýhy nebo hloubky kanalizace, jedná se o velký nárůst oproti projektu) jedná se o výkopy které vznikly při výškových kolizích kanalizace s ostatními IS + přeložkami (plyn, vodovod, cetin …) a pro přidané šachty šachty (doloženo geodet zaměřením)
  Doložený výpočet některých výkopů víceprací se překrývá s napočítanými výkopy v PDPS za hloubení rýh pro novou kanalizaci a vodovod

  2*3*2,5 "Šachta Š17" kolize s plynovodem nová – 15m3
  Odečet rýhy kanalizace 2,3m (dl.)*1,5m (hl.)*1,3m (š.)=4,48m3
  Celkem=15-4,48=10,52m3

  4*4*5,5 "Šachta Š18" nová - 88m3
  Odečet rýhy vodovodu DN 100 - 4,0m (dl.)*1,30(hl.)*0,6m(š.)=3,12m3
  Celkem=88-3,12=84,88m3

  2*2*1,5 "Šachta původní kanalizace" – 6m3
  Celkem=6m3

  9*2*1,2 "prodloužení kanalizace, napojení sídliště" – 21,60m3
  Odečet rýhy vodovodu DN100 – 2,0m (dl.)*1,20(hl.)*0,6m(š.)=1,44m3
  Odečet rýhy vodovodu DN250 – 2,0m (dl.)*1,20(hl.)*1,0m(š.)=2,40m3
  Odečet rýhy kanalizace 2,0m (dl.)*1,2m (hl.)*1,3m (š.)=3,12m3
  Celkem=21,6-1,44-2,40-3,12=14,64m3

  5*11*3 výšková kolize s vodovodem – 165m3
  Odečet rýhy kanalizace 5,0m (dl.)*2,75m (hl.)*1,3m (š.)=17,87m3
  Odečet rýhy vodovodu DN100 – 5,0m (dl.)*1,30(hl.)*0,6m(š.)=3,90m3
  Odečet rýhy vodovodu DN250 – 5,0m (dl.)*1,30(hl.)*1,0m(š.)=6,50m3
  Celkem=165-17,87-3,90-6,50=136,73m3

3*4,5*2,5 výšková kolize s vodovodem – 33,75m3
Odečet rýhy kanalizace 3,0m (dl.)*2,68m (hl.)*1,3m (š.)=10,45m3
Celkem=33,75-10,45=23,30m3

3*6*2,5 výšková kolize s teplovodem – 45,00m3
Odečet rýhy kanalizace 3,0m (dl.)*2,90m (hl.)*1,3m (š.)=11,31m3
Odečet rýhy vodovodu DN100 – 6,0m (dl.)*1,30(hl.)*0,6m(š.)=4,68m3
Celkem=45,00-11,31-4,68=29,01m3

35*5*1,5 přípojky k nemovitostem – 26,25
Celkem=26,25m3

CELKOVÉ MNOŽSTVÍ = 10,52+84,88+6+14,64+136,73+23,30+29,01+26,25=331,33m3

- HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II uvést výpočet a doložit geodetické zaměření
  ano bude zasláno)
  Bude zkontrolováno po doložení
- ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ V AKTIV ZÓNĚ SE ZHUT DO 100% PS předpokládám že se jedná o zasypanou rýhu po neprovedené trase Š5-Š12. Posun sítě o 3 m mimo plánovanou trasu byl z důvodu vodovodu DN250? Aktivní zóna by měla být v objektu SO 102
  jednalo se o zásyp montážních jam po kolizi, po jednání s tdi změněno na zásyp z nakupovaného materiálu – tak to bylo i skutečně provedeno, jedná se o chybu přípraváře)
  Bez připomínek
  Výpočet:
  2*3*2,5 "Šachta Š17" kolize s plynovodem nová – 15m3
  Odečet rýhy kanalizace 2,3m (dl.)*1,5m (hl.)*1,3m (š.)=4,48m3
  Odečet šachty Š17 – 1,21m2 (plocha) * 2,5 (hl.) = 3,03m3
  Celkem=15-4,48-3,03=7,49m3

  4*4*5,5 "Šachta Š18" nová - 88m3
  Odečet rýhy vodovodu DN 100 - 4,0m (dl.)*1,30(hl.)*0,6m(š.)=3,12m3
  Odečet šachty Š18 – 1,21m2 (plocha) * 5,5 (hl.) = 6,66m3
  Celkem=88-3,12-6,66=78,22m3

  2*2*1,5 "Šachta původní kanalizace" – 6m3
  Odečet šachty – 1,21m2 (plocha) * 1,5 (hl.) = 1,82m3
  Celkem=6-1,82=4,18m3

  9*2*1,2 "prodloužení kanalizace, napojení sídliště" – 21,60m3
  Odečet rýhy vodovodu DN100 – 2,0m (dl.)*1,20(hl.)*0,6m(š.)=1,44m3
  Odečet rýhy vodovodu DN250 – 2,0m (dl.)*1,20(hl.)*1,0m(š.)=2,40m3

Odečet rýhy kanalizace 2,0m (dl.)*1,2m (hl.)*1,3m (š.)=3,12m3
Odečet lože pod potrubím kanalizace 9,0 (dl.)*2,0 (š.)*0,1 (hl.) = 1,8 m3
Celkem=21,6-1,44-2,40-3,12-1,8=12,84m3

5*11*3 výšková kolize s vodovodem – 165m3
Odečet rýhy kanalizace 5,0m (dl.)*2,75m (hl.)*1,3m (š.)=17,87m3
Odečet rýhy vodovodu DN100 – 5,0m (dl.)*1,30(hl.)*0,6m(š.)=3,90m3
Odečet rýhy vodovodu DN250 – 5,0m (dl.)*1,30(hl.)*1,0m(š.)=6,50m3
Celkem=165-17,87-3,90-6,50=136,73m3

3*4,5*2,5 výšková kolize s vodovodem – 33,75m3
Odečet rýhy kanalizace 3,0m (dl.)*2,68m (hl.)*1,3m (š.)=10,45m3
Celkem=33,75-10,45=23,30m3

3*6*2,5 výšková kolize s teplovodem – 45,00m3
Odečet rýhy kanalizace 3,0m (dl.)*2,90m (hl.)*1,3m (š.)=11,31m3
Odečet rýhy vodovodu DN100 – 6,0m (dl.)*1,30(hl.)*0,6m(š.)=4,68m3
Celkem=45,00-11,31-4,68=29,01m3

35*0,5*1,5 přípojky k nemovitostem – 26,25
Odečet lože pod potrubím přípojek 35,0 (dl.)*0,5 (š.)*0,1 (hl.) = 1,75 m3
Celkem=26,25-1,75=24,50m3

CELKOVÉ MNOŽSTVÍ = 7,49+78,22+4,18+12,84+136,73+23,30+29,01+24,50=316,27m3

- VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 20KM Aktivní zóna by měla být v objektu SO 102
  viz výše
  Bez připomínek
- VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 400MM KANALIZAČ v jakém místě byla kanalizace odstraněna? Jednalo se o kanalizaci, která nebyla v podkladech VAS?
  Jedná se o kanalizaci v trase nového kanálu, zjistím zda-li byla v podkladech VAS, nicméně ve staveništi bylo tolik starých dlouhodobě nepoužívaných kanalizací (o kterých nikdo nevěděl), že sám nevím.
  Dle zaměření rušené kanalizace od geodeta se jedná o kanalizaci, kterou jsme měli v podkladech od VAS a její odstranění je součástí objektu SO351. Odstranění stávající dešťové kanalizace je napočítána v objektu nového vodovodu SO351, protože sní byl v kolizi.
- Vypnutí kabelu VN, vč. dozoru a zabezpečení kabelu – je součástí pol. 02730 v SO 000.1
  zde si nárokujeme vypnutí soustavy VN v místě realizace nové revizní šachty Š17, při kalkulaci nabídky jsme předpokládali, že VN bude vypnuté (dle zadání měla proběhnout souběžná realizace vyvolané akce), nicméně Egd akci zrušilo (následně s časovým odstupem 2 měsíců stejně nakonec realizovalo). Nicméně se nám to časově „nepotkalo“. Dokládáme fakturou od smluvního partnera egd.

Bez připomínek

- Montážní práce VAS při opravách vodovodu z důvodu výškové kolize – o jaké místa se jednalo?
  Stávající vodovod byl ve velice špatném technickém stavu a litinové potrubí i při pouhém obnažení prasklo. Jelikož vodovod byl funkční musel být opraven.(následně po realizaci kanalizace proběhla výměna i tohoto vodovodu SO 351.1, nicméně v průběhu realizace kanalizace musel být funkční) Sám provozovatel neznal přesnou polohu tohoto starého vodovodu – stejně tak i vodovodu DN 250, kdy jsme nakonec museli vést obě vedení jinou trasou. Cenu dokládáme fa VAS
  Bez připomínek
- Přepojení kabelu VO, kolize s vedením – veřejné osvětlení se buduje nové, jednalo se o provizorní přepojení?
  kolize s kanalizací, nové vedení VO se realizovalo až po realizaci kanalizace, dokládáme fa od spol SETO (prováděli výměnu VN)
  Bez připomínek
- Napojení nemovitostí na dešťovou kanalizaci – co práce zahrnovaly?
  Projekt neuvažoval s přepojením nemovitostí do nové dešťové kanalizace (etapa 1a). Při realizace kanalizace jsme odstraňovali starou dešťovou kanalizaci a nalezené přípojky byli následně dohledány, opraveny a přes odbočky napojeny do nové kanalizace. Tento požadavek vznikl až v průběhu realizace – neuvažováno při cenotvorbě nabídky, proto níž uvažované odbočky 5 ks atd
  Bez připomínek
  -Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení
  -Hloubení zapažených rýh šířky do 2000 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně **Proč jsou tyto práce naceněny dle ÚRS 2024 a ne dle OTSKP2024?**

  Jednalo se o vyčíslení nadprůměrné četnosti IS v rámci stavby (zřejmé z fotodokumentací), obnažování starého litinového vodovod potrubí, teplovodu atd. Výkopy byli prováděny ručně u IS i u napojení nemovitostí do nové kanalizace.
  Práce jsou naceněny v položkách URS. Protože ceník OTSKP s tímto členěním neuvažuje a také z důvodu, že VCP pro město musí být provedeno v urs (dle SOD)
  Ano máte pravdu v OTSKP se výkopy nedělí na ruční nebo strojní vše je pod jednou položkou, také je součástí pažení výkopu a ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení a ve stísněných prostorech. Za mě byl vysoutěžený rozpočet v OTSKP a pokud jsou zmíněné práce součástí některé z položek rozpočtu tak nelze rozporovat že je rozdíl v OTSKP a URS. Tak by pak bylo možné nahlížet v dalších případech jako je třeba pažení, v URS je zvlášť položkou a v OTSKP je automaticky součástí položky pro výkop. Odsouhlasení těchto víceprací je na investorech Města Telč a Kraji Vysočina podle toho, co mají v SOD.
- Montáž odboček na kanalizačním potrubí z PP trub korugovaných DN 400 – odbočky jsou dle pol. 87446 a pol. 87457 součástí těchto položek

- Odbočka kanalizace PP korugované 45° DN 400/150– odbočky jsou dle pol. 87446 a pol. 87457 součástí těchto položek
  Projekt neuvažoval s přepojením nemovitostí do nové dešťové kanalizace (etapa 1a). Při realizace kanalizace jsme odstraňovali starou dešťovou kanalizaci a nalezené přípojky byli následně dohledány, opraveny a přes odbočky napojeny do nové kanalizace. Tento požadavek vznikl až v průběhu realizace – neuvažováno při cenotvorbě nabídky, proto níž uvažované odbočky 5 ks atd
  Bez připomínek

- **SO351.4 Přeložka vodovodu vč. přípojek – úsek 4**
  Bez připomínek

Vyjádření AD k vícepracím dne 8.1.2025

ZBV02_TELČ_MĚSTO

- **SO102.1 Místní komunikace**
  - Nesouhlasíme s novou pol. sanační vrstvy z lomového kamene, v rámci rozpočtu pol. 171303 zahrnuje provedení vč. výběru vhodného materiálu. Nákup a dovoz vhodného materiálu je součástí pol. 125738.a. Může být nárokován pouze rozdíl ceny za nákup mezi jednotlivými frakcemi 0/125, která je uvažována v rozpočtu a frakcí 0/200 navrženou geotechnikem.
  - Projektová dokumentace – 3D model. Má být součástí realizační dokumentace. Pokud je novou položkou myšlena fakturace realizační dokumentace tak změnit popis.
  - Pol. 916621 výpočet délky svodidel vychází z délky svodidla v jeho ose. Jednotlivé dílce svodidel, které bylo nutné objednat jsou uvedeny. Pokud bylo potřeba objednat více svodidel požadujeme doložit výpočet a seznam použitých svodidel.

- **SO103.1 Část 1 v km 0,009 – 0,242**
  001 Chodníky SFDI
  - Místo nové pol. 711161115 použít pol. 28999 z SO103.1 **Parkoviště, chodníky a vjezdy - 1. Část v km 0,009 - 0,242, 002 Chodníky Město**

  - Nové položky URS na Odkopávky č. 122211101, nakládání výkopku č. 167151101, vodorovné přemístění č. 162751117 a příplatek k vodorovnému přemístění č. 162751119 stejně jako u SO301.3 pol. 13273

- **SO301.3 Dešťová kanalizace – úsek 3**

  - Nové položky URS č. 139001101 na Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení a č. 132212221 Hloubení zapažených rýh šířky do 2000 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně je zahrnuto v pol. 13273. V OTSKP se výkopy nedělí na ruční nebo strojní vše je pod jednou položkou, také je součástí pažení výkopu a ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení a ve stísněných prostorech.

- **SO351.1 Přeložka vodovodu vč. přípojek – úsek 1**

  - Bylo provedeno zkrácení vodovodu o 25 m a nebyl proveden protlak pod komunikací z důvodu, že v rámci jiné stavby byl zrušen vodovod, do kterého měl být řád PE DN 90 napojen. Chybí odečty těchto prací.

  - Nemohlo být provedeno rozpojení stáv. Vodovodu DN 100/80 TLT, odstranění sekčního uzávěru včetně ZS+poklopu a osazení opravného kusu v místě odbočení dle výkresu 04.a Kladečské schéma. Jedná se o práce na stávajícím vodovodu v místě křižovatky II/406 a III/40618. v rámci rozpočtu se jedná o pol. č. 89942

  - Pol. 17481 Zásyp jam a rýh uvést výpočet: délka x šířka rýhy x hloubka. Z uvedeného výpočtu není možné určit o jakou délku vodovodu se jednalo.

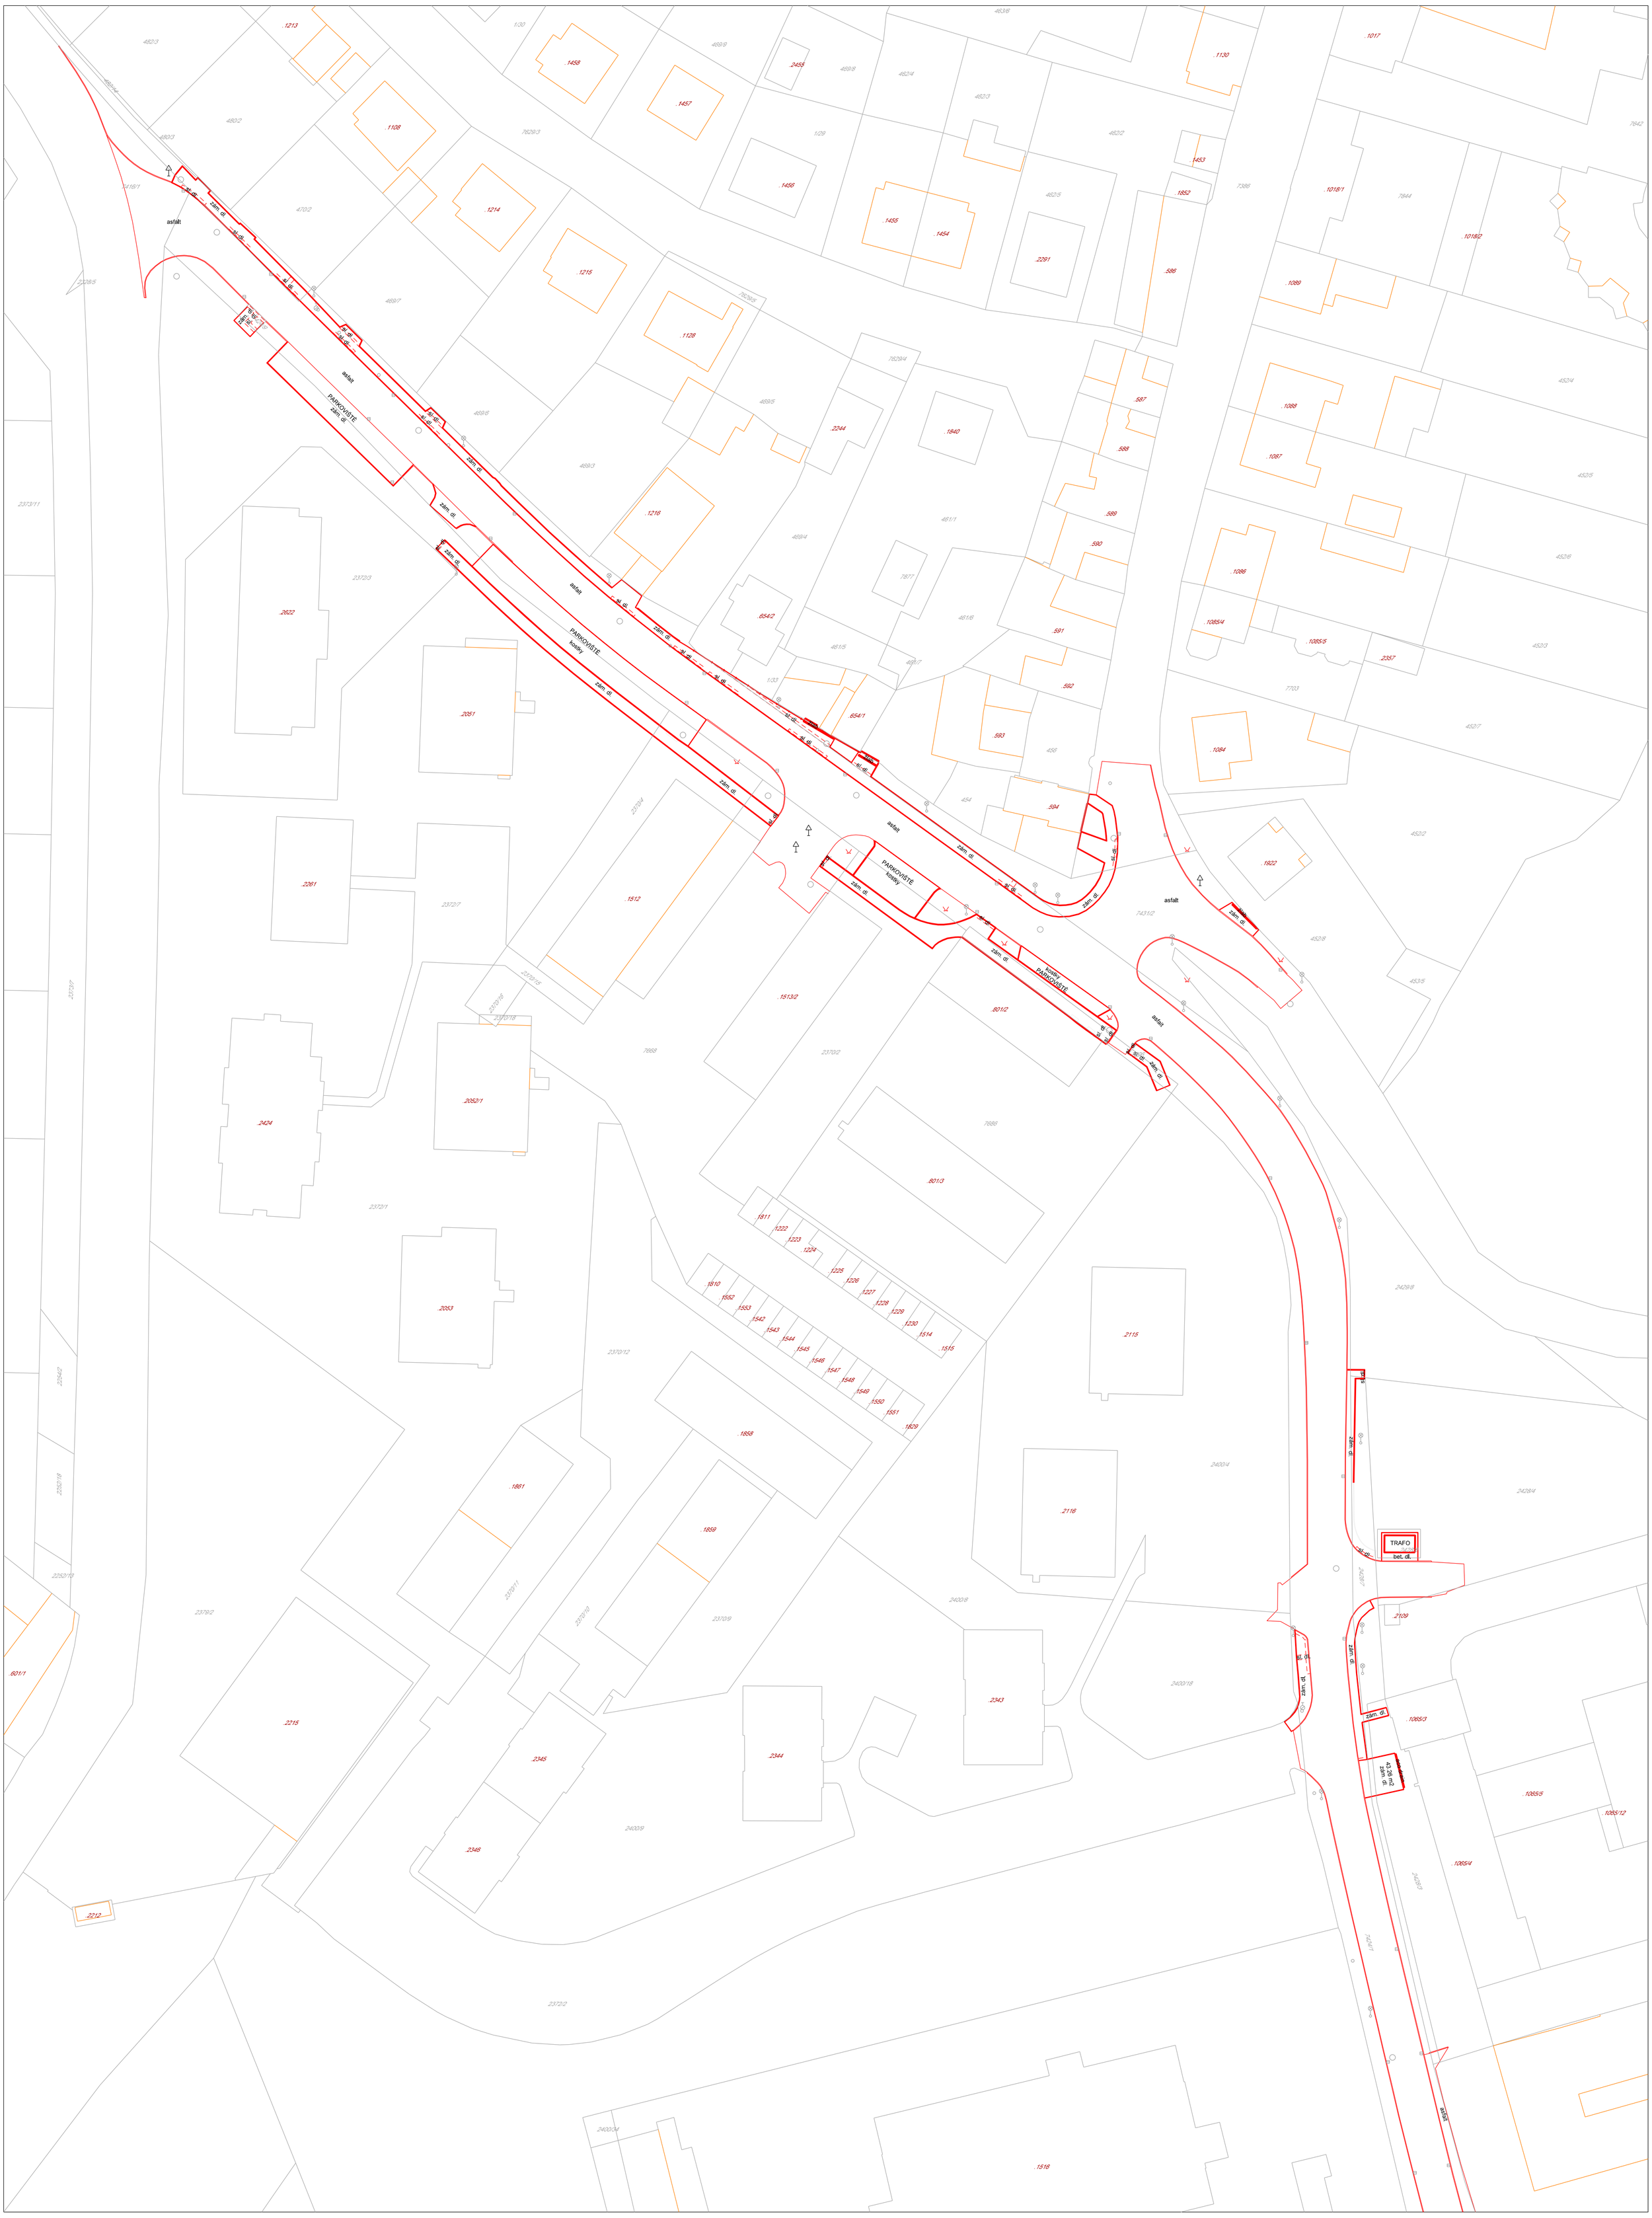

Potvrzuji, že geodetická část dokumentace předprojektového zaměření stavby náležitostmi a přesností odpovídá právním předpisům.
Zákres hranic je pouze informativní!

razítko a podpis AZ!

Název stavby:	III/40618 Telč, ul. Radkovská Dokumentace skutečného provedení	KVGEO s.r.o. Polní 696/11, 594 01 Velké Meziříčí
Geodetická firma:	KV GEO s.r.o.	Číslo ověření: 1024/2025
Zpracoval:	[redacted]	Číslo položky ČKZ: 2745
Ověřil:		Datum ověření: 8.10.2025
Odběratel:	HILDEBRANDT CZ, s.r.o.	Datum zaměření: 07/2024-09/2025
	Lublaňská 267/12, Vinohrady, 120 00 Praha 2	Kód charakteristiky přesnosti 3
		Formát výkresu: A1
		Měřítko: 1:500 / Číslo výkresu: 1
		S-JTSK / Bpv

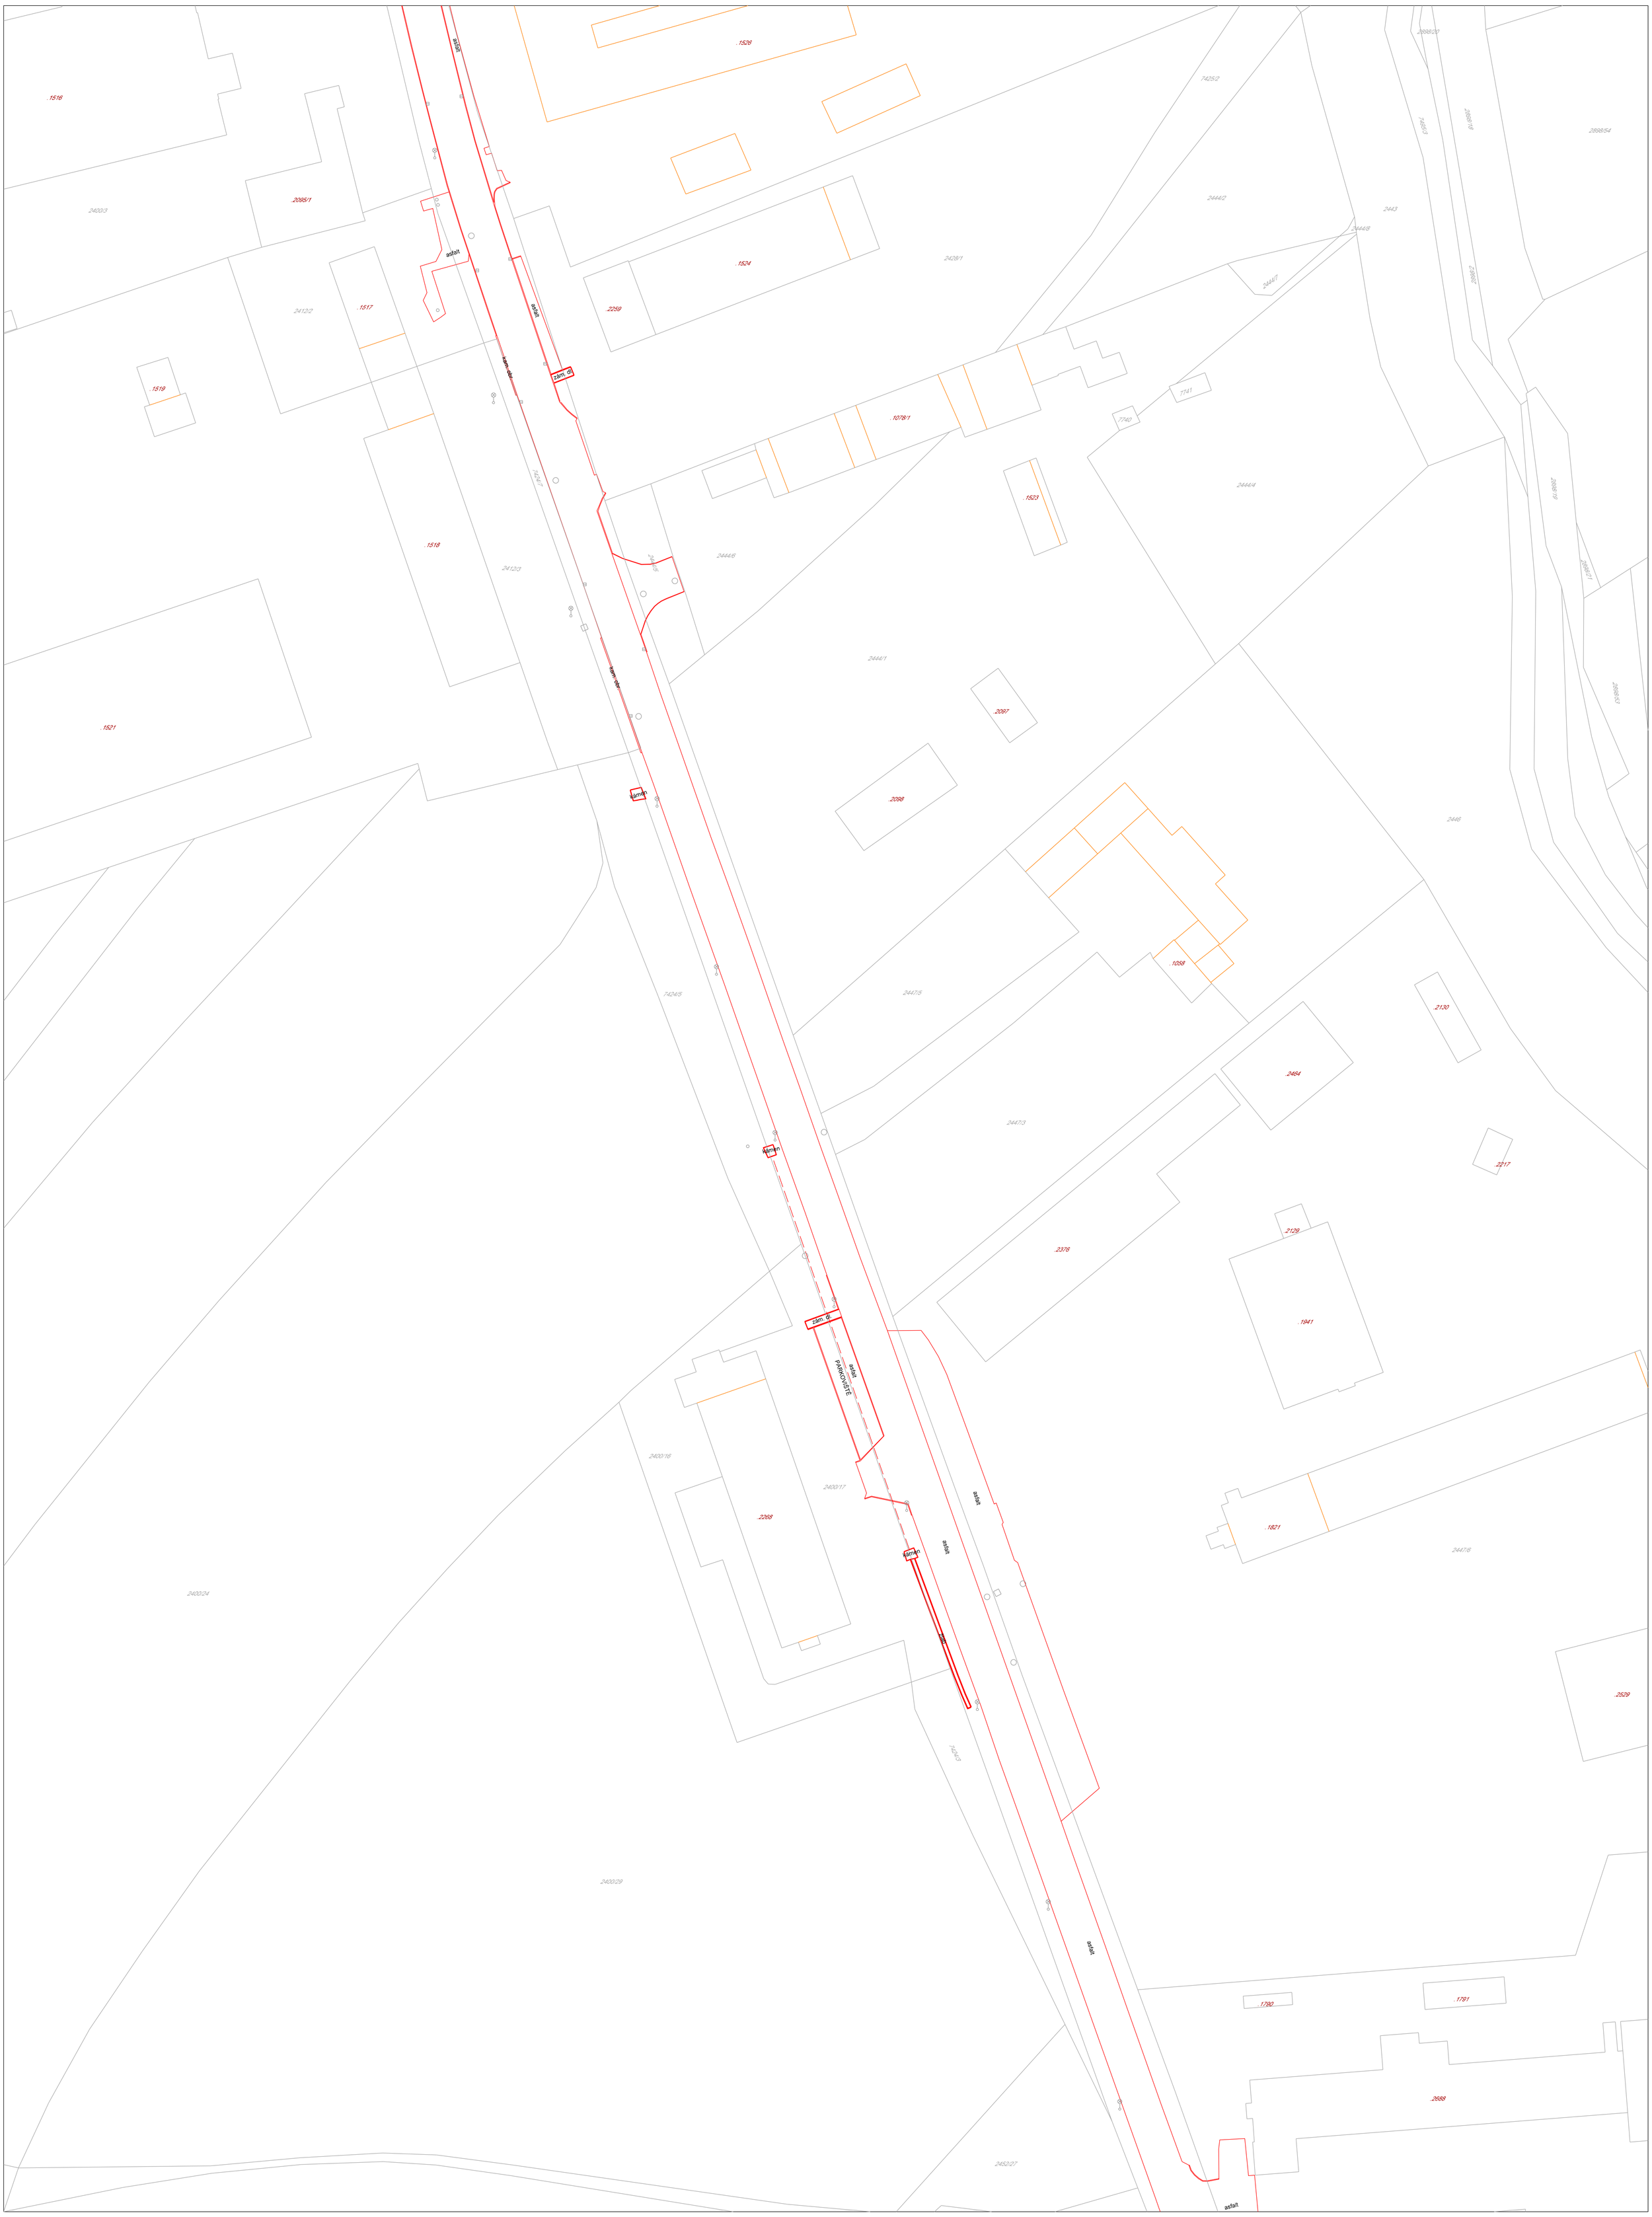

Potvrzuji, že geodetická část dokumentace předprojektového zaměření stavby náležitostmi a přesností odpovídá právním předpisům.
Zákres hranic je pouze informativní!

razítko a podpis AZ!

Název stavby:	III/40618 Telč, ul. Radkovská Dokumentace skutečného provedení	KVGEO s.r.o. Polní 696/11, 594 01 Velké Meziříčí	
Geodetická firma:	KV GEO s.r.o.	Číslo ověření:	1024/2025
Zpracoval:	[redacted]	Číslo položky ČKZ:	2745
		Datum ověření:	8.10.2025
Ověřil:		Datum zaměření:	07/2024-09/2025
		Kód charakteristiky přesnosti 3	
		Formát výkresu:	A1
Odběratel:	HILDEBRANDT CZ, s.r.o.	Měřítko: 1:500	Číslo výkresu: 2
	Lublaňská 267/12, Vinohrady, 120 00 Praha 2	S-JTSK	Bpv

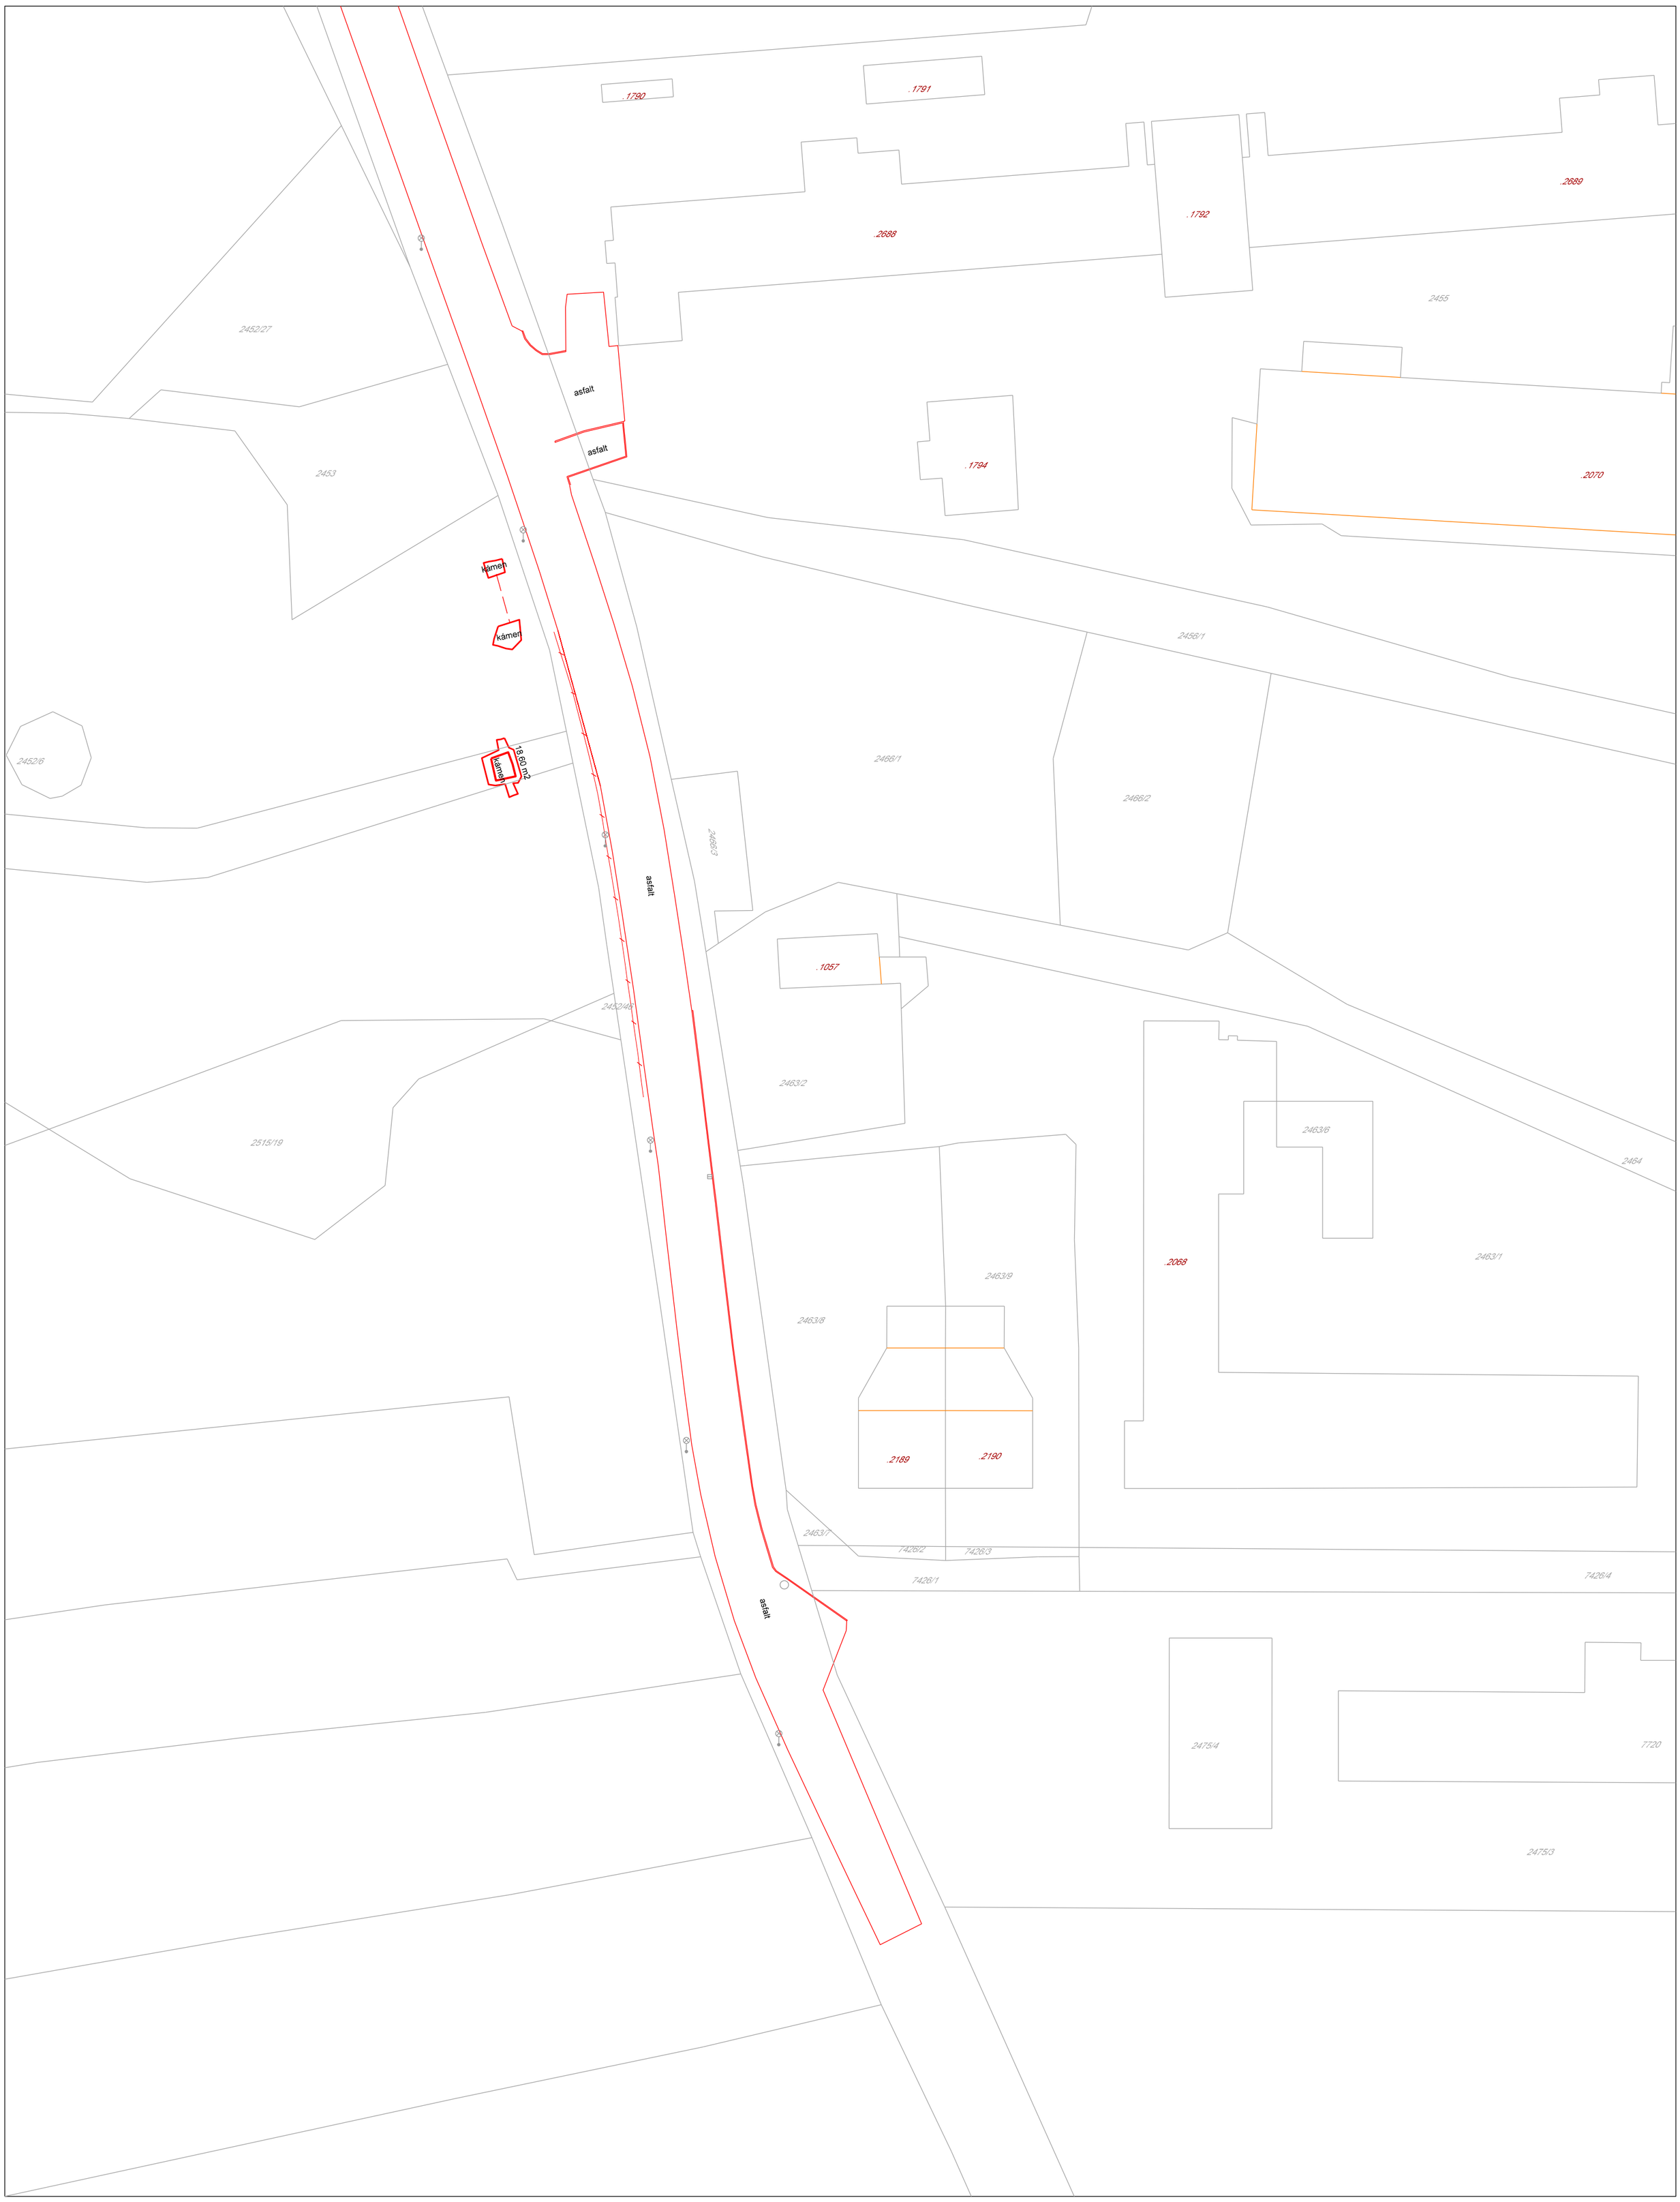

Potvrzuji, že geodetická část dokumentace předprojektového zaměření stavby náležitostmi a přesností odpovídá právním předpisům.
Zákres hranic je pouze informativní!

razítko a podpis AZI

Název stavby:	III/40618 Telč, ul. Radkovská Dokumentace skutečného provedení	KVGEO s.r.o. Polní 696/11, 594 01 Velké Meziříčí	
Geodetická firma:	KV GEO s.r.o.	Číslo ověření:	1024/2025
Zpracoval:	[redacted]	Číslo položky ČKZ:	2745
Ověřil:		Datum ověření:	8.10.2025
Odběratel:	HILDEBRANDT CZ, s.r.o.	Datum zaměření:	07/2024-09/2025
	Lublaňská 267/12, Vinohrady, 120 00 Praha 2	Kód charakteristiky přesnosti 3	
		Formát výkresu:	A2
		Měřítko: 1:500	Číslo výkresu: 3
		S-JTSK	Bpv

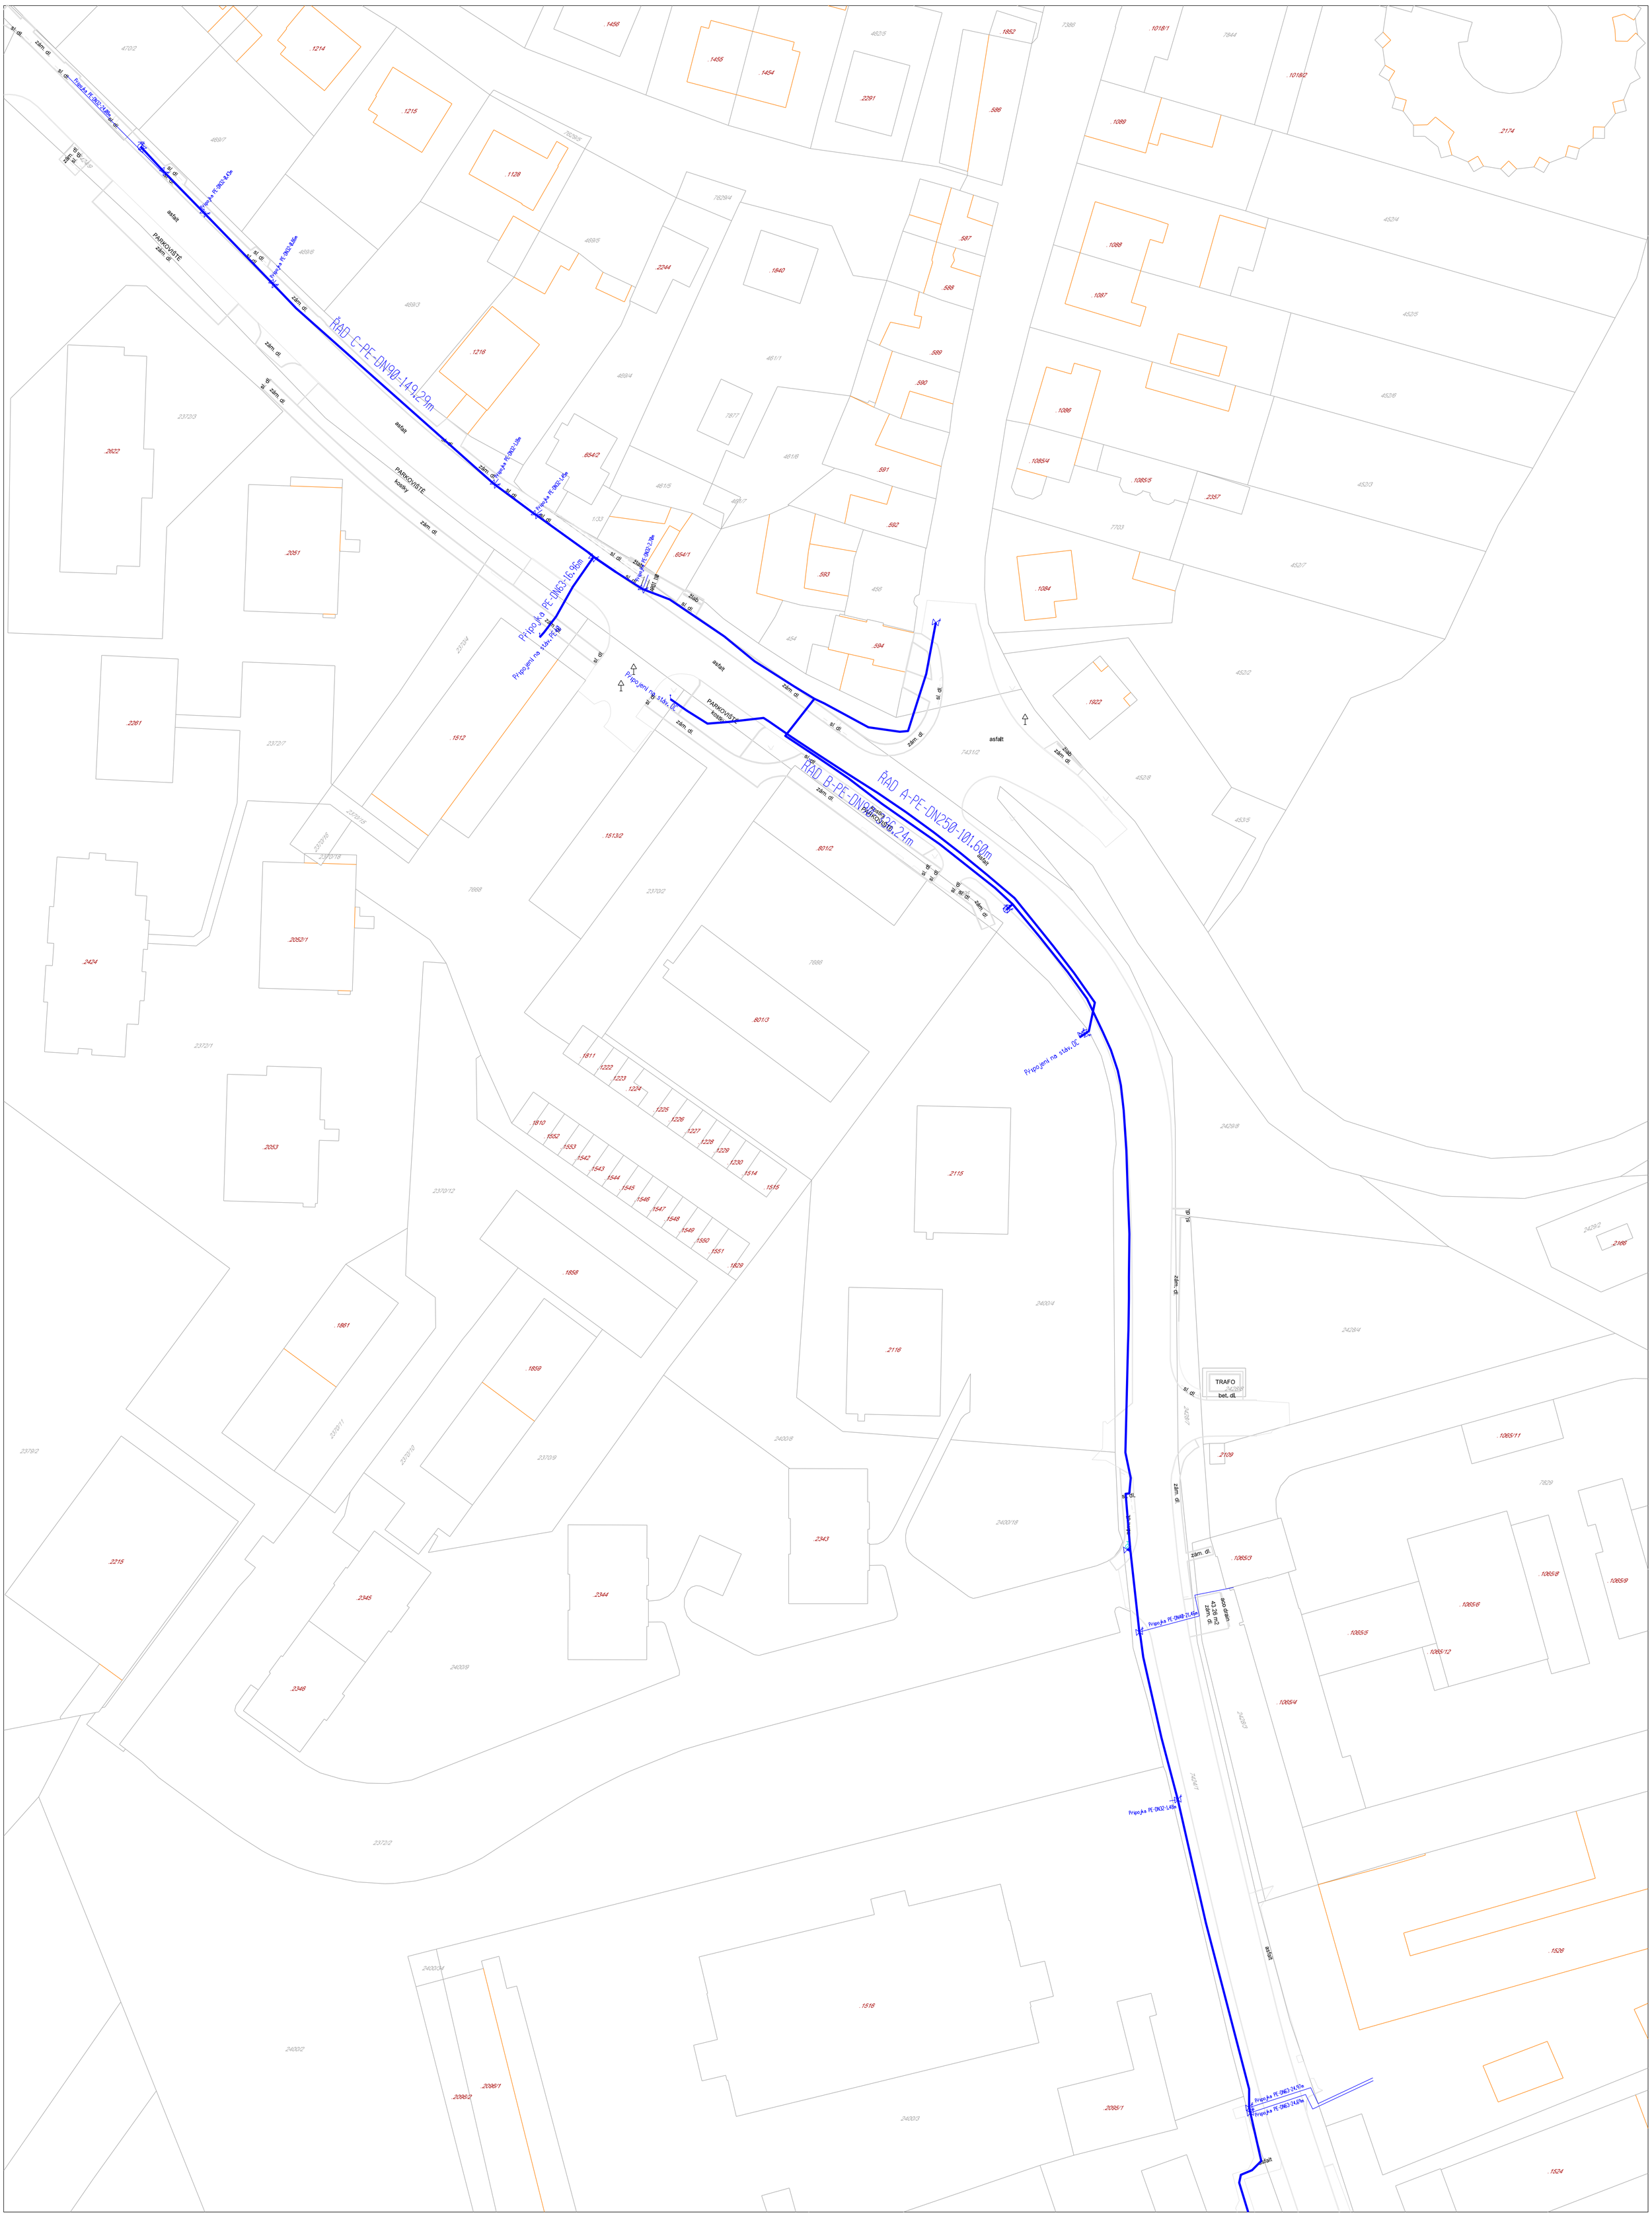

Potvrzuji, že geodetická část dokumentace předprojektového zaměření stavby náležitostmi a přesností odpovídá právním předpisům.
Zákres hranic je pouze informativní!

razítko a podpis AZI

Název stavby: III/40618 Telč, ul. Radkovská Vodovod		KVGEO s.r.o. Polní 696/11, 594 01 Velké Meziříčí	
Geodetická firma:	KV GEO s.r.o.	Číslo ověření:	1024/2025
Zpracoval:	[redacted]	Číslo položky ČKZ:	2745
Ověřil:	[redacted]	Datum ověření:	8.10.2025
Odběratel:	HILDEBRANDT CZ, s.r.o.	Datum zaměření:	07/2024-09/2025
	Lublaňská 267/12, Vinohrady, 120 00 Praha 2	Kód charakteristiky přesnosti 3	
		Formát výkresu:	A1
		Měřítko: 1:500	Číslo výkresu: 4
		S-JTSK	Bpv

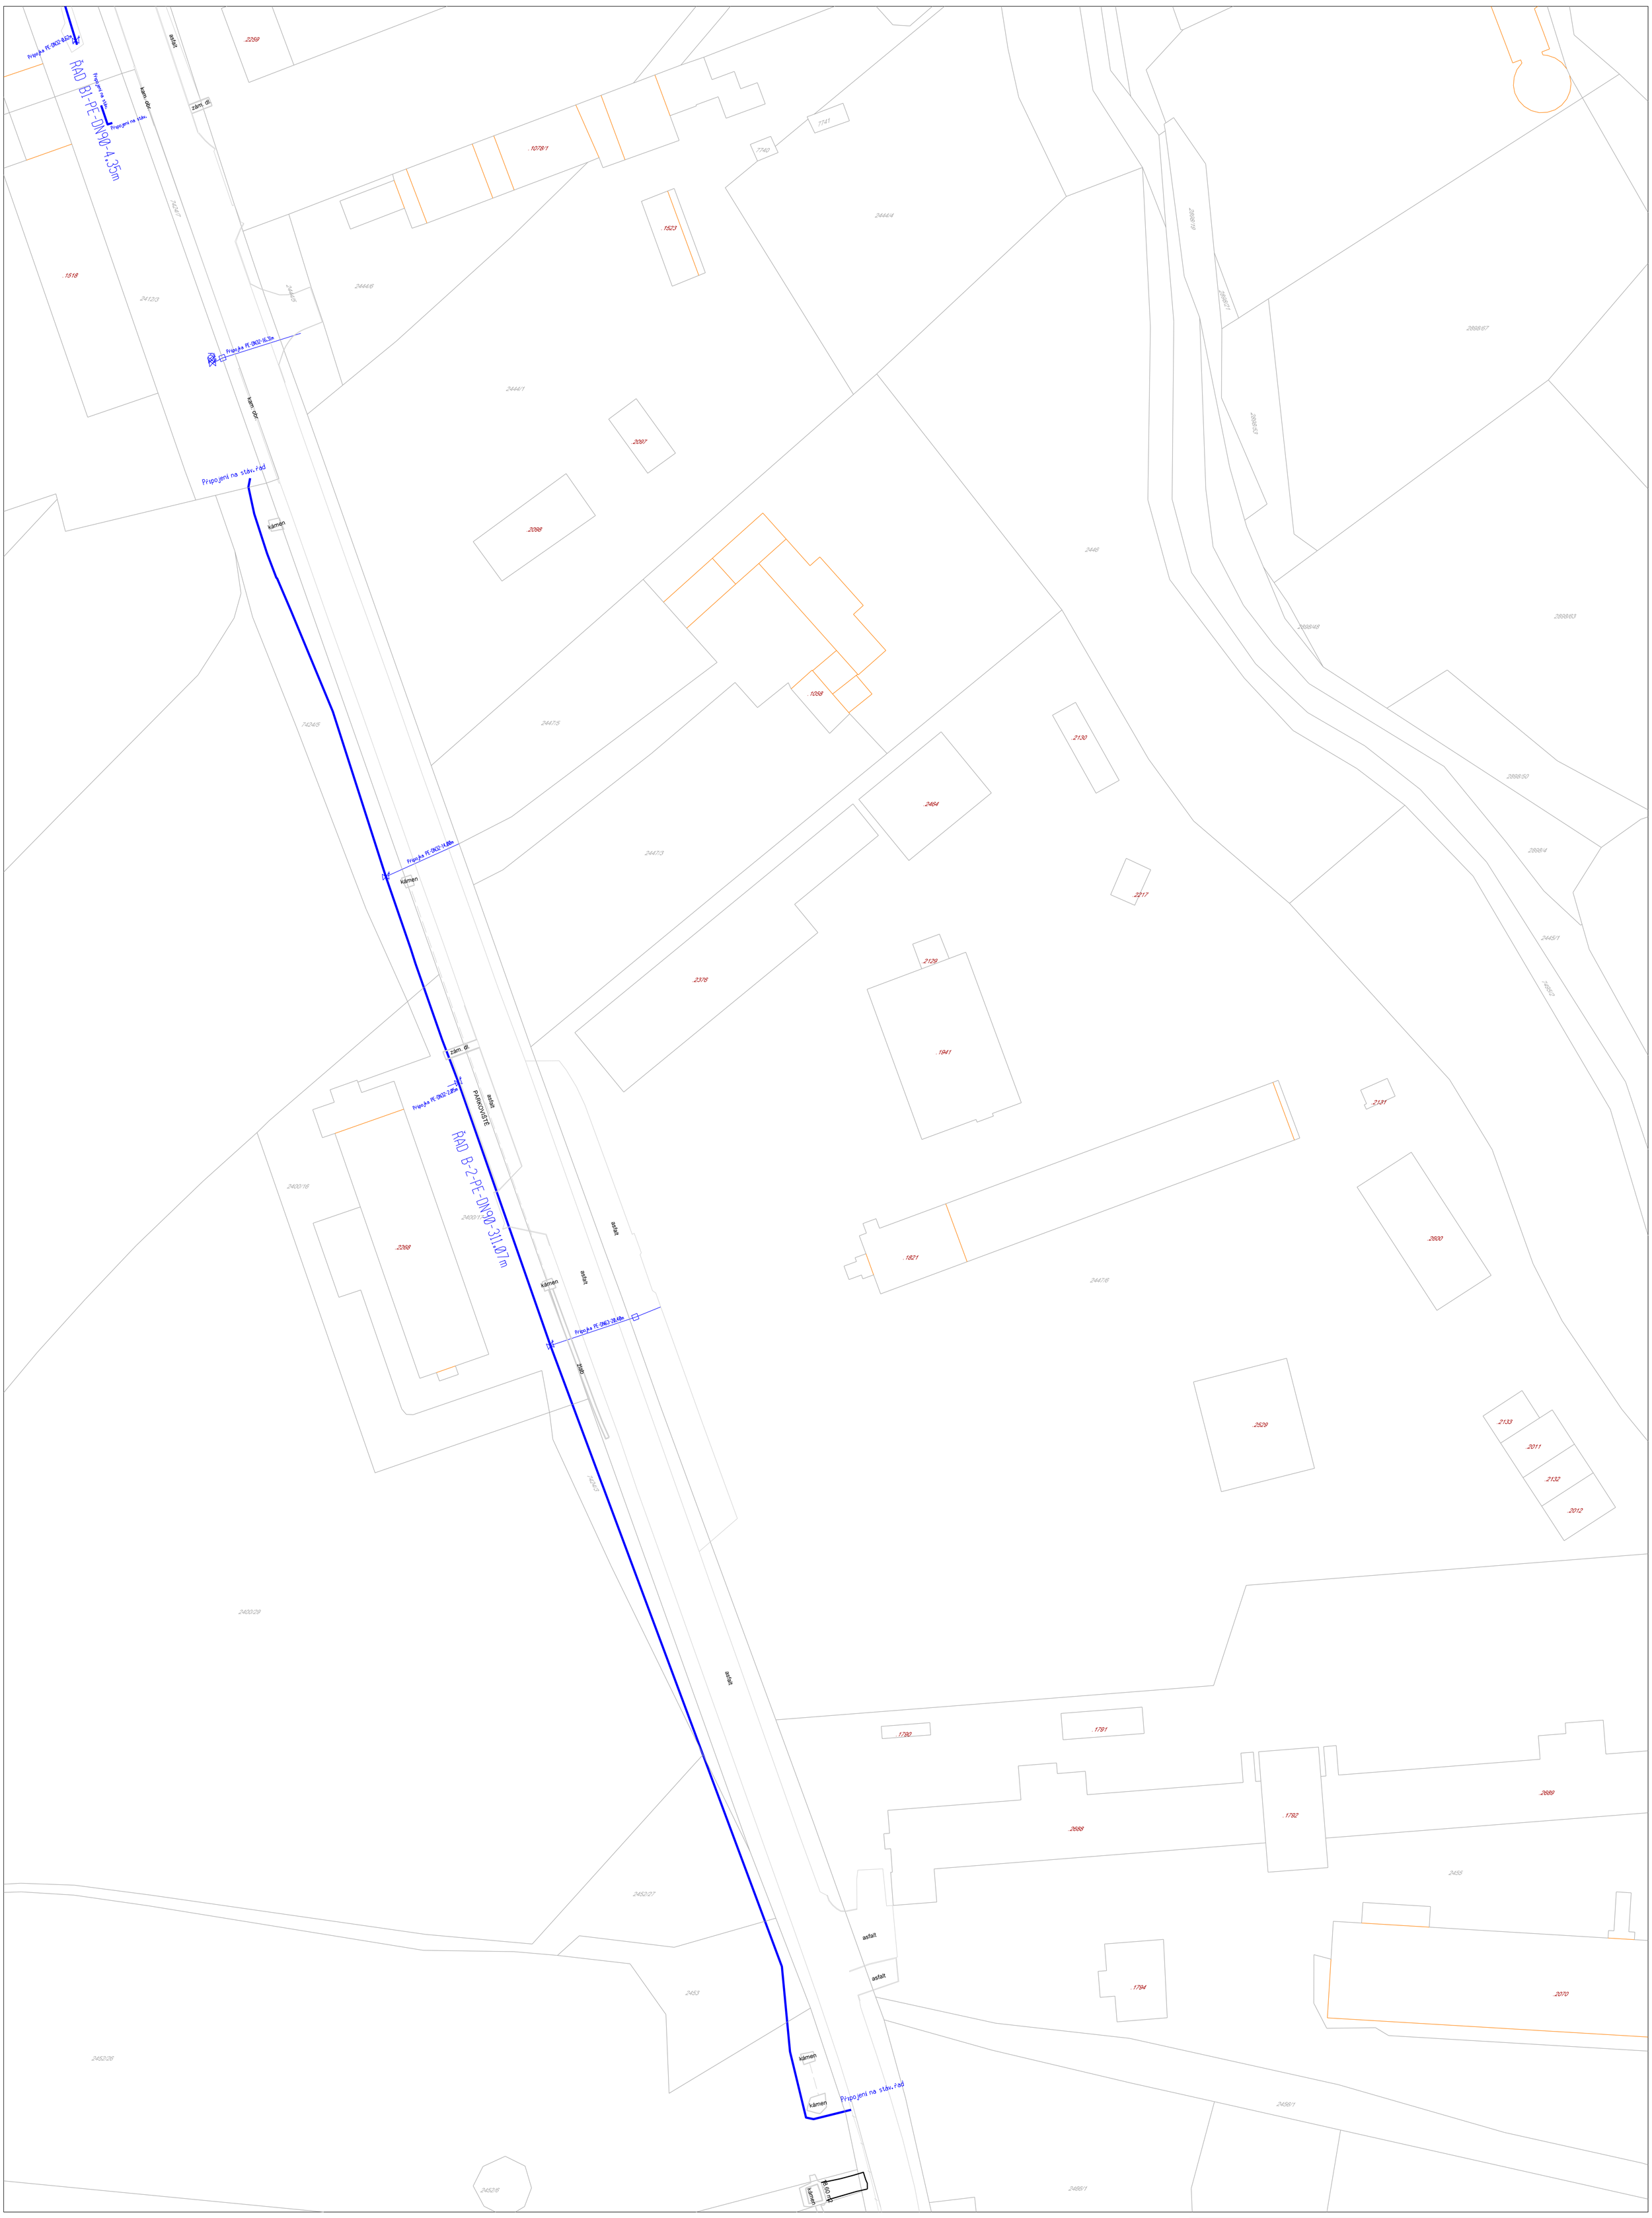

Potvrzuji, že geodetická část dokumentace předprojektového zaměření stavby náležitostmi a přesností odpovídá právním předpisům.
Zákres hranic je pouze informativní!

razítko a podpis AZI

Název stavby:	III/40618 Telč, ul. Radkovská Vodovod	KVGEO s.r.o. Polní 696/11, 594 01 Velké Meziříčí	
Geodetická firma:	KV GEO s.r.o.	Číslo ověření:	1024/2025
Zpracoval:	[redacted]	Číslo položky ČKZ:	2745
Ověřil:		Datum ověření:	8.10.2025
Odběratel:	HILDEBRANDT CZ, s.r.o.	Datum zaměření:	07/2024-09/2025
	Lublaňská 267/12, Vinohrady, 120 00 Praha 2	Kód charakteristiky přesnosti	3
		Formát výkresu:	A1
		Měřítko: 1:500	Číslo výkresu: 5
		S-JTSK	Bpv

změna horniny km 0,150-0,175 rýha 25x1,7x3
kanalizace DN 500/400

výkop celkem 278
změna horniny 14

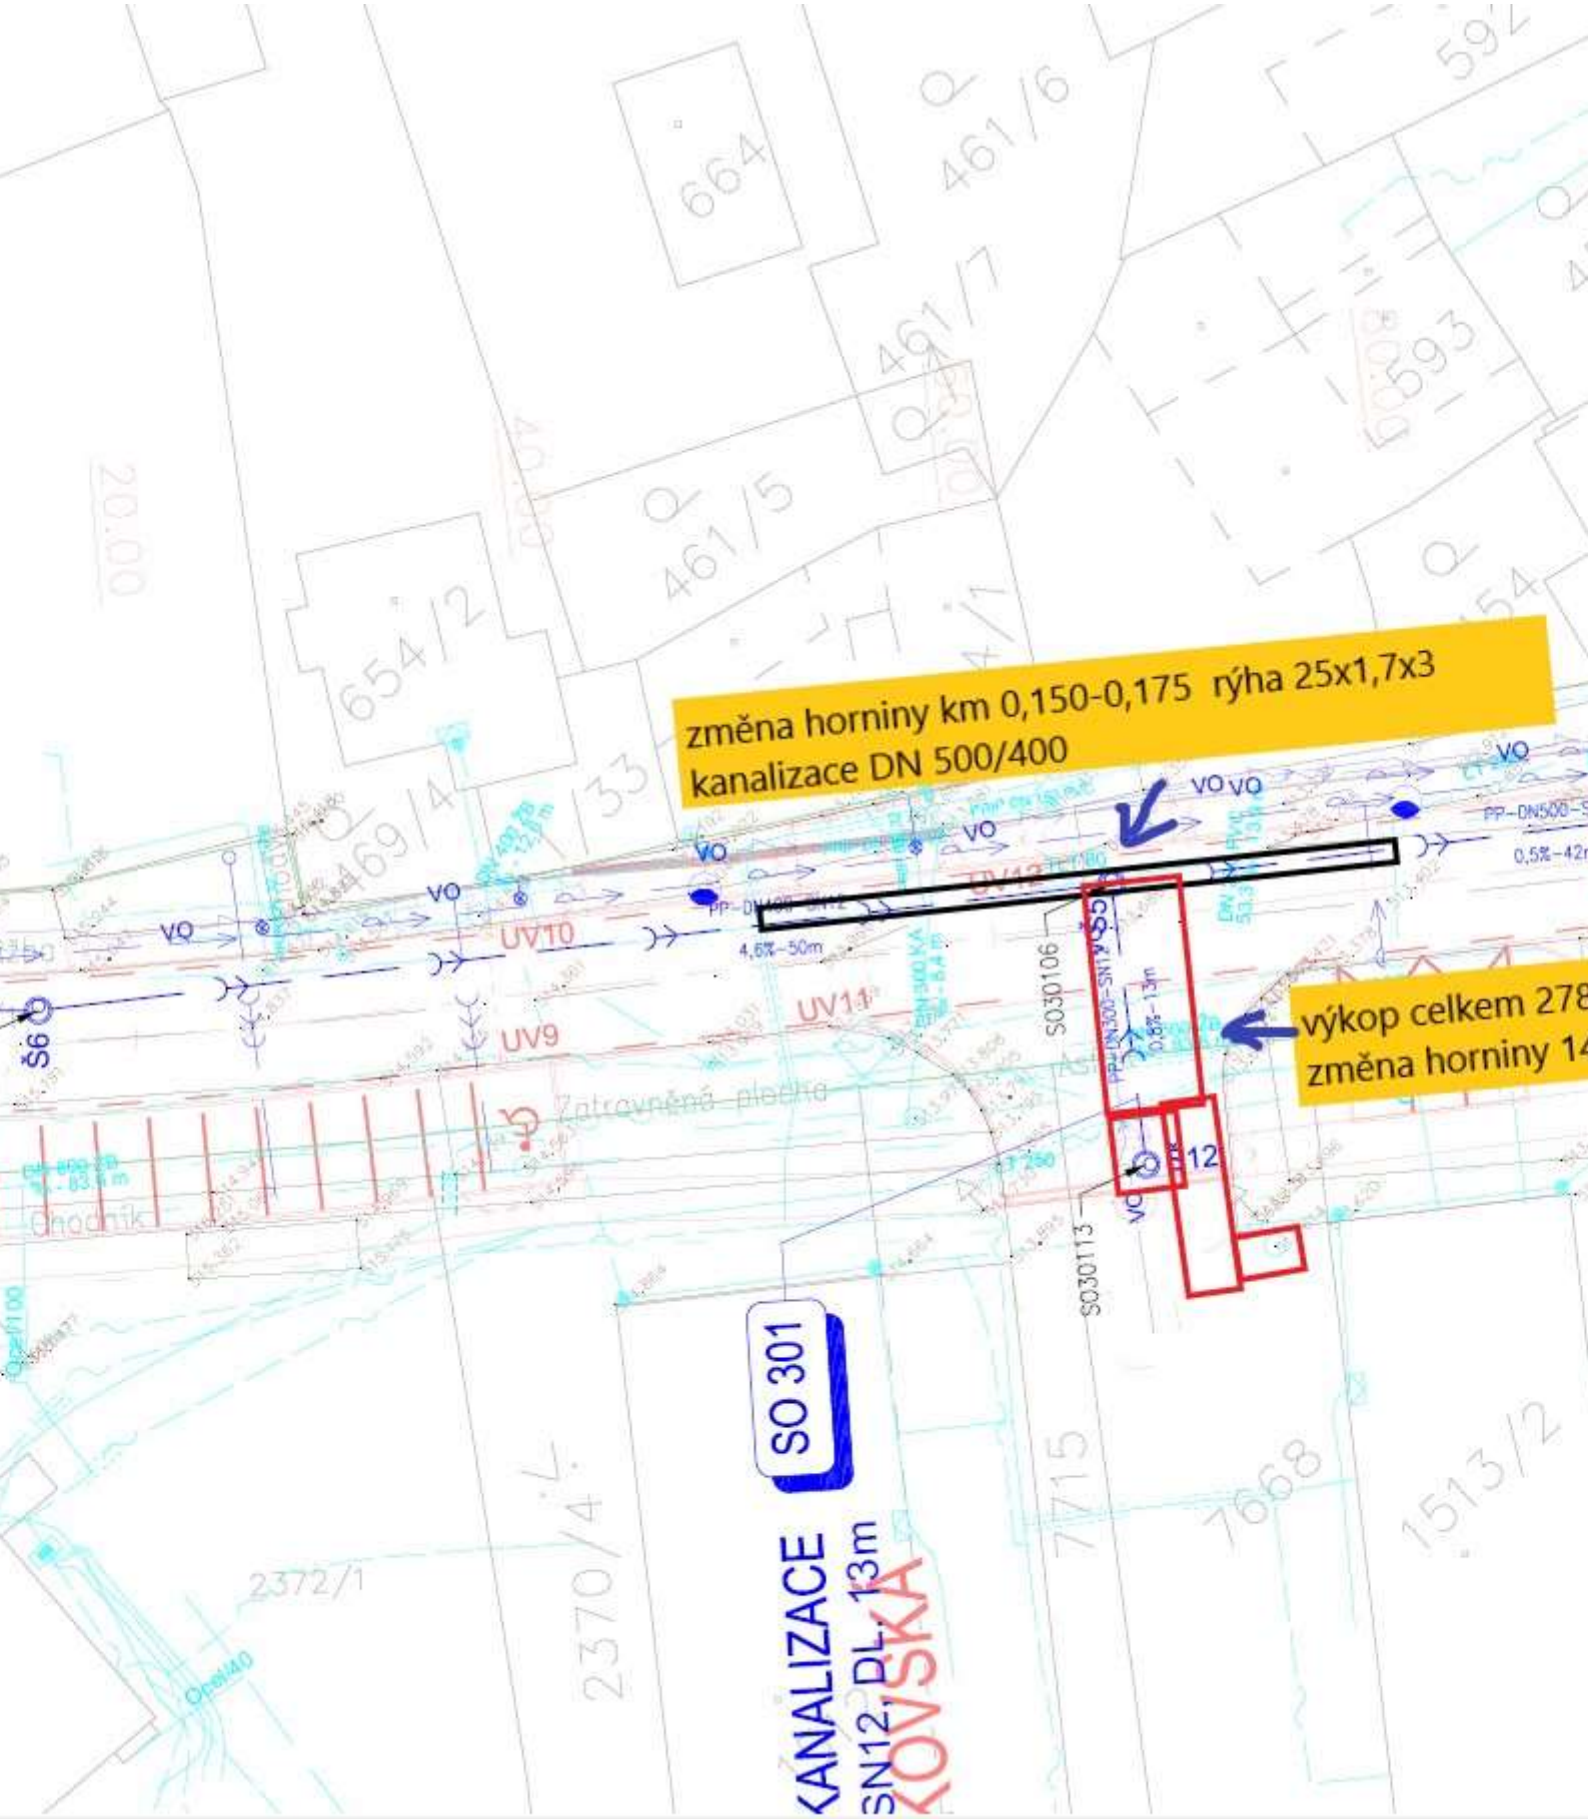

Krycí list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby : III/40618 Telč, ul. Radkovská Název stavebního objektu/provozního souboru(SO/PS): SO 182, SO 301.1	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS SO 182 SO 301.1	Číslo změny stavby 01

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 29.4.2024 – Kraj a 30.4.2024 Město (dále jen Smlouva):
Objednatel: Kraj Vysočina a město Tělč
Zhotovitel: IMOS Brno, a.s.

Obsah:

Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS, Rozpis ocenění změn položek - počet stran A4	
Soupis prací - počet stran A4	
Další doklady nezbytné pro popis, řádné zdůvodnění, dokladování a ocenění změn - počet stran A4	

Iniciátor změny: ☐ zhotovitel ☐ objednatel ☐ projektant ☐ .....

Zdůvodnění a popis změny:

[redacted]

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
[redacted]		

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno	datum	podpis
Technický dozor – Kraj Vysočina	jméno	datum	podpis
Technický dozor – Město Telč	jméno	datum	podpis
Objednatel – Kraj Vysočina	jméno	datum	podpis
Objednatel – Město Telč	jméno	datum	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny výše a v přiložené Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby.Tento Evidenční list změny stavby představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Zhotovitel	jméno	Tomáš Jurásek	datum	podpis

Evidenční list změny stavby

Evidenční číslo a název Stavby:	Číslo SO/PS /	Číslo ZBV:
III/40618 Telč, ul. Radkovská	/ číslo Změny SO/PS:	
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):		
SO 182 Úprava objízdné komunikace (Město + Kraj)	**SO 182**	**01**
Číslo a název podobjektu/rozpočtu:	**01**	
SO 182 Úprava objízdné komunikace (Město + Kraj)		

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 29. 4. 2024 - Kraj a 30. 4. 2024 - Město (dále jen Smlouva):

Objednatel: Kraj Vysočina a město Telč

Zhotovitel: IMOS Brno, a.s.

Popis Změny:

SO 182 Změna skladby objízdné komunikace a prodloužení délky výhyben

Konstrukce hlavní trasy

Při zahájení prací bylo z důvodu výskytu štětové vrstvy z velmi hrubého kameniva zjištěno, že není možné provést projektem navrženou technologii opravy prostřednictvím mechanicky zpevněné zeminy. Po konzultaci s geologem stavby bylo rozhodnuto, že stávající kryt bude rozryt a následně reprofilován do požadovaných příčných a podélných sklonů. Následně byla tato vrstva doplněna vrstvou z asfaltového recyklátu o mocnosti 100 mm. Na tuto vrstvu byla provedena již projektem navržena vrstva penetračního makadamu včetně dvou uzavíracích nátěrů.

Výhybny

ZBV řeší navýšení rozsahu ploch výhyben (požadavek objednatele) a sanace pláně u některých z výhyben. Dále jsou řešeny s tím související práce při odstranění výhyben.

Údaje v Kč bez DPH:

	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
celkem	[redacted]		

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno	datum	podpis
Technický dozor investora	jméno	datum	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny výše a v přiložené Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel	jméno		datum	podpis
Zhotovitel	jméno	Tomáš Jurásek	datum	podpis

SOUPIS PRACÍ

Stavba: **21007 III/40618 Telč, ul. Radkovská, PD**

Objekt: **SO182 Úprava objízdné komunikace (Město+Kraj)**

Rozpočet: **SO182 Úprava objízdné komunikace (Město+Kraj)**

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: IMOS Brno,a.s.

Základní cena: [redacted]

Cena celková:

DPH:

Cena s daní:

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek:

Náklad na měrnou jednotku:

Vypracoval zadání: **Vypracoval nabídku:**

Datum zadání: **Datum vypracování nabídky:**

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 21007 III/40618 Telč, ul. Radkovská, PD
Objekt: SO182 Úprava objízdné komunikace (Město+Kraj)
Rozpočet: SO182 Úprava objízdné komunikace (Město+Kraj)

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
[redacted]							

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 21007 III/40618 Telč, ul. Radkovská, PD
Objekt: SO182 Úprava objízdné komunikace (Město+Kraj)
Rozpočet: SO182 Úprava objízdné komunikace (Město+Kraj)

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
[redacted]							

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 21007 III/40618 Telč, ul. Radkovská, PD
Objekt: SO182 Úprava objízdné komunikace (Město+Kraj)
Rozpočet: SO182 Úprava objízdné komunikace (Město+Kraj)

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
[redacted]							

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 21007 III/40618 Telč, ul. Radkovská, PD
Objekt: SO182 Úprava objízdné komunikace (Město+Kraj)
Rozpočet: SO182 Úprava objízdné komunikace (Město+Kraj)

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 21007 III/40618 Telč, ul. Radkovská, PD
Objekt: SO182 Úprava objízdné komunikace (Město+Kraj)
Rozpočet: SO182 Úprava objízdné komunikace (Město+Kraj)

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
[redacted]							

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 21007 III/40618 Telč, ul. Radkovská, PD
Objekt: SO182 Úprava objízdné komunikace (Město+Kraj)
Rozpočet: SO182 Úprava objízdné komunikace (Město+Kraj)

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
[redacted]							

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 21007 III/40618 Telč, ul. Radkovská, PD
Objekt: SO182 Úprava objízdné komunikace (Město+Kraj)
Rozpočet: SO182 Úprava objízdné komunikace (Město+Kraj)

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
[redacted]							

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 21007 III/40618 Telč, ul. Radkovská, PD
Objekt: SO182 Úprava objízdné komunikace (Město+Kraj)
Rozpočet: SO182 Úprava objízdné komunikace (Město+Kraj)

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
[redacted]							

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 21007 III/40618 Telč, ul. Radkovská, PD
Objekt: SO182 Úprava objízdné komunikace (Město+Kraj)
Rozpočet: SO182 Úprava objízdné komunikace (Město+Kraj)

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
[redacted]							

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 21007 III/40618 Telč, ul. Radkovská, PD
Objekt: SO182 Úprava objízdné komunikace (Město+Kraj)
Rozpočet: SO182 Úprava objízdné komunikace (Město+Kraj)

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 21007 III/40618 Telč, ul. Radkovská, PD
Objekt: SO182 Úprava objízdné komunikace (Město+Kraj)
Rozpočet: SO182 Úprava objízdné komunikace (Město+Kraj)

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
[redacted]							

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 21007 III/40618 Telč, ul. Radkovská, PD
Objekt: SO182 Úprava objízdné komunikace (Město+Kraj)
Rozpočet: SO182 Úprava objízdné komunikace (Město+Kraj)

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
[redacted]							

ZBV č. 01 Změna skladby objízdné komunikace, prodloužení délky výhybek

Stavba: 21007, III/40618 Telč, ul. Radkovská, PD

Objekt: SO182, Úprava objízdné komunikace (Město+Kraj)

Rozpočet: SO182, Úprava objízdné komunikace (Město+Kraj)

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: IMOS Brno,a.s.

Rozpočet:

Základní cena:

Cena - celkem:

DPH:

Cena s daní:

Z toho rozhod.hmoty:

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek:

Náklad na měrnou jedn.:

[redacted]

ZBV - celkem:

Cena - celkem:

DPH:

Cena s daní:

[redacted]

Vypracoval zadání:

Datum zadání:

ZBV vypracoval:

Datum vypracování ZBV 27.02.2026

Položky ZBV č. 01

Stavba: 21007, III/40618 Telč, ul. Radkovská, PD
Objekt: SO182, Úprava objízdné komunikace (Město+Kraj)
Rozpočet: SO182, Úprava objízdné komunikace (Město+Kraj)

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
[redacted]							

Položky ZBV č. 01

Stavba: 21007, III/40618 Telč, ul. Radkovská, PD
Objekt: SO182, Úprava objízdné komunikace (Město+Kraj)
Rozpočet: SO182, Úprava objízdné komunikace (Město+Kraj)

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
[redacted]							

Položky ZBV č. 01

Stavba: 21007, III/40618 Telč, ul. Radkovská, PD
Objekt: SO182, Úprava objízdné komunikace (Město+Kraj)
Rozpočet: SO182, Úprava objízdné komunikace (Město+Kraj)

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
[redacted]							

Položky ZBV č. 01

Stavba: 21007, III/40618 Telč, ul. Radkovská, PD
Objekt: SO182, Úprava objízdné komunikace (Město+Kraj)
Rozpočet: SO182, Úprava objízdné komunikace (Město+Kraj)

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
[redacted]							

FOTODOKUMENTACE – SO 182 – ZBV 01
Změna skladby objízdné komunikace a prodloužení délky výhyben

Sondy z hlavní trasy prokazující přítomnost štětové vrstvy

HILDEBRANT CZ s.r.o.
Ing. Jaroslav Kohout
Lublaňská 267/12
120 00 Praha 2, Vinohrady

Váš dopis zn.:	Ze dne:	Naše značka:	Vyřizuje:	Tel./E-mail	Místo, datum
		JH/2024-067	[redacted]		Habrovany 21.05.2024

Stavba: III/40618 Telč, ul. Radkovská

Věc: **Vyjádření geotechnika k únosnosti zemní pláně**

Na základě požadavku zástupce zhotovitele výše uvedené stavby Ing. Kohouta byla v průběhu května provedena kontrola pláně (AZ) objízdné trasy (účelové komunikace) SO 182 výše uvedené stavby.

Za účelem ověření skladby konstrukce výše uvedené účelové komunikace v dl. 1,3 km, na kterou je plánováno převést veškerou dopravu po dobu cca 1,5 roku, byly provedeny kopané sondy.

Po odstranění asfaltového souvrství (ne vždy byla kvalita asfaltu charakteru AB, místy je vrstva AB degradována). Pod touto vrstvou se nachází ve středové části vozovky štětová vrstva z velmi hrubého kameniva proměnlivé šířky cca 2,0 m. Tato vrstva tvoří kostru komunikace, nicméně nezasahuje až do krajů stávající komunikace viz obr. 1. V krajích silnice se nenachází žádná konstrukce (případně dosypávky z drcených cihel) a hned je zastižena vrstva z jílovitých zemin, které nedosahují potřebné únosnosnosti dle PD.

Obr. 1 Snímek z typického odkopu komunikace.

[redacted]

Konstrukce vozovky objízdné komunikace

Konstrukce vozovky D2-N-5, TDZ VI, PII – MODIFIKACE

Živičný nátěr dvouvrstvý asfaltový	N DV-A	ČSN 73 6129, ČSN EN 138 08	20 mm
- kamenivo (2. vrstva)	fr. 4-8 4-5 kg/m2		
- kamenivo (1. vrstva)	fr. 8-11 6-8 kg/m2		
- pojivo	1,0-1,6/0,7-1,4 kg/m2		
Penetrační makadam hrubý	PMH 32/63	ČSN 73 6127-2	100 mm
Mechanicky zpevněná zemina (původní mat. voz.)	MZ 0/32	ČSN 73 6126-1, ČSN EN 132 85	200 mm
rozpojení stávající vozovky, následné doplnění hrubozrnné složky ($ŠD_B$ 0/32 GN), promísení, srovnání povrchu do sklonu a přehutnění			
Konstrukce vozovky celkem			**min. 320 mm**

Návrh předpokládá na vrstvě mechanicky zpevněné zeminy dosažení modulu přetvárnosti min. $E_{def,2}$ = 65 MPa.

Obr. 2 Konstrukce objízdné komunikace dle návrhu PD.

Na základě výše uvedených skutečností navrhuji odkopat kraje vozovky na parapláň cca 60 cm od stávající nivelety a následně doplnit sanační vrstvou z ŠD 0/63-0/125 (případně recyklované kamenivo) po úroveň mechanicky zpevněné zeminy, která zde nelze provádět. Vzhledem k úrovni štětu navozit 10 -15 cm frézátu. Poté tuto vrstvu v rámci homogenizace vrstvy a zbavení se dehtového odpadu recyklovat za studena (přidáním podílu cementu a asfaltu).

Následně lze realizovat penetrační makadam. Tím dosáhneme potřebných parametru pro použití nákladní dopravy.

Tím, že se jedná o úzkou komunikaci s výhybnami, musí nákladní vozidla jezdit až po okrajích vozovky. Zesílením/vytvořením konstrukce pod krajnicemi tak bude zajištěna nutná dostatečná únosnost – nutno ověřit kontrolními SZZ, v případně nevyhovujících parametrů bude potřeba konstrukci upravit. Pod sanační vrstvou bude položena separační geotextílie 300 g/m^2.

Pro další konzultace jsem plně k dispozici.

S pozdravem

[redacted]

geotechnik specialista,
inženýrský geolog a hydroge[redacted]

CONSULTEST s.r.o., Medkova 4, 627 00 Brno;
ZL Znojmo, Dobšická 17, 669 02 Znojmo

L 1211	**Kontrola zhutnění zemin a sypanin podle ČSN 72 1006** Příloha A Statická zatěžovací zkouška pro pozemní komunikace Protokol o zkoušce č. **595/24/ZZ**	List 1/1 Výtisk č.: 1 2 3

Stavba: *	Telč
Stavební objekt: *	SO 182 objízdná trasa
Konstrukční celek: *	původní konstrukce
Specifikace materiálu: *	původní
Popis zkušebního místa:	km 0,700 LS
Zkoušeno dne:	14.06.2024

Údaje o zkoušce

Zkušební zařízení: statická zatěžovací deska

Průměr desky mm: 300
Teplota vzduchu °C: 18
Teplota vrstvy °C: 16

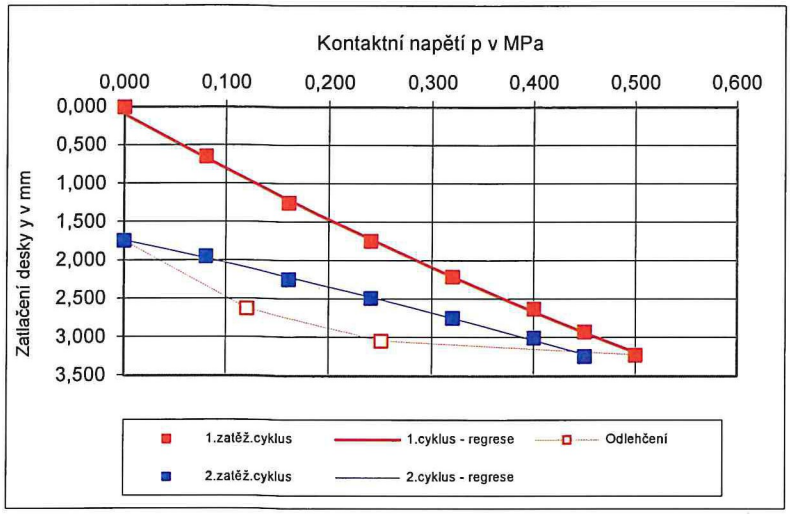

	1. cyklus	2. cyklus
p	y1	y2
MPa	mm	mm
	0,00	0,00	1,74
1	0,08	0,64	1,94
2	0,16	1,24	2,24
3	0,24	1,74	2,48
4	0,32	2,20	2,74
5	0,40	2,62	3,00
6	0,45	2,92	3,24
7	0,50	3,22	
odlehčení			
1	0,25	3,04	
2	0,12	2,62	
3	0,00	1,74	

Stanovení modulu přetvárnosti			**1. cyklus**	**2. cyklus**
Regresní výpočet	*Konstanta*	*a0*	0,096	1,734
	Koeficienty	*a1*	7,306	2,826
	R kvadrát	*a2*	-2,232	1,044
Modul přetvárnosti	E_{def1}		**36,4**	**MPa**
	E_{def2}		**68,3**	**MPa**
	E_{def2}/E_{def1}		**1,88**	

Objednatel zkoušky: **HILDEBRANT CZ s.r.o**
Antoninův Důl 107
586 01 Jihlava

Zkoušel: [redacted]

Místo zkoušky:

Protokol uzavřen dne: 15.06.2024

Vedoucí ZL :

Objednávka (zakázka): 045/2024/ZZ

poznámka: * data převzata od objednatele, laboratoř neodpovídá za relevantnost dat poskytnutých objednatelem.
**data převzata od subdodavatele ZL č.
*** v případě, že je jako vzorkař uveden objednatel, pak platí, že výsledky se vztahují ke vzorku tak, jak byl př[redacted]
Výsledky zkoušek se týkají pouze vzorků a protokol neznamená schválení výrobku orgánem udělujícím akreditaci ani ž[redacted]

Protokol může být reprodukován jedině celý, jinak s písemným souhlasem zkušební laboratoře. Protokol nebo jeho části nesmí být měněny.

Uvedená nejistota je rozšířená nejistota, která byla vypočtena s použitím koeficientu rozšíření 2, což odpovídá hladině spolehlivosti přibližně 95%.

Konec protokolu

CONSULTEST s.r.o., Medkova 4, 627 00 Brno;
ZL Znojmo, Dobšická 17, 669 02 Znojmo

L 1211	**Kontrola zhutnění zemin a sypanin podle ČSN 72 1006** Příloha A Statická zatěžovací zkouška pro pozemní komunikace Protokol o zkoušce č. **596/24/ZZ**	List 1/1 Výtisk č.: 1 2 3

Stavba: *	Telč
Stavební objekt: *	SO 182 objízdná trasa
Konstrukční celek: *	původní konstrukce
Specifikace materiálu: *	původní
Popis zkušebního místa:	km 0,700 PS
Zkoušeno dne:	14.06.2024

Údaje o zkoušce

Zkušební zařízení: statická zatěžovací deska

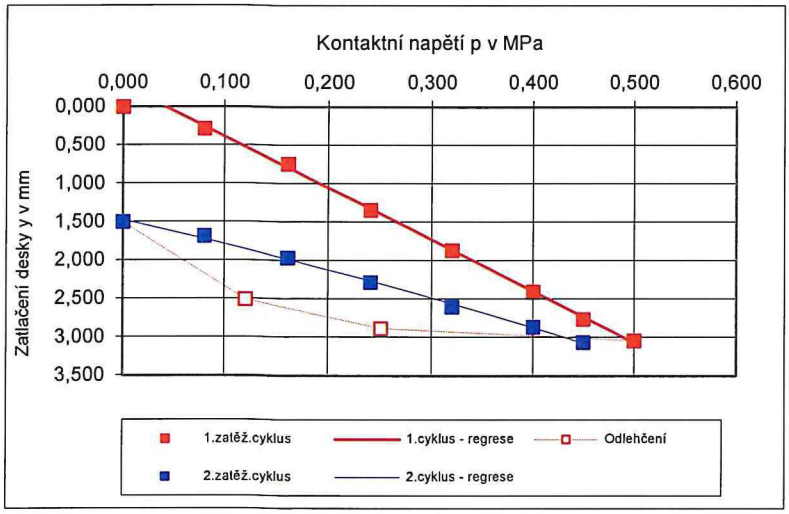

Průměr desky mm:	300
Teplota vzduchu °C:	18
Teplota vrstvy °C:	16

		1. cyklus	2. cyklus
	p	y1	y2
	MPa	mm	mm
	0,00	0,00	1,50
1	0,08	0,28	1,68
2	0,16	0,74	1,96
3	0,24	1,34	2,28
4	0,32	1,86	2,60
5	0,40	2,40	2,86
6	0,45	2,76	3,06
7	0,50	3,04	
odlehčení			
1	0,25	2,88	
2	0,12	2,50	
3	0,00	1,50	

Stanovení modulu přetvárnosti			**1. cyklus**	**2. cyklus**
Regresní výpočet	*Konstanta*	*a0*	-0,280	1,470
	Koeficienty	*a1*	6,679	3,019
	R kvadrát	*a2*	0,025	1,204
Modul přetvárnosti	E_{def1}		**33,6**	**MPa**
	E_{def2}		**63,2**	**MPa**
	E_{def2}/E_{def1}		**1,88**	

Objednatel zkoušky:	**HILDEBRANT CZ s.r.o** Antoninův Důl 107 586 01 Jihlava	Zkoušel:	[redacted]
		Místo zkoušky:	
Protokol uzavřen dne:	15.06.2024	Vedoucí ZL :	
Objednávka (zakázka):	045/2024/ZZ		

poznámka: * data převzata od objednatele, laboratoř neodpovídá za relevantnost dat poskytnutých objednatelem.
**data převzata od subdodavatele ZL č.
*** v případě, že je jako vzorkař uveden objednatel, pak platí, že výsledky se vztahují ke vzorku tak, jak byl př[redacted]

Výsledky zkoušek se týkají pouze vzorků a protokol neznamená schválení výrobku orgánem udělujícím akreditaci ani žádným jiným orgánem.

Protokol může být reprodukován jedině celý, jinak s písemným souhlasem zkušební laboratoře. Protokol nebo jeho části nesmí být měněny.

Uvedená nejistota je rozšířená nejistota, která byla vypočtena s použitím koeficientu rozšíření 2, což odpovídá hladině spolehlivosti přibližně 95%.

Konec protokolu

CONSULTEST s.r.o., Medkova 4, 627 00 Brno;
ZL Znojmo, Dobšická 17, 669 02 Znojmo

L 1211	**Kontrola zhutnění zemin a sypanin podle ČSN 72 1006** Příloha A Statická zatěžovací zkouška pro pozemní komunikace Protokol o zkoušce č. **597/24/ZZ**	List 1/1 Výtisk č.: 1 2 3

Stavba: *	Telč
Stavební objekt: *	SO 182 objízdná trasa
Konstrukční celek: *	původní konstrukce
Specifikace materiálu: *	původní štět
Popis zkušebního místa:	km 0,900 LS
Zkoušeno dne:	14.06.2024

Údaje o zkoušce

Zkušební zařízení: statická zatěžovací deska

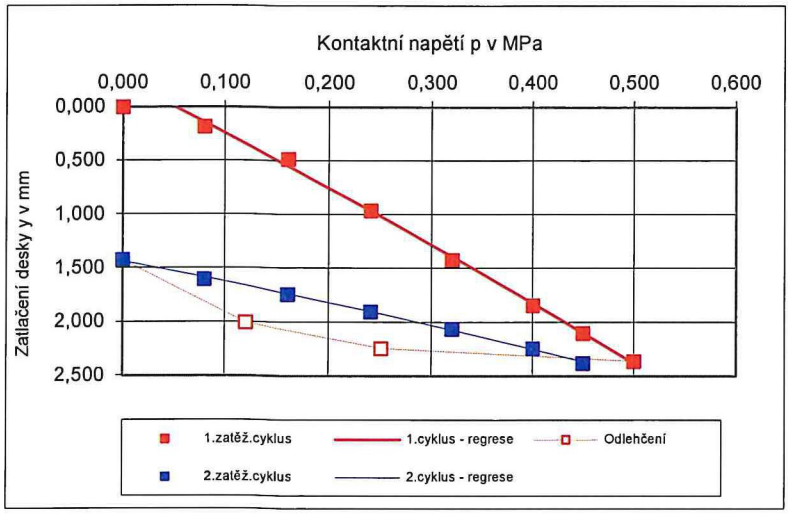

Průměr desky mm:	300
Teplota vzduchu °C:	18
Teplota vrstvy °C:	16

	1. cyklus	2. cyklus
p	y1	y2
MPa	mm	mm
0,00	0,00	1,42
1 0,08	0,18	1,60
2 0,16	0,48	1,74
3 0,24	0,96	1,90
4 0,32	1,42	2,06
5 0,40	1,84	2,24
6 0,45	2,10	2,38
7 0,50	2,36	
odlehčení		
1 0,25	2,24	
2 0,12	2,00	
3 0,00	1,42	

Stanovení modulu přetvárnosti			**1. cyklus**	**2. cyklus**
Regresní výpočet	*Konstanta*	*a0*	-0,255	1,433
	Koeficienty	*a1*	4,900	1,801
	R kvadrát	*a2*	0,737	0,608
Modul přetvárnosti	E_{def1}		**42,7**	**MPa**
	E_{def2}		**108,5**	**MPa**
	E_{def2}/E_{def1}		**2,54**	

Objednatel zkoušky:	**HILDEBRANT CZ s.r.o** Antoninův Důl 107 586 01 Jihlava	Zkoušel:	[redacted]
		Místo zkoušky:	
Protokol uzavřen dne:	15.06.2024	Vedoucí ZL :	
Objednávka (zakázka):	045/2024/ZZ		

poznámka: * data převzata od objednatele, laboratoř neodpovídá za relevantnost dat poskytnutých objednatelem.
**data převzata od subdodavatele ZL č.
*** v případě, že je jako vzorkař uveden objednatel, pak platí, že výsledky se vztahují ke vzorku tak, jak byl při[redacted]
Výsledky zkoušek se týkají pouze vzorků a protokol neznamená schválení výrobku orgánem udělujícím akreditaci ani ž[redacted]
Protokol může být reprodukován jedině celý, jinak s písemným souhlasem zkušební laboratoře. Protokol nebo jeho části nesmí být měněny.
Uvedená nejistota je rozšířená nejistota, která byla vypočtena s použitím koeficientu rozšíření 2, což odpovídá hladině spolehlivosti přibližně 95%.

Konec protokolu

CONSULTEST s.r.o., Medkova 4, 627 00 Brno;
ZL Znojmo, Dobšická 17, 669 02 Znojmo

L 1211	**Kontrola zhutnění zemin a sypanin podle ČSN 72 1006** Příloha A Statická zatěžovací zkouška pro pozemní komunikace Protokol o zkoušce č. **598/24/ZZ**	List 1/1 Výtisk č.: 1 2 3

Stavba: *	Telč
Stavební objekt: *	SO 182 objízdná trasa
Konstrukční celek: *	původní konstrukce
Specifikace materiálu: *	původní
Popis zkušebního místa:	km 0,900 PS
Zkoušeno dne:	14.06.2024

Údaje o zkoušce

Zkušební zařízení: statická zatěžovací deska

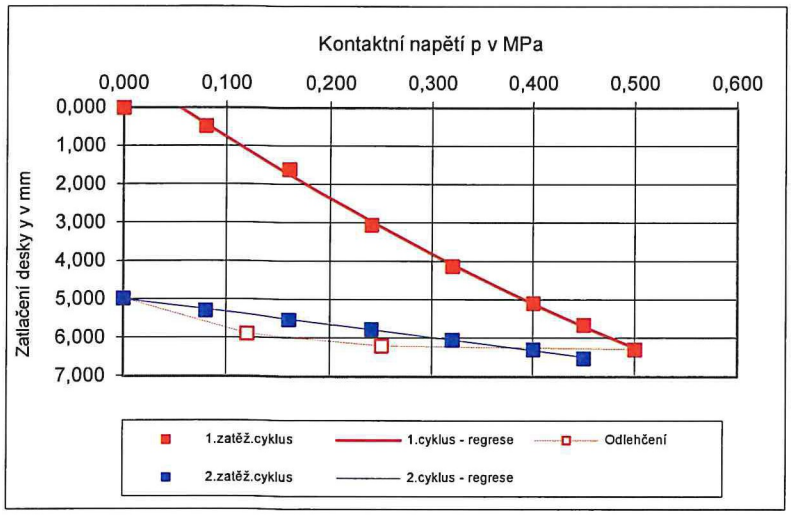

Průměr desky mm:	300
Teplota vzduchu °C:	18
Teplota vrstvy °C:	16

		1. cyklus	2. cyklus
	p	y1	y2
	MPa	mm	mm
	0,00	0,00	4,96
1	0,08	0,48	5,28
2	0,16	1,60	5,52
3	0,24	3,04	5,76
4	0,32	4,12	6,04
5	0,40	5,08	6,28
6	0,45	5,64	6,52
7	0,50	6,28	
odlehčení			
1	0,25	6,20	
2	0,12	5,88	
3	0,00	4,96	

Stanovení modulu přetvárnosti			**1. cyklus**	**2. cyklus**
Regresní výpočet	*Konstanta*	*a0*	-0,979	4,985
	Koeficienty	*a1*	18,184	3,231
	R kvadrát	*a2*	-7,457	0,244
Modul přetvárnosti	E_{def1}		**15,6**	**MPa**
	E_{def2}		**67,4**	**MPa**
	E_{def2}/E_{def1}		**4,33**	

Objednatel zkoušky:	**HILDEBRANT CZ s.r.o** Antoninův Důl 107 586 01 Jihlava	Zkoušel:	[redacted]
		Místo zkoušky:	
Protokol uzavřen dne:	15.06.2024	Vedoucí ZL :	
Objednávka (zakázka):	045/2024/ZZ		

poznámka: * data převzata od objednatele, laboratoř neodpovídá za relevantnost dat poskytnutých objednatelem.
**data převzata od subdodavatele ZL č.
*** v případě, že je jako vzorkař uveden objednatel, pak platí, že výsledky se vztahují ke vzorku tak, jak byl přij[redacted]

Výsledky zkoušek se týkají pouze vzorků a protokol neznamená schválení výrobku orgánem udělujícím akreditaci ani žádným jiným orgánem.

Protokol může být reprodukován jedině celý, jinak s písemným souhlasem zkušební laboratoře. Protokol nebo jeho části nesmí být měněny.

Uvedená nejistota je rozšířená nejistota, která byla vypočtena s použitím koeficientu rozšíření 2, což odpovídá hladině spolehlivosti přibližně 95%.

Konec protokolu

CONSULTEST s.r.o., Medkova 4, 627 00 Brno;
ZL Znojmo, Dobšická 17, 669 02 Znojmo

L 1211

Kontrola zhutnění zemin a sypanin podle ČSN 72 1006

Příloha A Statická zatěžovací zkouška pro pozemní komunikace

Protokol o zkoušce č. **465/24/ZZ**

Výtisk č.: 1 2 3

Stavba: *	Telč
Stavební objekt: *	objízdná trasa
Konstrukční celek: *	zemní pláň
Specifikace materiálu: *	původní
Popis zkušebního místa:	km 1,220
Zkoušeno dne:	21.05.2024

Údaje o zkoušce

Zkušební zařízení: statická zatěžovací deska

Průměr desky mm:	300
Teplota vzduchu °C:	15
Teplota vrstvy °C:	14

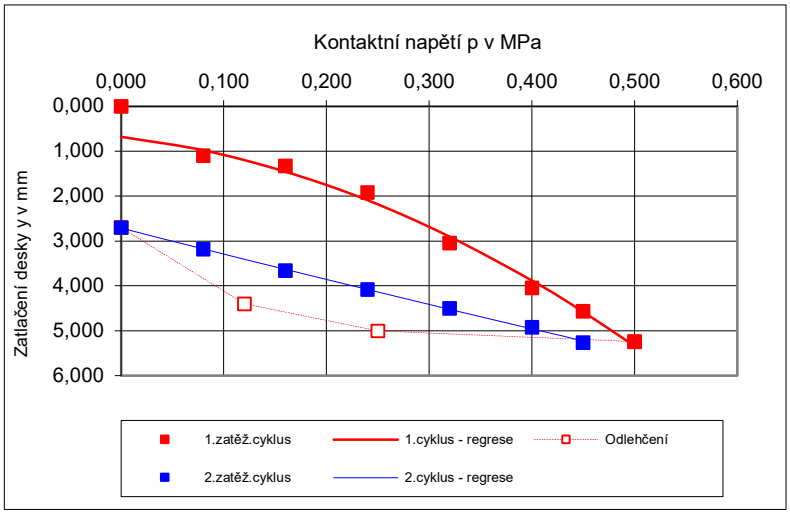

	1. cyklus	2. cyklus
p	y1	y2
MPa	mm	mm
0,00	0,00	2,70
1 0,08	1,10	3,18
2 0,16	1,32	3,66
3 0,24	1,92	4,08
4 0,32	3,04	4,50
5 0,40	4,04	4,92
6 0,45	4,56	5,26
7 0,50	5,24	
odlehčení		
1 0,25	5,00	
2 0,12	4,40	
3 0,00	5,70	

Stanovení modulu přetvárnosti			**1. cyklus**	**2. cyklus**
Regresní výpočet	*Konstanta*	*a0*	0,677	2,714
	Koeficienty	*a1*	2,749	5,809
	R kvadrát	*a2*	13,143	-0,508
Modul přetvárnosti	E_{def1}		**24,1**	**MPa**
	E_{def2}		**40,3**	**MPa**
	E_{def2}/E_{def1}		**1,67**	

Objednatel zkoušky: **HILDEBRANT CZ s.r.o**
Antoninův Důl 107
586 01 Jihlava

Zkoušel: [redacted]

Místo zkoušky:

Protokol uzavřen dne: 21.05.2024

Vedoucí ZL :

Objednávka (zakázka): 045/2024/ZZ

poznámka: * data převzata od objednatele, laboratoř neodpovídá za relevantnost dat poskytnutých objednatelem.
**data převzata od subdodavatele ZL č.
*** v případě, že je jako vzorkař uveden objednatel, pak platí, že výsledky se vztahují ke vzorku tak, jak byl přijat do laboratoře.

Výsledky zkoušek se týkají pouze vzorků a protokol neznamená schválení výrobku orgánem udělujícím akreditaci ani žádným jiným orgánem.

Protokol může být reprodukován jedině celý, jinak s písemným souhlasem zkušební laboratoře. Protokol nebo jeho části nesmí být měněny.

Uvedená nejistota je rozšířená nejistota, která byla vypočtena s použitím koeficientu rozšíření 2, což odpovídá hladině spolehlivosti přibližně 95%.

Konec protokolu

CONSULTEST s.r.o., Medkova 4, 627 00 Brno;
ZL Znojmo, Dobšická 17, 669 02 Znojmo

L 1211

Kontrola zhutnění zemin a sypanin podle ČSN 72 1006

Příloha A Statická zatěžovací zkouška pro pozemní komunikace

Protokol o zkoušce č. **466/24/ZZ**

Výtisk č.: 1 2 3

Stavba: *	Telč
Stavební objekt: *	objízdná trasa
Konstrukční celek: *	zemní pláň
Specifikace materiálu: *	původní
Popis zkušebního místa:	km 0,760
Zkoušeno dne:	21.05.2024

Údaje o zkoušce

Zkušební zařízení: statická zatěžovací deska

Průměr desky mm: 300
Teplota vzduchu °C: 15
Teplota vrstvy °C: 14

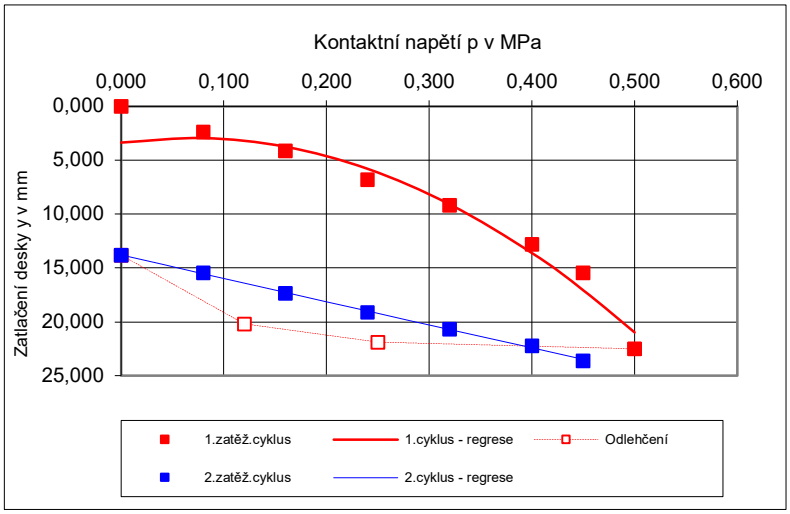

	p	1. cyklus y1	2. cyklus y2
	MPa	mm	mm
	0,00	0,00	13,80
1	0,08	2,38	15,44
2	0,16	4,12	17,32
3	0,24	6,80	19,12
4	0,32	9,18	20,66
5	0,40	12,80	22,22
6	0,45	15,44	23,60
7	0,50	22,50	
odlehčení			
1	0,25	21,88	
2	0,12	20,18	
3	0,00	13,80	

Stanovení modulu přetvárnosti			**1. cyklus**	**2. cyklus**
Regresní výpočet	*Konstanta*	*a0*	3,369	13,779
	Koeficienty	*a1*	-12,990	21,984
	R kvadrát	*a2*	96,411	-1,026

Modul přetvárnosti	E_{def1}	**6,4**	**MPa**
	E_{def2}	**10,5**	**MPa**
	E_{def2}/E_{def1}	**1,64**	

Objednatel zkoušky: **HILDEBRANT CZ s.r.o**
Antoninův Důl 107
586 01 Jihlava

Zkoušel: [redacted]

Místo zkoušky:

Protokol uzavřen dne: 21.05.2024

Vedoucí ZL :

Objednávka (zakázka): 045/2024/ZZ

poznámka: * data převzata od objednatele, laboratoř neodpovídá za relevantnost dat poskytnutých objednatelem.
**data převzata od subdodavatele ZL č.
*** v případě, že je jako vzorkař uveden objednatel, pak platí, že výsledky se vztahují ke vzorku tak, jak byl přijat do laboratoře.

Výsledky zkoušek se týkají pouze vzorků a protokol neznamená schválení výrobku orgánem udělujícím akreditaci ani žádným jiným orgánem.

Protokol může být reprodukován jedině celý, jinak s písemným souhlasem zkušební laboratoře. Protokol nebo jeho části nesmí být měněny.

Uvedená nejistota je rozšířená nejistota, která byla vypočtena s použitím koeficientu rozšíření 2, což odpovídá hladině spolehlivosti přibližně 95%.

Konec protokolu

CONSULTEST s.r.o., Medkova 4, 627 00 Brno;
ZL Znojmo, Dobšická 17, 669 02 Znojmo

L 1211

Kontrola zhutnění zemin a sypanin podle ČSN 72 1006

Příloha A Statická zatěžovací zkouška pro pozemní komunikace

Protokol o zkoušce č. **467/24/ZZ**

Výtisk č.: 1 2 3

Stavba: *	Telč
Stavební objekt: *	objízdná trasa
Konstrukční celek: *	zemní pláň
Specifikace materiálu: *	původní
Popis zkušebního místa:	km 0,560
Zkoušeno dne:	21.05.2024

Údaje o zkoušce

Zkušební zařízení: statická zatěžovací deska

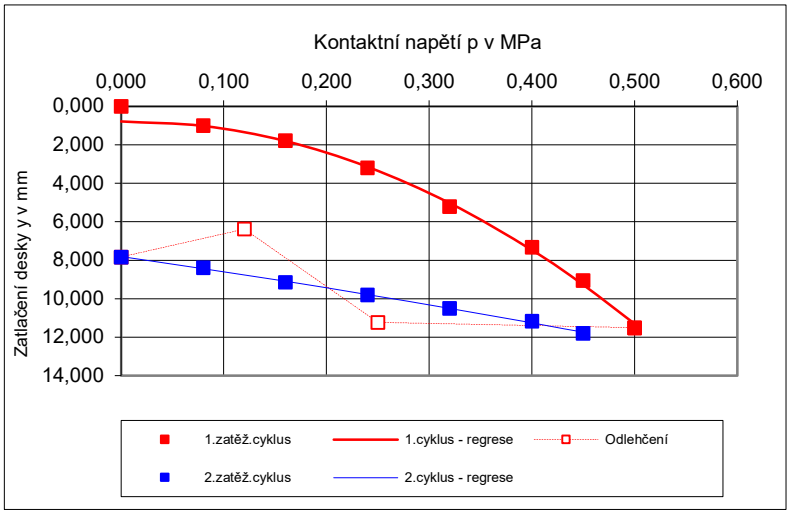

Průměr desky mm:	300
Teplota vzduchu °C:	15
Teplota vrstvy °C:	14

	1. cyklus	2. cyklus
p	y1	y2
MPa	mm	mm
0,00	0,00	7,82
1 0,08	1,00	8,38
2 0,16	1,78	9,14
3 0,24	3,20	9,80
4 0,32	5,20	10,50
5 0,40	7,32	11,16
6 0,45	9,04	11,80
7 0,50	11,50	
odlehčení		
1 0,25	11,22	
2 0,12	6,38	
3 0,00	7,82	

Stanovení modulu přetvárnosti			**1. cyklus**	**2. cyklus**
Regresní výpočet	*Konstanta*	*a0*	0,795	7,808
	Koeficienty	*a1*	-0,580	7,612
	R kvadrát	*a2*	43,163	2,492
Modul přetvárnosti	E_{def1}		**10,7**	**MPa**
	E_{def2}		**25,8**	**MPa**
	E_{def2}/E_{def1}		**2,40**	

Objednatel zkoušky: **HILDEBRANT CZ s.r.o**
Antoninův Důl 107
586 01 Jihlava

Zkoušel:

Místo zkoušky:

Protokol uzavřen dne: 21.05.2024

Vedoucí ZL :

Objednávka (zakázka): 045/2024/ZZ

poznámka: * data převzata od objednatele, laboratoř neodpovídá za relevantnost dat poskytnutých objednatelem.
**data převzata od subdodavatele ZL č.
*** v případě, že je jako vzorkař uveden objednatel, pak platí, že výsledky se vztahují ke vzorku tak, jak byl přijat do laboratoře.

Výsledky zkoušek se týkají pouze vzorků a protokol neznamená schválení výrobku orgánem udělujícím akreditaci ani žádným jiným orgánem.

Protokol může být reprodukován jedině celý, jinak s písemným souhlasem zkušební laboratoře. Protokol nebo jeho části nesmí být měněny.

Uvedená nejistota je rozšířená nejistota, která byla vypočtena s použitím koeficientu rozšíření 2, což odpovídá hladině spolehlivosti přibližně 95%.

Konec protokolu

CONSULTEST s.r.o., Medkova 4, 627 00 Brno;
ZL Znojmo, Dobšická 17, 669 02 Znojmo

L 1211

Kontrola zhutnění zemin a sypanin podle ČSN 72 1006

Příloha A Statická zatěžovací zkouška pro pozemní komunikace

Protokol o zkoušce č. **468/24/ZZ**

Výtisk č.: 1 2 3

Stavba: *	Telč
Stavební objekt: *	objízdná trasa
Konstrukční celek: *	zemní pláň
Specifikace materiálu: *	původní
Popis zkušebního místa:	km 0,290
Zkoušeno dne:	21.05.2024

Údaje o zkoušce

Zkušební zařízení: statická zatěžovací deska

Průměr desky mm: 300
Teplota vzduchu °C: 15
Teplota vrstvy °C: 14

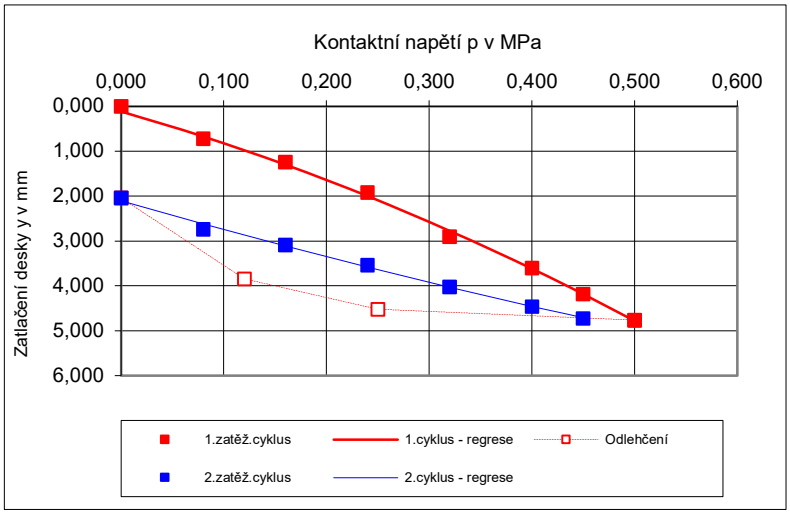

	1. cyklus	2. cyklus
p	y1	y2
MPa	mm	mm
0,00	0,00	2,04
1 0,08	0,72	2,74
2 0,16	1,24	3,08
3 0,24	1,92	3,54
4 0,32	2,90	4,02
5 0,40	3,60	4,46
6 0,45	4,18	4,72
7 0,50	4,76	
odlehčení		
1 0,25	4,52	
2 0,12	3,84	
3 0,00	2,04	

Stanovení modulu přetvárnosti			**1. cyklus**	**2. cyklus**
Regresní výpočet	*Konstanta*	*a0*	0,119	2,102
	Koeficienty	*a1*	6,472	6,581
	R kvadrát	*a2*	5,686	-1,749
Modul přetvárnosti	E_{def1}		**24,2**	**MPa**
	E_{def2}		**38,8**	**MPa**
	E_{def2}/E_{def1}		**1,61**	

Objednatel zkoušky: **HILDEBRANT CZ s.r.o**
Antoninův Důl 107
586 01 Jihlava

Zkoušel: [redacted]

Místo zkoušky:

Protokol uzavřen dne: 21.05.2024

Vedoucí ZL :

Objednávka (zakázka): 045/2024/ZZ

poznámka: * data převzata od objednatele, laboratoř neodpovídá za relevantnost dat poskytnutých objednatelem.
**data převzata od subdodavatele ZL č.
*** v případě, že je jako vzorkař uveden objednatel, pak platí, že výsledky se vztahují ke vzorku tak, jak byl přijat do laboratoře.

Výsledky zkoušek se týkají pouze vzorků a protokol neznamená schválení výrobku orgánem udělujícím akreditaci ani žádným jiným orgánem.

Protokol může být reprodukován jedině celý, jinak s písemným souhlasem zkušební laboratoře. Protokol nebo jeho části nesmí být měněny.

Uvedená nejistota je rozšířená nejistota, která byla vypočtena s použitím koeficientu rozšíření 2, což odpovídá hladině spolehlivosti přibližně 95%.

Konec protokolu

číslo zakázky : **2260/2024**
katastrální území : **Telč**
okres : **Jihlava**
lokalita : **Telč, Cihelna**
objednatel : **HILDEBRANDT CZ, s.r.o.**
Lublaňská 267/12, Vinohrady
120 00 Praha 2

Na základě objednávky firmy HILDEBRANDT CZ s.r.o. bylo provedeno výškové a polohopisné zaměření a vypočtení kubatur objízdné trasy v k.ú. Telč.

Systém zaměření - JTSK a Bpv

Předmět měření - Objízdná trasa, výhybny

Specifikace

Před započetím prací na rekonstrukci ulice Radkovská v Telči byla zaměřena objízdná trasa a nově zbudované výhybny.

- Plocha recyklátu komunikace- 5238,25 m^2
- Plocha recyklátu výhyben – 846,59 m^2
- Objem sanací výhyben- 205,54 m^3

Zaměřila firma - KV GEO s.r.o. , Polní 696/11 , 594 01 Velké Meziříčí
- GNSS Trimble R12i (S/N: 6150F00565)

Zpracování dat

Zaměření probíhalo v průběhu stavby června do srpna 2024.

Použité přístroje a software:

- MicroStation V8i, MGEO
- Atlas

tisk - plotr HP Designjet T525

Polní náčrty a ostatní zpracování výsledků měření jsou uloženy v archivu firmy KV GEO s.r.o.

Obsah elaborátu
1 – Technická zpráva (3x)
2 – Situační výkresy (3x)
3 – Seznam souřadnic (3x)
4

ve Velkém Meziříčí 11.12.2024 vypracova[redacted]

Náležitostmi a přesností odpovídá
právním předpisům
a požadavkům objednatele

Ověřil: [redacted]
Číslo ověření: **863/2024**
Datum: **11.12.2024**

Příloha č. 4 – Geodetické zaměření

REKAPITULACE

Označení	Staničení	Plocha	Objem
1	0,03	67,27	29,25
2	0,18	77,62	58,69
3	0,29	113,09	52,76
4	0,40	73,03	34,94
5	0,54	83,84	33,11
6	0,78	91,04	34,96
7	0,91	96,23	36,31
8	1,07	37,62	13,58
9+10	1,25	206,85	81,26
Celkem		**846,59**	**374,86**

1.

2.

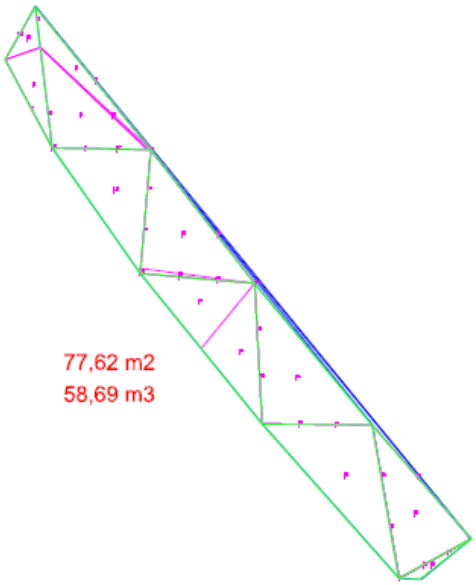

3.

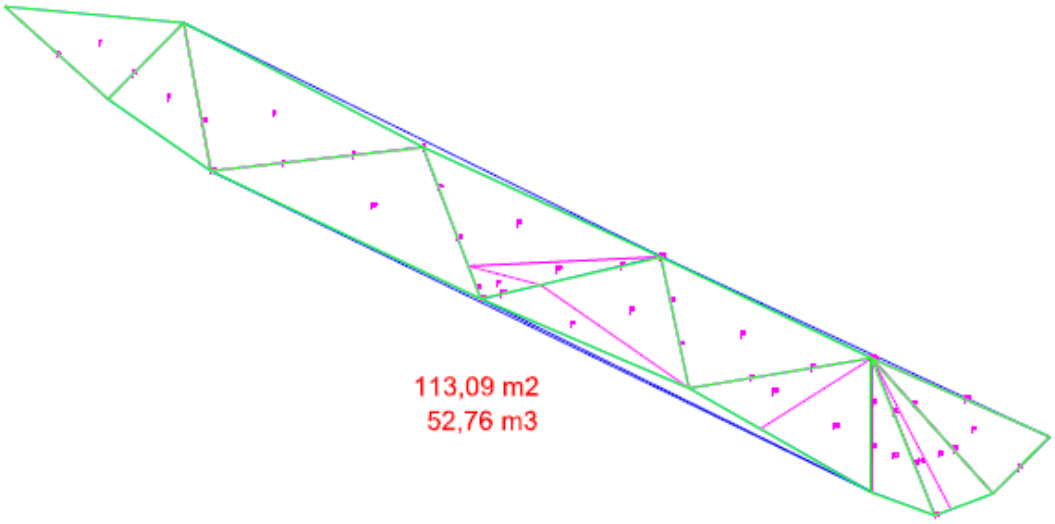

4.



73,03 m2
34,94 m3

5.

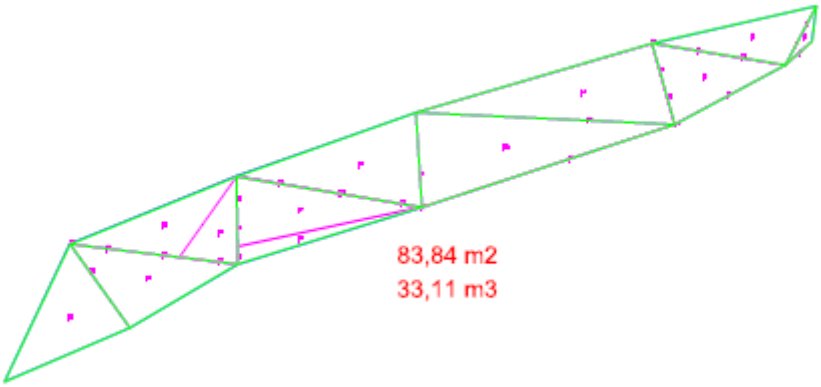

6.



7.

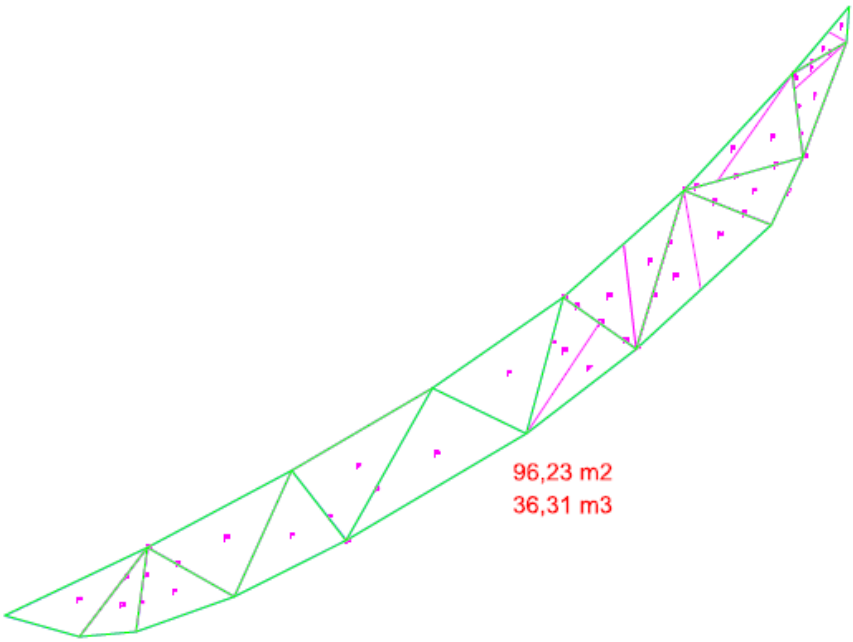

8.

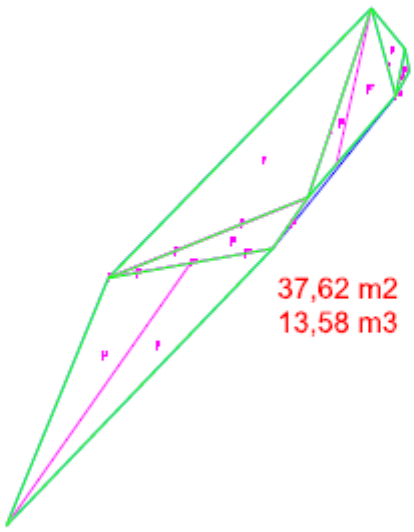

9. + 10.

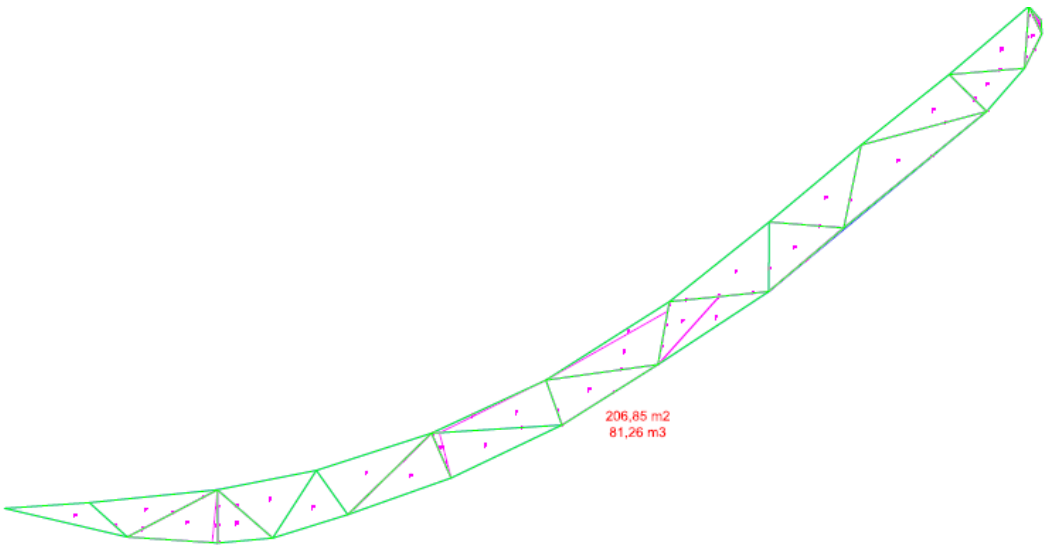

zaměření výhyben

Označení	Staničení	Plocha	Objem	tlouštka	rzp	zbýva/ rozdíl	
1	0,03	67,27	29,25	0,43	0,2	15,796	
2	0,18	77,62	58,69	0,76	0,2	43,166	
3	0,29	113,09	52,76	0,47	0,2	30,142	
4	0,40	73,03	34,94	0,48	0,2	20,334	
5	0,54	83,84	33,11	0,39	0,2	16,342	
6	0,78	91,04	34,96	0,38	0,2	16,752	
7	0,91	96,23	36,31	0,38	0,2	17,064	
8	1,07	37,62	13,58	0,36	0,2	6,056	
9+10	1,25	206,85	81,26	0,39	0,2	39,89	
zaměření		846,59	374,86			205,542	sanace objem
rzp		750					
navýšení		96,59					
		175,4					

Evidenční list změny stavby

Evidenční číslo a název Stavby:	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS:	Číslo ZBV:
III/40618 Telč, ul. Radkovská Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): **SO 301.1 Dešťová kanalizace - úsek 1 (Město + Kraj)** Číslo a název podobjektu/rozpočtu: **SO 301.1 Dešťová kanalizace - úsek 1 (Město + Kraj)**	**SO 301.1** **01**	**01**

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 29. 4. 2024 - Kraj a 30. 4. 2024 - Město (dále jen Smlouva):

Objednatel: Kraj Vysočina a město Telč

Zhotovitel: IMOS Brno, a.s.

Popis Změny:

[redacted]

Údaje v Kč bez DPH:

	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
celkem	[redacted]		

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:			
Projektant (autorský dozor)	jméno	datum	podpis
Technický dozor investora	jméno	datum	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny výše a v přiložené Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel	jméno		datum	podpis
Zhotovitel	jméno	[redacted]	datum	podpis

SOUPIS PRACÍ

Stavba: **21007 III/40618 Telč, ul. Radkovská, PD**

Objekt: **SO301 Dešťová kanalizace**

Rozpočet: **SO301.1 Dešťová kanalizace - úsek 1 (Město+Kraj)**

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: IMOS Brno,a.s.

Základní cena: [redacted]

Cena celková:

DPH:

Cena s daní:

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek:

Náklad na měrnou jednotku:

Vypracoval zadání: **Vypracoval nabídku:**

Datum zadání: **Datum vypracování nabídky:**

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 21007 III/40618 Telč, ul. Radkovská, PD
Objekt: SO301 Dešťová kanalizace
Rozpočet: SO301.1 Dešťová kanalizace - úsek 1 (Město+Kraj)

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
[redacted]							

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 21007 III/40618 Telč, ul. Radkovská, PD
Objekt: SO301 Dešťová kanalizace
Rozpočet: SO301.1 Dešťová kanalizace - úsek 1 (Město+Kraj)

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
[redacted]							

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	**21007**	**III/40618 Telč, ul. Radkovská, PD**
Objekt:	**SO301**	**Dešťová kanalizace**
Rozpočet:	**SO301.1**	**Dešťová kanalizace - úsek 1 (Město+Kraj)**

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 21007 III/40618 Telč, ul. Radkovská, PD
Objekt: SO301 Dešťová kanalizace
Rozpočet: SO301.1 Dešťová kanalizace - úsek 1 (Město+Kraj)

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
[redacted]							

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 21007 III/40618 Telč, ul. Radkovská, PD
Objekt: SO301 Dešťová kanalizace
Rozpočet: SO301.1 Dešťová kanalizace - úsek 1 (Město+Kraj)

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
[redacted]							

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 21007 III/40618 Telč, ul. Radkovská, PD
Objekt: SO301 Dešťová kanalizace
Rozpočet: SO301.1 Dešťová kanalizace - úsek 1 (Město+Kraj)

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
[redacted]							

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 21007 III/40618 Telč, ul. Radkovská, PD
Objekt: SO301 Dešťová kanalizace
Rozpočet: SO301.1 Dešťová kanalizace - úsek 1 (Město+Kraj)

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
[redacted]							

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 21007 III/40618 Telč, ul. Radkovská, PD
Objekt: SO301 Dešťová kanalizace
Rozpočet: SO301.1 Dešťová kanalizace - úsek 1 (Město+Kraj)

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
[redacted]							

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 21007 III/40618 Telč, ul. Radkovská, PD
Objekt: SO301 Dešťová kanalizace
Rozpočet: SO301.1 Dešťová kanalizace - úsek 1 (Město+Kraj)

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
[redacted]							

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 21007 III/40618 Telč, ul. Radkovská, PD
Objekt: SO301 Dešťová kanalizace
Rozpočet: SO301.1 Dešťová kanalizace - úsek 1 (Město+Kraj)

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
[redacted]							

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 21007 III/40618 Telč, ul. Radkovská, PD
Objekt: SO301 Dešťová kanalizace
Rozpočet: SO301.1 Dešťová kanalizace - úsek 1 (Město+Kraj)

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
[redacted]							

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 21007 III/40618 Telč, ul. Radkovská, PD
Objekt: SO301 Dešťová kanalizace
Rozpočet: SO301.1 Dešťová kanalizace - úsek 1 (Město+Kraj)

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
[redacted]							

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 21007 III/40618 Telč, ul. Radkovská, PD
Objekt: SO301 Dešťová kanalizace
Rozpočet: SO301.1 Dešťová kanalizace - úsek 1 (Město+Kraj)

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
[redacted]							

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 21007 III/40618 Telč, ul. Radkovská, PD
Objekt: SO301 Dešťová kanalizace
Rozpočet: SO301.1 Dešťová kanalizace - úsek 1 (Město+Kraj)

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
[redacted]							

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 21007 III/40618 Telč, ul. Radkovská, PD
Objekt: SO301 Dešťová kanalizace
Rozpočet: SO301.1 Dešťová kanalizace - úsek 1 (Město+Kraj)

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
[redacted]							

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 21007 III/40618 Telč, ul. Radkovská, PD
Objekt: SO301 Dešťová kanalizace
Rozpočet: SO301.1 Dešťová kanalizace - úsek 1 (Město+Kraj)

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
[redacted]							

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	**21007**	**III/40618 Telč, ul. Radkovská, PD**
Objekt:	**SO301**	**Dešťová kanalizace**
Rozpočet:	**SO301.1**	**Dešťová kanalizace - úsek 1 (Město+Kraj)**

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 21007 III/40618 Telč, ul. Radkovská, PD
Objekt: SO301 Dešťová kanalizace
Rozpočet: SO301.1 Dešťová kanalizace - úsek 1 (Město+Kraj)

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
[redacted]							

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 21007 III/40618 Telč, ul. Radkovská, PD
Objekt: SO301 Dešťová kanalizace
Rozpočet: SO301.1 Dešťová kanalizace - úsek 1 (Město+Kraj)

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
[redacted]							

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 21007 III/40618 Telč, ul. Radkovská, PD
Objekt: SO301 Dešťová kanalizace
Rozpočet: SO301.1 Dešťová kanalizace - úsek 1 (Město+Kraj)

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
[redacted]							

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 21007 III/40618 Telč, ul. Radkovská, PD
Objekt: SO301 Dešťová kanalizace
Rozpočet: SO301.1 Dešťová kanalizace - úsek 1 (Město+Kraj)

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
[redacted]							

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 21007 III/40618 Telč, ul. Radkovská, PD
Objekt: SO301 Dešťová kanalizace
Rozpočet: SO301.1 Dešťová kanalizace - úsek 1 (Město+Kraj)

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
[redacted]							

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 21007 III/40618 Telč, ul. Radkovská, PD
Objekt: SO301 Dešťová kanalizace
Rozpočet: SO301.1 Dešťová kanalizace - úsek 1 (Město+Kraj)

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
[redacted]							

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 21007 III/40618 Telč, ul. Radkovská, PD
Objekt: SO301 Dešťová kanalizace
Rozpočet: SO301.1 Dešťová kanalizace - úsek 1 (Město+Kraj)

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
[redacted]							

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 21007 III/40618 Telč, ul. Radkovská, PD
Objekt: SO301 Dešťová kanalizace
Rozpočet: SO301.1 Dešťová kanalizace - úsek 1 (Město+Kraj)

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
[redacted]							

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 21007 III/40618 Telč, ul. Radkovská, PD
Objekt: SO301 Dešťová kanalizace
Rozpočet: SO301.1 Dešťová kanalizace - úsek 1 (Město+Kraj)

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
[redacted]							

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 21007 III/40618 Telč, ul. Radkovská, PD
Objekt: SO301 Dešťová kanalizace
Rozpočet: SO301.1 Dešťová kanalizace - úsek 1 (Město+Kraj)

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
[redacted]							

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 21007 III/40618 Telč, ul. Radkovská, PD
Objekt: SO301 Dešťová kanalizace
Rozpočet: SO301.1 Dešťová kanalizace - úsek 1 (Město+Kraj)

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
[redacted]							

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 21007 III/40618 Telč, ul. Radkovská, PD
Objekt: SO301 Dešťová kanalizace
Rozpočet: SO301.1 Dešťová kanalizace - úsek 1 (Město+Kraj)

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
[redacted]							

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 21007 III/40618 Telč, ul. Radkovská, PD
Objekt: SO301 Dešťová kanalizace
Rozpočet: SO301.1 Dešťová kanalizace - úsek 1 (Město+Kraj)

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
[redacted]							

ZBV č. 01 Dešťová kanalizace - úsek 1

Stavba: 21007, III/40618 Telč, ul. Radkovská, PD

Objekt: SO301, Dešťová kanalizace

Rozpočet: SO301.1, Dešťová kanalizace - úsek 1 (Město+Kraj)

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: IMOS Brno,a.s.

Rozpočet:

Základní cena:

Cena - celkem:

DPH:

Cena s daní:

Z toho rozhod.hmoty:

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek:

Náklad na měrnou jedn.:

[redacted]

ZBV - celkem:

Cena - celkem:

DPH:

Cena s daní:

[redacted]

Vypracoval zadání:

Datum zadání:

ZBV vypracoval:

Datum vypracování ZBV 27.02.2026

Položky ZBV č. 01

Stavba: 21007, III/40618 Telč, ul. Radkovská, PD
Objekt: SO301, Dešťová kanalizace
Rozpočet: SO301.1, Dešťová kanalizace - úsek 1 (Město+Kraj)

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
[redacted]							

Položky ZBV č. 01

Stavba: 21007, III/40618 Telč, ul. Radkovská, PD
Objekt: SO301, Dešťová kanalizace
Rozpočet: SO301.1, Dešťová kanalizace - úsek 1 (Město+Kraj)

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem

Položky ZBV č. 01

Stavba: 21007, III/40618 Telč, ul. Radkovská, PD
Objekt: SO301, Dešťová kanalizace
Rozpočet: SO301.1, Dešťová kanalizace - úsek 1 (Město+Kraj)

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem

Položky ZBV č. 01

Stavba: 21007, III/40618 Telč, ul. Radkovská, PD
Objekt: SO301, Dešťová kanalizace
Rozpočet: SO301.1, Dešťová kanalizace - úsek 1 (Město+Kraj)

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
[redacted]							

Položky ZBV č. 01

Stavba: 21007, III/40618 Telč, ul. Radkovská, PD
Objekt: SO301, Dešťová kanalizace
Rozpočet: SO301.1, Dešťová kanalizace - úsek 1 (Město+Kraj)

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
[redacted]							

Položky ZBV č. 01

Stavba: 21007, III/40618 Telč, ul. Radkovská, PD
Objekt: SO301, Dešťová kanalizace
Rozpočet: SO301.1, Dešťová kanalizace - úsek 1 (Město+Kraj)

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
[redacted]							

Položky ZBV č. 01

Stavba: 21007, III/40618 Telč, ul. Radkovská, PD
Objekt: SO301, Dešťová kanalizace
Rozpočet: SO301.1, Dešťová kanalizace - úsek 1 (Město+Kraj)

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
[redacted]							

FOTODOKUMENTACE – SO 301.1 – ZBV 01
Dešťová kanalizace - úsek 1

Změna zatřídění horniny

Změna zatřídění horniny

Změna zatřídění horniny

přítomnost dalších IS se kterými PD neuvažoval

Nalezená chránička vodovodního přivaděče

IS nalezené v trase nové kanalizace a musely být přeloženy

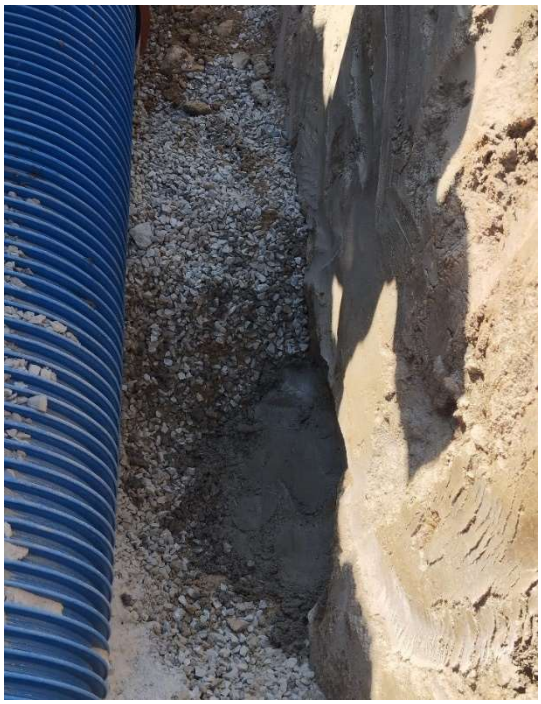

„zablombování“ staré kanalizace/ výšková kolize s novou realizovanou kanalizací

Výšková kolize vodovodu s budovaným vodovodem

číslo zakázky : **2260/2024**
katastrální území : **Telč**
okres : **Jihlava**
lokalita : **Telč, Radkovská**
objednatel : **HILDEBRANDT CZ, s.r.o.**
Lublaňská 267/12, Vinohrady
120 00 Praha 2

Na základě objednávky firmy HILDEBRANDT CZ s.r.o. bylo provedeno výškové a polohopisné zaměření dočasného suchovodu, odstraněné kanalizace a mimořádných výkopů kanalizace k.ú. Telč.

Systém zaměření - JTSK a Bpv

Předmět měření - suchovod, odstraněná kanalizace, mimořádné výkopy

Specifikace

Dočasný suchovod byl napojen na nové vedení vodovodu, délka suchovodu 132,12 metru.
Odstraněná kanalizace ve dvou úsecích- 0,013-0,139 a 0,262-0,323.
Zaměřené výkopy byly realizovány z důvodu křížení s ostatními inženýrskými sítěmi.

Objem zaměřených výkopů cca 400,6 m^3

Zaměřila firma - KV GEO s.r.o. , Polní 696/11 , 594 01 Velké Meziříčí
- GNSS Trimble R12i (S/N: 6150F00565)

Zpracování dat

Zaměření probíhalo v průběhu stavby od srpna do listopadu 2024

Použité přístroje a software:

- MicroStation V8i, MGEO
- Atlas

tisk - plotr HP Designjet T525

Polní náčrty a ostatní zpracování výsledků měření jsou uloženy v archivu firmy KV GEO s.r.o.

Obsah elaborátu
1 – Technická zpráva (3x)
2 – Situační výkresy (3x)
3 – Seznam souřadnic (3x)
4

ve Velkém Meziříčí 11.12.2024 vypracoval [redacted]

Náležitostmi a přesností odpovídá
právním předpisům
a požadavkům objednatele

Ověřil: [redacted]
Číslo ověření: **863/2024**
Datum: **11.12.2024**

číslo zakázky : **2260/2024**
katastrální území : **Telč**
okres : **Jihlava**
lokalita : **Telč Radkovská**
objednatel : **HILDEBRANDT CZ, s.r.o.**
Lublaňská 267/12, Vinohrady
120 00 Praha 2

SEZNAM SOUŘADNIC PODROBNÝCH BODŮ : S-JTSK, Bpv

ČÍSLO BODU X Y Z POZNÁMKA

(Číslování podle zakázky)

1,681665.100,1153438.570,512.03,suchovod
2,681666.032,1153438.570,514.18,suchovod
3,681671.723,1153441.620,514.23,suchovod
4,681677.853,1153439.121,514,37,suchovod
5,681680.782,1153434.481,514.51,suchovod
6,681673.248,1153426.130,513.48,suchovod
7,681674.585,1153422.728,513.14,suchovod
8,681688.163,1153411.816,512.50,suchovod
9,681715.767,1153393.119,512.80,suchovod
10,681716.963,1153393.293,512.87,suchovod
11,681724.418,1153402.588,513.49,suchovod
12,681730.377,1153399.002,513.70,suchovod
13,681727.240,1153394.248,513.76,suchovod
14,681735.461,1153387.816,513.71,suchovod
15,681737.981,1153385.854 513.58,suchovod
16,681739.498,1153383.972,513.65,suchovod
17,681736.890,1153380.150,512.37,suchovod
18,681849.560,1153264.569,517.07,ostraněná kanalizace
19,681833.851,1153280.139,516.70,ostraněná kanalizace
20,681803.818,1153309.683,515.86,ostraněná kanalizace
21,681792.800,1153320.522,515.49,ostraněná kanalizace
22,681779.036,1153332.074,514.02,ostraněná kanalizace
23,681762.678,1153345.684,513.25,ostraněná kanalizace
24,681757.030,1153349.823,513.00,ostraněná kanalizace
25,681657.919,1153486.900,512.40,ostraněná kanalizace
26,681658.067,1153468.928,512.07,ostraněná kanalizace
27,681658.516,1153456.582,511.84,ostraněná kanalizace
28,681660.371,1153446.545,511.50,ostraněná kanalizace
29,681664.310,1153436.546,511.40,ostraněná kanalizace
30,681669.309,1153428.153,511.11,ostraněná kanalizace
31,681642.284,1153434.225,510.51,hrana výkopu
32,681640.980,1153436.992,510.54,hrana výkopu
33,681642.858,1153437.709,510.60,hrana výkopu
34,681644.198,1153434.959,510.55,hrana výkopu
35,681663.782,1153435.929,512.60,hrana výkopu
36,681667.479,1153437.456,514.19,hrana výkopu
37,681665.802,1153440.979,514.28,hrana výkopu
38,681662.069,1153439.544,512.74,hrana výkopu
39,681682.128,1153401.288,511.80,hrana výkopu
40,681686.277,1153398.497,511.85,hrana výkopu
41,681692.350,1153407.669,511.51,hrana výkopu
42,681688.182,1153410.472,511.53,hrana výkopu
43,681711.291,1153383.714,512.78,hrana výkopu
44,681713.712,1153381.942,512.81,hrana výkopu
45,681716.996,1153386.963,512.93,hrana výkopu
46,681714.648,1153388.687,512.95,hrana výkopu
47,681700.644,1153393.192,512.80,hrana výkopu
48,681700.736,1153398.703,512.80,hrana výkopu
49,681698.226,1153394.968,512.83,hrana výkopu
50,681703.306,1153396.820,512.85,hrana výkopu
51,681736.74,1153377.27,514.40,hrana výkopu
52,681738.77,1153380.24,514.48,hrana výkopu
53,681735.18,1153382.56,514.46,hrana výkopu
54,681733.31,1153379.69,514.42,hrana výkopu
55,681668.07,1153418.04,512.76,hrana výkopu
56,681666.97,1153419.71,512.83,hrana výkopu
57,681674.30,1153424.93,513.13,hrana výkopu
58,681675.40,1153423.27,513.02,hrana výkopu
59,681656.05,1153434.61,512.70,hrana výkopu
60,681654.39,1153438.32,512.79,hrana výkopu
61,681649.04,1153435.92,512.10,hrana výkopu
62,681651.01,1153432.44,511.98,hrana výkopu

Náležitostmi a přesností odpovídá
právním předpisům
a požadavkům objednatele

Ověřil: [redacted]
Číslo ověření: **863/2024**
Datum: **11.12.2024**

RUŠENÁ KANALIZACE

DOČASNÝ SUCHOVOD

HLOUBKA CCA 2M

HLOUBKA CCA 2,5M

HLOUBKA CCA 2,5M

HLOUBKA CCA 3M

HLOUBKA CCA 1,2M

HLOUBKA CCA 5,5M

HLOUBKA CCA 4,5M

HLOUBKA CCA 2,5M

NAPOJENÍ NOVÉHO VODOVODU

NAPOJENÍ NOVÉHO VODOVODU

RUŠENÁ KANALIZACE

Název stavby:	Telč Radkovská Zaměření výkopů, odstraněné kanalizace, suchovodu	KVGEO s.r.o. Polní 696/11, 594 01 Velké Meziříčí	
Geodetická firma:	KV GEO s.r.o.	Číslo ověření:	863/2024
Zpracoval:	[redacted]	Číslo položky ČKZ:	2745
Ověřil:	[redacted]	Datum ověření:	11.12.2024
		Datum zaměření:	08-11/2024
		Kód charakteristiky přesnosti 3	
		Formát výkresu:	594x630 mm
Odběratel:	HILDEBRANDT CZ, s.r.o.	Měřítko: 1:400	Číslo výkresu: 1
	Lublaňská 267/12, Vinohrady, 120 00 Praha 2	S-JTSK	Bpv

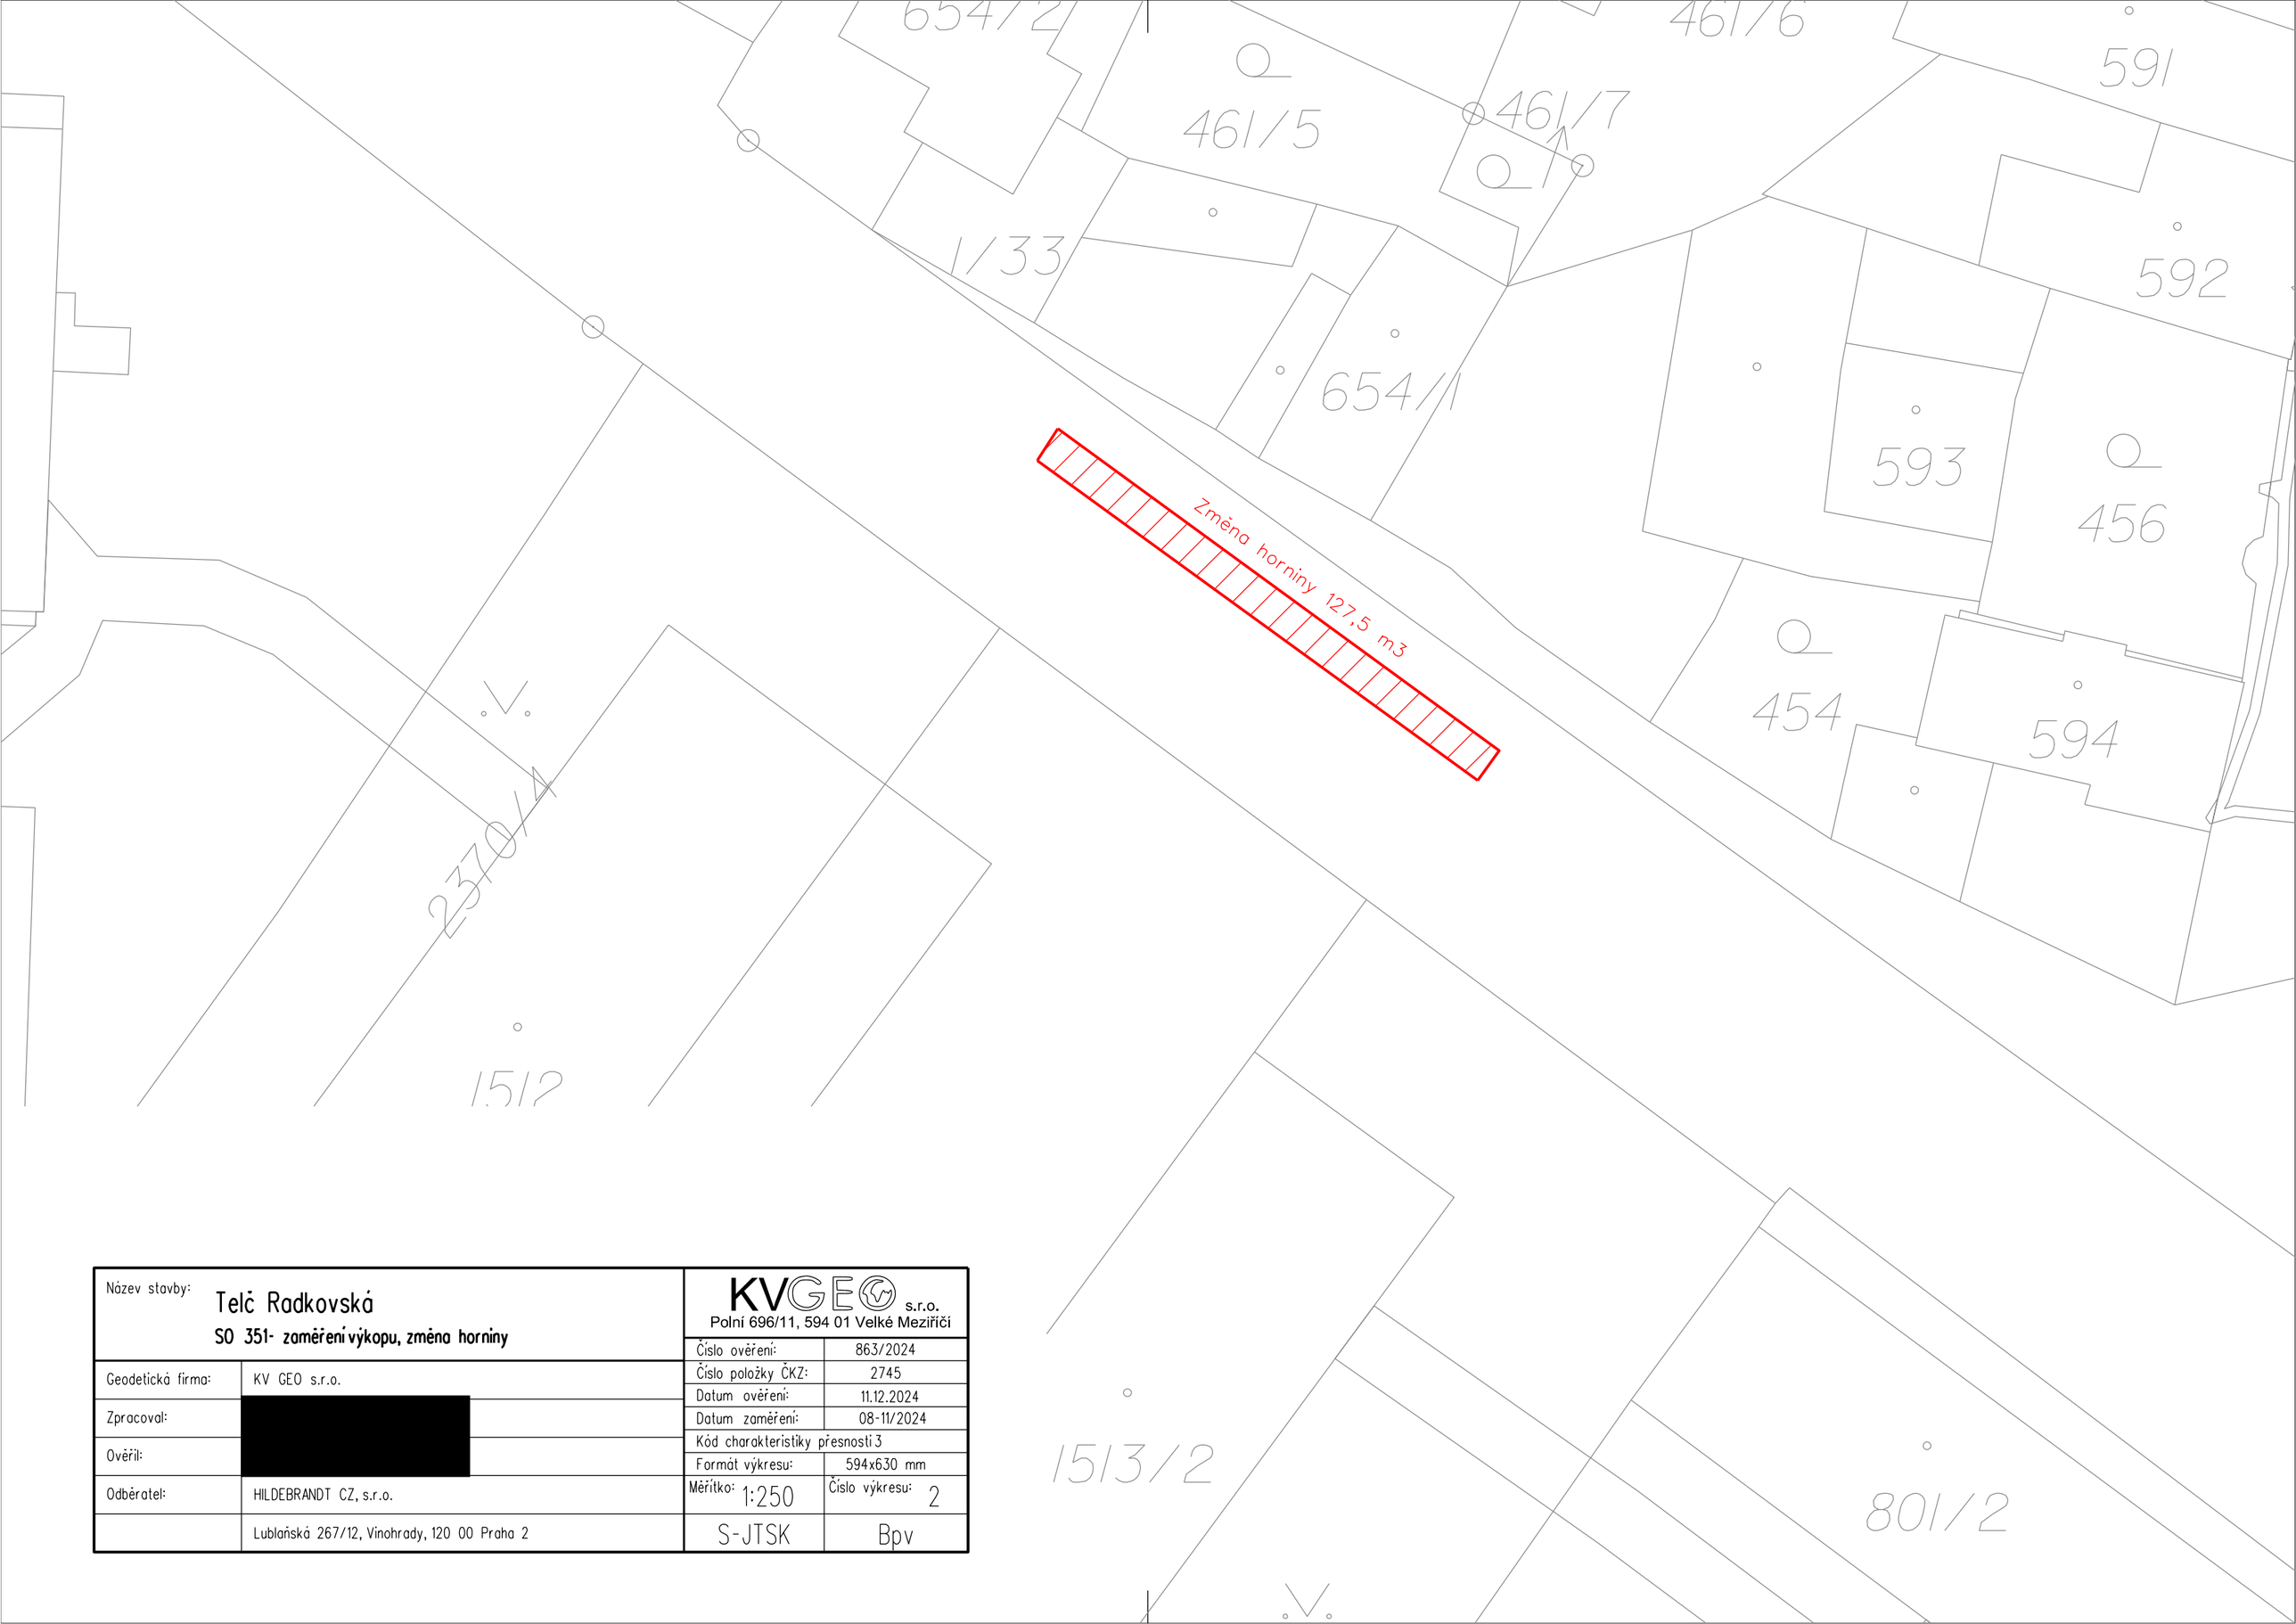

Název stavby:	Telč Radkovská SO 351- zaměření výkopu, změna horniny	KVGEO s.r.o. Polní 696/11, 594 01 Velké Meziříčí	
		Číslo ověření:	863/2024
Geodetická firma:	KV GEO s.r.o.	Číslo položky ČKZ:	2745
Zpracoval:	[redacted]	Datum ověření:	11.12.2024
		Datum zaměření:	08-11/2024
Ověřil:		Kód charakteristiky přesnosti 3	
		Formát výkresu:	594x630 mm
Odběratel:	HILDEBRANDT CZ, s.r.o.	Měřítko: 1:250	Číslo výkresu: 2
	Lublaňská 267/12, Vinohrady, 120 00 Praha 2	S-JTSK	Bpv

HILDEBRANT CZ s.r.o.
Ing. Jaroslav Kohout
Lublaňská 267/12
120 00 Praha 2, Vinohrady

Váš dopis zn.:	Ze dne:	Naše značka:	Vyřizuje:	Tel./E-mail	Místo, datum
		JH/2024-122	[redacted]		Habrovany 08.11.2024

Stavba: III/40618 Telč, ul. Radkovská

Věc: **Vyjádření geotechnika k zemním pracím na kanalizaci**

Na základě požadavku zástupce zhotovitele výše uvedené stavby Ing. Kohouta byla provedena kontrola zemních prací na kanalizaci. Na úseku kolem šachty Š5 cca v km 0,155-0,180 a v km Š5-Š12 (dl. 13 m) byla zastižena skalní hornina – zvětralý migmatit viz obr. 1.

Obr. 1 Snímek výkopu z odkopu pro kanalizaci.

Těžba je možná jen za pomoci těžkého bagru se skalní lžící, lze využít také hydraulického kladiva. Migmatity se vyskytují relativně mělce pod úrovní terénu cca v hl. do 1,5 m p.t. Tyto velmi pevné horniny je již nutno zařadit do II. a II. tř. těžitelnosti. Vzhledem k vyšší míře zvětrání a vzdálenosti diskontinuit do 150 mm je však lze zařadit pouze do II. tř. těžitelnosti dle ČSN 73 6133.

Objem horniny bude geodeticky zaměřen. Pro další konzultace jsem plně k dispozici.

S pozdravem [redacted]

geotechnik specialista,
inženýrský geolog a hydrog [redacted]

[redacted]

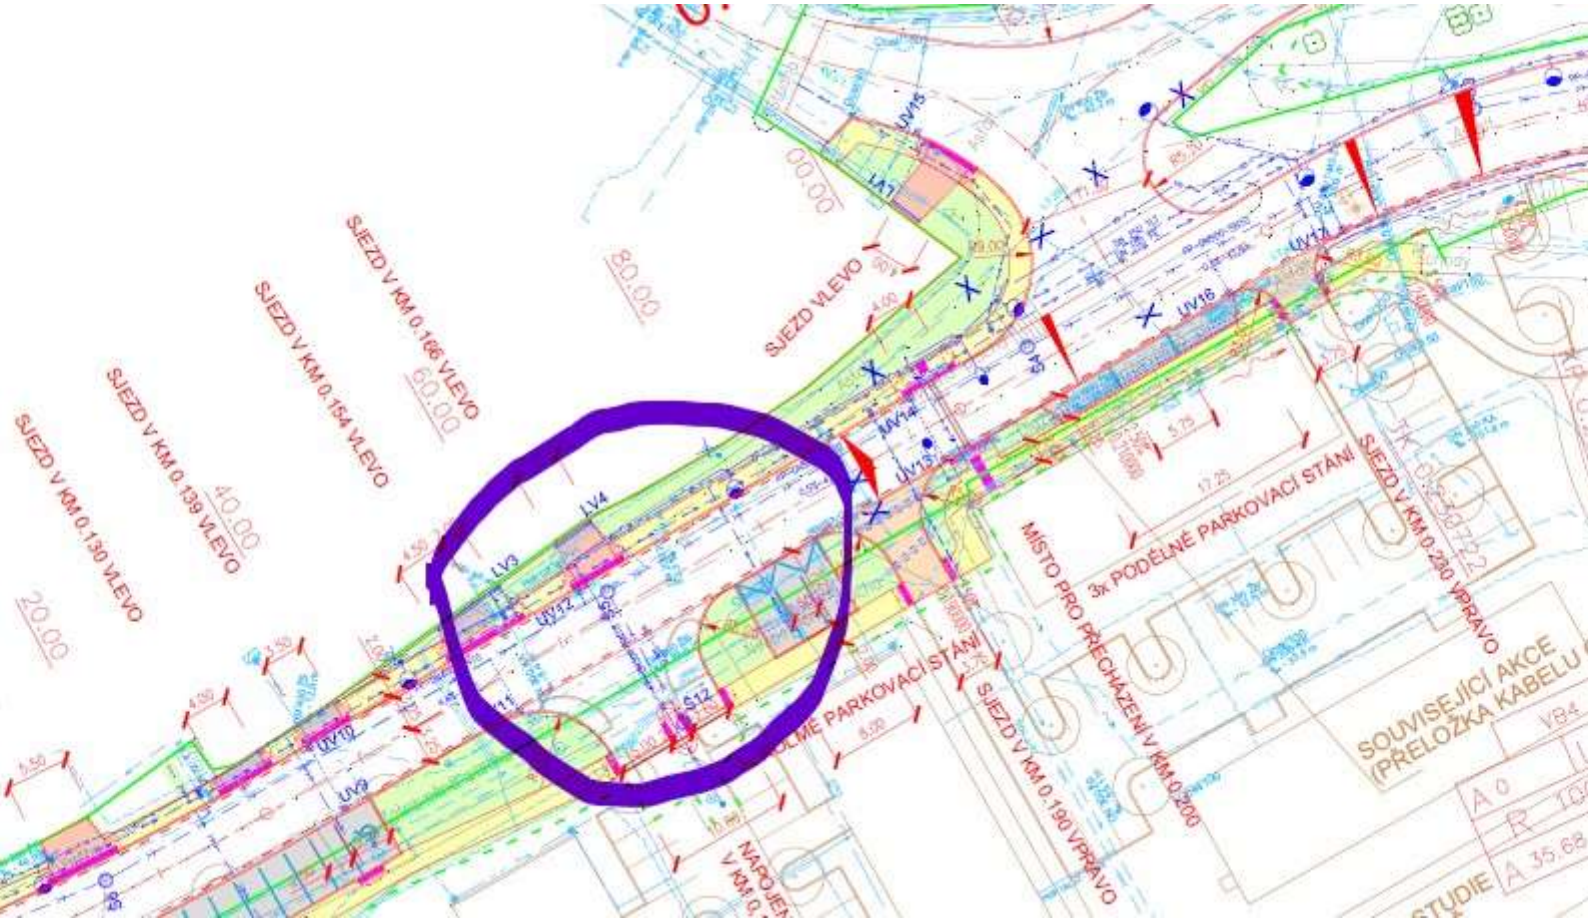
SJEZD V KM 0,166 V LEVO
SJEZD V KM 0,154 V LEVO
SJEZD V KM 0,139 V LEVO
SJEZD V KM 0,130 V LEVO
SJEZD V LEVO
3x PODÉLNÉ PARKOVACÍ STÁNÍ
MÍSTO PRO PŘECHÁZENÍ V KM 0,200
SJEZD V KM 0,190 V PRAVO
SJEZD V KM 0,230 V PRAVO
SOUVISEJÍCÍ AKCE
(PŘELOŽKA KABELU
LV3
LV4
UV12
UV13
UV14
UV15
UV16
UV17
S12
LA1
20.00
40.00
60.00
80.00
00.00

IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno

Kraj Vysočina
Žižkova 1882/57
586 01 Jihlava

Vyřizuje	E-mail/linka	Brno
[redacted] Přípravář stavby/technik kvality	[redacted]	22.8.2024

Oznámení víceprací stavby „III/40618 Telč, ul. Radkovská“

Na základě uzavřené Smlouvy o dílo č. 168500 ze dne 29.4.2024, čl. 4 – Cenové ujednání, pod. čl. 4.8., **Vám tímto oznamujeme vznik dodatečných stavebních prací.**

Popis:
Avizovaná vícepráce vznikla u stavebního objektu SO 351.4 – Přeložka vodovodu. Jedná se o přeložku vodovodního přivaděče DN 250, který zásobuje celou lokalitu Města Telče. V průběhu realizace odstávky předmětného potrubí bylo zjištěno, že druhý vodovodní přivaděč není kapacitně schopen pokrýt kompletní spotřebu vody města. Z důvodu zajištění dodávky pitné vody vznesl provozovatel VAS a.s. požadavek na vytvoření tzv. baypassu/ suchovodu na montovaném vodovodním přivaděči a tím, alespoň částečně pokryl deficit v dodávce pitné vody.

Dále oznamuje vznik dalších víceprací na stavbě ve formě zvýšených zemních prací souvisejících s realizací stavebních objektů kanalizace a vodovodů. Jedná se převážně o zemní práce, které vznikly při poruchách stávajícího vodovodu, či řešení kolizních situací s jinými sítěmi, popřípadě rozšíření montážních jam (viz zápis v SD). Dále při realizaci výstavby inženýrských sítí došlo k odstraňování stávajících kanalizací či revizních šachet, které byly v trase budovaných sítí.

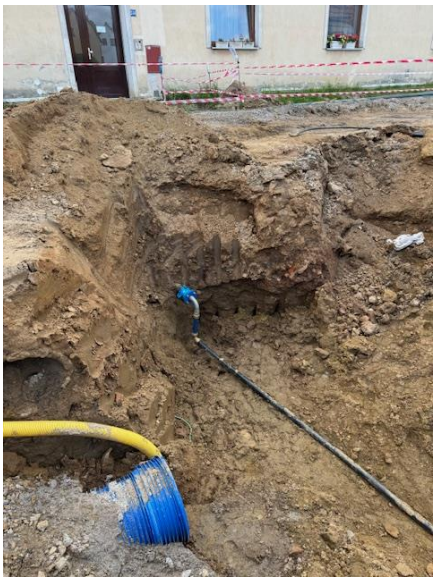

Z uvedených důvodu žádáme o projednání a odsouhlasení stavebních víceprací a materiálů, které nebyly v původních zadávacích podmínkách. Potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností a na základě požadavku správce sítě. Oceněný soupis prací bude předložen.

Předem děkuji za kladné vyřízení a jsem s pozdravem

[redacted]

HSV Žabčice

[redacted]

Vyjádření AD k vícepracím dne 12.12.2024
Doplněna odpověď zhotovitele 12.12.2024
Odpověď AD 13.12.2024

- **SO182 Úprava objízdné komunikace**

- Doložit vypočet u poplatků za skládku (17 05 04 VYTĚŽENE ZEMINY A HORNINY - I. TŘIDA TĚŽITELNOSTI) v nove verzi upraveno
Bez připomínek
- ODSTRANĚNI KRYTU ZPEVNĚNYCH PLOCH S ASFALTOVYM POJIVEM hodnota za vícepráce by měla byt 96,59*0,1=9,659 m3 (uvedeno 11,591 jak bylo spočítáno?) zjistím a upravíme ve final verzi
Bude zkontrolováno po doloženi
- ODSTRANĚNI PODKLADŮ ZPEVNĚNYCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENEHO hodnota za vícepráce by měla byt 96,59*0,2*1,17=22,602m3 (uvedeno 290,202 jak bylo spočítáno?) zde uvažováno s odstraněním sanaci výhyben– navýšeni kubatur ŠD popíši v následně ve finální verzi
Bez připomínek
- ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I
vypočet? tl. vrstvy? Jedna se o výkop pro sanace výhyben– vypočet vychází ze zaměřeni geodeta, v návrhu jsem zapomněl přiložit geodet zaměřeni, ve finální verzi bude zasláno. Omlouvám se
Bez připomínek

- **SO301 Dešťová kanalizace**

- U položek zemních prací uvést vypočet množství (není poznat, jestli je větší množství z důvodu délky kanalizace, šířky rýhy nebo hloubky kanalizace, jedna se o velký narůst oproti projektu) jedna se o výkopy které vznikly při výškových kolizích kanalizace s ostatními IS + přeložkami (plyn, vodovod, cetin …) a pro přidané šachty (doloženo geodet zaměřením)
Doloženy vypočet některých výkopů víceprací se překrývá s napočítanými výkopy v PDPS za hloubeni rýh pro novou kanalizaci a vodovod
2*3*2,5 "Šachta Š17" kolize s plynovodem nova – 15m3
Odečet rýhy kanalizace 2,3m (dl.)*1,5m (hl.)*1,3m (š.)=4,48m3
Celkem=15-4,48=10,52m3
4*4*5,5 "Šachta Š18" nova - 88m3
Odečet rýhy vodovodu DN 100 - 4,0m (dl.)*1,30(hl.)*0,6m(š.)=3,12m3
Celkem=88-3,12=84,88m3
2*2*1,5 "Šachta původní kanalizace" – 6m3
Celkem=6m3
9*2*1,2 "prodlouženi kanalizace, napojeni sídliště" – 21,60m3
Odečet rýhy vodovodu DN100 – 2,0m (dl.)*1,20(hl.)*0,6m(š.)=1,44m3
Odečet rýhy vodovodu DN250 – 2,0m (dl.)*1,20(hl.)*1,0m(š.)=2,40m3
Odečet rýhy kanalizace 2,0m (dl.)*1,2m (hl.)*1,3m (š.)=3,12m3
Celkem=21,6-1,44-2,40-3,12=14,64m3
5*11*3 výšková kolize s vodovodem – 165m3
Odečet rýhy kanalizace 5,0m (dl.)*2,75m (hl.)*1,3m (š.)=17,87m3
Odečet rýhy vodovodu DN100 – 5,0m (dl.)*1,30(hl.)*0,6m(š.)=3,90m3
Odečet rýhy vodovodu DN250 – 5,0m (dl.)*1,30(hl.)*1,0m(š.)=6,50m3
Celkem=165-17,87-3,90-6,50=136,73m3
3*4,5*2,5 výšková kolize s vodovodem – 33,75m3
Odečet rýhy kanalizace 3,0m (dl.)*2,68m (hl.)*1,3m (š.)=10,45m3

Celkem=33,75-10,45=23,30m3
3*6*2,5 výšková kolize s teplovodem – 45,00m3
Odečet rýhy kanalizace 3,0m (dl.)*2,90m (hl.)*1,3m (š.)=11,31m3
Odečet rýhy vodovodu DN100 – 6,0m (dl.)*1,30(hl.)*0,6m(š.)=4,68m3
Celkem=45,00-11,31-4,68=29,01m3
35*5*1,5 přípojky k nemovitostem – 26,25
Celkem=26,25m3
CELKOVÉ MNOŽSTVÍ = 10,52+84,88+6+14,64+136,73+23,30+29,01+26,25=331,33m3
- HLOUBENI RYH ŠIŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II uvést vypočet a doložit geodetické zaměřeni
ano bude zasláno)
Bude zkontrolováno po doloženi
- ULOŽENI SYPANINY DO NASYPŮ V AKTIV ZONĚ SE ZHUT DO 100% PS předpokládám že se jedná o zasypanou rýhu po neprovedené trase Š5-Š12. Posun sítě o 3 m mimo plánovanou trasu byl z důvodu vodovodu DN250? Aktivní zóna by měla byt v objektu SO 102
jednalo se o zasyp montážních jam po kolizi, po jednáni s tdi změněno na zasyp z nakupovaného materiálu – tak to bylo i skutečně provedeno, jedna se o chybu přípraváře)
Bez připomínek
- VYKOPAVKY ZE ZEMNIKŮ A SKLADEK TŘ. I, ODVOZ DO 20KM Aktivní zona by měla byt v objektu SO 102
viz výše
Bez připomínek
- VYBOURANI POTRUBI DN DO 400MM KANALIZAČ v jakém místě byla kanalizace odstraněna? Jednalo se o kanalizaci, která nebyla v podkladech VAS?
Jedná se o kanalizaci v trase nového kanálu, zjistím zda-li byla v podkladech VAS, nicméně ve staveništi bylo tolik starých dlouhodobě nepoužívaných kanalizaci (o kterých nikdo nevěděl), že sám nevím.
Dle zaměřeni rušené kanalizace od geodeta se jedna o kanalizaci, kterou jsme měli v podkladech od VAS a její odstraněni je součástí objektu SO351. Odstraněni stávající dešťové kanalizace je napočítána v objektu nového vodovodu SO351, protože sni byl v kolizi.
- Vypnutí kabelu VN, vč. dozoru a zabezpečeni kabelu – je součástí pol. 02730 v SO 000.1
zde si nárokujeme vypnutí soustavy VN v místě realizace nove revizní šachty Š17, při kalkulaci nabídky jsme předpokládali, že VN bude vypnuté (dle zadáni měla proběhnout souběžná realizace vyvolané akce), nicméně Egd akci zrušilo (následně s časovým odstupem 2 měsíců stejně nakonec realizovalo). Nicméně se nám to časově „nepotkalo“. Dokládáme fakturou od smluvního partnera egd.
Bez připomínek
- Montážní práce VAS při opravách vodovodu z důvodu výškové kolize – o jaké místa se jednalo?
Stávající vodovod byl ve velice špatném technickém stavu a litinové potrubí i při pouhém obnaženi prasklo. Jelikož vodovod byl funkční musel být opraven. Následně po realizaci kanalizace proběhla výměna i tohoto vodovodu SO 351.1, nicméně v průběhu realizace kanalizace musel být funkční) Sam provozovatel neznal přesnou polohu tohoto starého vodovodu – stejně tak i vodovodu DN 250, kdy jsme nakonec museli vest obě vedeni jinou trasou. Cenu dokládáme fa VAS
Bez připomínek
- Přepojeni kabelu VO, kolize s vedením – veřejného osvětleni se buduje nove, jednalo se o provizorní přepojeni?
kolize s kanalizaci, nove vedeni VO se realizovalo až po realizaci kanalizace, dokládáme fa od spol SETO (prováděli výměnu VN)

Bez připomínek
- Napojeni nemovitostí na dešťovou kanalizaci – co práce zahrnovaly?
Projekt neuvažoval s přepojením nemovitostí do nove dešťové kanalizace (etapa 1a). Při realizace kanalizace jsme odstraňovali starou dešťovou kanalizaci a nalezené přípojky byli následně dohledány, opraveny a přes odbočky napojeny do nove kanalizace. Tento požadavek vznikl až v průběhu realizace – neuvažováno při cenotvorbě nabídky, proto niž uvažované odbočky 5 ks atd
Bez připomínek
-Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti_ podzemního vedení
-Hloubení zapažených rýh šířky do 2000 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti skupiny 3 ručně **Proč jsou tyto práce naceněny dle ÚRS 2024 a ne dle OTSKP2024?**
Jednalo se o vyčísleni nadprůměrné četnosti IS v rámci stavby (zřejmé z fotodokumentaci), obnažování starého litinového vodovod potrubí, teplovodu atd. Výkopy byli prováděny ručně u IS i u napojeni nemovitostí do nove kanalizace.
Prace jsou naceněny v položkách URS. Protože ceník OTSKP s Tímto členěním neuvažuje a také z důvodu, že VCP pro město musí být provedeno v urs (dle SOD)
Ano mate pravdu v OTSKP se výkopy neděli na ruční nebo strojní vše je pod jednou položkou, také je součástí paženi vykopu a ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedeni a ve stísněných prostorech. Za mě byl vysoutěženy rozpočet v OTSKP a pokud jsou zmíněné práce součástí některé z položek rozpočtu tak nelze rozporovat, že je rozdíl v OTSKP a URS. Tak by pak bylo možné nahlížet v dalších případech jako je třeba paženi, v URS je zvlášť položkou a v OTSKP je automaticky součástí položky pro výkop. Odsouhlaseni těchto víceprací je na investorech Města Telč a Kraji Vysočina podle toho, co mají v SOD.
- Montáž odboček na kanalizačním potrubí z PP trub korugovaných DN 400 – odbočky jsou dle pol. 87446 a pol. 87457 součástí těchto položek
- Odbočka kanalizace PP korugované 45° DN 400/150 - odbočky jsou dle pol. 87446 a pol. 87457 součástí těchto položek
Projekt neuvažoval s přepojením nemovitostí do nove dešťové kanalizace (etapa 1a). Při realizace kanalizace jsme odstraňovali starou dešťovou kanalizaci a nalezené přípojky byli následně dohledány, opraveny a přes odbočky napojeny do nove kanalizace. Tento požadavek vznikl až v průběhu realizace – neuvažováno při cenotvorbě nabídky, proto niž uvažované odbočky 5 ks atd
Bez připomínek
- **SO351.4 Přeložka vodovodu vč. přípojek – úsek 4**

Bez připomínek

Číslo jednací:
Spisová značka:

Počet stran: 2
Počet výtisků: 1
Výtisk číslo: 1

Zápis z kontrolního dne stavby

III/40618 Telč, ul. Radkovská

Kontrolní den				
Číslo	**23**	Konaný dne	**13.11.2024**	
Účastníci	Seznam účastníků je uveden v příloze č. 1 – Prezenční listina			

Kontrola úkolů z předchozího kontrolního dne			
Úkol číslo	**Název**	**Skutečný stav splnění úkolu**	**Splněno [A/N]**
8	Změna šachty	Zhotovitel ocení novou šachtu 17	N
10	Ocenění víceprací	Budeme postupovat dle e-mailu ze dne 11.6.2024 od [redacted] – viz příloha k Zápisu	N
12	TePř, KZP	Zasílat TePř, KZP na prováděné práce k odsouhlasení TDS (město , kraj) a BOZP - 8 dnů před zahájením prací	N
16	SO 351 Vodovod	Zhotovitel navrhuje provést etapu Ia a Ib najednou bez přepojování, etapa Ia bude v rámci provádění vodovodu průjezdná pro obyvatele	N- nebude realizován
17	[redacted]		
18	Výtok z SO 301	Ze šachty Š1 bude zkrácen výtok, bude provedena terénní úprava s kamennou rovnaninou směrem k rybníku, včetně výtokového objektu a mříže	N
22	SO 301 Š18	Kolize SO 301 s VTL nutnost instalace Š 18 1000 skluzová, zhotovitel ocení vícepráce	N
25	SO 351.1	PE DN 90 bude přiložen k TLT 250 v úseku 0,180 – 0,240 v prostoru tělesa SO 101. Dále bude zkrácen řad PE DN 90 cca o 25 m a nebude proveden protlak pod komunikací II/406 z důvodu, že v rámci jiné stavby byl zrušen vodovod do kterého měl být řad PE DN 90 napojen = zástupci VAS v rámci projednání na KD tuto skutečnost potvrdili. Tento řad bude ukončen podzemní hydrantovou sestavou, která bude osazena min. 5m za posledním odbočením vodovodní přípojky.	N
29	SO 351	Zástupce města vyjádřil velkou nespokojenost s průběhem prací při odpojování vodovodního přivaděče (velká část města zůstala bez vody) a komunikací stavby vůči městu	
33	SO 301	Kamerové zkoušky Š1 – Š 5, Š 17 – Š 11	N
37	[redacted]		
38	Termín dokončení etapy Ia, Ib	Zhotovitel žádá o prodloužení dílčího termínu uvedení stavby v etapách Ia a Ib do předčasného užívání do 15.11.2024	N
44	SO 103	Ve staničení 0,100 – 0,160 předpoklad převedení prací do etapy II, z důvodu vyřešení návaznosti na řešený chodník na ulici Dačická	N
47	SO 301	Doklady od kamerových zkoušek	N
48	SO 101	Výměna sanační vrstvy za frakci 0/200, ocenění	N
49	Prohlídka AHV ACP před před pokládkou AHV obrusu	Před pokládkou AHV ACO (předpoklad 11.11) budou specifikovány možné vady a ty budou před pokládkou ACO odstraněny	N
50	SO 351.1	Nová přípojka pro nemovitost č.p.393, bude řešena jako vícepráce, VAS určí dimenzi přípojky	N
51	SO 102, SO 103	Změna vjezdu na chodník 0,190 vpravo	N
52	Úklid etapa Ib	Stavba zajistí úklid po ukončené činnosti po etapě Ib	A
53	Stávající Š148	Byl zjištěn nevyhovující stav stávající šachty Š 148, bude provedena výměna	N
54	Sanace SO 101	Zhuňovací pokus a zkušební pole na sanaci v SO 101	A

55	SO 103 - reprezenťák	AD zašle zpracovaný detail napojení chodníku na nemovitost	A
56	SO 351.1	17.10. bude provedena dezinfekce a proplach. Bude zahájena tlaková zkouška	A
57	SO 351.1 - přípojky	V pátek a pondělí (18.10 a 21.10) budou provedeny přípojky vodovodu k nemovitostem vč. č.p. 393 v DN 50	A
58	Kontejnery u bytovek	Informace od [redacted] pro stavbu -prosím nevyužívat kontejnery u bytovek na odkládání objemného odpadu, město Telč ústy [redacted] zajistí mimořádný svoz odpadu	Trvale
59	Sanace pláně SO 101 etapa Ia	Parapláň v etapě Ia (SO 101)vykazuje velkou míru nestejnorodosti. Navržené opatření z etapy Ib se jeví jako nedostečné, předpoklad potřeby lokální sanace ve větší hloubce – posouzení geotechnikem stavby a následné vyjádření AD	N
60	Pláň SO 103	Pod budoucím parkovacím stáním byla provedena za účasti TDS SZZ s výsledkem $E_{def,2}$ = 14 MPa a poměrem 1,61, bude proveden odkop na úroveň parapláně a následná sanace 0/125	N
61	SO 301 propoj šachty Š12 a Š5	Při výkopu byl zastižen vodovodní přivaděč z hrdlové tvárné litiny, který ve spoji vykazuje známky vyosení. Nebezpečí havárie tohoto potrubí. Navržené řešení – zasypání a zastabilizování stávající tvárné litiny vhodným materiálem. Výkop nové trasy k nově určené poloze šachty Š5 vedle stávající dešťové šachty. Z šachty Š 12 bude ve stávajícím výkopu položena 1 trubka propoje a v rámci zasypávání bude tato zahutněna. Další propojení bude v nově vykopané rýze, kde v úrovni stávajícího vodovodního přivaděče bude provedena sonda k ověření celistvosti trubního vedení (nesmí být zastižen ve výkopu vyosený spoj trubního vedení) o dalším postupu bude informován provozovatel	A
62	SO 351.1 vodovodní přípojka	U domu č.p. 393 bude přípojka vody přepoložena pod kabely VN	A
63	SO 451	Na dnešním KD nebyla přítomna odborně způsobilá osoba viz zápis v SD	trvale
64	Přítomnost AD	TDS pozve na KD 30.10.2024 AD	N
65	Zaměření vodovodu	VAS žádá předání zaměření SO 351.1	N
66	Stožár VO SO 451	V km 0,350 bude posunut mimo ochranné pásmo VN směrem od komunikace cca 0,75 m, v km 0,280 bude posunut o cca 3m směrem k ZÚ, trasa bude snížena na projektovanou úroveň.	A
67	Sjezd na stávající parkoviště	V km 0,350 bude stávající sjezd zaříznut v dohodnuté úrovni (cca 2 m od spodního lomu) nově budovaná část bude provedena dle legendy povrchů	N
68	SO 103	Dle zaslaného projektu od AD a zpracovaných detailů před domem č.p. 214 (reprezenťák) bude chodník dodlážděn až k hraně domu se zvednutím horní úrovně anglických dvorků na úroveň nivelety chodníku	N
69	SO 351.1	Ve staniční 0,110 – 0,140 je trasa SO 351.1 vedena mimo projektovanou trasu, 3 ks špinglů dle vyjádření provozovatelů nevadí (KSÚSV, VAS)	
70	Pokládka obrub	Betonové lože položených obrub bude při poklesu teplot ochráněno geotextilií	
71	Závěrečná prohlídka SO 101	Bude svolána na 13.11. na 15.hod	

72	VO SO 451	Ve staničení 0,100 bude propojena stávající lampa u parkoviště skrz položenou chráničku v rámci stavby.	
73	SO 451	Navržená chránička v SO 451 bude posunuta směrem k parnímu mlýnu na hranu stávajících a nových HAV	
74	ZBV	Zhotovitel zašle AD podklady na změny vůči RDS	

Zpráva zhotovitele o průběhu stavebních prací	
1. plnění věcného harmonogramu	Aktualizace HMG dle aktuálního stavu věci na příští KD tj. 6.11.2024
2. popis provedených prací	SO 101 – ŠD
	SO 301 – protlak pod komunikací Dačická, Š8 s propojem
3. popis plánovaných prací	SO 101 – recyklace za studena, pokládka ACO
	SO 103 chodníky levou stranu
	SO 301 – Š9
4. finanční plnění	
5. fotodokumentace	

Kontrola kvality	
1.	Byly provedeny SZZ na SO 182 s vyhovujícím výsledkem – viz protokol
2.	Byly provedeny SZZ na SO 301
3.	Byly provedeny SZZ SO 101 parapláň,
4.	Byly provedeny SZZ SO 101 pláň, ŠD
5.	Byly provedeny SZZ SO 101 RSA, SO 102 ŠD
6.	Byla provedena SZZ SO 101 pláň 0,140 $E_{def,2}$ =49 MPa, poměr 2,02
7.	Byly provedena SZZ SO 301 před č.p. 416 $E_{def,2}$ =79,9 MPa, poměr 1,96
8.	Byla provedena SZZ SO 101 pláň 0,100 $E_{def,2}$ =76,9 MPa, poměr 2,19
9.	Byly provedena kamerová zkouška Š 8 – Š 5,Š5 - Š12, dle sdělení zhotovitele je ovalita i podélné sklony v pořádku

Stav BOZP a PO

Různé
Zhotovitel k dnešnímu dni předal návrh možného provedení konstrukce SO 182 (mimo výhyben) vč. posudku geotechnika a nacenění možných prací
Zahájení prací na etapě Ib od 15.7.2024
Od září 2024 bude působit jako investiční technik na stavbě [redacted]

Závěry kontrolního dne
Zápis z KD je součástí stavebního deníku
K zápisu z KD nejsou žádné připomínky

Úkoly z kontrolního dne č.23				
Úkol číslo	**Název**	**Obsah úkolu a požadovaný cílový stav**	**Odpovídá**	**Termín**

Datum konání příštího KD	Operativně před uplynutím zimní technologické přestávky, sraz na ZS

Přílohy	
Číslo	**Název**
1	Prezenční listina

Zapsal [redacted]

Jméno a funkce

[redacted]

Podpis

Rozdělovník
Vyhotoveno v1 výtisku o 2 stranách a rozesláno elektronicky, originály budou předány po dokončení stavby objednateli

Číslo jednací:
Spisová značka:

Počet stran: 2
Počet výtisků: 1
Výtisk číslo: 1

Zápis z kontrolního dne stavby

III/40618 Telč, ul. Radkovská

Kontrolní den				
Číslo	**23**	Konaný dne	**13.11.2024**	
Účastníci	Seznam účastníků je uveden v příloze č. 1 – Prezenční listina			

Kontrola úkolů z předchozího kontrolního dne			
Úkol číslo	**Název**	**Skutečný stav splnění úkolu**	**Splněno [A/N]**
8	Změna šachty	Zhotovitel ocení novou šachtu 17	N
10	Ocenění víceprací	Budeme postupovat dle e-mailu ze dne 11.6.2024 od [redacted] – viz příloha k Zápisu	N
12	TePř, KZP	Zasílat TePř, KZP na prováděné práce k odsouhlasení TDS (město , kraj) a BOZP - 8 dnů před zahájením prací	N
16	SO 351 Vodovod	Zhotovitel navrhuje provést etapu Ia a Ib najednou bez přepojování, etapa Ia bude v rámci provádění vodovodu průjezdná pro obyvatele	N- nebude realizován
17	Svody	Pokud se v trase SO 301 budou nacházet nepřipojené svody budou tyto zaústěny do SO 301	N
18	Výtok z SO 301	Ze šachty Š1 bude zkrácen výtok, bude provedena terénní úprava s kamennou rovnaninou směrem k rybníku, včetně výtokového objektu a mříže	N
22	SO 301 Š18	Kolize SO 301 s VTL nutnost instalace Š 18 1000 skluzová, zhotovitel ocení vícepráce	N
25	SO 351.1	PE DN 90 bude přiložen k TLT 250 v úseku 0,180 – 0,240 v prostoru tělesa SO 101. Dále bude zkrácen řad PE DN 90 cca o 25 m a nebude proveden protlak pod komunikací II/406 z důvodu, že v rámci jiné stavby byl zrušen vodovod do kterého měl být řad PE DN 90 napojen = zástupci VAS v rámci projednání na KD tuto skutečnost potvrdili. Tento řad bude ukončen podzemní hydrantovou sestavou, která bude osazena min. 5m za posledním odbočením vodovodní přípojky.	N
29	SO 351	Zástupce města vyjádřil velkou nespokojenost s průběhem prací při odpojování vodovodního přivaděče (velká část města zůstala bez vody) a komunikací stavby vůči městu	
33	SO 301	Kamerové zkoušky Š1 – Š 5, Š 17 – Š 11	N
37	Dešťové svody vlevo	Dešťové svody z nemovitostí vlevo (ve směru staničení) v etapě Ia budou zaústěny do SO 301	N
38	Termín dokončení etapy Ia, Ib	Zhotovitel žádá o prodloužení dílčího termínu uvedení stavby v etapách Ia a Ib do předčasného užívání do 15.11.2024	N
44	SO 103	Ve staničení 0,100 – 0,160 předpoklad převedení prací do etapy II, z důvodu vyřešení návaznosti na řešený chodník na ulici Dačická	N
47	SO 301	Doklady od kamerových zkoušek	N
48	SO 101	Výměna sanační vrstvy za frakci 0/200, ocenění	N
49	Prohlídka AHV ACP před před pokládkou AHV obrusu	Před pokládkou AHV ACO (předpoklad 11.11) budou specifikovány možné vady a ty budou před pokládkou ACO odstraněny	N
50	SO 351.1	Nová přípojka pro nemovitost č.p.393, bude řešena jako vícepráce, VAS určí dimenzi přípojky	N
51	SO 102, SO 103	Změna vjezdu na chodník 0,190 vpravo	N
52	Úklid etapa Ib	Stavba zajistí úklid po ukončené činnosti po etapě Ib	A
53	[redacted]		
54	Sanace SO 101	Zhuňovací pokus a zkušební pole na sanaci v SO 101	A

55	SO 103 - reprezenťák	AD zašle zpracovaný detail napojení chodníku na nemovitost	A
56	SO 351.1	17.10. bude provedena dezinfekce a proplach. Bude zahájena tlaková zkouška	A
57	SO 351.1 - přípojky	V pátek a pondělí (18.10 a 21.10) budou provedeny přípojky vodovodu k nemovitostem vč. č.p. 393 v DN 50	A
58	Kontejnery u bytovek	Informace od [redacted] pro stavbu -prosím nevyužívat kontejnery u bytovek na odkládání objemného odpadu, město Telč ústy [redacted] zajistí mimořádný svoz odpadu	Trvale
59	Sanace pláně SO 101 etapa Ia	Parapláň v etapě Ia (SO 101)vykazuje velkou míru nestejnorodosti. Navržené opatření z etapy Ib se jeví jako nedostečné, předpoklad potřeby lokální sanace ve větší hloubce – posouzení geotechnikem stavby a následné vyjádření AD	N
60	Pláň SO 103	Pod budoucím parkovacím stáním byla provedena za účasti TDS SZZ s výsledkem $E_{def,2}$ = 14 MPa a poměrem 1,61, bude proveden odkop na úroveň parapláně a následná sanace 0/125	N
61	SO 301 propoj šachty Š12 a Š5	Při výkopu byl zastižen vodovodní přivaděč z hrdlové tvárné litiny, který ve spoji vykazuje známky vyosení. Nebezpečí havárie tohoto potrubí. Navržené řešení – zasypání a zastabilizování stávající tvárné litiny vhodným materiálem. Výkop nové trasy k nově určené poloze šachty Š5 vedle stávající dešťové šachty. Z šachty Š 12 bude ve stávajícím výkopu položena 1 trubka propoje a v rámci zasypávání bude tato zahutněna. Další propojení bude v nově vykopané rýze, kde v úrovni stávajícího vodovodního přivaděče bude provedena sonda k ověření celistvosti trubního vedení (nesmí být zastižen ve výkopu vyosený spoj trubního vedení) o dalším postupu bude informován provozovatel	A
62	SO 351.1 vodovodní přípojka	U domu č.p. 393 bude přípojka vody přepoložena pod kabely VN	A
63	SO 451	Na dnešním KD nebyla přítomna odborně způsobilá osoba viz zápis v SD	trvale
64	Přítomnost AD	TDS pozve na KD 30.10.2024 AD	N
65	Zaměření vodovodu	VAS žádá předání zaměření SO 351.1	N
66	Stožár VO SO 451	V km 0,350 bude posunut mimo ochranné pásmo VN směrem od komunikace cca 0,75 m, v km 0,280 bude posunut o cca 3m směrem k ZÚ, trasa bude snížena na projektovanou úroveň.	A
67	Sjezd na stávající parkoviště	V km 0,350 bude stávající sjezd zaříznut v dohodnuté úrovni (cca 2 m od spodního lomu) nově budovaná část bude provedena dle legendy povrchů	N
68	SO 103	Dle zaslaného projektu od AD a zpracovaných detailů před domem č.p. 214 (reprezenťák) bude chodník dodlážděn až k hraně domu se zvednutím horní úrovně anglických dvorků na úroveň nivelety chodníku	N
69	SO 351.1	Ve staniční 0,110 – 0,140 je trasa SO 351.1 vedena mimo projektovanou trasu, 3 ks špinglů dle vyjádření provozovatelů nevadí (KSÚSV, VAS)	
70	Pokládka obrub	Betonové lože položených obrub bude při poklesu teplot ochráněno geotextilií	
71	Závěrečná prohlídka SO 101	Bude svolána na 13.11. na 15.hod	

72	VO SO 451	Ve staničení 0,100 bude propojena stávající lampa u parkoviště skrz položenou chráničku v rámci stavby.	
73	SO 451	Navržená chránička v SO 451 bude posunuta směrem k parnímu mlýnu na hranu stávajících a nových HAV	
74	ZBV	Zhotovitel zašle AD podklady na změny vůči RDS	

Zpráva zhotovitele o průběhu stavebních prací	
1. plnění věcného harmonogramu	Aktualizace HMG dle aktuálního stavu věci na příští KD tj. 6.11.2024
2. popis provedených prací	SO 101 – ŠD
	SO 301 – protlak pod komunikací Dačická, Š8 s propojem
3. popis plánovaných prací	SO 101 – recyklace za studena, pokládka ACO
	SO 103 chodníky levou stranu
	SO 301 – Š9
4. finanční plnění	
5. fotodokumentace	

Kontrola kvality	
1.	Byly provedeny SZZ na SO 182 s vyhovujícím výsledkem – viz protokol
2.	Byly provedeny SZZ na SO 301
3.	Byly provedeny SZZ SO 101 parapláň,
4.	Byly provedeny SZZ SO 101 pláň, ŠD
5.	Byly provedeny SZZ SO 101 RSA, SO 102 ŠD
6.	Byla provedena SZZ SO 101 pláň 0,140 $E_{def,2}$ =49 MPa, poměr 2,02
7.	Byly provedena SZZ SO 301 před č.p. 416 $E_{def,2}$ =79,9 MPa, poměr 1,96
8.	Byla provedena SZZ SO 101 pláň 0,100 $E_{def,2}$ =76,9 MPa, poměr 2,19
9.	Byly provedena kamerová zkouška Š 8 – Š 5,Š5 - Š12, dle sdělení zhotovitele je ovalita i podélné sklony v pořádku

Stav BOZP a PO

Různé
Zhotovitel k dnešnímu dni předal návrh možného provedení konstrukce SO 182 (mimo výhyben) vč. posudku geotechnika a nacenění možných prací
Zahájení prací na etapě Ib od 15.7.2024
Od září 2024 bude působit jako investiční technik na stavbě [redacted]

Závěry kontrolního dne
Zápis z KD je součástí stavebního deníku
K zápisu z KD nejsou žádné připomínky

Úkoly z kontrolního dne č.23				
Úkol číslo	**Název**	**Obsah úkolu a požadovaný cílový stav**	**Odpovídá**	**Termín**

Datum konání příštího KD	Operativně před uplynutím zimní technologické přestávky, sraz na ZS

Přílohy	
Číslo	**Název**
1	Prezenční listina

Zapsal [redacted] [redacted]

Jméno a funkce Podpis

Rozdělovník
Vyhotoveno v1 výtisku o 2 stranách a rozesláno elektronicky, originály budou předány po dokončení stavby objednateli

Číslo jednací:
Spisová značka:

Počet stran: 2
Počet výtisků: 1
Výtisk číslo: 1

Zápis z kontrolního dne stavby

III/40618 Telč, ul. Radkovská

Kontrolní den				
Číslo	**23**	Konaný dne	**13.11.2024**	
Účastníci	Seznam účastníků je uveden v příloze č. 1 – Prezenční listina			

Kontrola úkolů z předchozího kontrolního dne			
Úkol číslo	**Název**	**Skutečný stav splnění úkolu**	**Splněno [A/N]**
8	[redacted]		
10	Ocenění víceprací	Budeme postupovat dle e-mailu ze dne 11.6.2024 od [redacted] – viz příloha k Zápisu	N
12	TePř, KZP	Zasílat TePř, KZP na prováděné práce k odsouhlasení TDS (město , kraj) a BOZP - 8 dnů před zahájením prací	N
16	SO 351 Vodovod	Zhotovitel navrhuje provést etapu Ia a Ib najednou bez přepojování, etapa Ia bude v rámci provádění vodovodu průjezdná pro obyvatele	N- nebude realizován
17	Svody	Pokud se v trase SO 301 budou nacházet nepřipojené svody budou tyto zaústěny do SO 301	N
18	Výtok z SO 301	Ze šachty Š1 bude zkrácen výtok, bude provedena terénní úprava s kamennou rovnaninou směrem k rybníku, včetně výtokového objektu a mříže	N
22	SO 301 Š18	Kolize SO 301 s VTL nutnost instalace Š 18 1000 skluzová, zhotovitel ocení vícepráce	N
25	SO 351.1	PE DN 90 bude přiložen k TLT 250 v úseku 0,180 – 0,240 v prostoru tělesa SO 101. Dále bude zkrácen řad PE DN 90 cca o 25 m a nebude proveden protlak pod komunikací II/406 z důvodu, že v rámci jiné stavby byl zrušen vodovod do kterého měl být řad PE DN 90 napojen = zástupci VAS v rámci projednání na KD tuto skutečnost potvrdili. Tento řad bude ukončen podzemní hydrantovou sestavou, která bude osazena min. 5m za posledním odbočením vodovodní přípojky.	N
29	SO 351	Zástupce města vyjádřil velkou nespokojenost s průběhem prací při odpojování vodovodního přivaděče (velká část města zůstala bez vody) a komunikací stavby vůči městu	
33	SO 301	Kamerové zkoušky Š1 – Š 5, Š 17 – Š 11	N
37	Dešťové svody vlevo	Dešťové svody z nemovitostí vlevo (ve směru staničení) v etapě Ia budou zaústěny do SO 301	N
38	Termín dokončení etapy Ia, Ib	Zhotovitel žádá o prodloužení dílčího termínu uvedení stavby v etapách Ia a Ib do předčasného užívání do 15.11.2024	N
44	SO 103	Ve staničení 0,100 – 0,160 předpoklad převedení prací do etapy II, z důvodu vyřešení návaznosti na řešený chodník na ulici Dačická	N
47	SO 301	Doklady od kamerových zkoušek	N
48	SO 101	Výměna sanační vrstvy za frakci 0/200, ocenění	N
49	Prohlídka AHV ACP před před pokládkou AHV obrusu	Před pokládkou AHV ACO (předpoklad 11.11) budou specifikovány možné vady a ty budou před pokládkou ACO odstraněny	N
50	SO 351.1	Nová přípojka pro nemovitost č.p.393, bude řešena jako vícepráce, VAS určí dimenzi přípojky	N
51	SO 102, SO 103	Změna vjezdu na chodník 0,190 vpravo	N
52	Úklid etapa Ib	Stavba zajistí úklid po ukončené činnosti po etapě Ib	A
53	Stávající Š148	Byl zjištěn nevyhovující stav stávající šachty Š 148, bude provedena výměna	N
54	Sanace SO 101	Zhuňovací pokus a zkušební pole na sanaci v SO 101	A

55	SO 103 - reprezenťák	AD zašle zpracovaný detail napojení chodníku na nemovitost	A
56	SO 351.1	17.10. bude provedena dezinfekce a proplach. Bude zahájena tlaková zkouška	A
57	SO 351.1 - přípojky	V pátek a pondělí (18.10 a 21.10) budou provedeny přípojky vodovodu k nemovitostem vč. č.p. 393 v DN 50	A
58	Kontejnery u bytovek	Informace od [redacted] pro stavbu -prosím nevyužívat kontejnery u bytovek na odkládání objemného odpadu, město Telč ústy [redacted] zajistí mimořádný svoz odpadu	Trvale
59	Sanace pláně SO 101 etapa Ia	Parapláň v etapě Ia (SO 101)vykazuje velkou míru nestejnorodosti. Navržené opatření z etapy Ib se jeví jako nedostečné, předpoklad potřeby lokální sanace ve větší hloubce – posouzení geotechnikem stavby a následné vyjádření AD	N
60	Pláň SO 103	Pod budoucím parkovacím stáním byla provedena za účasti TDS SZZ s výsledkem $E_{def,2}$ = 14 MPa a poměrem 1,61, bude proveden odkop na úroveň parapláně a následná sanace 0/125	N
61	SO 301 propoj šachty Š12 a Š5	Při výkopu byl zastižen vodovodní přivaděč z hrdlové tvárné litiny, který ve spoji vykazuje známky vyosení. Nebezpečí havárie tohoto potrubí. Navržené řešení – zasypání a zastabilizování stávající tvárné litiny vhodným materiálem. Výkop nové trasy k nově určené poloze šachty Š5 vedle stávající dešťové šachty. Z šachty Š 12 bude ve stávajícím výkopu položena 1 trubka propoje a v rámci zasypávání bude tato zahutněna. Další propojení bude v nově vykopané rýze, kde v úrovni stávajícího vodovodního přivaděče bude provedena sonda k ověření celistvosti trubního vedení (nesmí být zastižen ve výkopu vyosený spoj trubního vedení) o dalším postupu bude informován provozovatel	A
62	SO 351.1 vodovodní přípojka	U domu č.p. 393 bude přípojka vody přepoložena pod kabely VN	A
63	SO 451	Na dnešním KD nebyla přítomna odborně způsobilá osoba viz zápis v SD	trvale
64	Přítomnost AD	TDS pozve na KD 30.10.2024 AD	N
65	Zaměření vodovodu	VAS žádá předání zaměření SO 351.1	N
66	Stožár VO SO 451	V km 0,350 bude posunut mimo ochranné pásmo VN směrem od komunikace cca 0,75 m, v km 0,280 bude posunut o cca 3m směrem k ZÚ, trasa bude snížena na projektovanou úroveň.	A
67	Sjezd na stávající parkoviště	V km 0,350 bude stávající sjezd zaříznut v dohodnuté úrovni (cca 2 m od spodního lomu) nově budovaná část bude provedena dle legendy povrchů	N
68	SO 103	Dle zaslaného projektu od AD a zpracovaných detailů před domem č.p. 214 (reprezenťák) bude chodník dodlážděn až k hraně domu se zvednutím horní úrovně anglických dvorků na úroveň nivelety chodníku	N
69	SO 351.1	Ve staniční 0,110 – 0,140 je trasa SO 351.1 vedena mimo projektovanou trasu, 3 ks špinglů dle vyjádření provozovatelů nevadí (KSÚSV, VAS)	
70	Pokládka obrub	Betonové lože položených obrub bude při poklesu teplot ochráněno geotextilií	
71	Závěrečná prohlídka SO 101	Bude svolána na 13.11. na 15.hod	

72	VO SO 451	Ve staničení 0,100 bude propojena stávající lampa u parkoviště skrz položenou chráničku v rámci stavby.	
73	SO 451	Navržená chránička v SO 451 bude posunuta směrem k parnímu mlýnu na hranu stávajících a nových HAV	
74	ZBV	Zhotovitel zašle AD podklady na změny vůči RDS	

Zpráva zhotovitele o průběhu stavebních prací	
1. plnění věcného harmonogramu	Aktualizace HMG dle aktuálního stavu věci na příští KD tj. 6.11.2024
2. popis provedených prací	SO 101 – ŠD
	SO 301 – protlak pod komunikací Dačická, Š8 s propojem
3. popis plánovaných prací	SO 101 – recyklace za studena, pokládka ACO
	SO 103 chodníky levou stranu
	SO 301 – Š9
4. finanční plnění	
5. fotodokumentace	

Kontrola kvality	
1.	Byly provedeny SZZ na SO 182 s vyhovujícím výsledkem – viz protokol
2.	Byly provedeny SZZ na SO 301
3.	Byly provedeny SZZ SO 101 parapláň,
4.	Byly provedeny SZZ SO 101 pláň, ŠD
5.	Byly provedeny SZZ SO 101 RSA, SO 102 ŠD
6.	Byla provedena SZZ SO 101 pláň 0,140 $E_{def,2}$ =49 MPa, poměr 2,02
7.	Byly provedena SZZ SO 301 před č.p. 416 $E_{def,2}$ =79,9 MPa, poměr 1,96
8.	Byla provedena SZZ SO 101 pláň 0,100 $E_{def,2}$ =76,9 MPa, poměr 2,19
9.	Byly provedena kamerová zkouška Š 8 – Š 5,Š5 - Š12, dle sdělení zhotovitele je ovalita i podélné sklony v pořádku

Stav BOZP a PO

Různé
Zhotovitel k dnešnímu dni předal návrh možného provedení konstrukce SO 182 (mimo výhyben) vč. posudku geotechnika a nacenění možných prací
Zahájení prací na etapě Ib od 15.7.2024
Od září 2024 bude působit jako investiční technik na stavbě [redacted]

Závěry kontrolního dne
Zápis z KD je součástí stavebního deníku
K zápisu z KD nejsou žádné připomínky

Úkoly z kontrolního dne č.23				
Úkol číslo	**Název**	**Obsah úkolu a požadovaný cílový stav**	**Odpovídá**	**Termín**

Datum konání příštího KD	Operativně před uplynutím zimní technologické přestávky, sraz na ZS

Přílohy	
Číslo	**Název**
1	Prezenční listina

Zapsal [redacted] [redacted]

Jméno a funkce Podpis

Rozdělovník
Vyhotoveno v1 výtisku o 2 stranách a rozesláno elektronicky, originály budou předány po dokončení stavby objednateli

Číslo jednací:
Spisová značka:

Počet stran: 2
Počet výtisků: 1
Výtisk číslo: 1

Zápis z kontrolního dne stavby

III/40618 Telč, ul. Radkovská

Kontrolní den				
Číslo	**23**	Konaný dne	**13.11.2024**	
Účastníci	Seznam účastníků je uveden v příloze č. 1 – Prezenční listina			

Kontrola úkolů z předchozího kontrolního dne			
Úkol číslo	**Název**	**Skutečný stav splnění úkolu**	**Splněno [A/N]**
8	Změna šachty	Zhotovitel ocení novou šachtu 17	N
10	Ocenění víceprací	Budeme postupovat dle e-mailu ze dne 11.6.2024 od [redacted] – viz příloha k Zápisu	N
12	TePř, KZP	Zasílat TePř, KZP na prováděné práce k odsouhlasení TDS (město , kraj) a BOZP - 8 dnů před zahájením prací	N
16	SO 351 Vodovod	Zhotovitel navrhuje provést etapu Ia a Ib najednou bez přepojování, etapa Ia bude v rámci provádění vodovodu průjezdná pro obyvatele	N- nebude realizován
17	Svody	Pokud se v trase SO 301 budou nacházet nepřipojené svody budou tyto zaústěny do SO 301	N
18	Výtok z SO 301	Ze šachty Š1 bude zkrácen výtok, bude provedena terénní úprava s kamennou rovnaninou směrem k rybníku, včetně výtokového objektu a mříže	N
22	[redacted]		
25	SO 351.1	PE DN 90 bude přiložen k TLT 250 v úseku 0,180 – 0,240 v prostoru tělesa SO 101. Dále bude zkrácen řad PE DN 90 cca o 25 m a nebude proveden protlak pod komunikací II/406 z důvodu, že v rámci jiné stavby byl zrušen vodovod do kterého měl být řad PE DN 90 napojen = zástupci VAS v rámci projednání na KD tuto skutečnost potvrdili. Tento řad bude ukončen podzemní hydrantovou sestavou, která bude osazena min. 5m za posledním odbočením vodovodní přípojky.	N
29	SO 351	Zástupce města vyjádřil velkou nespokojenost s průběhem prací při odpojování vodovodního přivaděče (velká část města zůstala bez vody) a komunikací stavby vůči městu	
33	SO 301	Kamerové zkoušky Š1 – Š 5, Š 17 – Š 11	N
37	Dešťové svody vlevo	Dešťové svody z nemovitostí vlevo (ve směru staničení) v etapě Ia budou zaústěny do SO 301	N
38	Termín dokončení etapy Ia, Ib	Zhotovitel žádá o prodloužení dílčího termínu uvedení stavby v etapách Ia a Ib do předčasného užívání do 15.11.2024	N
44	SO 103	Ve staničení 0,100 – 0,160 předpoklad převedení prací do etapy II, z důvodu vyřešení návaznosti na řešený chodník na ulici Dačická	N
47	SO 301	Doklady od kamerových zkoušek	N
48	SO 101	Výměna sanační vrstvy za frakci 0/200, ocenění	N
49	Prohlídka AHV ACP před před pokládkou AHV obrusu	Před pokládkou AHV ACO (předpoklad 11.11) budou specifikovány možné vady a ty budou před pokládkou ACO odstraněny	N
50	SO 351.1	Nová přípojka pro nemovitost č.p.393, bude řešena jako vícepráce, VAS určí dimenzi přípojky	N
51	SO 102, SO 103	Změna vjezdu na chodník 0,190 vpravo	N
52	Úklid etapa Ib	Stavba zajistí úklid po ukončené činnosti po etapě Ib	A
53	Stávající Š148	Byl zjištěn nevyhovující stav stávající šachty Š 148, bude provedena výměna	N
54	Sanace SO 101	Zhuňovací pokus a zkušební pole na sanaci v SO 101	A

55	SO 103 - reprezenťák	AD zašle zpracovaný detail napojení chodníku na nemovitost	A
56	SO 351.1	17.10. bude provedena dezinfekce a proplach. Bude zahájena tlaková zkouška	A
57	SO 351.1 - přípojky	V pátek a pondělí (18.10 a 21.10) budou provedeny přípojky vodovodu k nemovitostem vč. č.p. 393 v DN 50	A
58	Kontejnery u bytovek	Informace od [redacted] pro stavbu -prosím nevyužívat kontejnery u bytovek na odkládání objemného odpadu, město Telč ústy [redacted] zajistí mimořádný svoz odpadu	Trvale
59	Sanace pláně SO 101 etapa Ia	Parapláň v etapě Ia (SO 101)vykazuje velkou míru nestejnorodosti. Navržené opatření z etapy Ib se jeví jako nedostečné, předpoklad potřeby lokální sanace ve větší hloubce – posouzení geotechnikem stavby a následné vyjádření AD	N
60	Pláň SO 103	Pod budoucím parkovacím stáním byla provedena za účasti TDS SZZ s výsledkem $E_{def,2}$ = 14 MPa a poměrem 1,61, bude proveden odkop na úroveň parapláně a následná sanace 0/125	N
61	SO 301 propoj šachty Š12 a Š5	Při výkopu byl zastižen vodovodní přivaděč z hrdlové tvárné litiny, který ve spoji vykazuje známky vyosení. Nebezpečí havárie tohoto potrubí. Navržené řešení – zasypání a zastabilizování stávající tvárné litiny vhodným materiálem. Výkop nové trasy k nově určené poloze šachty Š5 vedle stávající dešťové šachty. Z šachty Š 12 bude ve stávajícím výkopu položena 1 trubka propoje a v rámci zasypávání bude tato zahutněna. Další propojení bude v nově vykopané rýze, kde v úrovni stávajícího vodovodního přivaděče bude provedena sonda k ověření celistvosti trubního vedení (nesmí být zastižen ve výkopu vyosený spoj trubního vedení) o dalším postupu bude informován provozovatel	A
62	SO 351.1 vodovodní přípojka	U domu č.p. 393 bude přípojka vody přepoložena pod kabely VN	A
63	SO 451	Na dnešním KD nebyla přítomna odborně způsobilá osoba viz zápis v SD	trvale
64	Přítomnost AD	TDS pozve na KD 30.10.2024 AD	N
65	Zaměření vodovodu	VAS žádá předání zaměření SO 351.1	N
66	Stožár VO SO 451	V km 0,350 bude posunut mimo ochranné pásmo VN směrem od komunikace cca 0,75 m, v km 0,280 bude posunut o cca 3m směrem k ZÚ, trasa bude snížena na projektovanou úroveň.	A
67	Sjezd na stávající parkoviště	V km 0,350 bude stávající sjezd zaříznut v dohodnuté úrovni (cca 2 m od spodního lomu) nově budovaná část bude provedena dle legendy povrchů	N
68	SO 103	Dle zaslaného projektu od AD a zpracovaných detailů před domem č.p. 214 (reprezenťák) bude chodník dodlážděn až k hraně domu se zvednutím horní úrovně anglických dvorků na úroveň nivelety chodníku	N
69	SO 351.1	Ve staniční 0,110 – 0,140 je trasa SO 351.1 vedena mimo projektovanou trasu, 3 ks špinglů dle vyjádření provozovatelů nevadí (KSÚSV, VAS)	
70	Pokládka obrub	Betonové lože položených obrub bude při poklesu teplot ochráněno geotextilií	
71	Závěrečná prohlídka SO 101	Bude svolána na 13.11. na 15.hod	

72	VO SO 451	Ve staničení 0,100 bude propojena stávající lampa u parkoviště skrz položenou chráničku v rámci stavby.	
73	SO 451	Navržená chránička v SO 451 bude posunuta směrem k parnímu mlýnu na hranu stávajících a nových HAV	
74	ZBV	Zhotovitel zašle AD podklady na změny vůči RDS	

Zpráva zhotovitele o průběhu stavebních prací	
1. plnění věcného harmonogramu	Aktualizace HMG dle aktuálního stavu věci na příští KD tj. 6.11.2024
2. popis provedených prací	SO 101 – ŠD
	SO 301 – protlak pod komunikací Dačická, Š8 s propojem
3. popis plánovaných prací	SO 101 – recyklace za studena, pokládka ACO
	SO 103 chodníky levou stranu
	SO 301 – Š9
4. finanční plnění	
5. fotodokumentace	

Kontrola kvality	
1.	Byly provedeny SZZ na SO 182 s vyhovujícím výsledkem – viz protokol
2.	Byly provedeny SZZ na SO 301
3.	Byly provedeny SZZ SO 101 parapláň,
4.	Byly provedeny SZZ SO 101 pláň, ŠD
5.	Byly provedeny SZZ SO 101 RSA, SO 102 ŠD
6.	Byla provedena SZZ SO 101 pláň 0,140 $E_{def,2}$ =49 MPa, poměr 2,02
7.	Byly provedena SZZ SO 301 před č.p. 416 $E_{def,2}$ =79,9 MPa, poměr 1,96
8.	Byla provedena SZZ SO 101 pláň 0,100 $E_{def,2}$ =76,9 MPa, poměr 2,19
9.	Byly provedena kamerová zkouška Š 8 – Š 5,Š5 - Š12, dle sdělení zhotovitele je ovalita i podélné sklony v pořádku

Stav BOZP a PO

Různé
Zhotovitel k dnešnímu dni předal návrh možného provedení konstrukce SO 182 (mimo výhyben) vč. posudku geotechnika a nacenění možných prací
Zahájení prací na etapě Ib od 15.7.2024
Od září 2024 bude působit jako investiční technik na stavbě [redacted]

Závěry kontrolního dne
Zápis z KD je součástí stavebního deníku
K zápisu z KD nejsou žádné připomínky

Úkoly z kontrolního dne č.23				
Úkol číslo	**Název**	**Obsah úkolu a požadovaný cílový stav**	**Odpovídá**	**Termín**

Datum konání příštího KD	Operativně před uplynutím zimní technologické přestávky, sraz na ZS

Přílohy	
Číslo	**Název**
1	Prezenční listina

Zapsal [redacted] [redacted]

Jméno a funkce Podpis

Rozdělovník
Vyhotoveno v1 výtisku o 2 stranách a rozesláno elektronicky, originály budou předány po dokončení stavby objednateli

Daňový doklad - faktura 2024
FV241001

SETO, spol. s r.o.

Malý Pěčín 33
380 01 Dačice
IČO: 46683461 DIČ: CZ46683461
Banka: [redacted]
č.ú.:
Tel:
E-mail:
Registrace v obchodním rejstříku v Č. Budějovicích, Oddíl C, vložka 1773

HILDEBRANT CZ, s.r.o.

Lublaňská 267/12, Vinohrady
120 00 Praha 2

IČO: 14380196 DIČ: CZ14380196

Datum vystavení:	05.11.2024	Vyřídil:	[redacted]	Variabilní symbol:	241001
Datum splatnosti:	05.12.2024	Způsob úhrady:		Konstantní symbol:	0308
Datum zdanitelného plnění:	05.11.2024		**Převodní příkaz**	Specifický symbol:	

Fakturujeme Vám - stavba - "Telč,ul.Radkovská objednávka č.18-7-2024 - oprava kabelového vedené VO,dozor při zemních pracích v blízkosti VN"

Kód	Popis	Cena za jedn.	DPH [%]	Množství	Cena celkem
[redacted]					

Daň odvede zákazník

Dodavatel [redacted]

Odběratel

Dodavatel:

SETO, spol. s r.o.
Hradecká 17/IV
380 01 Dačice

Odběratel:

HILDEBRANT CZ, s.r.o.
Lublaňská 267/12
120 00 Praha 2

Název stavby: **Telč,Radkovská**
dozor při zemních pracích v blízkosti VN
oprava kabelové vedení veřejného osvětlení

Položky	Množství	MJ	Cena/MJ	Cena bez DPH
[redacted]				

Vypracoval: [redacted] SETO, spol. s r.o.

HILDEBRANT CZ, s.r.o.

Lublaňská 267/12, Vinohrady; 120 00 Praha
IČO: 143 80 196 DIČ: CZ143 80 196
Tel.: [redacted]

Dodavatel:

SETO, spol. s r.o.

Hradecká 17/IV

380 01 Dačice

IČ: 46683461

DIČ: CZ46683461

[redacted]

Fakturační a doručovací adresa:
HILDEBRANT CZ s.r.o.
Lublaňská 267/12
120 00 Praha

Objednávka číslo: 18-07-2024
V Jihlavě dne: 18.7.2024
Uvádějte vždy na daňovém dokladu a při každém písemném styku

Stavba: **Telč, ul Radkovská**
Dodací lhůta: 24.7.2024
Zásilku avizuje: [redacted]

Objednáváme u Vás:

Dozorování VN kabelu spojenou s manipulací s kabelem

Cena:
Dle skutečnosti

Splatnost:
- 30 dní

Termín:
- Od 24.7.2024

Koordinace a upřesnění na místě:
[redacted]

Fakturační a korespondenční adresa: HILDEBRANT CZ s.r.o., Lublaňská 267/12, 120 00 Praha
Faktury prosím zasílejte, včetně objednávky a dodacích listu na [redacted]

Cena celkem: **- Dle skutečně odebraného množství ,- Kč**

Cena je bez DPH a definitivní a je určena skutečným dodáním materiálu a je účtována dle odsouhlasených jednotkových cen. Splatnost faktur – 30 dní. Splatnost faktury začne nabíhat datem přijetí naší společností. Délka splatnosti se řídí dle objednávek a smluv, které jsou mezi oběma stranami uzavřeny.

[redacted] Dodavatel:

Dodavatel:

SETO, spol. s r.o.
Hradecká 17/IV
380 01 Dačice

Odběratel:

HILDEBRANT CZ, s.r.o.
Lublaňská 267/12
120 00 Praha 2

Název stavby: **Telč,Radkovská**
dozor při zemních pracích v blízkosti VN
oprava kabelové vedení veřejného osvětlení

Položky	Množství	MJ	Cena/MJ	Cena bez DPH
[redacted]				

Vypracoval:	[redacted]	SETO, spol. s r.o.

VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a. s.

Sídlo společnosti: Soběšická 820/156, Lesná, 638 00 Brno
IČ: 49455842 DIČ: CZ49455842 B1181 Krajský soud v Brně

Faktura - daňový doklad 6132400402

Odběratel	Zasílací adresa
HILDEBRANT CZ s.r.o.	**HILDEBRANT CZ s.r.o.**
Lublaňská 267/12	Lublaňská 267/12
120 00 Praha 2	120 00 Praha 2
Česká republika	Česká republika

IČ Odběratel	14380196	Datum vystavení	31. 10. 2024
DIČ Odběratel	CZ14380196	DUZP	31. 10. 2024
Vaše obj. číslo	02082024	**Datum splatnosti**	**6. 12. 2024**
		Variabilní symbol	**6132400402**
		Forma úhrady	Bankovním převodem
		Číslo bank. účtu	[redacted]
		IBAN	
		Kód SWIFT	

Kontaktní místo **VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. Žižkova 93, 586 29 Jihlava**
Telefon: [redacted]

Vystavil [redacted]

Číslo	Popis	Množství	MJ	Jednotková cena bez DPH	Sleva %	Jednotková cena po slevě	DPH %	Částka na řádku bez DPH
	Fakturujeme Vám za opravy vodovodu v rámci stavby "III/40618 Telč, ul. Radkovská".							

[redacted]

[redacted]

VODÁRENSKÁ
AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a. s.

VÝKAZ PROVEDENÝCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB

205306 - OPRAVY
- viz stavba: ´III/40618 Telč, ul. Radkovská´

Popis	*Kč bez DPH*
[redacted]	

[redacted]

[redacted]

ID 205 127 + ID + ID

HILDEBRANT CZ, s.r.o.
Lublaňská 267/12, Vinohrady, 120 00 Praha 2
IČO: 143 80 196, DIČ: CZ143 80 196
Tel.: [redacted]

Dodavatel:
Vodárenská akciová společnost, a.s.
Divize Jihlava
Žižkova 93
586 29 Jihlava
Tel.: [redacted]

Fakturační adresa:
HILDEBRANT CZ, s.r.o.
Lublaňská 267/12, Vinohrady
120 00 Praha

Korespondenční adresa:
HILDEBRANT CZ, s.r.o.
Antonínův Důl 107
586 01 Jihlava

Objednávka číslo: 02082024
V Jihlavě dne: 01.08.2024
Uvádějte vždy na daňovém dokladu a při každém písemném styku

Stavba: **Telč**
Dodací lhůta: od 1. 8. 2024
Zásilku avizuje: [redacted]

Objednáváme si u Vás:

- Objednáváme u Vás opravy a přeložky vodovodních sítí v rámci stavby **III/40618 Telč, ul. Radkovská**.

Cena:
Dle skutečnosti.

Splatnost:
- 30 dní

Termín:
- od 05.2024

Koordinace a upřesnění na místě:
[redacted]

Fakturační a korespondenční adresa: HILDEBRANT CZ s.r.o., Okrajová 40, 586 01 Jihlava
Faktury prosím zasílejte, včetně objednávky a dodacích listu na [redacted]

Cena celkem: **- Dle dohody ,- Kč**

Cena je bez DPH a definitivní a je určena skutečným dodáním materiálu a je účtována dle odsouhlasených jednotkových cen. Splatnost faktur 30 dnů. Splatnost faktury začne nabíhat datem přijetí naší společností. Délka splatnosti se řídí dle objednávek a smluv, které jsou mezi oběma stranami uzavřeny.

[redacted] Dodavatel:

Daňový doklad - faktura 2024
FV241054

SETO, spol. s r.o.

Malý Pěčín 33
380 01 Dačice
IČO: 46683461 DIČ: CZ46683461
Banka: [redacted]
č.ú.: [redacted]
Tel: [redacted]
E-mail: [redacted]
Registrace v obchodním rejstříku v Č. Budějovicích, Oddíl C, vložka 1773

HILDEBRANT CZ, s.r.o.

Lublaňská 267/12, Vinohrady
120 00 Praha 2

IČO: 14380196 DIČ: CZ14380196

Datum vystavení:	26.11.2024	Vyřídil:	[redacted]	Variabilní symbol:	241054
Datum splatnosti:	11.12.2024	Způsob úhrady:		Konstantní symbol:	0308
Datum zdanitelného plnění:	26.11.2024		**Převodní příkaz**	Specifický symbol:	

Fakturujeme Vám - stavba - "Telč,ul.Radkovská - oprava kabelového vedené VO"

Kód	Popis	Cena za jedn.	DPH [%]	Množství	Cena celkem
[redacted]					

Daň odvede [redacted]

Dodavatel [redacted]

Odběratel

Dodavatel:

SETO, spol. s r.o.
Hradecká 17/IV
380 01 Dačice

Odběratel:

HILDEBRANT CZ, s.r.o.
Lublaňská 267/12
120 00 Praha 2

Název stavby: **Telč,Radkovská - oprava kabelové vedení veřejného osvětlení**

Položky	Množství	MJ	Cena/MJ	Cena bez DPH
[redacted]				

Vypracoval: [redacted] SETO, spol. s r.o.

Dodavatel:

SETO, spol. s r.o.
Hradecká 17/IV
380 01 Dačice

Odběratel:

HILDEBRANT CZ, s.r.o.
Lublaňská 267/12
120 00 Praha 2

Název stavby: **Telč,Radkovská - oprava kabelové vedení veřejného osvětlení**

Položky	Množství	MJ	Cena/MJ	Cena bez DPH
[redacted]				

Vypracoval: [redacted] SETO, spol. s r.o.
