ID		Režim úkolu	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	Názvy zdrojů
1			**Městský hřbitov , Česká Lípa - výstavba kolumbária (II.)**	**170 dny**	**6.10. 17**	**31.5. 18**	1.536.078,91 Kč bez DPH
2			podpis SOD	1 den	6.10. 17	6.10. 17	
3			převzetí staveniště	1 den	16.11. 17	16.11. 17	
4			zařízení staveniště	2 dny	17.11. 17	20.11. 17	
5			oplocení	1 den	24.11. 17	24.11. 17	
6			zemní práce - výkopy	7 dny	24.11. 17	4.12. 17	203.424,80 Kč
7			podkladový beton	2 dny	4.12. 17	5.12. 17	
8			bednění základů	3 dny	6.12. 17	8.12. 17	
9			armování základů	4 dny	8.12. 17	13.12. 17	
10			základy - betonáž	2 dny	13.12. 17	14.12. 17	
11			odbednění	2 dny	21.12. 17	22.12. 17	327.394,84 Kč + 12.102,92 Kč
12			odstávka vánoční svátky	10 dny	23.12. 17	4.1. 18	
13			zednické práce1 část	32 dny	24.1. 18	8.3. 18	200.000,- Kč
14			zamečnické práce - dodávka kříže	4 dny	16.4. 18	19.4. 18	
15			zednické práce 2 část	30 dny	16.4. 18	25.5. 18	
16			terénní úpravy	7 dny	12.3. 18	20.3. 18	
17			pokládky dlažby	22 dny	20.4. 18	21.5. 18	
18			lavičky- základ	10 dny	21.3. 18	3.4. 18	620.000,- Kč
19			lavičky - zednické práce	14 dny	4.4. 18	23.4. 18	
20			kompletace	10 dny	24.4. 18	7.5. 18	
21			předpřejímka	3 dny	21.5. 18	23.5. 18	
22			úklidové práce	2 dny	24.5. 18	25.5. 18	
23			předání díla	1 den	28.5. 18	28.5. 18	364.156,35 Kč

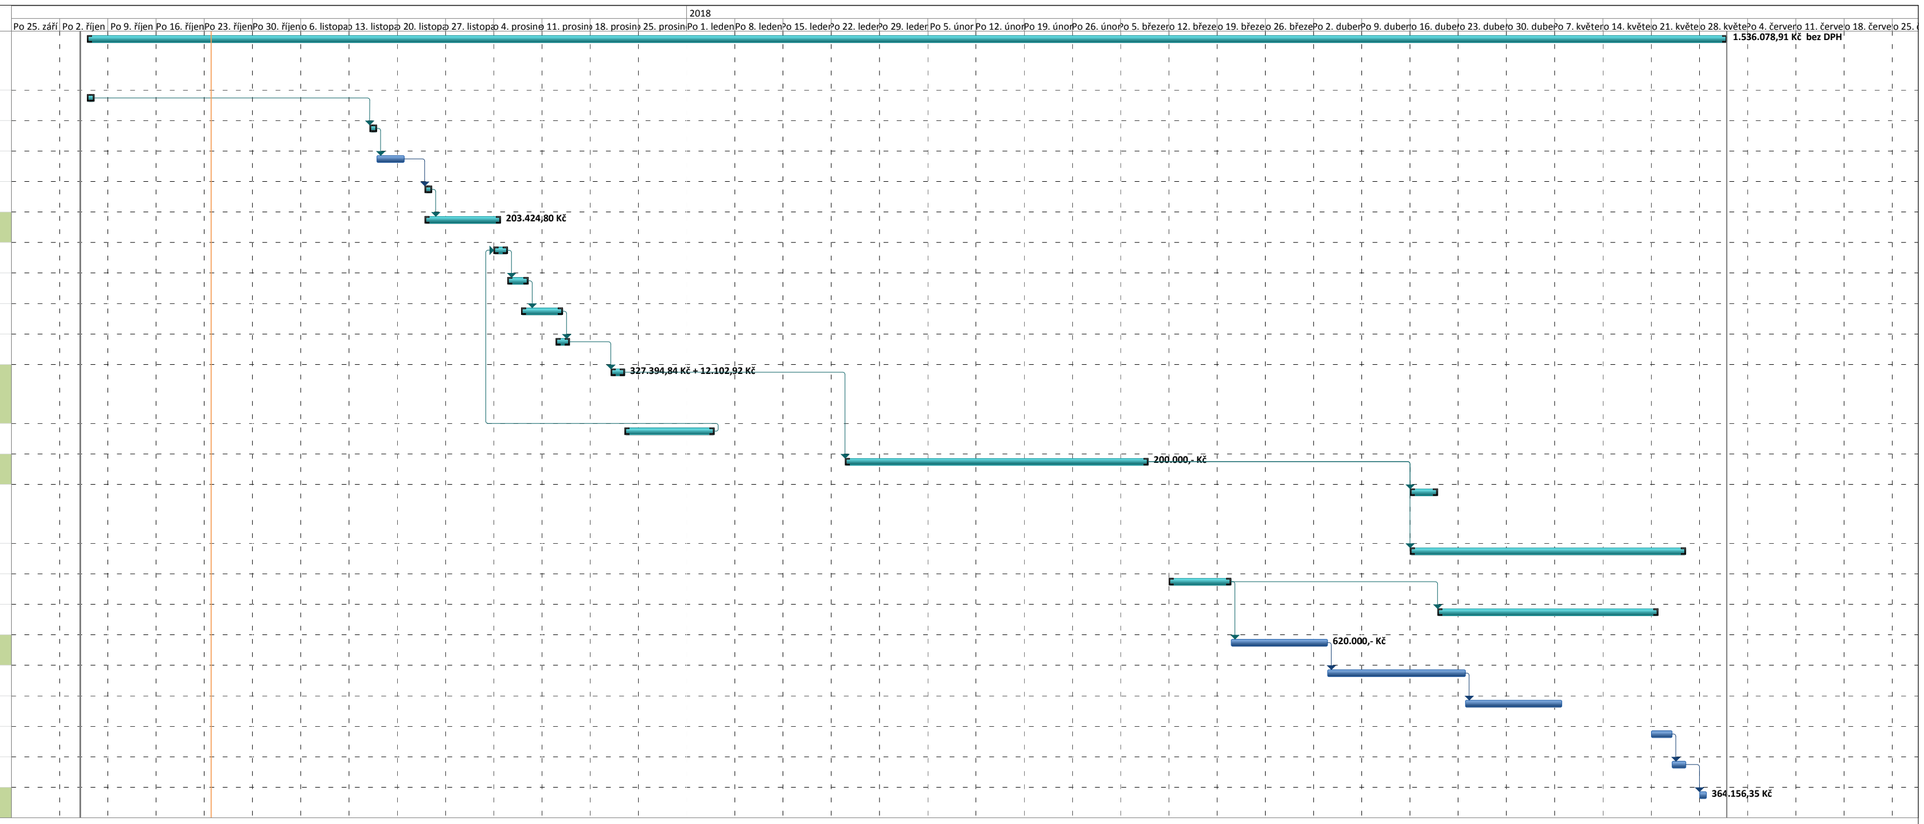

Projekt: Jurek HMG Lípa
Datum: 24.10. 17

Úkol		Souhrnný		Vnější milník		Neaktivní souhrn		Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu		Pouze s datem dokončení	
Rozdělení		Souhrn projektu		Neaktivní úkol		Ruční úkol		Ruční souhrn		Konečný termín	
Milník		Vnější úkoly		Neaktivní milník		Pouze s dobou trvání		Pouze zahájení		Průběh	
