Příloha č. 3 smlouvy: Časový harmonogram

P.č.	Činnost	1. týden	2. týden	3. týden	4. týden	5. týden	6. týden	7. týden	8. týden	9. týden
	Objekt 01 - SPU									
	Svislé a kompletní konstrukce									
	Vodorovné konstrukce									
	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní									
	Ostatní konstrukce a práce, bourání									
	Přesun sutě									
	Přesun hmot									
	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům									
	Izolace tepelné									
	Konstrukce tesařské									
	Konstrukce suché výstavby									
	Konstrukce truhlářské									
	Konstrukce zámečnické									
	Podlahy z dlaždic									
	Podlahy povlakové									
	Podlahy lité									
	Dokončovací práce - obklady									
	Dokončovací práce - nátěry									
	Dokončovací práce - malby a tapety									
	Interiér									
	Ostatní									
	Objekt 02 - objekt DEPO									
	Zenmí práce									
	Zakládání									
	Svislé a kompletní konstrukce									
	Vodorovné konstrukce									
	Komunikace pozemní									
	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní									
	Ostatní konstrukce a práce, bourání									
	Přesun sutě									
	Přesun hmot									
	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům									
	Konstrukce klempířské									
	Konstrukce tesařské									
	Konstrukce truhlářské									
	Konstrukce zámečnické									
	Podlahy z dlaždic									
	Podlahy lité									
	Dokončovací práce - nátěry									
	Dokončovací práce - malby a tapety									
	Objekt 03 - Pošta Ostrava 2									
	Zemní práce									
	Svislé a kompletní konstrukce									
	Vodorovné konstrukce									
	Komunikace pozemní									
	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní									

STAVBA CELEK

předání a převzetí staveniště

- Ostatní konstrukce a práce, bourání
- Přesun sutě
- Přesun hmot
- Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům
- Izolace tepelné
- Konstrukce suché výstavby
- Konstrukce truhlářské
- Konstrukce zámečnické
- Podlahy z dlaždic
- Podlahy povlakové
- Podlahy lité
- Dokončovací práce - obklady
- Dokončovací práce - nátěry
- Dokončovací práce - malby a tapety
- Dokončovací práce - zasklívání
- Interiér
- Montáže dopravních zařízení a váh
- **Objekt 04 - Společná část**
- Zemní práce
- Zakládání
- Svislé a kompletní konstrukce
- Vodorovné konstrukce
- Komunikace pozemní
- Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
- Ostatní konstrukce a práce, bourání
- Přesun sutě
- Přesun hmot
- Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům
- Izolace tepelné
- Povlakové krytiny
- Akustická a protiotřesová opatření
- Zdravotechnika
- Ústřední vytápění
- Elektromontáže
- Vzduchotechnika
- Konstrukce tesařské
- Konstrukce suché výstavby
- Konstrukce klempířské
- Konstrukce truhlářské
- Konstrukce zámečnické
- Podlahy z dlaždic
- Podlahy povlakové
- Podlahy lité
- Dokončovací práce - obklady
- Dokončovací práce - nátěry
- Dokončovací práce - malby a tapety
- Dokončovací práce - stínící
- Dokončovací práce - zasklívání
- Interiér
- Ostatní



* Lhůta výstavby je počítána ode dne následujícího po dni předání a převzetí staveniště v kalendářních dnech.

Příloha č. 3 smlouvy: Časový harmonogram

P.č.	Činnost	10. týden	11. týden	12. týden	13. týden	14. týden	15. týden	16. týden	17. týden
	Objekt 01 - SPU								
	Svislé a kompletní konstrukce								
	Vodorovné konstrukce								
	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní								
	Ostatní konstrukce a práce, bourání								
	Přesun sutě								
	Přesun hmot								
	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům								
	Izolace tepelné								
	Konstrukce tesařské								
	Konstrukce suché výstavby								
	Konstrukce truhlářské								
	Konstrukce zámečnické								
	Podlahy z dlaždic								
	Podlahy povlakové								
	Podlahy lité								
	Dokončovací práce - obklady								
	Dokončovací práce - nátěry								
	Dokončovací práce - malby a tapety								
	Interiér								
	Ostatní								
	Objekt 02 - objekt DEPO								
	Zenmí práce								
	Zakládání								
	Svislé a kompletní konstrukce								
	Vodorovné konstrukce								
	Komunikace pozemní								
	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní								
	Ostatní konstrukce a práce, bourání								
	Přesun sutě								
	Přesun hmot								
	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům								
	Konstrukce klempířské								
	Konstrukce tesařské								
	Konstrukce truhlářské								
	Konstrukce zámečnické								
	Podlahy z dlaždic								
	Podlahy lité								
	Dokončovací práce - nátěry								
	Dokončovací práce - malby a tapety								
	Objekt 03 - Pošta Ostrava 2								
	Zemní práce								
	Svislé a kompletní konstrukce								
	Vodorovné konstrukce								
	Komunikace pozemní								
	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní								

STAVBA CELEK

	Ostatní konstrukce a práce, bourání
	Přesun sutě
	Přesun hmot
	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům
	Izolace tepelné
	Konstrukce suché výstavby
	Konstrukce truhlářské
	Konstrukce zámečnické
	Podlahy z dlaždic
	Podlahy povlakové
	Podlahy lité
	Dokončovací práce - obklady
	Dokončovací práce - nátěry
	Dokončovací práce - malby a tapety
	Dokončovací práce - zasklívání
	Interiér
	Montáže dopravních zařízení a váh
	Objekt 04 - Společná část
	Zemní práce
	Zakládání
	Svislé a kompletní konstrukce
	Vodorovné konstrukce
	Komunikace pozemní
	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
	Ostatní konstrukce a práce, bourání
	Přesun sutě
	Přesun hmot
	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům
	Izolace tepelné
	Povlakové krytiny
	Akustická a protiotřesová opatření
	Zdravotechnika
	Ústřední vytápění
	Elektromontáže
	Vzduchotechnika
	Konstrukce tesařské
	Konstrukce suché výstavby
	Konstrukce klempířské
	Konstrukce truhlářské
	Konstrukce zámečnické
	Podlahy z dlaždic
	Podlahy povlakové
	Podlahy lité
	Dokončovací práce - obklady
	Dokončovací práce - nátěry
	Dokončovací práce - malby a tapety
	Dokončovací práce - stínící
	Dokončovací práce - zasklívání
	Interiér
	Ostatní

| | | |

Příloha č. 3 smlouvy: Časový harmonogram

P.č.	Činnost	18. týden	19. týden	20. týden	21. týden	22. týden	23. týden	24
	Objekt 01 - SPU							
	Svislé a kompletní konstrukce							
	Vodorovné konstrukce							
	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							
	Ostatní konstrukce a práce, bourání							
	Přesun sutě							
	Přesun hmot							
	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům							
	Izolace tepelné							
	Konstrukce tesařské							
	Konstrukce suché výstavby							
	Konstrukce truhlářské							
	Konstrukce zámečnické							
	Podlahy z dlaždic							
	Podlahy povlakové							
	Podlahy lité							
	Dokončovací práce - obklady							
	Dokončovací práce - nátěry							
	Dokončovací práce - malby a tapety							
	Interiér							
	Ostatní							
	Objekt 02 - objekt DEPO							
	Zenmí práce							
	Zakládání							
	Svislé a kompletní konstrukce							
	Vodorovné konstrukce							
	Komunikace pozemní							
	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							
	Ostatní konstrukce a práce, bourání							
	Přesun sutě							
	Přesun hmot							
	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům							
	Konstrukce klempířské							
	Konstrukce tesařské							
	Konstrukce truhlářské							
	Konstrukce zámečnické							
	Podlahy z dlaždic							
	Podlahy lité							
	Dokončovací práce - nátěry							
	Dokončovací práce - malby a tapety							
	Objekt 03 - Pošta Ostrava 2							
	Zemní práce							
	Svislé a kompletní konstrukce							
	Vodorovné konstrukce							
	Komunikace pozemní							
	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							

STAVBA CELEK

	Ostatní konstrukce a práce, bourání
	Přesun sutě
	Přesun hmot
	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům
	Izolace tepelné
	Konstrukce suché výstavby
	Konstrukce truhlářské
	Konstrukce zámečnické
	Podlahy z dlaždic
	Podlahy povlakové
	Podlahy lité
	Dokončovací práce - obklady
	Dokončovací práce - nátěry
	Dokončovací práce - malby a tapety
	Dokončovací práce - zasklívání
	Interiér
	Montáže dopravních zařízení a váh
	Objekt 04 - Společná část
	Zemní práce
	Zakládání
	Svislé a kompletní konstrukce
	Vodorovné konstrukce
	Komunikace pozemní
	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
	Ostatní konstrukce a práce, bourání
	Přesun sutě
	Přesun hmot
	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům
	Izolace tepelné
	Povlakové krytiny
	Akustická a protiotřesová opatření
	Zdravotechnika
	Ústřední vytápění
	Elektromontáže
	Vzduchotechnika
	Konstrukce tesařské
	Konstrukce suché výstavby
	Konstrukce klempířské
	Konstrukce truhlářské
	Konstrukce zámečnické
	Podlahy z dlaždic
	Podlahy povlakové
	Podlahy lité
	Dokončovací práce - obklady
	Dokončovací práce - nátěry
	Dokončovací práce - malby a tapety
	Dokončovací práce - stínící
	Dokončovací práce - zasklívání
	Interiér
	Ostatní

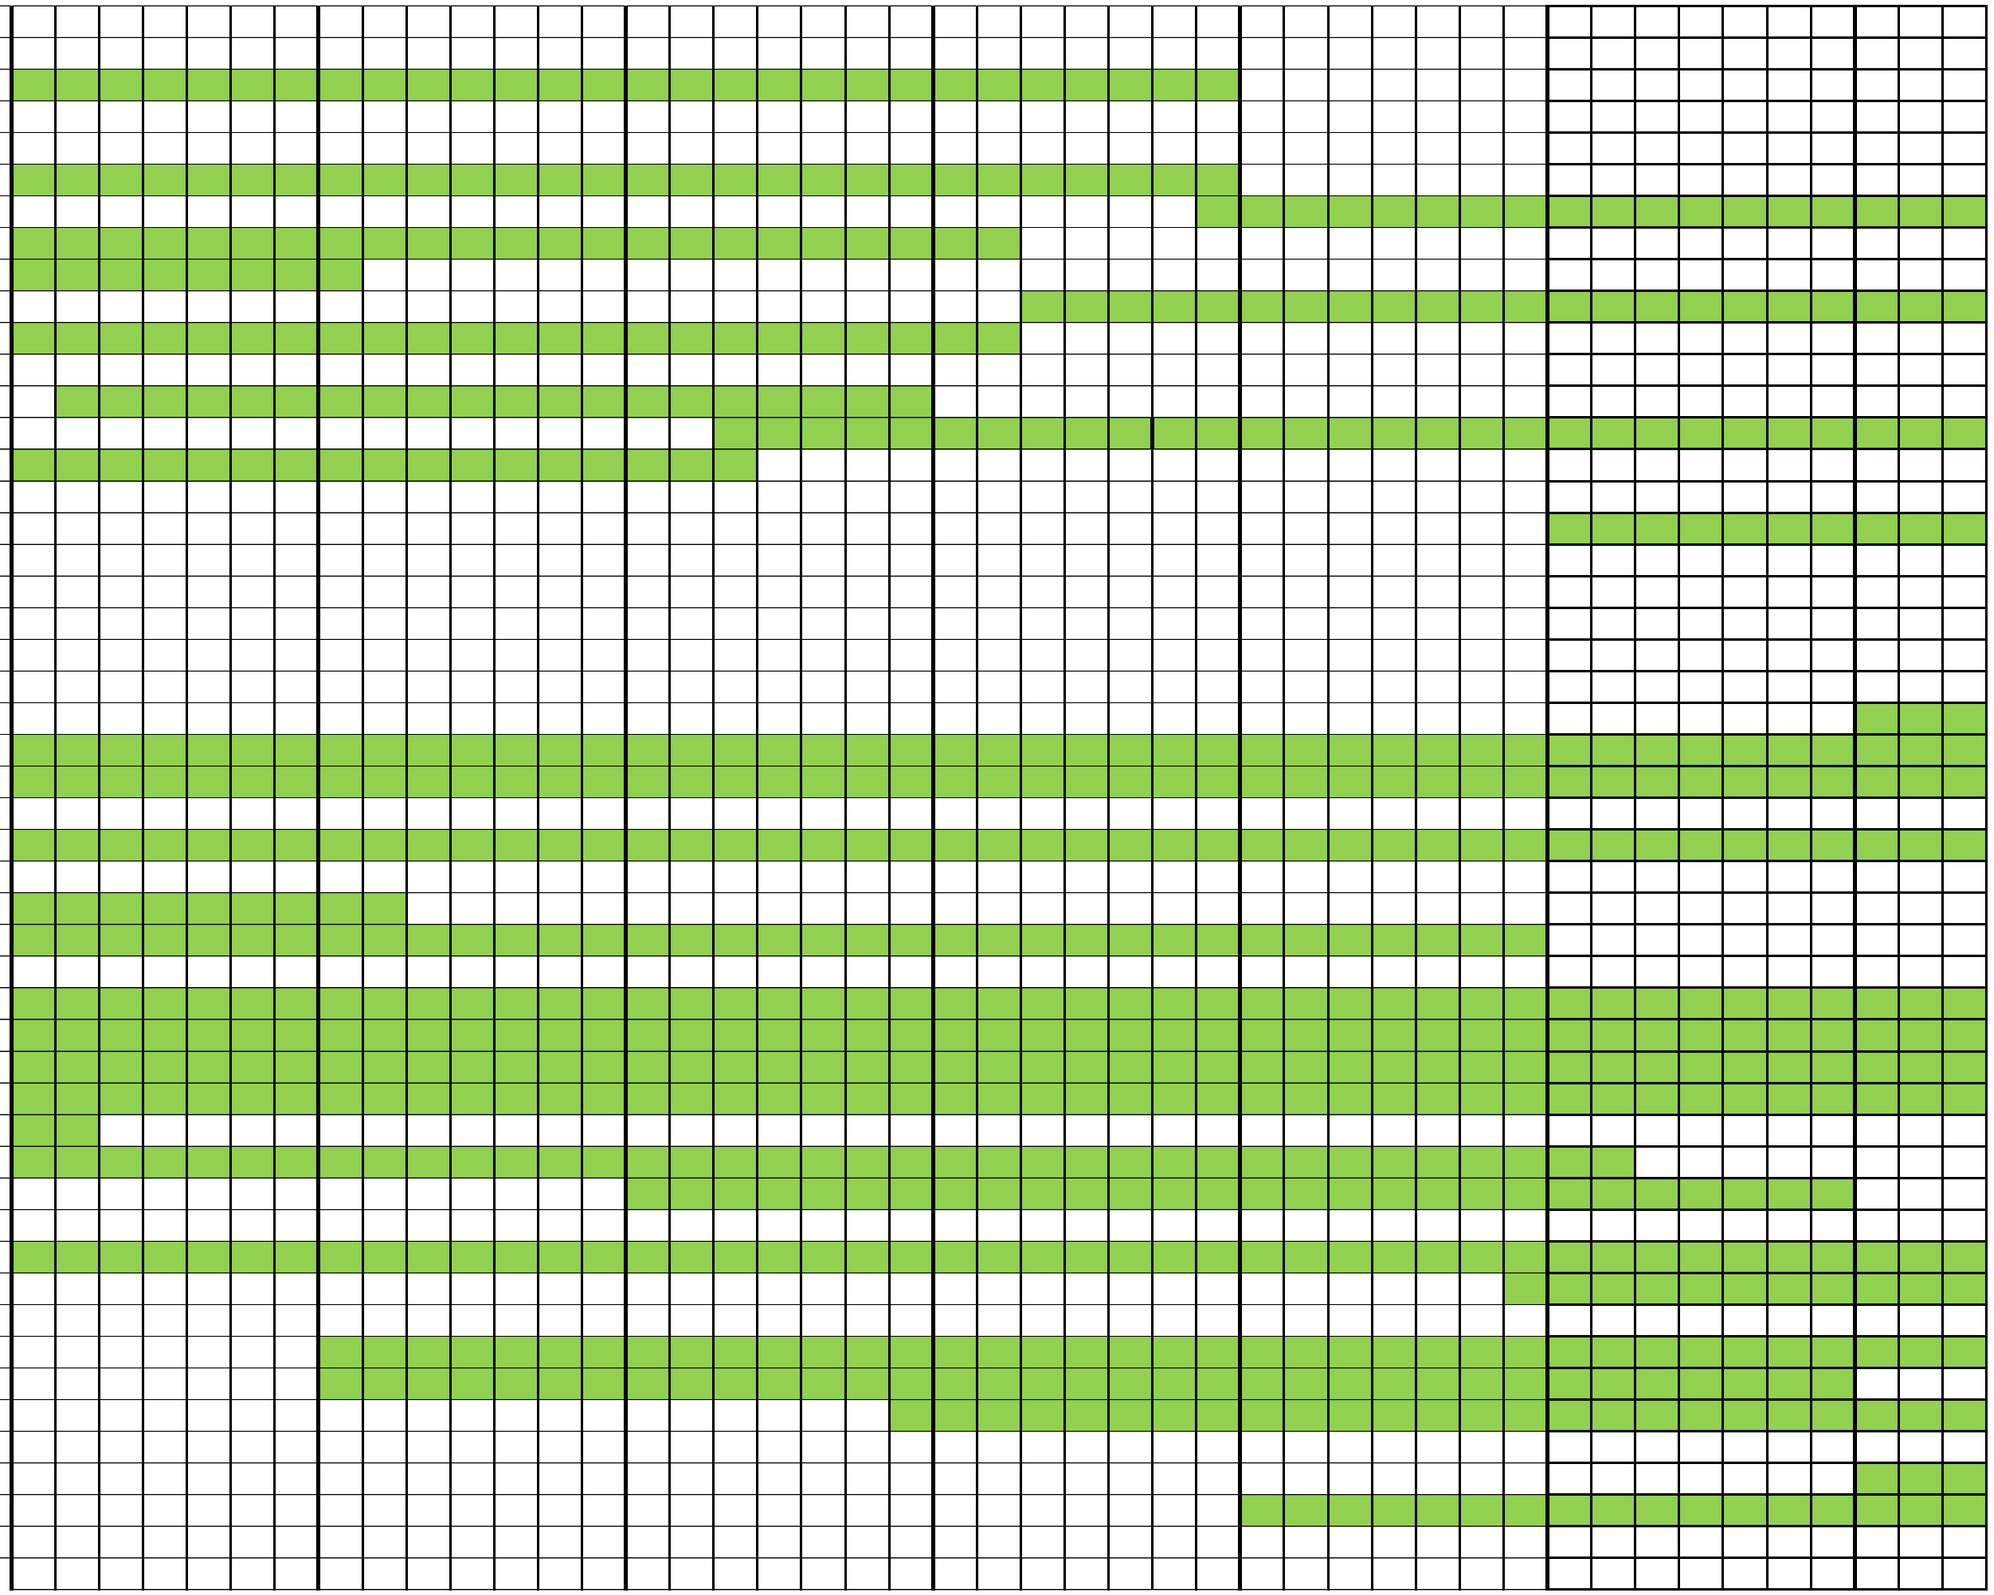

	Repase																																															
	Provizorní opatření																																															
	Vedlejší náklady																																															
	Odstranění KV a KN																																															
	Předání díla																																															
	Lhůta výstavby* : max. 215	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164

* Lhůta výstavby je počítána ode dne ná

Příloha č. 3 smlouvy: Časový harmonogram

P.č.	Činnost	. týden	25. týden	26. týden	27. týden	28. týden	29. týden	30. týden
	Objekt 01 - SPU							
	Svislé a kompletní konstrukce							
	Vodorovné konstrukce							
	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							
	Ostatní konstrukce a práce, bourání							
	Přesun sutě							
	Přesun hmot							
	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům							
	Izolace tepelné							
	Konstrukce tesařské							
	Konstrukce suché výstavby							
	Konstrukce truhlářské							
	Konstrukce zámečnické							
	Podlahy z dlaždic							
	Podlahy povlakové							
	Podlahy lité							
	Dokončovací práce - obklady							
	Dokončovací práce - nátěry							
	Dokončovací práce - malby a tapety							
	Interiér							
	Ostatní							
	Objekt 02 - objekt DEPO							
	Zenmí práce							
	Zakládání							
	Svislé a kompletní konstrukce							
	Vodorovné konstrukce							
	Komunikace pozemní							
	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							
	Ostatní konstrukce a práce, bourání							
	Přesun sutě							
	Přesun hmot							
	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům							
	Konstrukce klempířské							
	Konstrukce tesařské							
	Konstrukce truhlářské							
	Konstrukce zámečnické							
	Podlahy z dlaždic							
	Podlahy lité							
	Dokončovací práce - nátěry							
	Dokončovací práce - malby a tapety							
	Objekt 03 - Pošta Ostrava 2							
	Zemní práce							
	Svislé a kompletní konstrukce							
	Vodorovné konstrukce							
	Komunikace pozemní							
	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							

STAVBA CELEK

Ostatní konstrukce a práce, bourání																																												
Přesun sutě																																												
Přesun hmot																																												
Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům																																												
Izolace tepelné																																												
Konstrukce suché výstavby																																												
Konstrukce truhlářské																																												
Konstrukce zámečnické																																												
Podlahy z dlaždic																																												
Podlahy povlakové																																												
Podlahy lité																																												
Dokončovací práce - obklady																																												
Dokončovací práce - nátěry																																												
Dokončovací práce - malby a tapety																																												
Dokončovací práce - zasklívání																																												
Interiér																																												
Montáže dopravních zařízení a váh																																												
Objekt 04 - Společná část																																												
Zemní práce																																												
Zakládání																																												
Svislé a kompletní konstrukce																																												
Vodorovné konstrukce																																												
Komunikace pozemní																																												
Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní																																												
Ostatní konstrukce a práce, bourání																																												
Přesun sutě																																												
Přesun hmot																																												
Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům																																												
Izolace tepelné																																												
Povlakové krytiny																																												
Akustická a protiotřesová opatření																																												
Zdravotechnika																																												
Ústřední vytápění																																												
Elektromontáže																																												
Vzduchotechnika																																												
Konstrukce tesařské																																												
Konstrukce suché výstavby																																												
Konstrukce klempířské																																												
Konstrukce truhlářské																																												
Konstrukce zámečnické																																												
Podlahy z dlaždic																																												
Podlahy povlakové																																												
Podlahy lité																																												
Dokončovací práce - obklady																																												
Dokončovací práce - nátěry																																												
Dokončovací práce - malby a tapety																																												
Dokončovací práce - stínící																																												
Dokončovací práce - zasklívání																																												
Interiér																																												
Ostatní																																												

Repase																																														
Provizorní opatření																																														
Vedlejší náklady																																														
Odstranění KV a KN																																														
Předání díla																																														
Lhůta výstavby* : max. 215	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209

* Lhůta výstavby je počítána ode dne ná

Příloha č. 3 smlouvy: Časový harmonogram

P.č.	Činnost		31 týden				
	Objekt 01 - SPU						
	Svislé a kompletní konstrukce						
	Vodorovné konstrukce						
	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní						
	Ostatní konstrukce a práce, bourání						
	Přesun sutě						
	Přesun hmot						
	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům						
	Izolace tepelné						
	Konstrukce tesařské						
	Konstrukce suché výstavby						
	Konstrukce truhlářské						
	Konstrukce zámečnické						
	Podlahy z dlaždic						
	Podlahy povlakové						
	Podlahy lité						
	Dokončovací práce - obklady						
	Dokončovací práce - nátěry						
	Dokončovací práce - malby a tapety						
	Interiér						
	Ostatní						
	Objekt 02 - objekt DEPO						
	Zenmí práce						
	Zakládání						
	Svislé a kompletní konstrukce						
	Vodorovné konstrukce						
	Komunikace pozemní						
	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní						
	Ostatní konstrukce a práce, bourání						
	Přesun sutě						
	Přesun hmot						
	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům						
	Konstrukce klempířské						
	Konstrukce tesařské						
	Konstrukce truhlářské						
	Konstrukce zámečnické						
	Podlahy z dlaždic						
	Podlahy lité						
	Dokončovací práce - nátěry						
	Dokončovací práce - malby a tapety						
	Objekt 03 - Pošta Ostrava 2						
	Zemní práce						
	Svislé a kompletní konstrukce						
	Vodorovné konstrukce						
	Komunikace pozemní						
	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní						

STAVBA CELEK		Ostatní konstrukce a práce, bourání					předání díla
		Přesun sutě					
		Přesun hmot					
		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům					
		Izolace tepelné					
		Konstrukce suché výstavby					
		Konstrukce truhlářské					
		Konstrukce zámečnické					
		Podlahy z dlaždic					
		Podlahy povlakové					
		Podlahy lité					
		Dokončovací práce - obklady					
		Dokončovací práce - nátěry					
		Dokončovací práce - malby a tapety					
		Dokončovací práce - zasklívání					
		Interiér					
		Montáže dopravních zařízení a váh					
		Objekt 04 - Společná část					
		Zemní práce					
		Zakládání					
		Svislé a kompletní konstrukce					
		Vodorovné konstrukce					
		Komunikace pozemní					
		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					
		Ostatní konstrukce a práce, bourání					
		Přesun sutě					
		Přesun hmot					
		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům					
		Izolace tepelné					
		Povlakové krytiny					
		Akustická a protiotřesová opatření					
		Zdravotechnika					
		Ústřední vytápění					
		Elektromontáže					
		Vzduchotechnika					
		Konstrukce tesařské					
		Konstrukce suché výstavby					
		Konstrukce klempířské					
		Konstrukce truhlářské					
		Konstrukce zámečnické					
		Podlahy z dlaždic					
		Podlahy povlakové					
		Podlahy lité					
		Dokončovací práce - obklady					
		Dokončovací práce - nátěry					
		Dokončovací práce - malby a tapety					
		Dokončovací práce - stínící					
		Dokončovací práce - zasklívání					
		Interiér					
		Ostatní					

	Repase						
	Provizorní opatření						
	Vedlejší náklady						
	Odstranění KV a KN						
	Předání díla						
	Lhůta výstavby* : max. 215	210	211	212	213	214	215

* Lhůta výstavby je počítána ode dne ná
