příloha č.2 k SOD 17 - 011
z.č. 17 - 022

Stavební úpravy krytého bazénu v Karviné

Harmonogram projektové a inženýrské přípravy

název fáze	FÁZE	stav	LHŮTA
	týden		
průzkumy	Podklady a průzkumy	hotovo	
studie	Dispoziční studie	hotovo	
DÚR	Zpracování dokumentace pro rozhodnutí o umístění stavby		8 týdnů
	Projednání dokumentace se správci sítí a OSS		6 týdnů
	Podání žádosti a zajištění rozhodnutí o umístění stavby		14 týdnů
KZ	Dokumentace kácení zeleně		3 týdny
	Projednání dokumentace kácení s OSS		5 týdnů
	Podání žádosti a zajištění rozhodnutí o kácení		5 týdnů
DSP	Zpracování dokumentace pro stavební povolení		10 týdnů
	Projednání dokumentace se správci sítí a OSS		6 týdnů
	Podání žádosti a zajištění stavebního povolení		10 týdnů
DPS	Zpracování dokumentace pro provádění stavby		10 týdnů

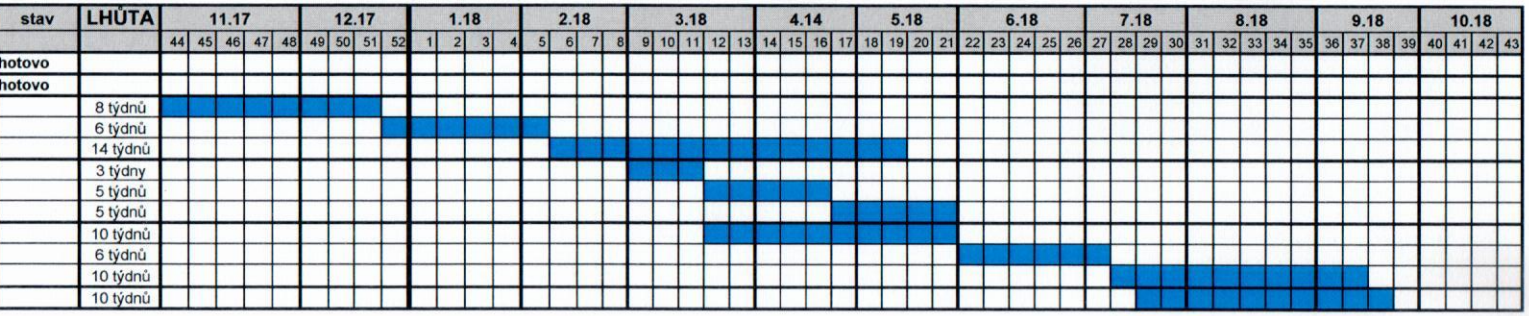

V Ostravě dne 31.10.2017

.....
ing. arch. Aleš Vojtasík
jednatel
