ID	Text_1	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení
1					
2		**Milníky a doba plnění**	**913 dny**	**1.12. 17**	**31.5. 20**
3		**Převzetí staveniště, zahájení prací**	**0 dny**	**1.12. 17**	**1.12. 17**
4		**Časový úsek uvedení stavby do provozu (30 měsíců)**	**913 dny**	**1.12. 17**	**31.5. 20**
5		**Časový úsek dokončení stavby (30 měsíců)**	**913 dny**	**1.12. 17**	**31.5. 20**
6					
7		**Etapy výstavby**	**907 dny**	**1.12. 17**	**25.5. 20**
8		**ETAPA 1**	**120 dny**	**1.12. 17**	**30.3. 18**
9		**ETAPA 2**	**30 dny**	**1.3. 18**	**30.3. 18**
10		**ETAPA 3**	**125 dny**	**31.3. 18**	**2.8. 18**
11		**ETAPA 4**	**345 dny**	**31.3. 18**	**10.3. 19**
12		**ETAPA 5**	**332 dny**	**11.3. 19**	**5.2. 20**
13		**ETAPA 6**	**140 dny**	**19.9. 19**	**5.2. 20**
14		**ETAPA 7**	**20 dny**	**6.2. 20**	**25.2. 20**
15		**ETAPA 8**	**35 dny**	**26.2. 20**	**31.3. 20**
16		**ETAPA 9**	**30 dny**	**1.4. 20**	**30.4. 20**
17		**ETAPA 10**	**25 dny**	**1.5. 20**	**25.5. 20**
18					
19		**Nestavební činnosti**	**913 dny**	**1.12. 17**	**31.5. 20**
20		**Projektová dokumentace realizační (ZAJIŠŤUJE OBJEDNATEL)**	**25 dny**	**1.12. 17**	**25.12. 17**
21		**Výrobně technická dokumentace, technol předpisy - po etapách**	**340 dny**	**16.12. 17**	**30.12. 19**
22		**Dokumentace skutečného provedení stavby - DSPS**	**255 dny**	**20.9. 19**	**31.5. 20**
23		**Předání a převzetí stavby**	**62 dny**	**31.3. 20**	**31.5. 20**
24	**000**	**Vedlejší a ostatní náklady**	**913 dny**	**1.12. 17**	**31.5. 20**
25					
26	**17069D01**	**Stavba v zájmu Statutárního města Brna**	**897 dny**	**1.12. 17**	**15.5. 20**
27	**PS**	**Technologická část**	**829 dny**	**23.1. 18**	**30.4. 20**
28	**PS 140**	**Světelná signalizace**	**829 dny**	**23.1. 18**	**30.4. 20**
29	**140.10.01**	**Výstavba SSZ 3.14 Dornych-Nová Agrozet**	**84 dny**	**5.11. 18**	**27.1. 19**
31	**140.10.02**	**Koordinační kabel Dornych v úseku Spěšná - Svatopeterská**	**84 dny**	**31.3. 18**	**22.6. 18**
33	**140.10.03**	**Výstavba SSZ 3.09 Dornych-Svatopeterská**	**155 dny**	**1.3. 18**	**2.8. 18**
34	HSV	ETAPA 2	30 dny	1.3. 18	30.3. 18
35		ETAPA 3	74 dny	21.5. 18	2.8. 18
36	**140.20.01**	**Výstavba SSZ 3.11 Dornych - Nová (Rosická)**	**95 dny**	**5.11. 18**	**7.2. 19**
38	**140.20.02**	**Výstavba SSZ 3.13 Dornych - Trinity business**	**71 dny**	**25.8. 18**	**3.11. 18**
40	**140.20.04**	**Koordinační kabel Dornych v úseku Dornych - Nová (Rosická) - Spěšná**	**58 dny**	**7.8. 18**	**3.10. 18**
42	**140.30.01**	**Rekonsturkce SSZ 3.12. Dornych - Úzká**	**20 dny**	**12.3. 20**	**31.3. 20**
44	**140.30.04**	**Demontáž SSZ 3,09 Dornych -Svatopetrská**	**90 dny**	**31.3. 18**	**28.6. 18**
45		ETAPA 3	43 dny	31.3. 18	12.5. 18
46		ETAPA 4	51 dny	9.5. 18	28.6. 18
47	**140.30.05**	**Koordinační kabel Nová Roscká Plotní**	**35 dny**	**23.1. 18**	**26.2. 18**
49	**140.40.01**	**Výstavba SSZ 3.06. Dornych Plotní**	**30 dny**	**1.4. 20**	**30.4. 20**
51	**140.40.03**	**Přeložka koordinačního kabelu**	**49 dny**	**19.9. 19**	**6.11. 19**
53	**140.40.04**	**Koordinační kabel dornych v úseku Úzká-Dornych**	**155 dny**	**22.5. 19**	**23.10. 19**
55	**SO**	**Stavební část**	**897 dny**	**1.12. 17**	**15.5. 20**
56	**SO 100**	**Komunikace, zpevněné plochy**	**845 dny**	**1.1. 18**	**24.4. 20**
57	**100.10.2**	**Ul. Svatopetrská - Dornych 1.část, chodníky**	**71 dny**	**24.5. 18**	**2.8. 18**
77	**100.13.1**	**Ul. Kovářská, komunikace**	**69 dny**	**2.8. 19**	**9.10. 19**
91	**100.13.2**	**Ul. Kovářská, chodníky**	**50 dny**	**25.9. 19**	**13.11. 19**
100	**100.20.2**	**Ul. Dornych 2.část, chodníky**	**249 dny**	**5.7. 18**	**10.3. 19**
101	**100.20.2-1**	**Ul. Dornych 2.část, chodníky**	**249 dny**	**5.7. 18**	**10.3. 19**
102	1	Zemní práce	249 dny	5.7. 18	10.3. 19
103	18	Povrchové úpravy terénu	70 dny	31.12. 18	10.3. 19
104	21	Úprava podloží a základ.spáry	78 dny	23.8. 18	8.11. 18
105	2	Zakládání	55 dny	5.10. 18	28.11. 18
106	3	Svislé a kompletní konstrukce	45 dny	24.10. 18	7.12. 18
107	4	Vodorovné konstrukce	94 dny	30.8. 18	1.12. 18
108	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování	95 dny	28.11. 18	2.3. 19
109	8	Trubní vedení	74 dny	20.8. 18	1.11. 18
110	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	57 dny	8.7. 18	2.9. 18
111	997	Přesun sutě	60 dny	5.7. 18	2.9. 18
112	998	Přesun hmot	249 dny	5.7. 18	10.3. 19
113	**100.20.2-2**	**4ZM2 nové oplocení**	**94 dny**	**17.10. 18**	**18.1. 19**
120	**100.20.2-3**	**Nové oplocení, vč. demolice stávajícího**	**74 dny**	**18.8. 18**	**30.10. 18**
125	**100.20.2-0**	**Nové oplocení, vč. demolice stávajícího (HM RENT)**	**55 dny**	**9.7. 18**	**1.9. 18**
135	**100.20.4**	**Křižovatka Dornych - Zvonařka, chodníky**	**89 dny**	**4.11. 19**	**31.1. 20**
151	**100.21.2**	**Ul. Nová (Rosická), chodníky**	**50 dny**	**2.8. 19**	**20.9. 19**
158	**100.22.1**	**Vnitroblok , komunikace**	**94 dny**	**13.10. 19**	**14.1. 20**
169	**100.30.1**	**Ul. Svatopetrská - 2. část, komunikace**	**85 dny**	**5.1. 18**	**30.3. 18**
188	**100.30.2**	**Ul. Svatopetrská - 2. část, chodníky**	**73 dny**	**15.1. 18**	**28.3. 18**
209	**100.30.4**	**Ul. Nová AGROZET, Komárovská - Plotní, chodníky**	**74 dny**	**8.1. 18**	**22.3. 18**
224	**100.31.1**	**Ul. Plotní - 1. část, komunikace**	**178 dny**	**22.4. 19**	**16.10. 19**
225	**01 PÚ**	**příprava území demolice, odstranění, fréza**	**54 dny**	**22.4. 19**	**14.6. 19**
227	**02 STAVBA**	**výkopy, sanace, násypy, drenáže, gabiony**	**120 dny**	**24.5. 19**	**20.9. 19**
229	**02.02 CHRÁNIČKY**	**založení chrániček**	**55 dny**	**17.6. 19**	**10.8. 19**
231	**03 STAVBA**	**odvodnění UV, šterbiny, přídlažba, spáry, obruby**	**77 dny**	**28.6. 19**	**12.9. 19**
232	**2**	**Zakládání**	**69 dny**	**8.6. 19**	**15.8. 19**
233	**4**	**Vodorovné konstrukce**	**58 dny**	**7.7. 19**	**2.9. 19**
234	**5**	**Komunikace**	**65 dny**	**9.8. 19**	**12.10. 19**
235	**9**	**Ostatní konstrukce a práce-bourání CPV 4525900000-1**	**155 dny**	**22.4. 19**	**23.9. 19**
236	**997**	**Přesun sutě**	**84 dny**	**22.4. 19**	**14.7. 19**
237	**998**	**Přesun hmot**	**178 dny**	**22.4. 19**	**16.10. 19**
238	**PSV**	**Práce a dodávky PSV**	**74 dny**	**28.7. 19**	**9.10. 19**
240	**100.31.2**	**Ul. Plotní - 1. část, chodníky**	**101 dny**	**27.6. 19**	**5.10. 19**
241	**01 PÚ**	**příprava území demolice, odstranění, fréza**	**55 dny**	**27.6. 19**	**20.8. 19**
244	**02 STAVBA**	**výkopy, sanace, násypy, drenáže, gabiony**	**74 dny**	**8.7. 19**	**19.9. 19**
246	**02.02 CHRÁNIČKY**	**založení chrániček**	**45 dny**	**22.7. 19**	**4.9. 19**
248	**03 STAVBA**	**odvodnění UV, šterbiny, přídlažba, spáry, obruby**	**64 dny**	**15.7. 19**	**16.9. 19**
250	**K Cch**	**KOMUNIKACE**	**55 dny**	**12.8. 19**	**5.10. 19**
252	**100.32.1B**	**Ul. Plotní - 2. část, komunikace**	**161 dny**	**15.7. 19**	**22.12. 19**
253	**01 PÚ**	**příprava území demolice, odstranění, fréza**	**77 dny**	**15.7. 19**	**29.9. 19**
256	**02 STAVBA**	**výkopy, sanace, násypy, drenáže, gabiony**	**121 dny**	**5.8. 19**	**3.12. 19**
258	**PSV**	**Práce a dodávky PSV**	**80 dny**	**26.8. 19**	**13.11. 19**
260	**11.1.06.2.1**	**Komunikace**	**63 dny**	**21.10. 19**	**22.12. 19**
263	**100.32.2**	**Ul. Plotní - 2. část, chodníky**	**87 dny**	**13.10. 19**	**7.1. 20**
264	**01 PÚ**	**příprava území demolice, odstranění, fréza**	**49 dny**	**13.10. 19**	**30.11. 19**
267	**02 STAVBA**	**výkopy, sanace, násypy, drenáže, gabiony**	**60 dny**	**24.10. 19**	**22.12. 19**
269	**02.02 CHRÁNIČKY**	**založení chrániček**	**33 dny**	**9.11. 19**	**11.12. 19**
271	**03 STAVBA**	**odvodnění UV, šterbiny, přídlažba, spáry, obruby**	**46 dny**	**5.11. 19**	**20.12. 19**
273	**K Cch**	**Komunikace**	**46 dny**	**23.11. 19**	**7.1. 20**
275	**100.33.1**	**Ul. Plotní - 3. část, komunikace**	**94 dny**	**1.1. 18**	**4.4. 18**
292	**100.33.2**	**Ul. Plotní - 3. část, chodníky**	**72 dny**	**8.1. 18**	**20.3. 18**
311	**100.34.1**	**Ul. Spěšná, komunikace**	**67 dny**	**6.12. 19**	**10.2. 20**
328	**100.34.2**	**Ul. Spěšná, chodníky**	**55 dny**	**6.12. 19**	**29.1. 20**

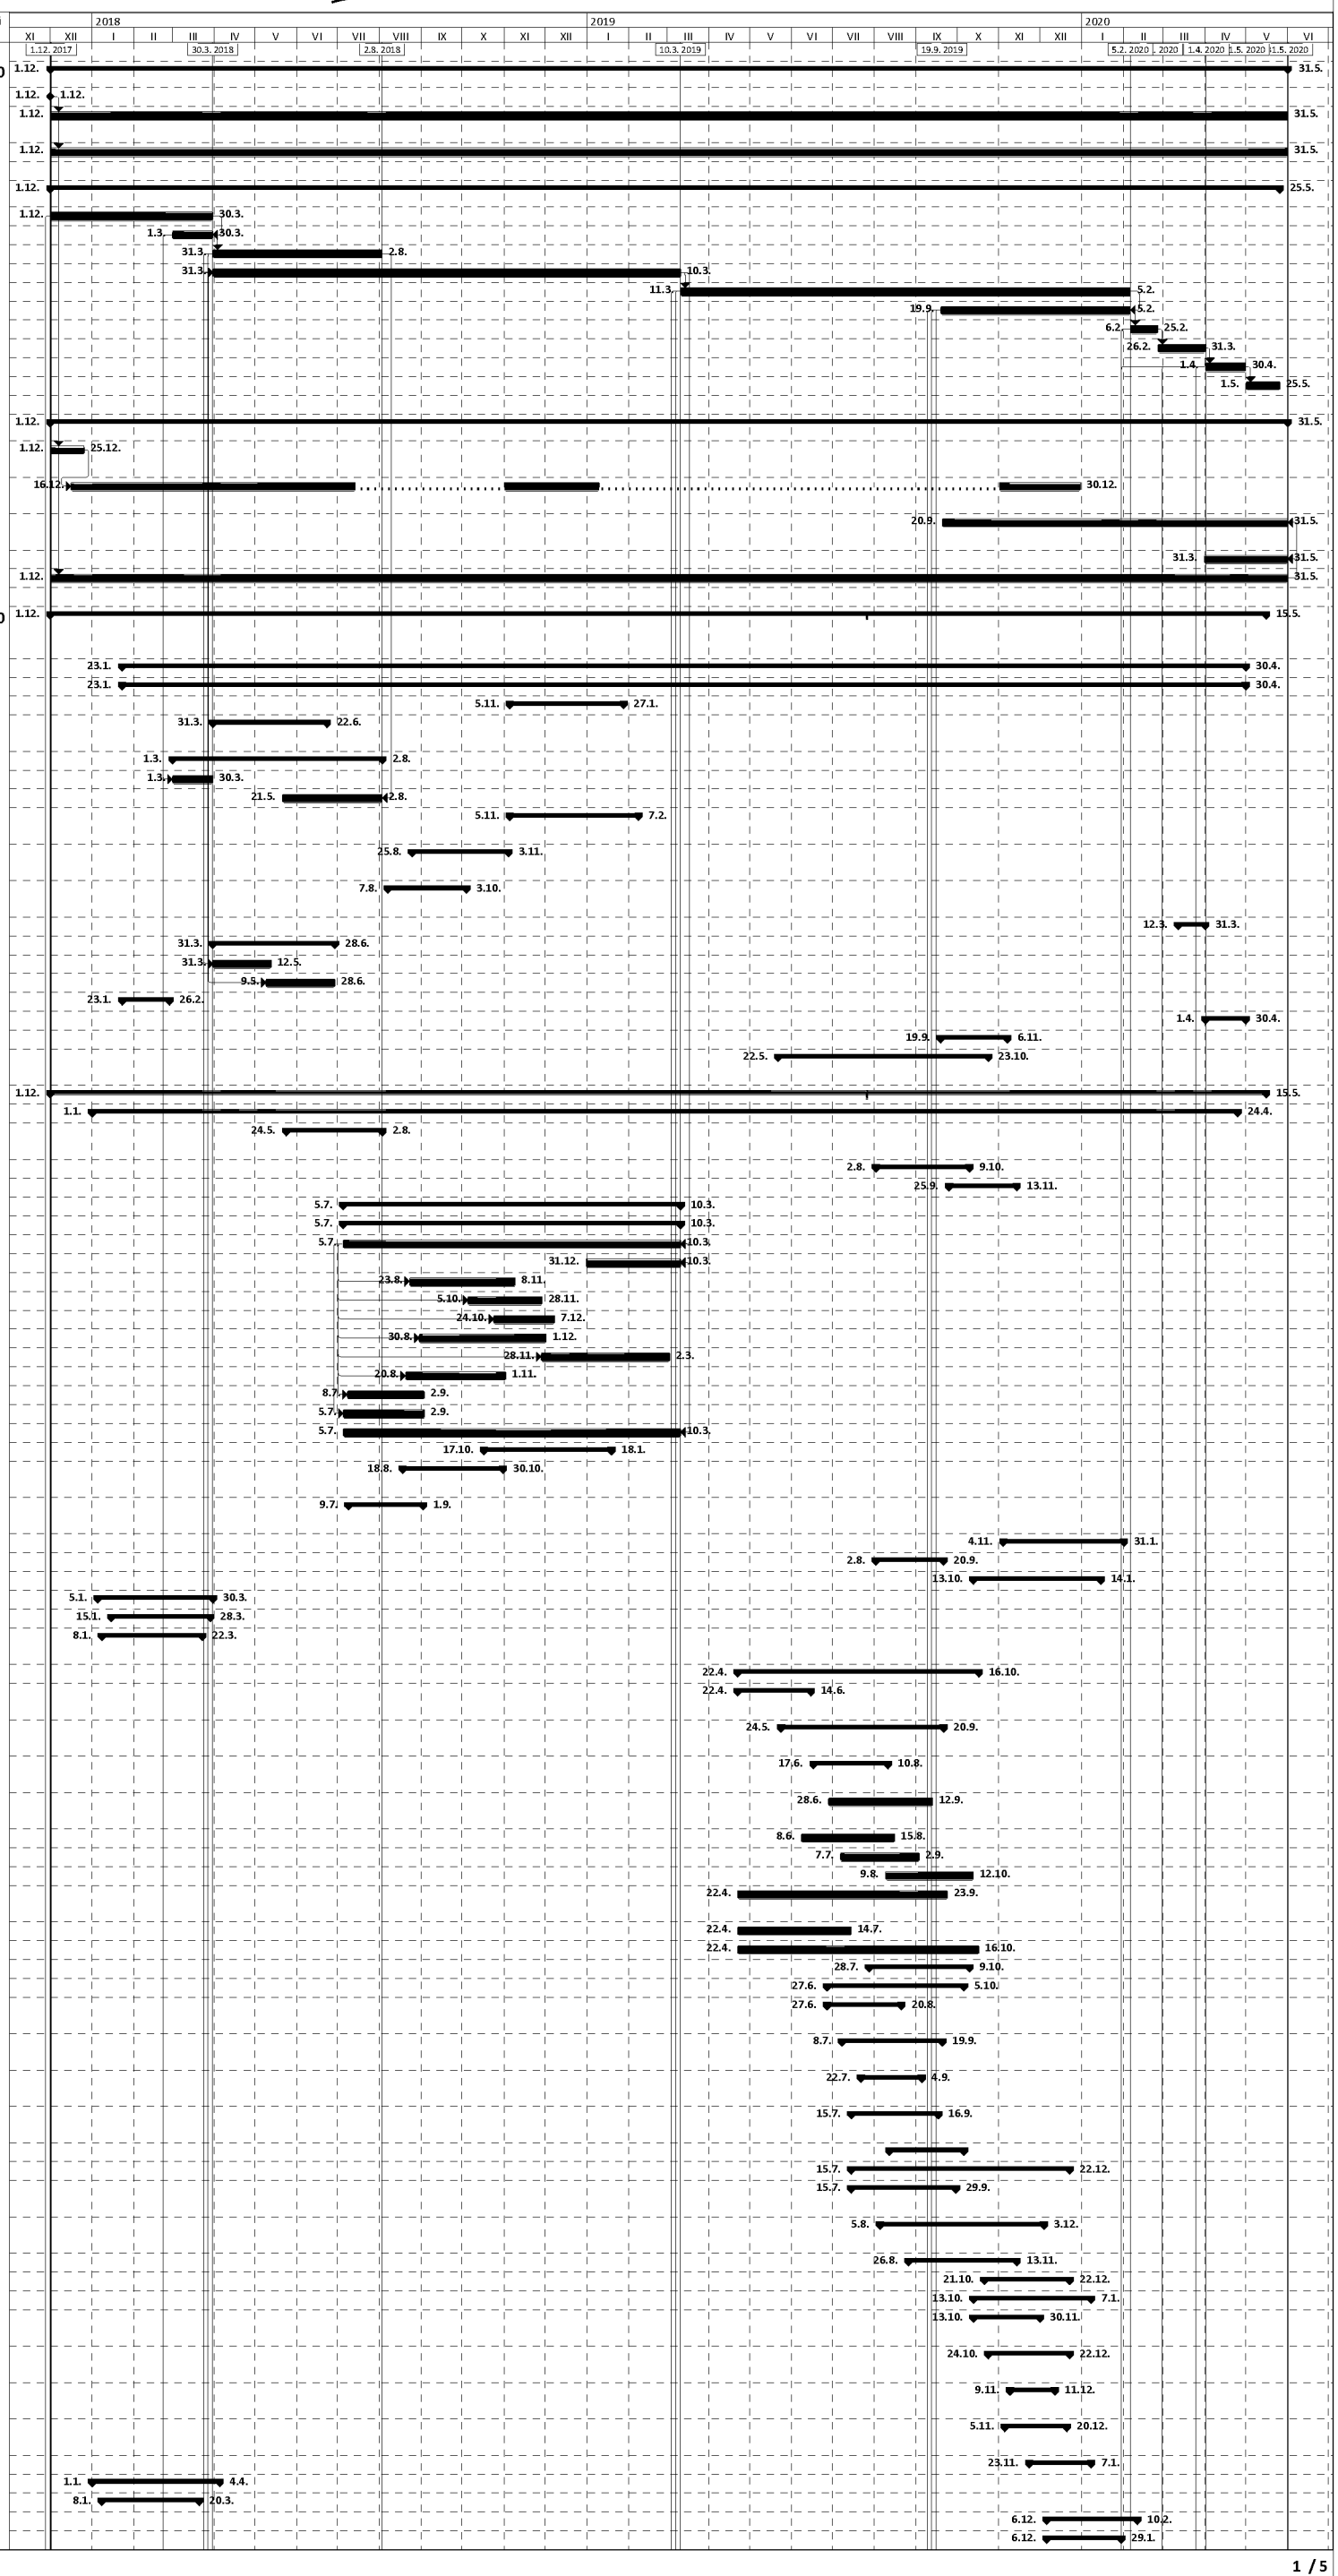

ID	Text_1	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení
335	**100.35.2**	**Křižovatka Zvonařka - Plotní, chodníky**	**59 dny**	**2.12. 19**	**29.1. 20**
345	**100.40.1B**	**Ul. Dornych 3.část, komunikace**	**20 dny**	**6.2. 20**	**25.2. 20**
356	**100.40.2**	**Ul. Dornych 3.část, chodníky**	**131 dny**	**16.12. 19**	**24.4. 20**
368	**101.30**	**DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - III.etapa**	**67 dny**	**24.12. 19**	**28.2. 20**
372	**SO 120 a 130**	**Zabezpečení veřejných zájmů, vegetační úpravy, demolice**	**853 dny**	**1.12. 17**	**1.4. 20**
373	**120.10.01**	**Vegetační úpravy - kácení porostů, Brno jih**	**20 dny**	**1.12. 17**	**20.12. 17**
377	**120.20.01**	**Vegetační úpravy - kácení porostů, Brno střed**	**46 dny**	**10.1. 19**	**24.2. 19**
380	**120.20.02**	**Vegetační úpravy - kácení porostů, Brno jih**	**33 dny**	**12.12. 17**	**13.1. 18**
383	**120.30.01**	**Vegetační úpravy - kácení porostů, Brno jih**	**40 dny**	**23.12. 17**	**31.1. 18**
387	**120.30.02**	**Vegetační úpravy - kácení porostů, Brno střed**	**40 dny**	**5.2. 19**	**16.3. 19**
391	**120.40.01**	**Vegetační úpravy - kácení porostů, Brno střed**	**35 dny**	**5.2. 19**	**11.3. 19**
395	**121.10.01**	**Vegetační úpravy - sadové úpravy, Brno jih**	**67 dny**	**7.9. 19**	**12.11. 19**
411	**121.20.01**	**Vegetační úpravy - sadové úpravy, Brno střed**	**36 dny**	**26.2. 20**	**1.4. 20**
426	**121.20.02**	**Vegetační úpravy - sadové úpravy, Brno jih**	**58 dny**	**25.9. 19**	**21.11. 19**
442	**121.30.01**	**Vegetační úpravy - sadové úpravy, Brno jih**	**82 dny**	**20.8. 19**	**9.11. 19**
458	**121.30.02**	**Vegetační úpravy - sadové úpravy, Brno střed**	**35 dny**	**26.2. 20**	**31.3. 20**
474	**121.40.01**	**Vegetační úpravy - sadové úpravy, Brno střed**	**30 dny**	**26.2. 20**	**26.3. 20**
488	**130.20.12**	**Demolice obj. Plotní č.37,k.ú.Trnitá,č.p.766,765/1**	**30 dny**	**1.3. 18**	**30.3. 18**
498	**130.30.00**	**Demolice obj. Plotní č.33, objekty firmy Famko**	**67 dny**	**31.3. 18**	**5.6. 18**
508	**130.30.01**	**Plotní, Zvonařka,k.ú.Trnitá,č.p.740,736/1,767/1,**	**77 dny**	**24.4. 18**	**9.7. 18**
527	**130.30.02**	**Demolice obj. Dornych 44**	**60 dny**	**5.4. 18**	**3.6. 18**
535	**130.30.03**	**Demolice obj. Plotní č.6a,k.ú.Trnitá,č.p.768/18**	**91 dny**	**11.5. 18**	**9.8. 18**
567	**130.30.04**	**Demolice obj. Dornych 60**	**33 dny**	**30.5. 18**	**1.7. 18**
577	**SO 150**	**Pozemní objekty**	**389 dny**	**11.3. 19**	**2.4. 20**
578	**152.20.01**	**Stavební úpravy obj. Dornych č.60,k.ú.Trnitá,č.p.747 (vjezdy do obj.garáž)**	**389 dny**	**11.3. 19**	**2.4. 20**
630	**152.20.13**	**Stavební úpravy obj. Plotní č.33 k.ú.Trnitá č.p.758/4 (průjezd halou)**	**97 dny**	**15.7. 19**	**19.10. 19**
671	**152.20.20**	**Stavební úpravy obj. Plotní č.39 k.ú.Komárov č.p.1141**	**109 dny**	**2.8. 19**	**18.11. 19**
689	**SO 200**	**Inženýrské sítě, vodovody**	**739 dny**	**12.12. 17**	**20.12. 19**
690	**200.10.03**	**Vodovodní řady - Kovářská - A6**	**67 dny**	**16.4. 19**	**21.6. 19**
701	**200.11.01**	**Vodovodní přípojky - Dornych, Kovářská**	**55 dny**	**22.5. 19**	**15.7. 19**
705	**200.12.03**	**Náhradní zásobování vodou Dornych, Svatopetrská**	**25 dny**	**31.3. 18**	**24.4. 18**
707	**200.21.01**	**Vodovodní přípojky - Dornych, Zvonařka**	**57 dny**	**12.9. 18**	**7.11. 18**
722	**200.21.02**	**Vodovodní přípojky - ulice: Dornych**	**88 dny**	**30.9. 18**	**26.12. 18**
736	**200.22.02**	**Náhradní zásobování - ulice: Zvonařka**	**55 dny**	**19.9. 19**	**12.11. 19**
746	**200.30.01**	**Vodovodní řady - Svatopetrská (C1, C2, C2a)**	**57 dny**	**5.1. 18**	**2.3. 18**
757	**200.30.02**	**Vodovodní řady - Plotní, Spěšná, Rosická**	**182 dny**	**11.3. 19**	**8.9. 19**
758	**HSV**	**Práce a dodávky HSV**	**182 dny**	**11.3. 19**	**8.9. 19**
759	1	Zemní práce	114 dny	11.3. 19	30.8. 19
760	4	Vodorovné konstrukce	74 dny	8.4. 19	20.6. 19
761	8	Trubní vedení	78 dny	13.5. 19	29.7. 19
762	99	Přesuny hmot a suti	72 dny	11.3. 19	21.5. 19
763	997	Přesun sutě	72 dny	11.3. 19	21.5. 19
764	998	Přesun hmot	182 dny	11.3. 19	8.9. 19
765	**200.30.03**	**Vodovodní řady - Plotní, Železniční (C4, C9)**	**582 dny**	**12.1. 18**	**16.8. 19**
766	HSV	ETAPA 1	80 dny	12.1. 18	1.4. 18
767	VRN	ETAPA 5	69 dny	9.6. 19	16.8. 19
768	**200.30.07**	**Vodovodní řady - Komárovská, Nová**	**55 dny**	**2.1. 18**	**25.2. 18**
778	**200.31.01**	**Vodovodní přípojky - Plotní, Zvonařka, Dornych, Rosická**	**125 dny**	**26.7. 19**	**27.11. 19**
806	**200.31.02**	**Vodovodní přípojky - Dornych, Zvonařka**	**97 dny**	**9.7. 19**	**13.10. 19**
823	**200.32.01**	**Náhradní zásobování vodou - Svatopetrská**	**32 dny**	**15.12. 17**	**15.1. 18**
833	**200.32.02**	**Náhradní zásobování vodou - Plotní, Spěšná, Rosická**	**65 dny**	**12.12. 17**	**14.2. 18**
834	**HSV**	**Práce a dodávky HSV**	**65 dny**	**12.12. 17**	**14.2. 18**
835	1	Zemní práce	38 dny	20.12. 17	14.2. 18
836	8	Trubní vedení	24 dny	11.1. 18	3.2. 18
837	99	Přesuny hmot a suti	22 dny	12.12. 17	2.1. 18
838	**200.32.03**	**Náhradní zásobování vodou - Plotní, Železniční**	**22 dny**	**3.1. 18**	**24.1. 18**
848	**200.32.05**	**Náhradní zásobování vodou - Zvonařka (řad C7)**	**49 dny**	**19.9. 19**	**6.11. 19**
858	**200.32.07**	**Náhradní zásobování vodou - Komárovská, Nová**	**27 dny**	**3.1. 18**	**29.1. 18**
868	**200.41.01**	**Vodovodní přípojky - Dornych, Zvonařka**	**68 dny**	**14.10. 19**	**20.12. 19**
881	**SO 300**	**Inženýrské sítě, kanalizace**	**897 dny**	**1.12. 17**	**15.5. 20**
882	**300.11.1**	**Komárovské nábřeží - Dornych - Kanalizace**	**163 dny**	**5.1. 18**	**16.6. 18**
883	**11.1.04.11**	**Kanalizace Dornych ŠD07 - ŠD14**	**78 dny**	**31.3. 18**	**16.6. 18**
884	**HSV**	**Práce a dodávky HSV**	**78 dny**	**31.3. 18**	**16.6. 18**
885	1	Zemní práce	78 dny	31.3. 18	16.6. 18
886	2	Zakládání	35 dny	9.4. 18	13.5. 18
887	3	Svislé a kompletní konstrukce	28 dny	3.5. 18	30.5. 18
888	4	Vodorovné konstrukce	30 dny	17.4. 18	16.5. 18
889	5	Komunikace pozemní	32 dny	16.5. 18	16.6. 18
890	8	Trubní vedení	27 dny	3.5. 18	29.5. 18
891	9	Ostatní konstrukce a práce, bourár	22 dny	31.3. 18	21.4. 18
892	997	Přesun sutě	25 dny	31.3. 18	24.4. 18
893	998	Přesun hmot	78 dny	31.3. 18	16.6. 18
894	**11.1.04.12**	**Kanalizace Plotní ŠD10 - ŠP01**	**28 dny**	**1.3. 18**	**28.3. 18**
903	**11.1.04.2**	**Kanalizace Svatopetrská**	**65 dny**	**5.1. 18**	**10.3. 18**
914	**11.1.04.4**	**Napojení uličních stok**	**65 dny**	**5.1. 18**	**10.3. 18**
923	**11.1.06.1.1**	**Šachta DN1200 - Dornych**	**65 dny**	**5.1. 18**	**10.3. 18**
927	**300.11.2**	**Komárovské nábřeží - Dornych - Kanalizační přípojky**	**158 dny**	**20.1. 18**	**26.6. 18**
928	HSV	ETAPA 1	65 dny	20.1. 18	25.3. 18
929	8	ETAPA 3	59 dny	29.4. 18	26.6. 18
930	**300.11.3**	**Komárovské nábřeží - Dornych - Zrušení stávající kanalizace**	**129 dny**	**31.1. 18**	**8.6. 18**
931	HSV	ETAPA 1	22 dny	31.1. 18	21.2. 18
932	41.1.07.09	ETAPA 3	33 dny	7.5. 18	8.6. 18
933	**300.13.1**	**Kovářská - Kanalizace**	**87 dny**	**11.3. 19**	**5.6. 19**
935	**300.13.2**	**Kovářská - Kanalizační přípojky**	**88 dny**	**29.4. 19**	**25.7. 19**
937	**300.13.3**	**Kovářská - Zrušení stávající kanalizace**	**19 dny**	**20.5. 19**	**7.6. 19**
939	**300.21.1**	**Dornych - Kanalizace**	**207 dny**	**31.3. 18**	**23.10. 18**
940	1	Zemní práce	147 dny	31.3. 18	22.10. 18
941	2	Zakládání	66 dny	9.4. 18	13.6. 18
942	3	Svislé a kompletní konstrukce	28 dny	3.5. 18	30.5. 18
943	4	Vodorovné konstrukce	74 dny	30.4. 18	12.7. 18
944	5	Komunikace pozemní	32 dny	22.9. 18	23.10. 18
945	8	Trubní vedení	79 dny	18.6. 18	4.9. 18
946	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	94 dny	31.3. 18	18.10. 18
947	997	Přesun sutě	25 dny	31.3. 18	24.4. 18
948	998	Přesun hmot	207 dny	31.3. 18	23.10. 18
949	**300.21.2**	**Dornych - Kanalizační přípojky**	**224 dny**	**14.6. 18**	**23.1. 19**
950	**HSV**	**Práce a dodávky HSV**	**224 dny**	**14.6. 18**	**23.1. 19**
951	1	Zemní práce	109 dny	14.6. 18	9.1. 19
952	2	Zakládání	59 dny	30.7. 18	26.9. 18
953	3	Svislé a kompletní konstrukce	64 dny	6.8. 18	8.10. 18
954	4	Vodorovné konstrukce	70 dny	27.8. 18	4.11. 18
955	8	Trubní vedení	84 dny	8.10. 18	30.12. 18

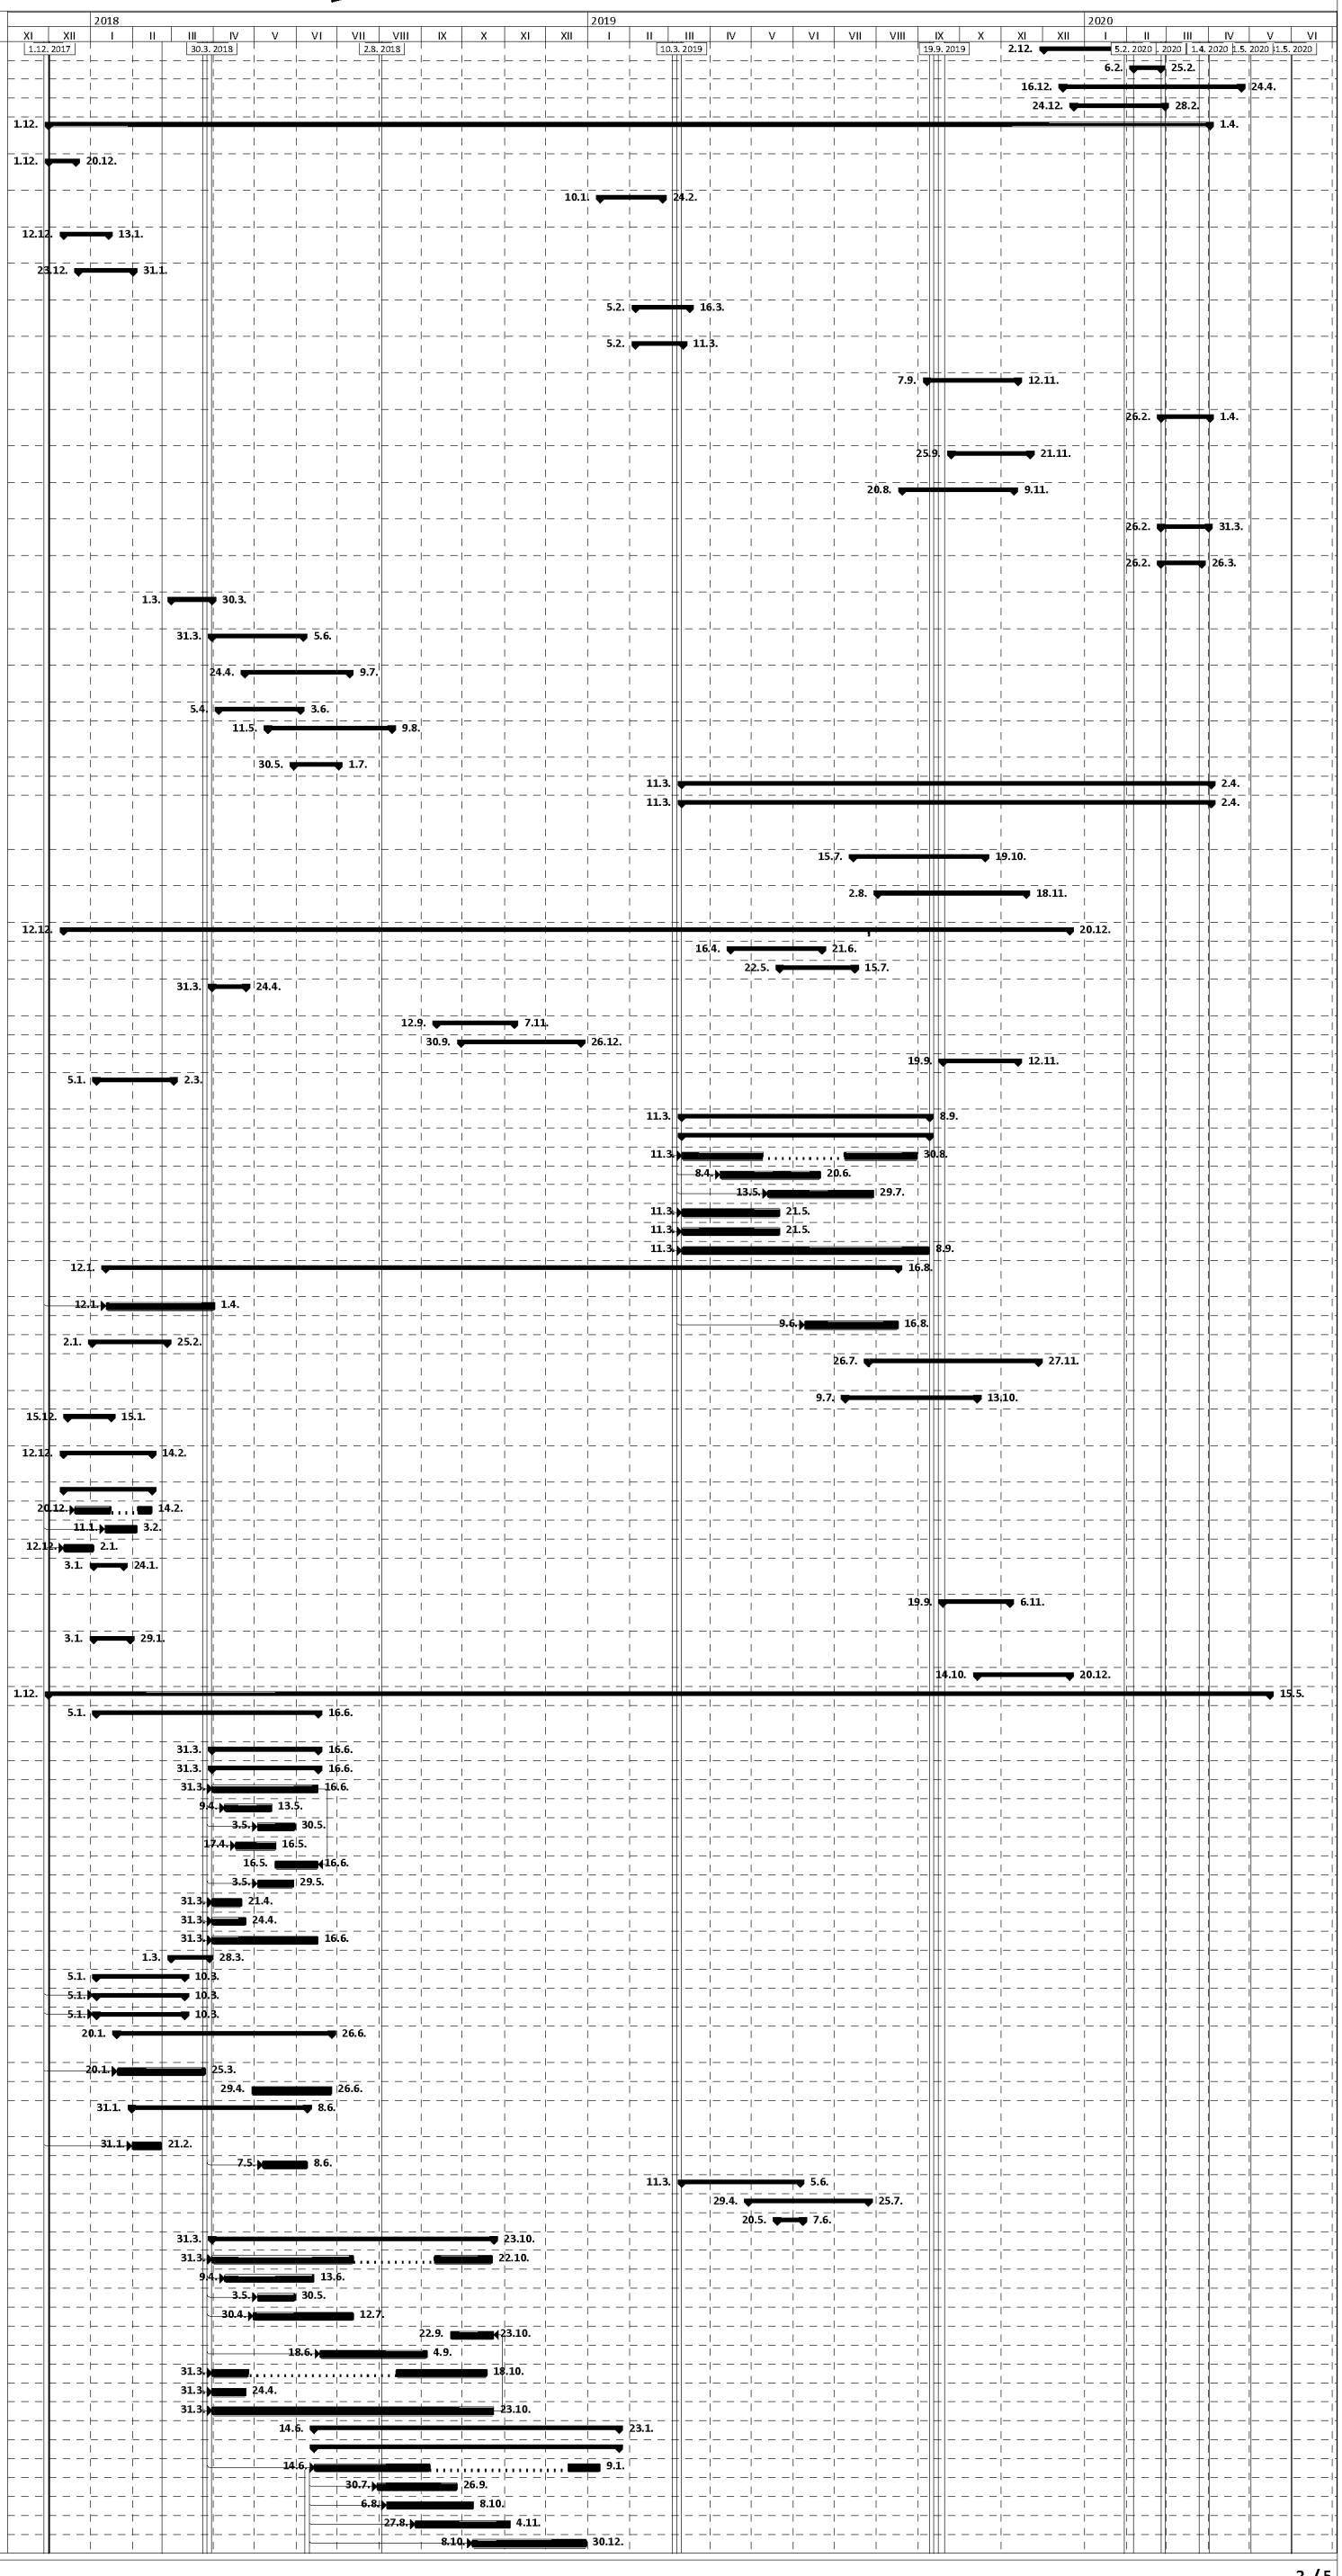

ID	Text_1	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení
956	997	Přesun sutě	55 dny	14.6. 18	7.8. 18
957	998	Přesun hmot	224 dny	14.6. 18	23.1. 19
958	**PSV**	**Práce a dodávky PSV**	**64 dny**	**21.11. 18**	**23.1. 19**
959	721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	64 dny	21.11. 18	23.1. 19
960	764	Konstrukce klempířské	38 dny	17.12. 18	23.1. 19
961	**300.21.3**	**Dornych - Zrušení stávající kanalizace**	**58 dny**	**5.11. 18**	**1.1. 19**
972	**300.22.1**	**Nová ulice - Kanalizace**	**67 dny**	**25.5. 19**	**30.7. 19**
992	**300.22.2**	**Nová ulice - Kanalizační přípojky**	**25 dny**	**15.7. 19**	**8.8. 19**
999	**300.23.1**	**Vnitroblok - Kanalizace**	**70 dny**	**11.7. 19**	**18.9. 19**
1020	**300.23.2**	**Vnitroblok - Kanalizační přípojky**	**19 dny**	**26.8. 19**	**13.9. 19**
1027	**300.31.1**	**Plotní 1.část - Kanalizace**	**251 dny**	**11.3. 19**	**16.11. 19**
1028	31.1.04.1	ETAPA 5	159 dny	11.3. 19	16.8. 19
1029	31.1.04.2	ETAPA 6	59 dny	19.9. 19	16.11. 19
1030	**300.31.2**	**Plotní 1.část - Kanalizační přípojky**	**184 dny**	**3.6. 19**	**3.12. 19**
1031	HSV	ETAPA 5	87 dny	3.6. 19	28.8. 19
1032	PSV	ETAPA 6	51 dny	14.10. 19	3.12. 19
1033	**300.31.3**	**Plotní 1.část - Zrušení stávající kanalizace**	**55 dny**	**28.6. 19**	**21.8. 19**
1044	**300.32.1**	**Plotní 2.část - Kanalizace**	**95 dny**	**1.12. 17**	**5.3. 18**
1064	**300.32.2**	**Plotní 2.část - Kanalizační přípojky**	**55 dny**	**2.2. 18**	**28.3. 18**
1077	**300.41.1**	**Dornych - Kanalizace**	**751 dny**	**21.4. 18**	**10.5. 20**
1078	**41.1.04.11**	**ETAPA 4**	**255 dny**	**21.4. 18**	**31.12. 18**
1079	**HSV**	**Práce a dodávky HSV**	**255 dny**	**21.4. 18**	**31.12. 18**
1080	1	Zemní práce	155 dny	28.4. 18	26.12. 18
1081	2	Zakládání	29 dny	2.7. 18	30.7. 18
1082	3	Svislé a kompletní konstrukce	49 dny	7.8. 18	24.9. 18
1083	4	Vodorovné konstrukce	100 dny	27.5. 18	3.9. 18
1084	8	Trubní vedení	145 dny	14.6. 18	5.11. 18
1085	997	Přesun sutě	155 dny	21.4. 18	22.9. 18
1086	998	Přesun hmot	248 dny	28.4. 18	31.12. 18
1087	**41.1.04.12**	**ETAPA 9**	**21 dny**	**1.4. 20**	**21.4. 20**
1096	**41.1.04.4**	**ETAPA 10**	**45 dny**	**27.3. 20**	**10.5. 20**
1105	**300.41.2**	**Dornych - Kanalizační přípojky**	**648 dny**	**7.8. 18**	**15.5. 20**
1106	**HSV**	**ETAPA 4**	**144 dny**	**7.8. 18**	**28.12. 18**
1116	**PSV**	**ETAPA 9**	**20 dny**	**8.4. 20**	**27.4. 20**
1119	**VRN**	**ETAPA 10**	**15 dny**	**1.5. 20**	**15.5. 20**
1122	**300.41.3**	**Dornych - Zrušení stávající kanalizace**	**582 dny**	**12.9. 18**	**15.4. 20**
1123	**HSV**	**ETAPA 4**	**68 dny**	**12.9. 18**	**18.11. 18**
1130	**VRN**	**ETAPA 9**	**15 dny**	**1.4. 20**	**15.4. 20**
1133	**300.42.1**	**Úzká - Kanalizace**	**84 dny**	**7.1. 20**	**30.3. 20**
1148	**300.42.2**	**Úzká - Kanalizační přípojky**	**16 dny**	**16.3. 20**	**31.3. 20**
1155	**300.42.3**	**Úzká - Zrušení stávající kanalizace**	**15 dny**	**12.3. 20**	**26.3. 20**
1162	**301.10,20,3**	**Čerpání podzemní vody během relaizace kanalizace - I-IV.etapa**	**713 dny**	**10.1. 18**	**23.12. 19**
1163	**etapa01**	**Etapa 1**	**40 dny**	**10.1. 18**	**18.2. 18**
1172	**etapa02**	**Etapa 2**	**22 dny**	**1.3. 18**	**22.3. 18**
1181	**etapa03**	**Etapa 3**	**84 dny**	**15.4. 18**	**7.7. 18**
1190	**etapa04**	**Etapa 4**	**220 dny**	**8.7. 18**	**12.2. 19**
1199	**etapa05**	**Etapa 5**	**288 dny**	**11.3. 19**	**23.12. 19**
1204	**SO 500**	**Inženýrské sítě, plynovody**	**857 dny**	**31.12. 17**	**5.5. 20**
1205	**500.10.10**	**STL přípojky Svatopetrská - Dornych**	**32 dny**	**12.5. 18**	**12.6. 18**
1213	**500.10.11-1**	**Dopojení domovních instalací Dornych , 1.část**	**30 dny**	**29.5. 18**	**27.6. 18**
1220	**500.11.01**	**STL plynovod PE 63 – Kovářská**	**88 dny**	**11.3. 19**	**6.6. 19**
1227	**500.11.10**	**STL přípojky Kovářská**	**71 dny**	**8.4. 19**	**17.6. 19**
1234	**500.11.11-1**	**Dopojení domovních instalací Kovářská**	**45 dny**	**13.5. 19**	**26.6. 19**
1241	**500.20.10**	**STL přípojky Dornych, 2. a 3. část**	**60 dny**	**27.5. 18**	**25.7. 18**
1248	**500.20.11**	**STL přepojení Škrobáren**	**29 dny**	**2.7. 18**	**30.7. 18**
1255	**500.20.12**	**STL přepojení sléváren UXA**	**19 dny**	**11.7. 18**	**29.7. 18**
1262	**500.20.13**	**STL přepojení obchodu LIDL**	**33 dny**	**21.4. 18**	**23.5. 18**
1268	**500.20.20-3**	**Dopojení domovních instalací Dornych, 2. a 3. část**	**67 dny**	**2.7. 18**	**6.9. 18**
1275	**500.26.01**	**STL plynovod PE 160 – Zvonařka**	**55 dny**	**19.9. 19**	**12.11. 19**
1282	**500.26.10**	**STL přípojky Zvonařka**	**41 dny**	**14.10. 19**	**23.11. 19**
1289	**500.26.11-1**	**Dopojení domovních instalací Zvonařka**	**30 dny**	**4.11. 19**	**3.12. 19**
1294	**500.30.01**	**SO 500.33.01 STL plynovod PE 63 - Svatopetrská**	**28 dny**	**31.12. 17**	**27.1. 18**
1299	**500.32.01**	**STL plynovod PE 110 - Široká**	**64 dny**	**3.6. 19**	**5.8. 19**
1306	**500.32.10**	**STL přípojky Široká**	**51 dny**	**1.7. 19**	**20.8. 19**
1313	**500.32.11-1**	**Dopojení domovních instalací Široká**	**49 dny**	**22.7. 19**	**8.9. 19**
1320	**500.33.01**	**STL plynovod PE 63 – Svatopetrská**	**29 dny**	**5.1. 18**	**2.2. 18**
1322	**500.33.10**	**STL přípojky Svatopetrská**	**37 dny**	**28.1. 18**	**5.3. 18**
1329	**500.33.11-2**	**Dopojení domovních instalací Svatopetrská**	**40 dny**	**9.2. 18**	**20.3. 18**
1336	**500.34.01**	**STL plynovod PE 160 – Plotní, 1.část**	**115 dny**	**27.5. 19**	**18.9. 19**
1343	**500.34.02**	**STL plynovod PE 110 – Plotní, 2.část**	**44 dny**	**10.1. 18**	**22.2. 18**
1351	**500.34.10**	**STL přípojky Plotní, 1.část**	**79 dny**	**15.7. 19**	**1.10. 19**
1358	**500.34.11-2**	**SO 500.34.11-22 Dopojení domovních instalací Plotní, 1.část**	**81 dny**	**5.8. 19**	**24.10. 19**
1363	**500.34.11-3**	**Dopojení domovních instalací Plotní, 1.část**	**70 dny**	**19.8. 19**	**27.10. 19**
1365	**500.34.40**	**STL přípojky Plotní, 2.část**	**40 dny**	**20.1. 18**	**28.2. 18**
1376	**500.34.41-4**	**Dopojení domovních instalací Plotní, 2.část**	**45 dny**	**30.1. 18**	**15.3. 18**
1383	**500.35.01**	**STL plynovod PE 63 – Železniční**	**31 dny**	**9.2. 18**	**11.3. 18**
1390	**500.35.10**	**STL přípojky Železniční**	**24 dny**	**21.2. 18**	**16.3. 18**
1397	**500.35.11-1**	**Dopojení domovních instalací Železniční**	**27 dny**	**3.3. 18**	**29.3. 18**
1404	**500.36.02**	**STL plynovod PE 160 – Zvonařka**	**68 dny**	**14.10. 19**	**20.12. 19**
1411	**500.40.10**	**STL přípojky Dornych, 4.část**	**22 dny**	**22.3. 20**	**12.4. 20**
1418	**500.40.11-1**	**Dopojení domovních instalací Dornych , 4.část**	**40 dny**	**27.3. 20**	**5.5. 20**
1425	**SO 700**	**Silnoproudé rozvody a přeložky**	**831 dny**	**15.1. 18**	**24.4. 20**
1426	**701.20.01**	**Přeložky vedení E.ON**	**631 dny**	**31.3. 18**	**21.12. 19**
1427		ETAPA 3, 4	204 dny	31.3. 18	20.10. 18
1428		ETAPA 6	55 dny	28.10. 19	21.12. 19
1429	**701.30.01**	**Přeložky vedení E.ON**	**294 dny**	**11.3. 19**	**29.12. 19**
1430		ETAPA 5	55 dny	11.3. 19	4.5. 19
1431		ETAPA 6	42 dny	18.11. 19	29.12. 19
1432	**701.40.01**	**Přeložky vedení E.ON**	**61 dny**	**6.2. 20**	**6.4. 20**
1434	**703.30.03**	**Přípojky NN**	**487 dny**	**15.1. 18**	**16.5. 19**
1435	1	ETAPA 1	28 dny	15.1. 18	11.2. 18
1436	2	ETAPA 3	55 dny	31.3. 18	24.5. 18
1437	3	ETAPA 5	67 dny	11.3. 19	16.5. 19
1438	**704.10.01**	**Veřejné osvětlení, Svatopetrská-Dornych**	**165 dny**	**11.5. 18**	**22.10. 18**
1446	**704.10.02**	**Veřejné osvětlení, ul.Nová Agrozet po Plotní**	**68 dny**	**22.1. 18**	**30.3. 18**
1456	**704.10.03**	**Veřejné osvětlení, ul. Kovářská**	**66 dny**	**27.5. 19**	**31.7. 19**
1464	**704.20.01**	**Veřejné osvětlení, ul. Dornych 1.část**	**77 dny**	**5.11. 18**	**20.1. 19**
1474	**704.20.02**	**Veřejné osvětlení, ul.Nová (Rosická)**	**55 dny**	**15.7. 19**	**7.9. 19**
1481	**704.20.03**	**Veřejné osvětlení, vnitroblok**	**59 dny**	**22.7. 19**	**18.9. 19**
1511	**704.30.01**	**Veřejné osvětlení, ul.Plotní**	**124 dny**	**22.7. 19**	**22.11. 19**
1513	**704.30.02**	**Veřejné osvětlení, ul.Spěšná**	**58 dny**	**5.8. 19**	**1.10. 19**
1515	**704.40.01**	**Veřejné osvětlení,ul.Dornych 2.část**	**59 dny**	**26.2. 20**	**24.4. 20**
1517	**SO 800**	**Sdělovací rozvody a přeložky**	**832 dny**	**31.12. 17**	**10.4. 20**
1518	**800.10**	**Kabelovod Dornych - Svatopetrská**	**170 dny**	**12.1. 18**	**30.6. 18**
1532	**800.20**	**Kabelovod Dornych**	**602 dny**	**21.4. 18**	**13.12. 19**
1533	**HSV**	**ETAPA 4**	**185 dny**	**21.4. 18**	**22.10. 18**
1540	**PSV**	**ETAPA 6**	**54 dny**	**21.10. 19**	**13.12. 19**
1542	**800.30**	**Kabelovod Plotní**	**287 dny**	**11.3. 19**	**22.12. 19**
1543	**HSV**	**ETAPA 5**	**241 dny**	**11.3. 19**	**6.11. 19**
1550	**PSV**	**ETAPA 6**	**287 dny**	**11.3. 19**	**22.12. 19**
1554	**800.40**	**Kabelovod Zvonařka-Dornych**	**70 dny**	**1.2. 20**	**10.4. 20**
1566	**801.10**	**Přeložky kabelů CETIN oblast Svatopetrská**	**45 dny**	**5.1. 18**	**18.2. 18**
1568	**801.12**	**Přeložky kabelů CETIN v ul. Kovářská**	**45 dny**	**1.7. 19**	**14.8. 19**
1570	**801.30**	**Přeložky kabelů CETIN**	**55 dny**	**20.5. 19**	**13.7. 19**
1572	**802.10**	**Přeložky kabelů UPC oblast Svatopetrská**	**55 dny**	**31.12. 17**	**23.2. 18**
1574	**802.11**	**Přeložky kabelů UPC v ul. Kovářská (zahrnuto v SO 802.10)**	**55 dny**	**24.6. 19**	**17.8. 19**
1576	**802.30**	**Přeložky kabelů UPC**	**55 dny**	**11.3. 19**	**4.5. 19**
1578	**805.20**	**Optický kabel BKOM-oblast Brno jih**	**189 dny**	**10.1. 18**	**17.7. 18**
1579	1	ETAPA 1	38 dny	10.1. 18	16.2. 18
1580	2	ETAPA 4	54 dny	25.5. 18	17.7. 18
1581	**805.21**	**Optický kabel BKOM-oblast Brno střed**	**503 dny**	**18.7. 18**	**2.12. 19**

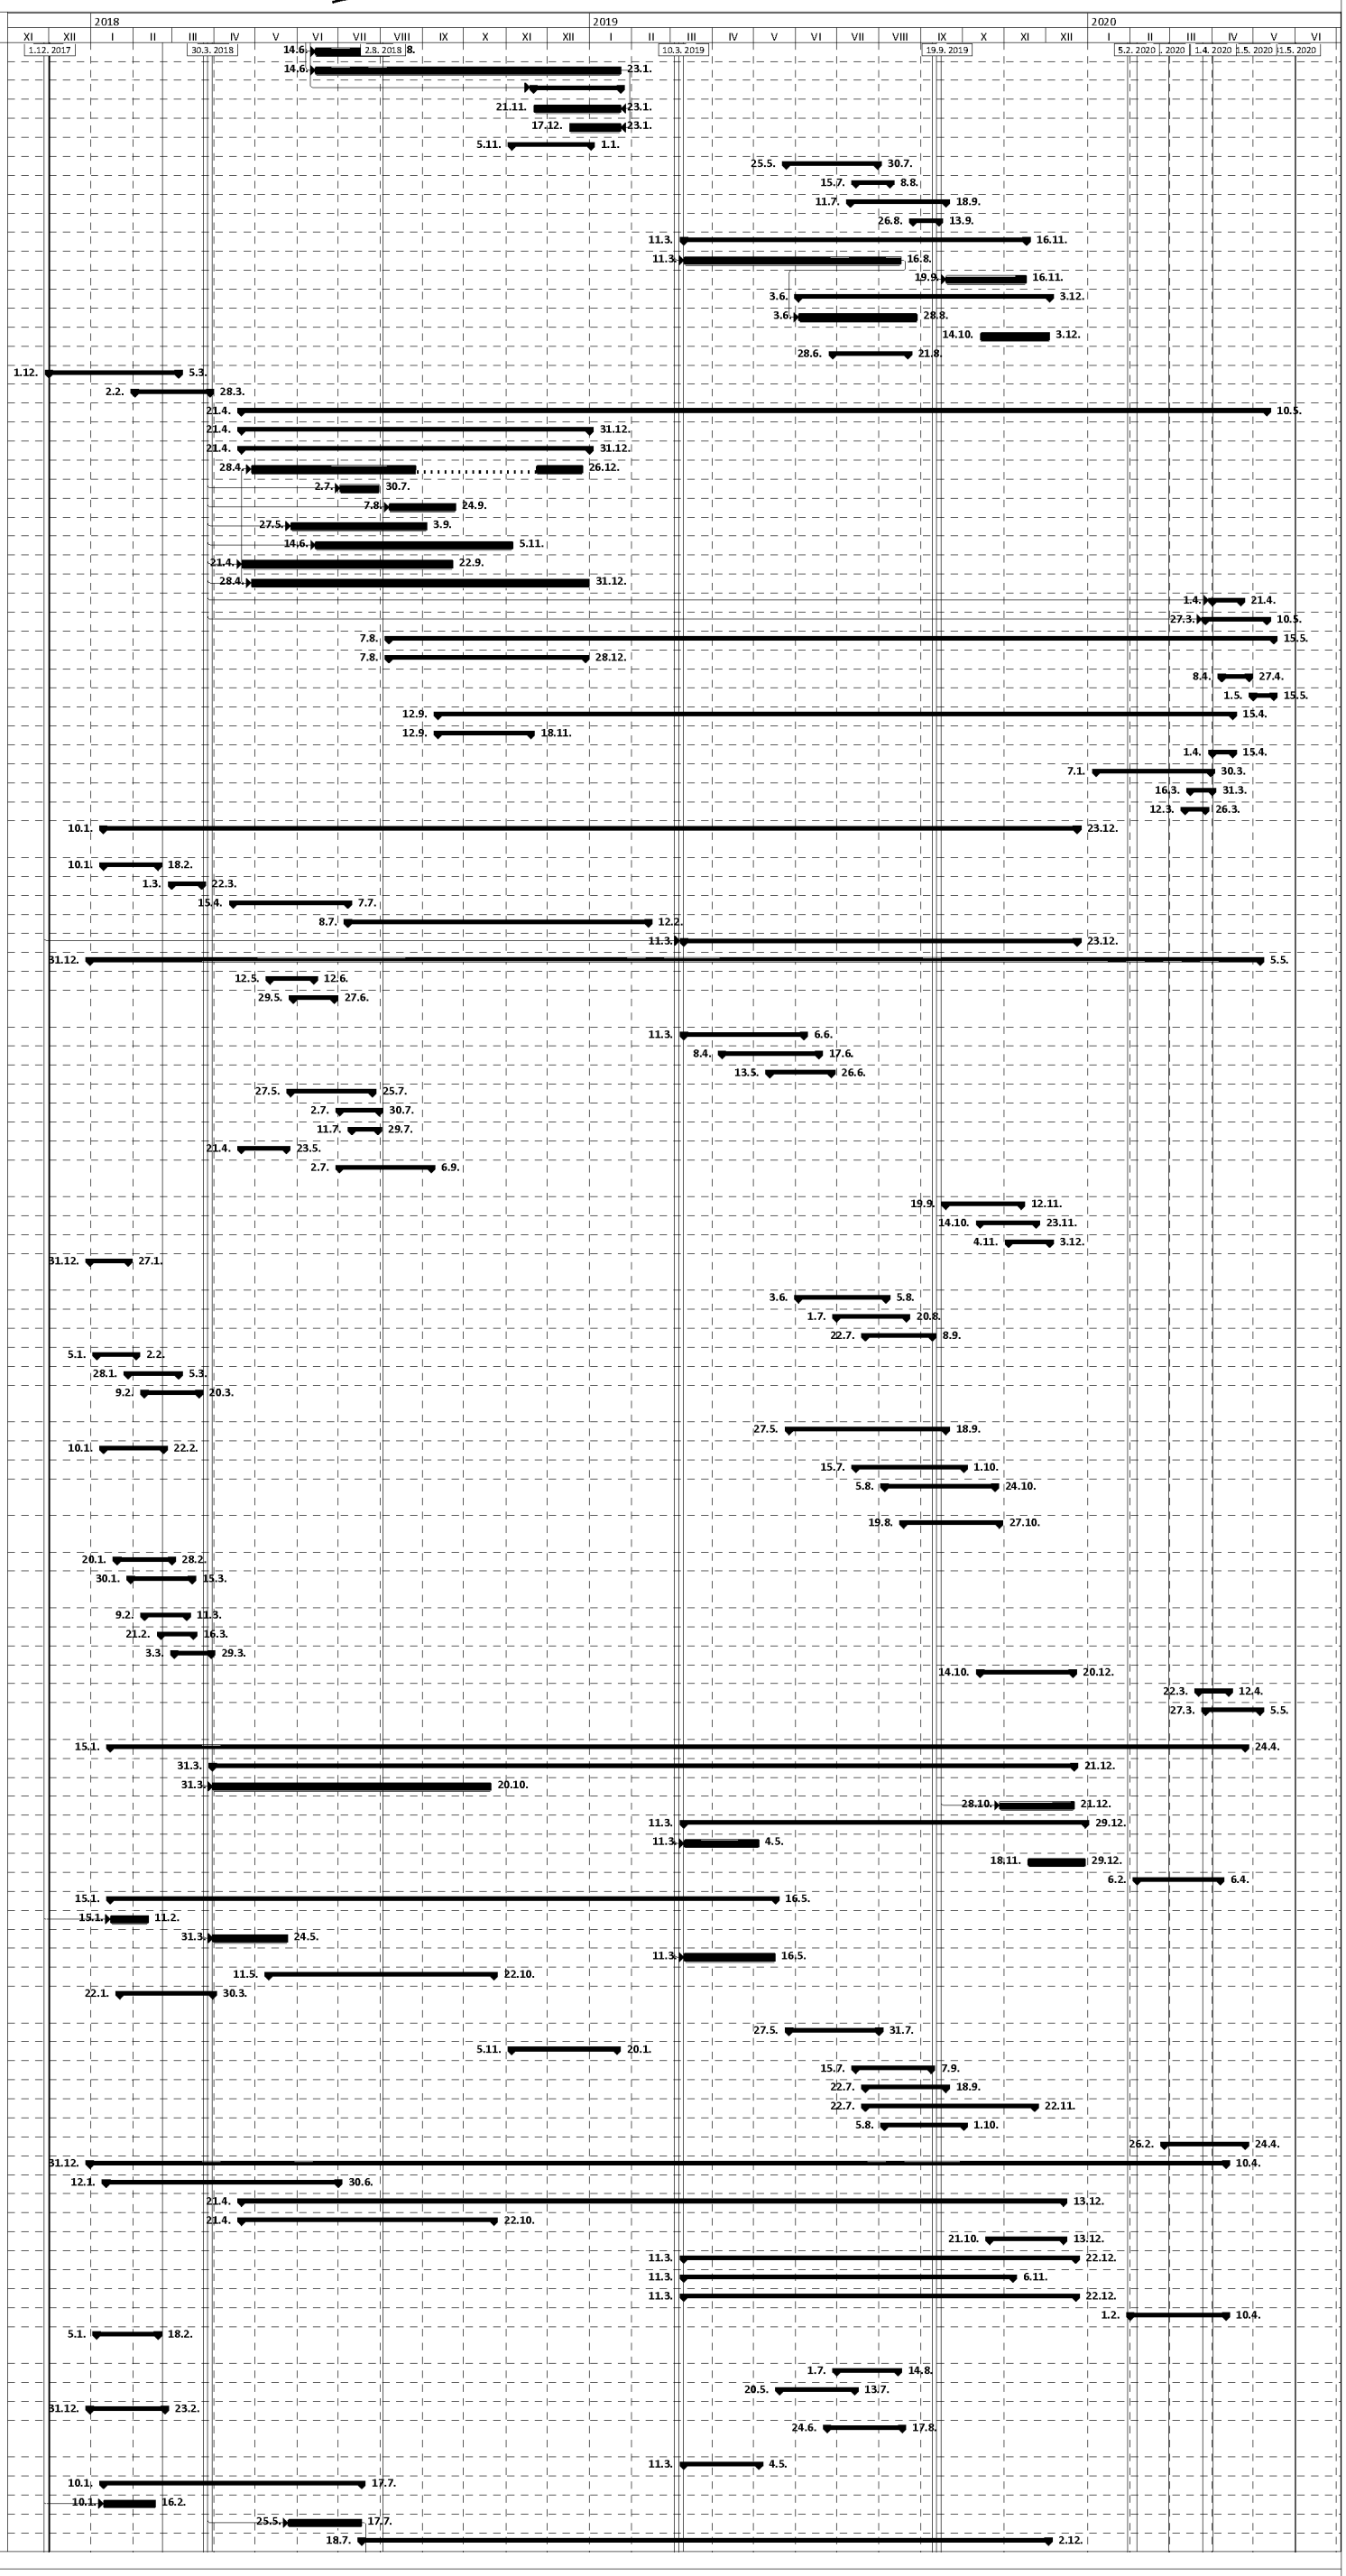

ID	Text_1	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení
1582	0	ETAPA 4	49 dny	18.7. 18	4.9. 18
1583	1	ETAPA 6	29 dny	4.11. 19	2.12. 19
1584	**805.30**	**Optický kabel BKOM-oblast Brno střed**	**691 dny**	**15.1. 18**	**6.12. 19**
1585	1	ETAPA 1	40 dny	15.1. 18	23.2. 18
1586	2	ETAPA 6	61 dny	7.10. 19	6.12. 19
1587					
1588					
1589		**Stavba v zájmu Ředitelství silnic a dálnic ČR**	**842 dny**	**10.1. 18**	**30.4. 20**
1590	**PS**	**Technologická část**	**559 dny**	**30.9. 18**	**10.4. 20**
1591	**PS 140**	**Světelná signalizace**	**559 dny**	**30.9. 18**	**10.4. 20**
1592	**140.20.03**	**Rekonstrukce SSZ 3.01 Dornych - Zvonařka-1.část**	**76 dny**	**30.9. 18**	**14.12. 18**
1594	**140.30.02**	**Rekonstrukce SSZ 3.07 Plotní - Zvonařka**	**59 dny**	**2.12. 19**	**29.1. 20**
1596	**140.40.02**	**Rekonstrukce SSZ 3.01 Dornych-Zvonařka - definitivní stav**	**124 dny**	**9.12. 19**	**10.4. 20**
1597		ETAPA 6	55 dny	9.12. 19	1.2. 20
1598		ETAPA 9	10 dny	1.4. 20	10.4. 20
1599	**SO**	**Stavební část**	**842 dny**	**10.1. 18**	**30.4. 20**
1600	**SO 100**	**Komunikace, zpevněné plochy**	**762 dny**	**31.3. 18**	**30.4. 20**
1601	**100.10.1**	**Ul. Svatopetrská - Dornych 1.část, komunikace**	**125 dny**	**31.3. 18**	**2.8. 18**
1602	**100.10.1-2**	**Demolice oplocení**	**32 dny**	**31.3. 18**	**1.5. 18**
1607	**100.10.1-1**	**Ul. Svatopetrská - Dornych 1.část, komunikace**	**120 dny**	**5.4. 18**	**2.8. 18**
1608	1	Zemní práce	89 dny	5.4. 18	17.7. 18
1609	18	Povrchové úpravy terénu	42 dny	22.6. 18	2.8. 18
1610	2	Základy a zvláštní zakládání	38 dny	23.4. 18	30.5. 18
1611	21	Úprava podloží a základ.spáry	54 dny	16.4. 18	8.6. 18
1612	3	Svislé a kompletní konstrukce	44 dny	30.4. 18	12.6. 18
1613	4	Vodorovné konstrukce	69 dny	30.4. 18	7.7. 18
1614	5	Komunikace	58 dny	28.5. 18	24.7. 18
1615	62	Úpravy povrchů vnější	49 dny	23.4. 18	10.6. 18
1616	8	Trubní vedení	55 dny	30.4. 18	23.6. 18
1617	9	Ostatní konstrukce, bourání	15 dny	5.4. 18	19.4. 18
1618	91	Doplňující práce na komunikaci	28 dny	6.7. 18	2.8. 18
1619	93	Dokončovací práce inženýrských stav	8 dny	26.7. 18	2.8. 18
1620	961	Vybourané stavební suti	30 dny	5.4. 18	4.5. 18
1621	962	Vybourané stavební hmoty	30 dny	5.4. 18	4.5. 18
1622	99	Staveništní přesun hmot	120 dny	5.4. 18	2.8. 18
1623	711	Izolace proti vodě	1 den	5.4. 18	5.4. 18
1624	**100.20.1**	**Ul. Dornych 2.část, komunikace**	**331 dny**	**14.4. 18**	**10.3. 19**
1625	**100.20.1**	**Ul. Dornych 2.část, komunikace**	**324 dny**	**21.4. 18**	**10.3. 19**
1626	1	Zemní práce	245 dny	21.4. 18	9.2. 19
1627	18	Povrchové úpravy terénu	29 dny	10.2. 19	10.3. 19
1628	21	Úprava podloží a základ.spáry	123 dny	9.5. 18	8.9. 18
1629	3	Svislé a kompletní konstrukce	79 dny	20.7. 18	6.10. 18
1630	4	Vodorovné konstrukce	29 dny	14.6. 18	12.7. 18
1631	5	Komunikace	166 dny	12.9. 18	24.2. 19
1632	8	Trubní vedení	127 dny	27.5. 18	30.9. 18
1633	91	Doplňující práce na komunikaci	204 dny	14.6. 18	3.1. 19
1634	961	Vybourané stavební suti	149 dny	21.4. 18	16.9. 18
1635	962	Vybourané stavební hmoty	155 dny	9.5. 18	10.10. 18
1636	99	Staveništní přesun hmot	324 dny	21.4. 18	10.3. 19
1637	M46	Zemní práce při montážích	54 dny	18.10. 18	10.12. 18
1638	**100.20.1-2**	**Demolice oplocení**	**74 dny**	**14.4. 18**	**26.6. 18**
1643	**100.20.3**	**Křižovatka Dornych - Zvonařka, komunikace**	**138 dny**	**19.9. 19**	**3.2. 20**
1644	**100.20.3-1**	**Křižovatka Dornych - Zvonařka, komunikace**	**120 dny**	**7.10. 19**	**3.2. 20**
1645	1	Zemní práce	66 dny	7.10. 19	4.1. 20
1646	18	Povrchové úpravy terénu	29 dny	6.1. 20	3.2. 20
1647	21	Úprava podloží a základ.spáry	54 dny	21.10. 19	13.12. 19
1648	3	Svislé a kompletní konstrukce	33 dny	11.11. 19	13.12. 19
1649	4	Vodorovné konstrukce	67 dny	28.10. 19	2.1. 20
1650	5	Komunikace	42 dny	24.12. 19	3.2. 20
1651	8	Trubní vedení	55 dny	11.11. 19	4.1. 20
1652	91	Doplňující práce na komunikaci	19 dny	16.1. 20	3.2. 20
1653	961	Vybourané stavební suti	28 dny	7.10. 19	3.11. 19
1654	962	Vybourané stavební hmoty	28 dny	7.10. 19	3.11. 19
1655	99	Staveništní přesun hmot	120 dny	7.10. 19	3.2. 20
1656	**100.20.3-2**	**Demolice oplocení**	**54 dny**	**19.9. 19**	**11.11. 19**
1661	**100.32.1A**	**Ul. Plotní - 2. část, komunikace**	**154 dny**	**9.6. 19**	**9.11. 19**
1682	**100.35.1**	**Křižovatka Zvonařka - Plotní, komunikace**	**140 dny**	**19.9. 19**	**5.2. 20**
1683	1	Zemní práce	68 dny	19.9. 19	25.11. 19
1684	2	Základy	44 dny	7.10. 19	19.11. 19
1685	4	Vodorovné konstrukce	68 dny	21.10. 19	27.12. 19
1686	5	Komunikace	51 dny	17.12. 19	5.2. 20
1687	8	Potrubí	50 dny	4.11. 19	23.12. 19
1688	9	Ostatní konstrukce a práce	140 dny	19.9. 19	5.2. 20
1689	**100.40.1A**	**Ul. Dornych 3.část, komunikace**	**85 dny**	**6.2. 20**	**30.4. 20**
1690	1	Zemní práce	57 dny	6.2. 20	23.4. 20
1691	21	Úprava podloží a základ.spáry	40 dny	15.2. 20	25.3. 20
1692	3	Svislé a kompletní konstrukce	35 dny	26.2. 20	31.3. 20
1693	4	Vodorovné konstrukce+komunikace	67 dny	24.2. 20	30.4. 20
1694	VRN7	Provozní vlivy	85 dny	6.2. 20	30.4. 20
1695	**101.20**	**DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - II.etapa**	**72 dny**	**29.12. 18**	**10.3. 19**
1703	**SO 200**	**Inženýrské sítě, vodovody**	**747 dny**	**31.3. 18**	**15.4. 20**
1704	**200.10.01**	**Vodovodní řady - Dornych, Svatopetrská (A1, A2)**	**68 dny**	**20.4. 18**	**26.6. 18**
1714	**200.12.01**	**Náhradní zásobování vodou Kovářská**	**40 dny**	**11.3. 19**	**19.4. 19**
1716	**200.20.01**	**Vodovodní řady - Dornych, Spěšná**	**149 dny**	**25.5. 18**	**20.10. 18**
1717	**HSV**	**Práce a dodávky HSV**	**149 dny**	**25.5. 18**	**20.10. 18**
1718	1	Zemní práce	48 dny	25.5. 18	11.10. 18
1719	4	Vodorovné konstrukce	40 dny	2.7. 18	10.8. 18
1720	8	Trubní vedení	42 dny	6.8. 18	16.9. 18
1721	997	Přesun sutě	50 dny	25.5. 18	13.7. 18
1722	998	Přesun hmot	149 dny	25.5. 18	20.10. 18
1723	**200.20.02**	**Vodovodní řady - Zvonařka (D3)**	**27 dny**	**19.9. 19**	**15.10. 19**
1734	**200.22.01**	**Náhradní zásobování vodou - Dornych, Spěšná**	**88 dny**	**31.3. 18**	**26.6. 18**
1744	**200.30.05**	**Vodovodní řady - Zvonařka**	**69 dny**	**14.10. 19**	**21.12. 19**
1754	**200.30.06**	**Vodovodní řady - Dornych, Přízova**	**75 dny**	**30.11. 19**	**12.2. 20**
1793	**200.32.06**	**Náhradní zásobování vodou - Dornych, Přízova**	**12 dny**	**6.2. 20**	**17.2. 20**
1803	**200.40.01**	**Vodovodní řady - Dornych**	**55 dny**	**21.2. 20**	**15.4. 20**
1840	**200.40.02**	**Vodovodní řady - Zvonařka**	**55 dny**	**14.10. 19**	**7.12. 19**
1850	**200.42.01**	**Náhradní zásobování vodou - Dornych**	**55 dny**	**31.3. 18**	**24.5. 18**
1860	**200.42.02**	**Náhradní zásobování vodou - Zvonařka**	**59 dny**	**19.9. 19**	**16.11. 19**
1875	**SO 400**	**Tramvajová trať**	**89 dny**	**1.3. 18**	**28.5. 18**
1876	**421.10.1**	**Tramvajová trať, demontáž , trolejové vedení Svatopetrská-Zvonařka**	**89 dny**	**1.3. 18**	**28.5. 18**
1877	74D	ETAPA 2	30 dny	1.3. 18	30.3. 18
1878	74M	ETAPA 3	45 dny	31.3. 18	14.5. 18
1879	990	ETAPA 4	59 dny	31.3. 18	28.5. 18
1880	**450.10.1**	**Tram. trať Svatopetrská-Dornych-po ul. Nová Agrezet demontáž,tram. spodek,svršek**	**67 dny**	**1.3. 18**	**6.5. 18**
1881	HSV	ETAPA 2	30 dny	1.3. 18	30.3. 18
1882	VRN	ETAPA 3	37 dny	31.3. 18	6.5. 18
1883	**SO 500**	**Inženýrské sítě, plynovody**	**737 dny**	**31.3. 18**	**5.4. 20**
1884	**500.10.01**	**STL plynovod PE 225 – Dornych, 1. část**	**67 dny**	**31.3. 18**	**5.6. 18**
1891	**500.20.01**	**STL plynovod PE 225 – Dornych, 2. část**	**127 dny**	**31.3. 18**	**4.8. 18**
1898	**500.20.02**	**STL plynovod PE 160 – Dornych, 3. část**	**97 dny**	**9.5. 18**	**13.8. 18**
1905	**500.40.01**	**STL plynovod PE 160 - Dornych, 4.část**	**95 dny**	**2.1. 20**	**5.4. 20**
1912	**SO 700**	**Silnoproudé rozvody a přeložky**	**417 dny**	**31.3. 18**	**21.5. 19**
1913	701.10.01	Přeložky vedení E.ON	95 dny	31.3. 18	21.5. 19
1914	**SO 800**	**Sdělovací rozvody a přeložky**	**700 dny**	**10.1. 18**	**10.12. 19**
1915	**801.20**	**Přeložky kabelůCETIN Dornych**	**156 dny**	**10.1. 18**	**14.6. 18**
1916		ETAPA 1	27 dny	10.1. 18	5.2. 18
1917		ETAPA 3	46 dny	31.3. 18	15.5. 18
1918		ETAPA 4	30 dny	16.5. 18	14.6. 18

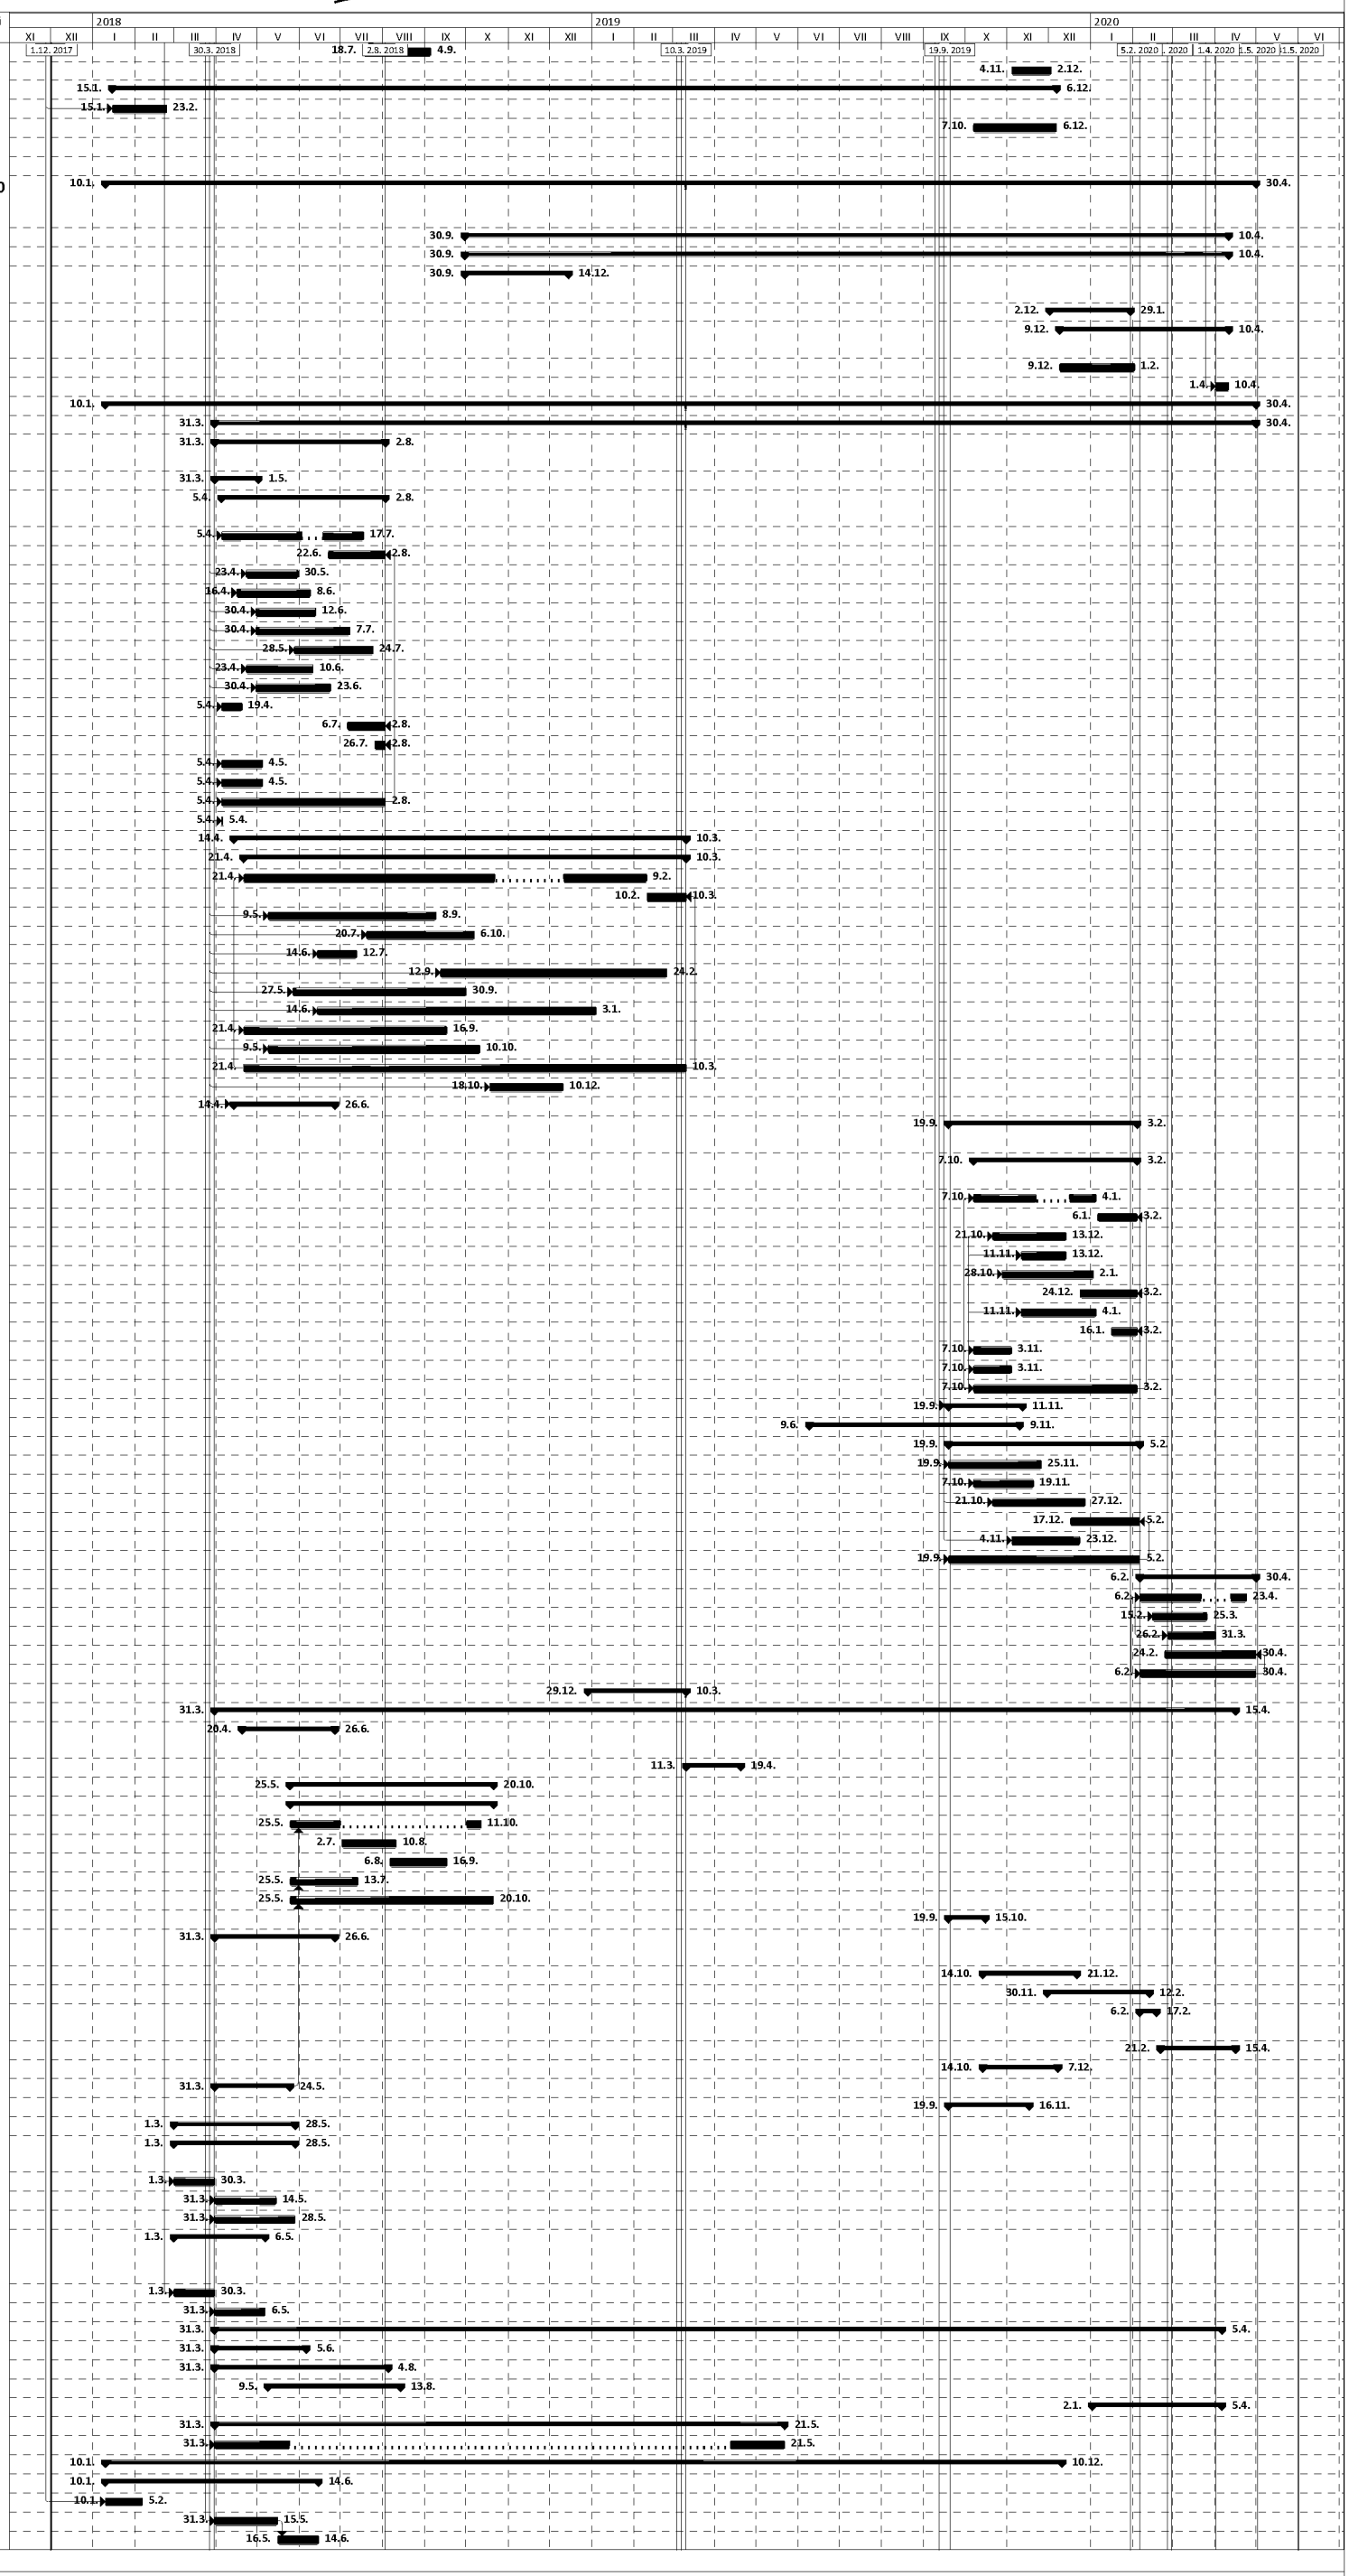
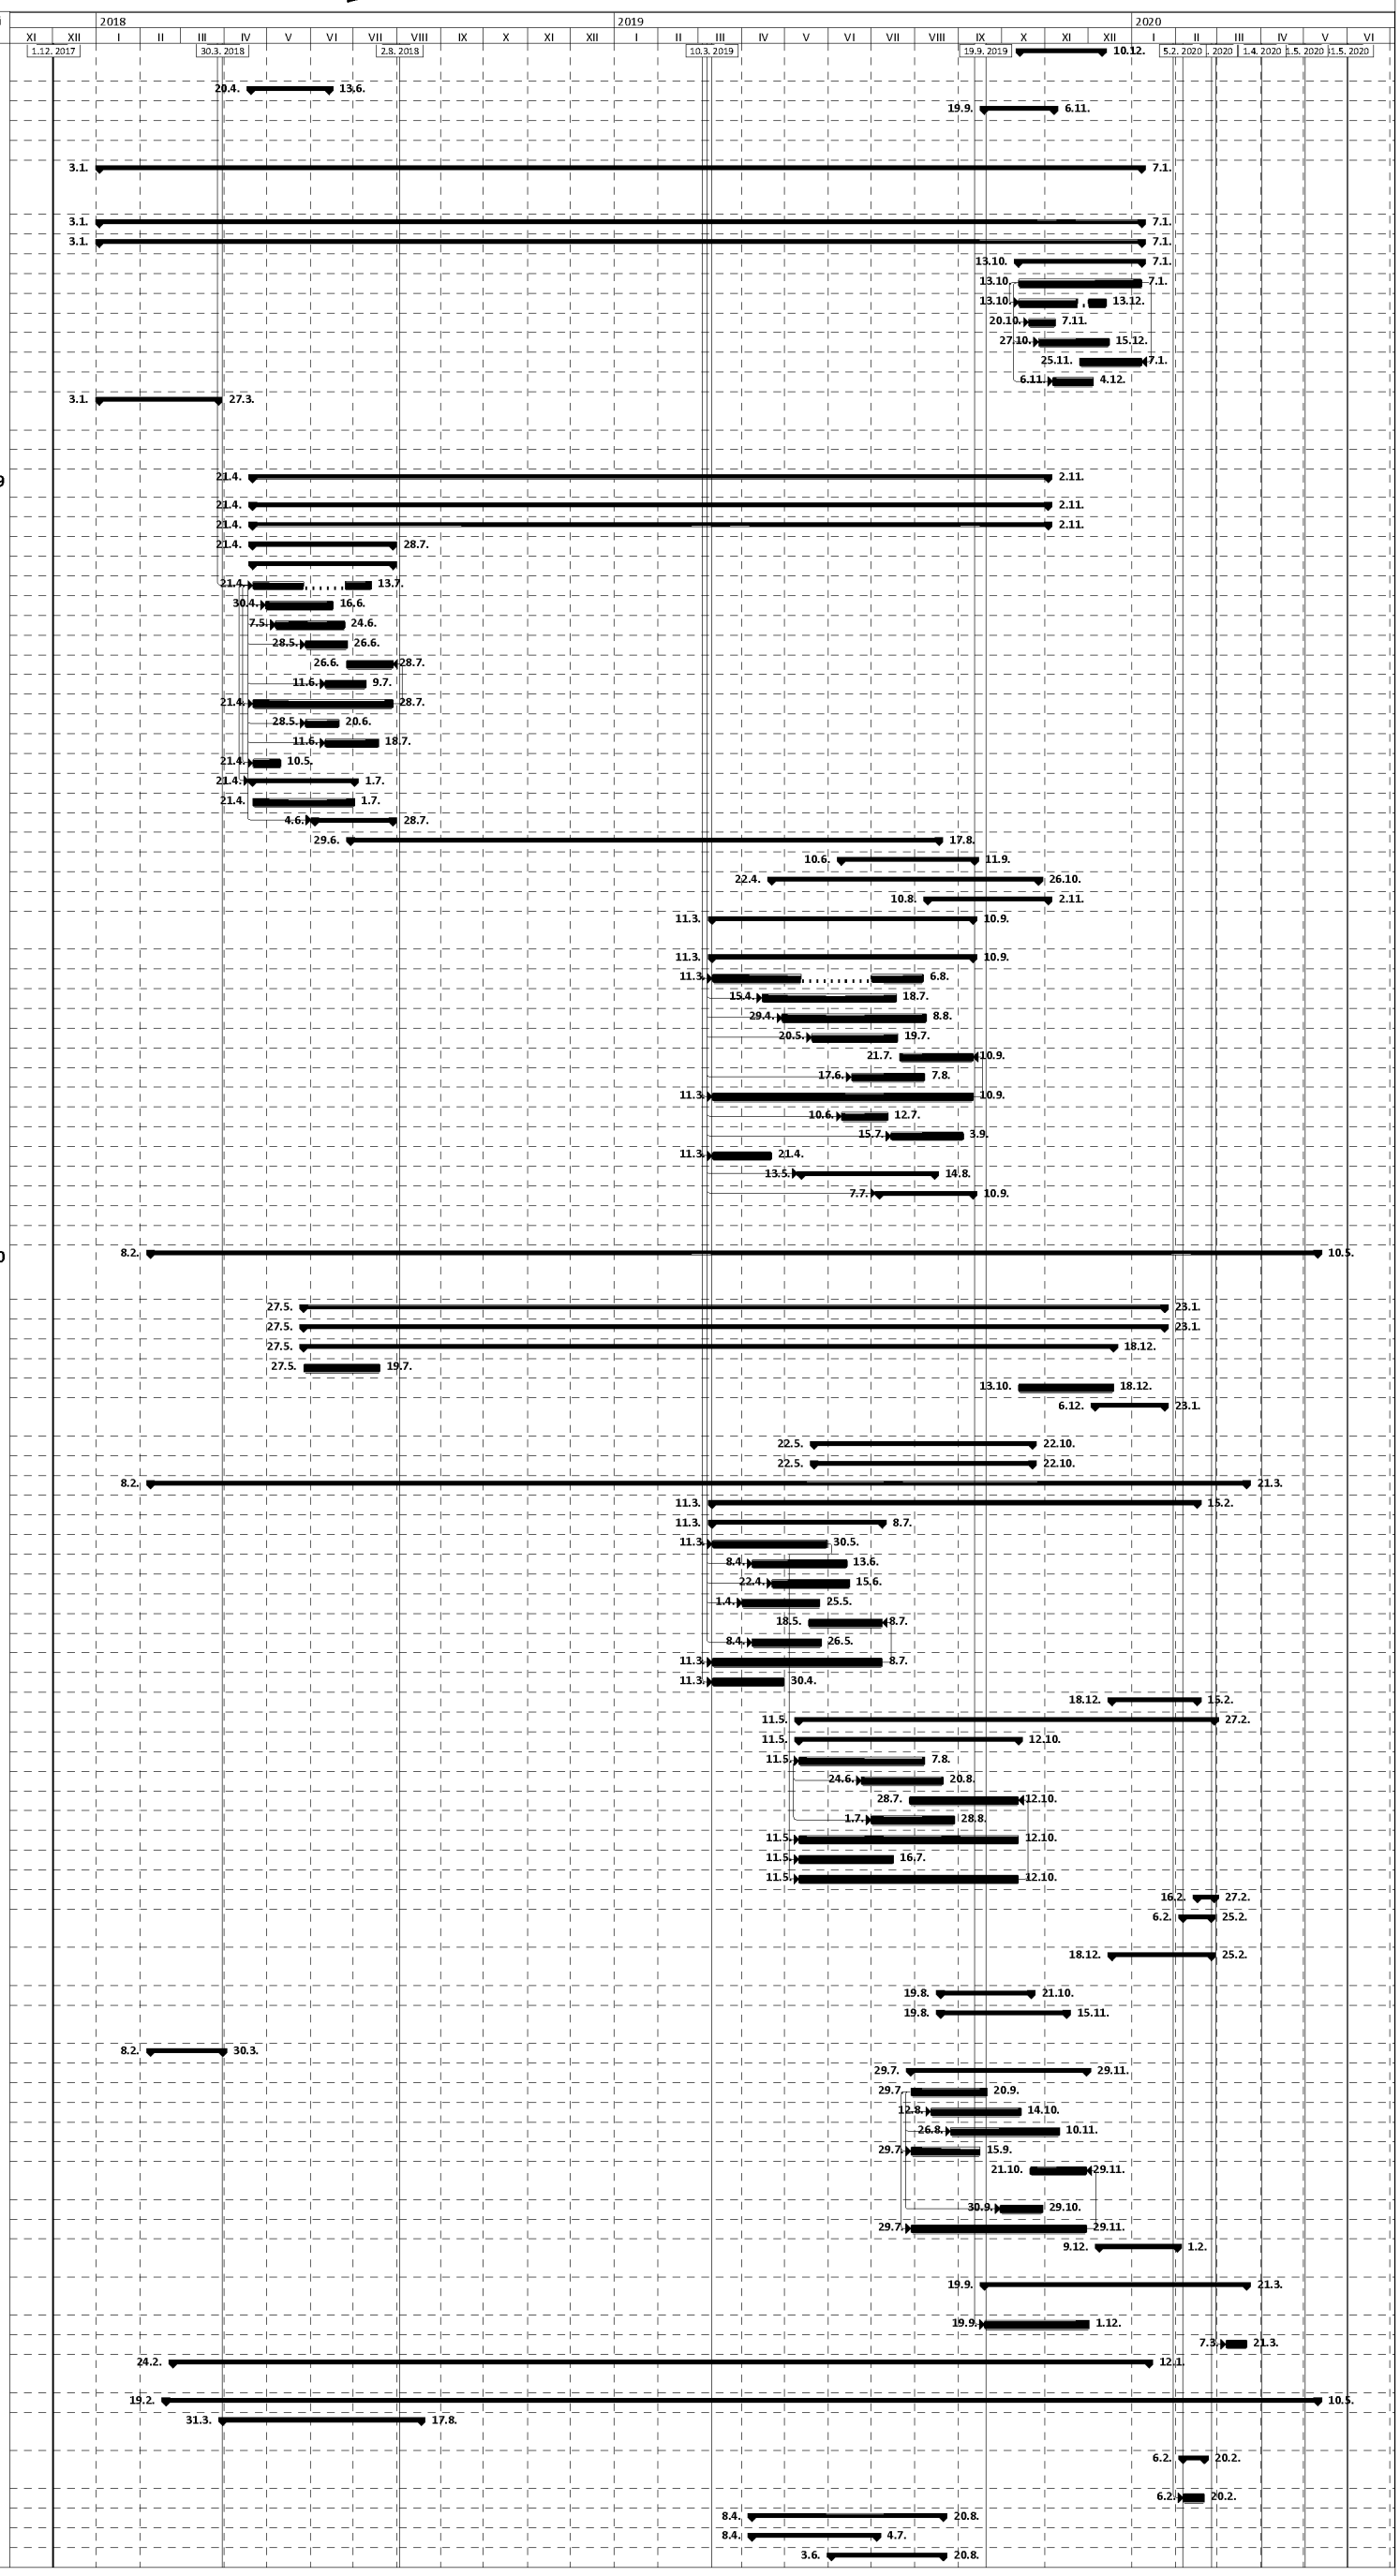
ID	Text_1	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení
1919	**801.40**	**Přeložky kabelů CETIN v oblasti Zvonařka-Dornych**	**58 dny**	**14.10. 19**	**10.12. 19**
1921	**802.20**	**Přeložky kabelů UPC Dornych**	**55 dny**	**20.4. 18**	**13.6. 18**
1923	**802.40**	**Přeložky kabelů UPC Zvonařka**	**49 dny**	**19.9. 19**	**6.11. 19**
1925					
1926					
1927		**Stavba v zájmu Statutárního města Brna a Ředitelství silnic a**	**735 dny**	**3.1. 18**	**7.1. 20**
1928	**SO**	**Stavební část**	**735 dny**	**3.1. 18**	**7.1. 20**
1929	**SO 100**	**Komunikace, zpevněné plochy**	**735 dny**	**3.1. 18**	**7.1. 20**
1930	**100.21.1**	**Ul. Nová (Rosická), komunikace**	**87 dny**	**13.10. 19**	**7.1. 20**
1931	0	Ostatní konstrukce a práce	87 dny	13.10. 19	7.1. 20
1932	1	Zemní práce	55 dny	13.10. 19	13.12. 19
1933	2	Základy	19 dny	20.10. 19	7.11. 19
1934	4	Vodorovné konstrukce	50 dny	27.10. 19	15.12. 19
1935	5	Komunikace	44 dny	25.11. 19	7.1. 20
1936	8	Potrubí	29 dny	6.11. 19	4.12. 19
1937	**100.30.3**	**Ul. Nová AGROZET, Komárovská - Plotní, komunikace**	**84 dny**	**3.1. 18**	**27.3. 18**
1961					
1962					
1963		**Stavba v zájmu Tepláren Brno, a.s.**	**561 dny**	**21.4. 18**	**2.11. 19**
1964	**SO**	**Stavební část**	**561 dny**	**21.4. 18**	**2.11. 19**
1965	**SO 600**	**Inženýrské sítě, parovody**	**561 dny**	**21.4. 18**	**2.11. 19**
1966	**600.20**	**Parovod 2xDN250 - Dornych**	**99 dny**	**21.4. 18**	**28.7. 18**
1967	**S20**	**Stavební část**	**99 dny**	**21.4. 18**	**28.7. 18**
1968	1	Zemní práce	55 dny	21.4. 18	13.7. 18
1969	2	Základy a zvláštní zakládání	48 dny	30.4. 18	16.6. 18
1970	3	Svislé a kompletní konstrukce	49 dny	7.5. 18	24.6. 18
1971	4	Vodorovné konstrukce	30 dny	28.5. 18	26.6. 18
1972	5	Komunikace	33 dny	26.6. 18	28.7. 18
1973	61	Upravy povrchů vnitřní	29 dny	11.6. 18	9.7. 18
1974	99	Staveništní přesun hmot	99 dny	21.4. 18	28.7. 18
1975	711	Izolace proti vodě	24 dny	28.5. 18	20.6. 18
1976	767	Konstrukce zámečnické	38 dny	11.6. 18	18.7. 18
1977	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	20 dny	21.4. 18	10.5. 18
1978	**T20**	**Potrubí**	**72 dny**	**21.4. 18**	**1.7. 18**
1979	713	Potrubí	72 dny	21.4. 18	1.7. 18
1980	**Z20**	**Komunikační rozvody**	**55 dny**	**4.6. 18**	**28.7. 18**
1982	**600.21**	**Parovod 2xDN100 - Plotní - J62/04**	**415 dny**	**29.6. 18**	**17.8. 19**
1999	**600.22**	**Parovod 2xDN100 - Plotní - J64**	**94 dny**	**10.6. 19**	**11.9. 19**
2018	**600.24**	**Parovod 2xDN200 - Kovářská - J70**	**188 dny**	**22.4. 19**	**26.10. 19**
2034	**600.25**	**Parovod 2xDN80 - Zvonařka - J62/02**	**85 dny**	**10.8. 19**	**2.11. 19**
2050	**600.30**	**Parovod 2xDN200 - podchod pod tramvají Plotní**	**184 dny**	**11.3. 19**	**10.9. 19**
2051	**S30**	**Stavební část**	**184 dny**	**11.3. 19**	**10.9. 19**
2052	1	Zemní práce	100 dny	11.3. 19	6.8. 19
2053	2	Základy a zvláštní zakládání	95 dny	15.4. 19	18.7. 19
2054	3	Svislé a kompletní konstrukce	102 dny	29.4. 19	8.8. 19
2055	4	Vodorovné konstrukce	61 dny	20.5. 19	19.7. 19
2056	5	Komunikace	52 dny	21.7. 19	10.9. 19
2057	61	Upravy povrchů vnitřní	52 dny	17.6. 19	7.8. 19
2058	99	Staveništní přesun hmot	184 dny	11.3. 19	10.9. 19
2059	711	Izolace proti vodě	33 dny	10.6. 19	12.7. 19
2060	767	Konstrukce zámečnické	51 dny	15.7. 19	3.9. 19
2061	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	42 dny	11.3. 19	21.4. 19
2062	**T30**	**Potrubí**	**94 dny**	**13.5. 19**	**14.8. 19**
2064	**Z30**	**Komunikační rozvody**	**66 dny**	**7.7. 19**	**10.9. 19**
2066					
2067					
2068		**Stavba v zájmu Dopravního podniku města Brna, a.s.**	**823 dny**	**8.2. 18**	**10.5. 20**
2069	**PS**	**Technologická část**	**607 dny**	**27.5. 18**	**23.1. 20**
2070	**PS 200**	**Sdělovací zařízení**	**607 dny**	**27.5. 18**	**23.1. 20**
2071	**201.30**	**Kamerový systém DPMB-oblast Brno jih**	**571 dny**	**27.5. 18**	**18.12. 19**
2072	čod	ETAPA 3	54 dny	27.5. 18	19.7. 18
2073		ETAPA 5	67 dny	13.10. 19	18.12. 19
2074	**201.31**	**Kamerový systém DPMB-oblast Brno střed**	**49 dny**	**6.12. 19**	**23.1. 20**
2076	**SO**	**Stavební část**	**154 dny**	**22.5. 19**	**22.10. 19**
2077	**SO 150**	**Pozemní objekty**	**154 dny**	**22.5. 19**	**22.10. 19**
2103	**SO 400**	**Tramvajová trať**	**773 dny**	**8.2. 18**	**21.3. 20**
2104	**400.30.1**	**Tramvajová trať Plotní, tram. spodek**	**342 dny**	**11.3. 19**	**15.2. 20**
2105	**HSV**	**ETAPA 5**	**120 dny**	**11.3. 19**	**8.7. 19**
2106	1	Zemní práce	81 dny	11.3. 19	30.5. 19
2107	2	Zakládání	67 dny	8.4. 19	13.6. 19
2108	3	Svislé a kompletní konstrukce	55 dny	22.4. 19	15.6. 19
2109	4	Vodorovné konstrukce	55 dny	1.4. 19	25.5. 19
2110	5	Komunikace	52 dny	18.5. 19	8.7. 19
2111	8	Trubní vedení	49 dny	8.4. 19	26.5. 19
2112	9	Ostatní konstrukce a práce-bourání	120 dny	11.3. 19	8.7. 19
2113	997	Přesun sutě	51 dny	11.3. 19	30.4. 19
2114	**PSV**	**ETAPA 7**	**60 dny**	**18.12. 19**	**15.2. 20**
2118	**400.30.2**	**Tramvajová trať Plotní, tram. svršek**	**293 dny**	**11.5. 19**	**27.2. 20**
2119	**HSV**	**ETAPA 5**	**155 dny**	**11.5. 19**	**12.10. 19**
2120	1	Zemní práce	89 dny	11.5. 19	7.8. 19
2121	2	Zakládání	58 dny	24.6. 19	20.8. 19
2122	5	Komunikace CPV 45233120-6	77 dny	28.7. 19	12.10. 19
2123	8	Automatický zavlažovací systém	59 dny	1.7. 19	28.8. 19
2124	9	Ostatní konstrukce a práce-bourání	155 dny	11.5. 19	12.10. 19
2125	997	Přesun sutě	67 dny	11.5. 19	16.7. 19
2126	998	Přesun hmot	155 dny	11.5. 19	12.10. 19
2127	**VRN**	**ETAPA 7**	**12 dny**	**16.2. 20**	**27.2. 20**
2130	**400.30.3**	**Úprava koleje z důvodu napojení na novou trať**	**20 dny**	**6.2. 20**	**25.2. 20**
2140	**401.30.1**	**Prodloužení nástupiště tramvajové zastávky Úzká**	**70 dny**	**18.12. 19**	**25.2. 20**
2214	**401.30.2**	**Nástupiště tramvajových zastávek Zvonařka**	**64 dny**	**19.8. 19**	**21.10. 19**
2221	**401.30.3**	**Nástupiště tramvajových zastávek Železniční**	**89 dny**	**19.8. 19**	**15.11. 19**
2235	**401.30.4**	**Nástupiště tramvajových zastávek Konopná**	**51 dny**	**8.2. 18**	**30.3. 18**
2250	**420.30.1**	**Tramvajová trať Plotní, trolejové vedení**	**124 dny**	**29.7. 19**	**29.11. 19**
2251	74A	74A ZÁKLADY TV	54 dny	29.7. 19	20.9. 19
2252	74B	74B STOŽÁRY TV	64 dny	12.8. 19	14.10. 19
2253	74C	74C VODIČE S PŘÍSLUŠENSTVÍM	77 dny	26.8. 19	10.11. 19
2254	74D	74D DEMONTÁŽE TV	49 dny	29.7. 19	15.9. 19
2255	74M	74M REVIZE, ZKOUŠKY, MĚŘENÍ A TECHNICKÁ POMOC TV	40 dny	21.10. 19	29.11. 19
2256	74N	74N NÁTĚRY TV	30 dny	30.9. 19	29.10. 19
2257	990	Všeobecné práce	124 dny	29.7. 19	29.11. 19
2258	**420.30.1.1**	**Tramvajová trať Plotní, trolejové vedení - úprava řídícího systému ED Tábor**	**55 dny**	**9.12. 19**	**1.2. 20**
2260	**421.40.1**	**Tramvajová trať Zvonařka -Dornych - Úzká, demontáž, trolejové vedení**	**185 dny**	**19.9. 19**	**21.3. 20**
2261	74D	ETAPA 6	74 dny	19.9. 19	1.12. 19
2262	990	ETAPA 9	15 dny	7.3. 20	21.3. 20
2263	**430.30.01**	**Tramvajová trať Plotní, napájecí a zpětné vedení**	**688 dny**	**24.2. 18**	**12.1. 20**
2285	**430.30.02**	**Tramvajová trať Plotní, kabelovod DPMB**	**812 dny**	**19.2. 18**	**10.5. 20**
2299	**450.20.1**	**Tram. Trať Nová Agrezet - Zvonařka, demontáž,tram. spodek,svršek**	**140 dny**	**31.3. 18**	**17.8. 18**
2301	**450.40.1**	**Tram. trať Zvonařka-Dornych-Úzká, demontáž,tram. spodek,svršek**	**15 dny**	**6.2. 20**	**20.2. 20**
2302		<Nový úkol>	15 dny	6.2. 20	20.2. 20
2303	**SO 800**	**Sdělovací rozvody a přeložky**	**135 dny**	**8.4. 19**	**20.8. 19**
2304	**804.30**	**Optický kabel DPmB-oblast Brno jih**	**88 dny**	**8.4. 19**	**4.7. 19**
2313	**804.31**	**Optický kabel DPmB-oblast Brno střed**	**79 dny**	**3.6. 19**	**20.8. 19**
