PŘÍLOHA č. 4

ÚVN - VoFN Praha - dokončení rekonstrukce Pavilonu B - realizace

Linka	Název	Začátek	Konec
1	předání staveniště	2.2.2018	2.2.2018
2	zařízení staveniště	5.2.2018	9.2.2018
3	bourání a podchycování konstrukcí	12.2.2018	6.6.2018
4	zdivo, dozdívky	2.3.2018	6.7.2018
5	omítky	9.4.2018	13.8.2018
6	hrubé podlahy, tep. izolace podlah	9.4.2018	13.8.2018
7	SDK kce	11.6.2018	21.12.2018
8	keramické obklady a dlažby	4.3.2019	17.5.2019
9	lité teraco	14.1.2019	10.5.2019
10	povlakové podlahy	25.2.2019	24.5.2019
11	nátěry+malby	1.4.2019	24.5.2019
12	úpravy pro VZT 276-030	13.8.2018	25.1.2019
13	severní přístřešek	1.8.2018	1.2.2019
14	rampa, opěrné stěny	4.6.2018	25.1.2019
15	partery	19.2.2018	26.10.2018
16	vnitřní výplně otvorů	4.3.2019	10.5.2019
17	prosklené stěny	4.3.2019	10.5.2019
18	zámečnické výrobky	7.1.2019	17.5.2019
19	ostatní výrobky	11.2.2019	17.5.2019
20	ZTI	16.7.2018	17.5.2019
21	elektroinstalace	16.7.2018	17.5.2019
22	UT	23.7.2018	17.5.2019
23	MaR	8.10.2018	17.5.2019
24	VZT a chlazení	16.7.2018	17.5.2019
25	potrubní pošta	18.7.2018	17.5.2019
26	medicinální plyny, stanice dýchání, vakuová stanice	16.7.2018	17.5.2019
27	kolejnicový systém	4.3.2019	3.5.2019
28	interiéry	5.2.2019	15.5.2019
29	atypické výrobky	11.2.2019	17.5.2019
30	oprava kanalizace a vodovodu	19.2.2018	20.4.2018
31	sanace	5.3.2018	30.5.2018
32	zaregulování, kompletace, revize	1.5.2019	31.5.2019
33	předání díla	3.6.2019	3.6.2019

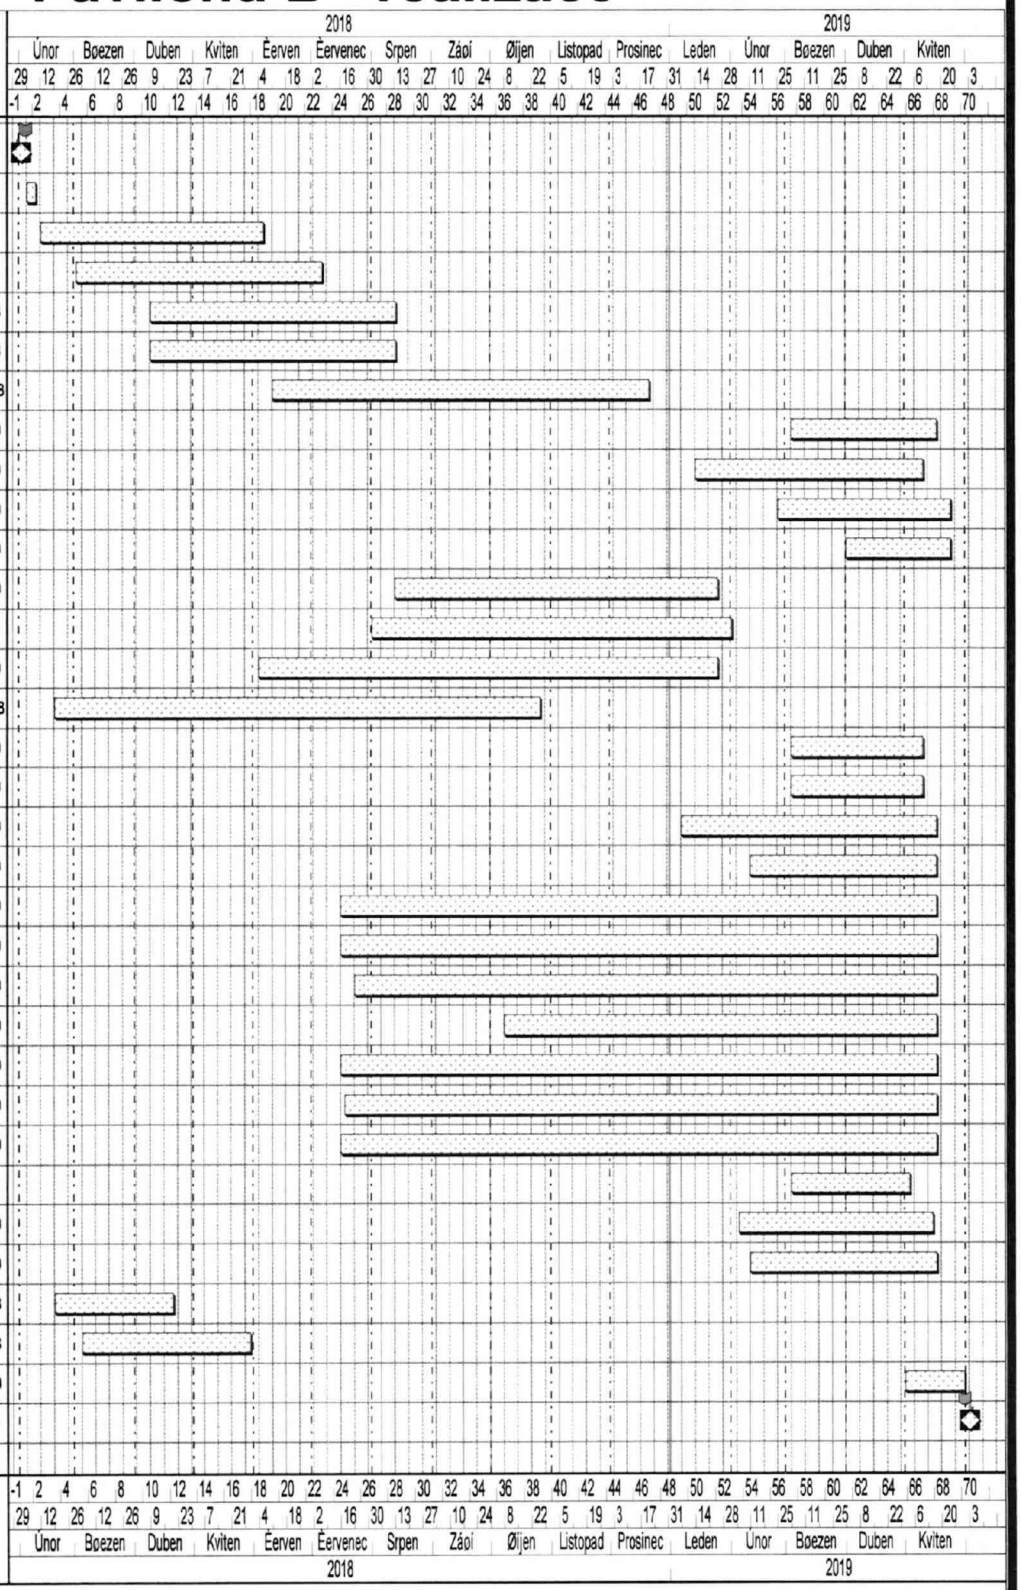

Symboly

Milník

Začít po

Page 1 of 1

Drawn by:	Dwg No.	Revision No.	Notes:

Planned By Powerproject Teamplan
