ID	Režim úkolu	Task Name	Doba trvání
1		**II/125 Kolín, most ev.č. 125-035, oprava dilatace**	**36 dny**
2		Převzetí staveniště	2 dny
3		**I. Etapa - uzavřen 1 jízdní pruh vozovky**	**7 dny**
4		DIO	0,5 dny
5		Frézování	0,5 dny
6		Vybourání dilatace	1 den
7		Ubourání římsy	1 den
8		Pokládka asfaltu ACL	0,5 dny
9		Pokládka asfaltu ACO	0,5 dny
10		Zaříznutí a vybourání kapsy afaltu pro nový MZ	0,5 dny
11		Úprava izolace, vyčištění kapsy	1 den
12		Montáž MZ	2 dny
13		**II. Etapa - uzavřeny 2 jízdní pruhy vozovky**	**9 dny**
14		Montáž DZ	0,5 dny
15		Frézování	0,5 dny
16		Vybourání dilatace	1 den
17		Ubourání římsy	1 den
18		Pokládka asfaltu ACL	0,5 dny
19		Pokládka asfaltu ACO	0,5 dny
20		Zaříznutí a vybourání kapsy afaltu pro nový MZ	1 den
21		Úprava izolace, vyčištění kapsy	1,5 dny
22		Montáž MZ	3 dny
23		**III. Etapa - most ev.č. 125-035.1 a 125-035.2**	**17 dny**
24		Montáž DZ	0,5 dny
25		Frézování	1 den
26		Vybourání dilatace	3 dny
27		Ubourání římsy	2 dny
28		Pokládka asfaltu ACL	1 den
29		Pokládka asfaltu ACO	1 den
30		Zaříznutí a vybourání kapsy afaltu pro nový MZ	2 dny
31		Úprava izolace, vyčištění kapsy	2 dny
32		Montáž MZ	5 dny
33		Obnova VDZ	1 den

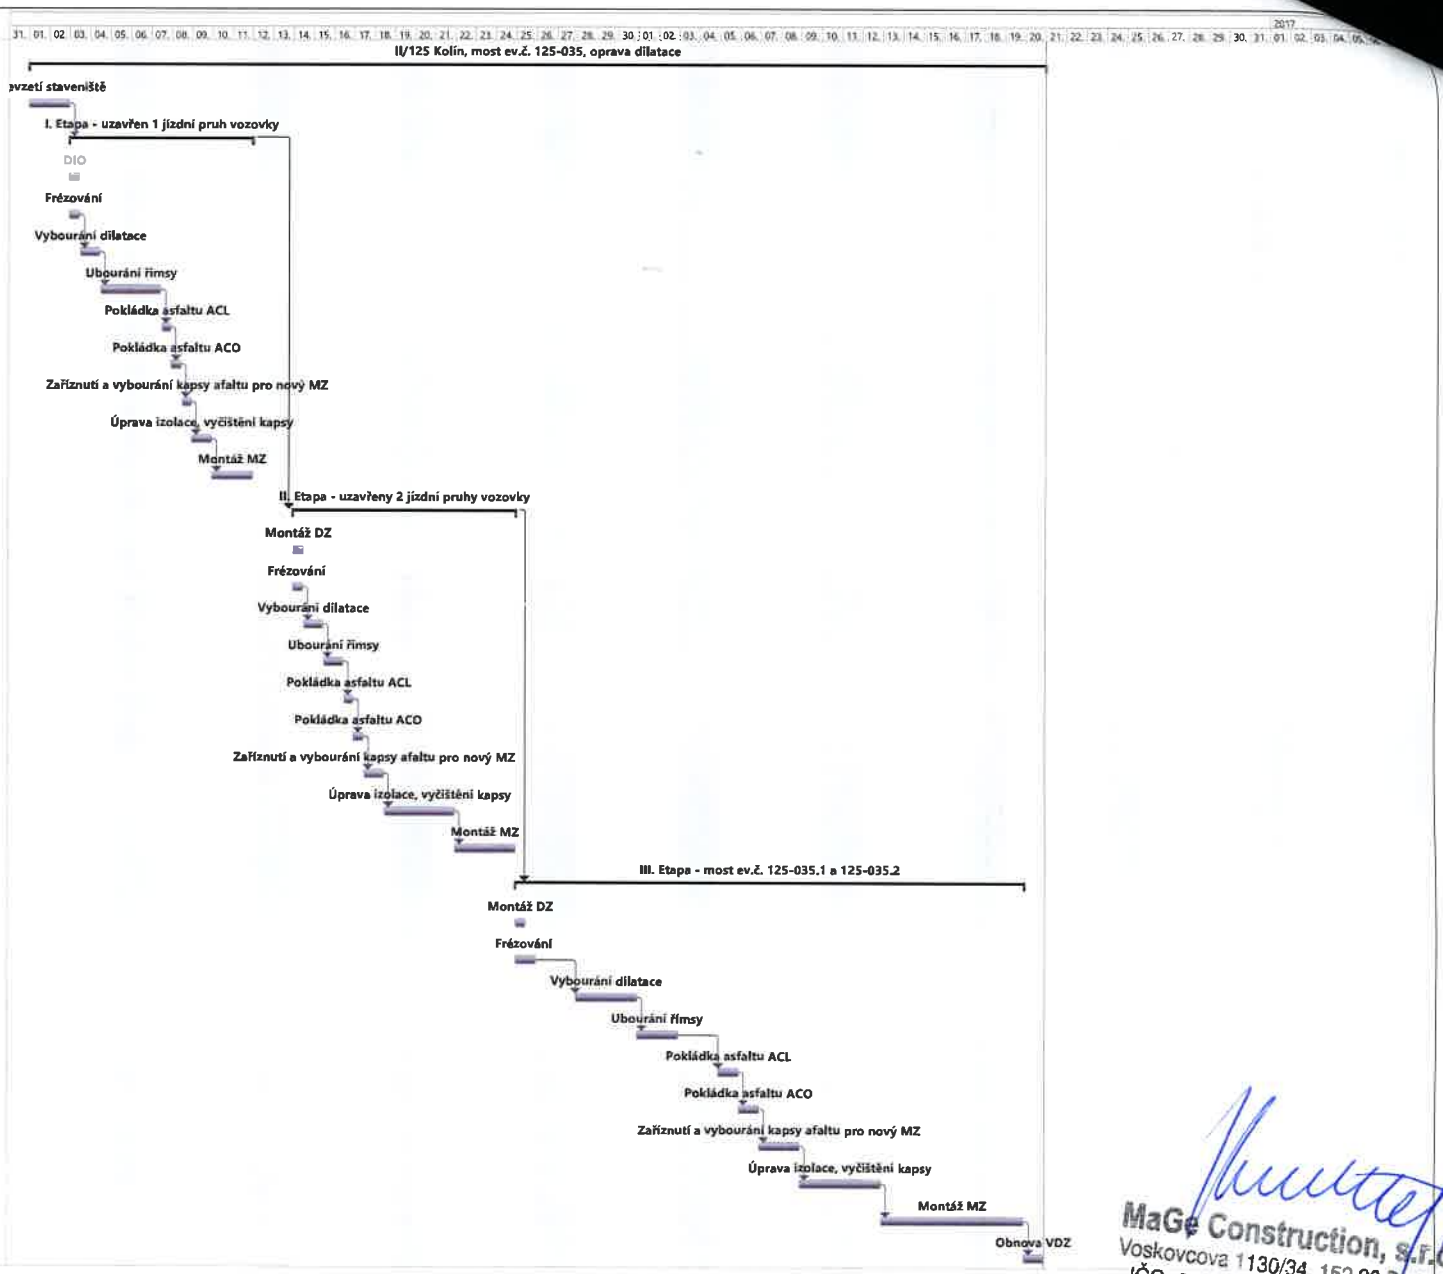

Project: Příloha č 2 HMG II_125
Date: 10.10. 16

Task | Split | Milestone | Summary | Project Summary | Inactive Task | Inactive Milestone | Inactive Summary | Manual Task | Duration-only | Manual Summary Rollup | Manual Summary | Start-only | Finish-only | External Tasks | External Milestone | Deadline | Progress | Manual Progress

MaGe Construction, s.r.o.
Voskovcova 1130/34, 152 00 Praha 5
IČO: 24166189, DIČ: CZ24166189
info@mageco.cz
