ID	Název úkolu	Zahájení	Dokončení
1			
2	**VŠPJ - Výstavba výukového centra**	**20.4. 18**	**25.9. 19**
3	Podpis smlouvy o dílo	20.4. 18	20.4. 18
4	Předání staveniště	23.4. 18	23.4. 18
5	Zahájení stavebních prací	24.4. 18	30.4. 18
6	Zařízení staveniště	27.4. 18	25.9. 19
7	Předání díla	25.9. 19	25.9. 19
8	**SO 01 - Stávající objekt VŠPJ**	**30.4. 18**	**24.9. 19**
9	Přesun + připojení kotelny	30.4. 18	17.9. 18
10	Bourací práce	7.5. 18	26.10. 18
11	Svislé konstrukce	3.7. 18	30.11. 18
12	Sanace	3.9. 18	31.12. 18
13	Omítky	6.11. 18	31.3. 19
14	Hrubé podlahy	4.3. 19	20.5. 19
15	Čisté podlahy - povrchy	4.4. 19	31.8. 19
16	Obklady	4.2. 19	31.5. 19
17	Podhledy	9.5. 19	1.9. 19
18	Nátěry, malby	3.5. 19	24.8. 19
19	Historická fasáda	16.7. 18	24.6. 19
20	Výplně otvorů	3.7. 18	30.9. 18
21	Střecha	16.7. 18	31.10. 18
22	Rozvody ZTI, ÚT, VZT	7.8. 18	31.3. 19
23	Rozvody silnoproud, slaboproud, MaR	14.8. 18	31.3. 19
24	Kompletace ZTI, ÚT, VZT	15.4. 19	6.9. 19
25	Kompletace silnoproud, slaboproud, MaR	16.4. 19	15.9. 19
26	Komunikace	25.3. 19	15.9. 19
27	Terénní a sadové úpravy	3.9. 19	22.9. 19
28	Dokončovací práce	19.8. 19	24.9. 19
29	**S0 02 - Objekt výukového centra**	**1.5. 18**	**24.9. 19**
30	Bourací práce	1.5. 18	3.6. 18
31	Zemní práce	8.5. 18	30.6. 18
32	Základové konstrukce-injektáže	4.6. 18	30.6. 18
33	Základové konstrukce + spodní stavba	25.6. 18	31.7. 18
34	Železobetonová konstrukce centra	24.7. 18	31.10. 18
35	Nosná konstukce střechy	29.10. 18	30.11. 18
36	Střešní plášť	19.11. 18	31.3. 19
37	Výplně otvorů	1.11. 18	20.12. 18
38	Fasáda	29.10. 18	15.9. 19
39	Železobetonové konstrukce vnitřní	1.10. 18	31.12. 18
40	Podlahy hrubé	25.2. 19	30.4. 19
41	SDK konstrukce a obklady	25.2. 19	31.8. 19
42	Rozvody ZTI, ÚT, VZT	2.7. 18	30.4. 19
43	Rozvody silnoproud, slaboproud, MaR	6.8. 18	30.4. 19
44	Kompletace ZTI, ÚT, VZT	3.6. 19	13.9. 19
45	Kompletace silnoproud, slaboproud, MaR	3.6. 19	13.9. 19
46	Inženýrské sítě	21.5. 18	31.8. 18
47	Komunikace	8.10. 18	24.8. 19
48	Terénní a sadové úpravy	26.8. 19	20.9. 19
49	Dokončovací práce	26.8. 19	24.9. 19
50	Uzlový bod - milník č.1	31.5. 18	31.5. 18
51	Uzlový bod - milník č.2	30.6. 18	30.6. 18
52	Uzlový bod - milník č.3	31.7. 18	31.7. 18
53	Uzlový bod - milník č.4	31.8. 18	31.8. 18
54	Uzlový bod - milník č.5	30.9. 18	30.9. 18
55	Uzlový bod - milník č.6	31.10. 18	31.10. 18
56	Uzlový bod - milník č.7	30.11. 18	30.11. 18
57	Uzlový bod - milník č.8	31.12. 18	31.12. 18
58	Uzlový bod - milník č.9	31.1. 19	31.1. 19
59	Uzlový bod - milník č.10	28.2. 19	28.2. 19
60	Uzlový bod - milník č.11	31.3. 19	31.3. 19
61	Uzlový bod - milník č.12	30.4. 19	30.4. 19
62	Uzlový bod - milník č.13	31.5. 19	31.5. 19
63	Uzlový bod - milník č.14	30.6. 19	30.6. 19
64	Uzlový bod - milník č.15	31.7. 19	31.7. 19
65	Uzlový bod - milník č.16	31.8. 19	31.8. 19
66	Uzlový bod - milník č.17	25.9. 19	25.9. 19

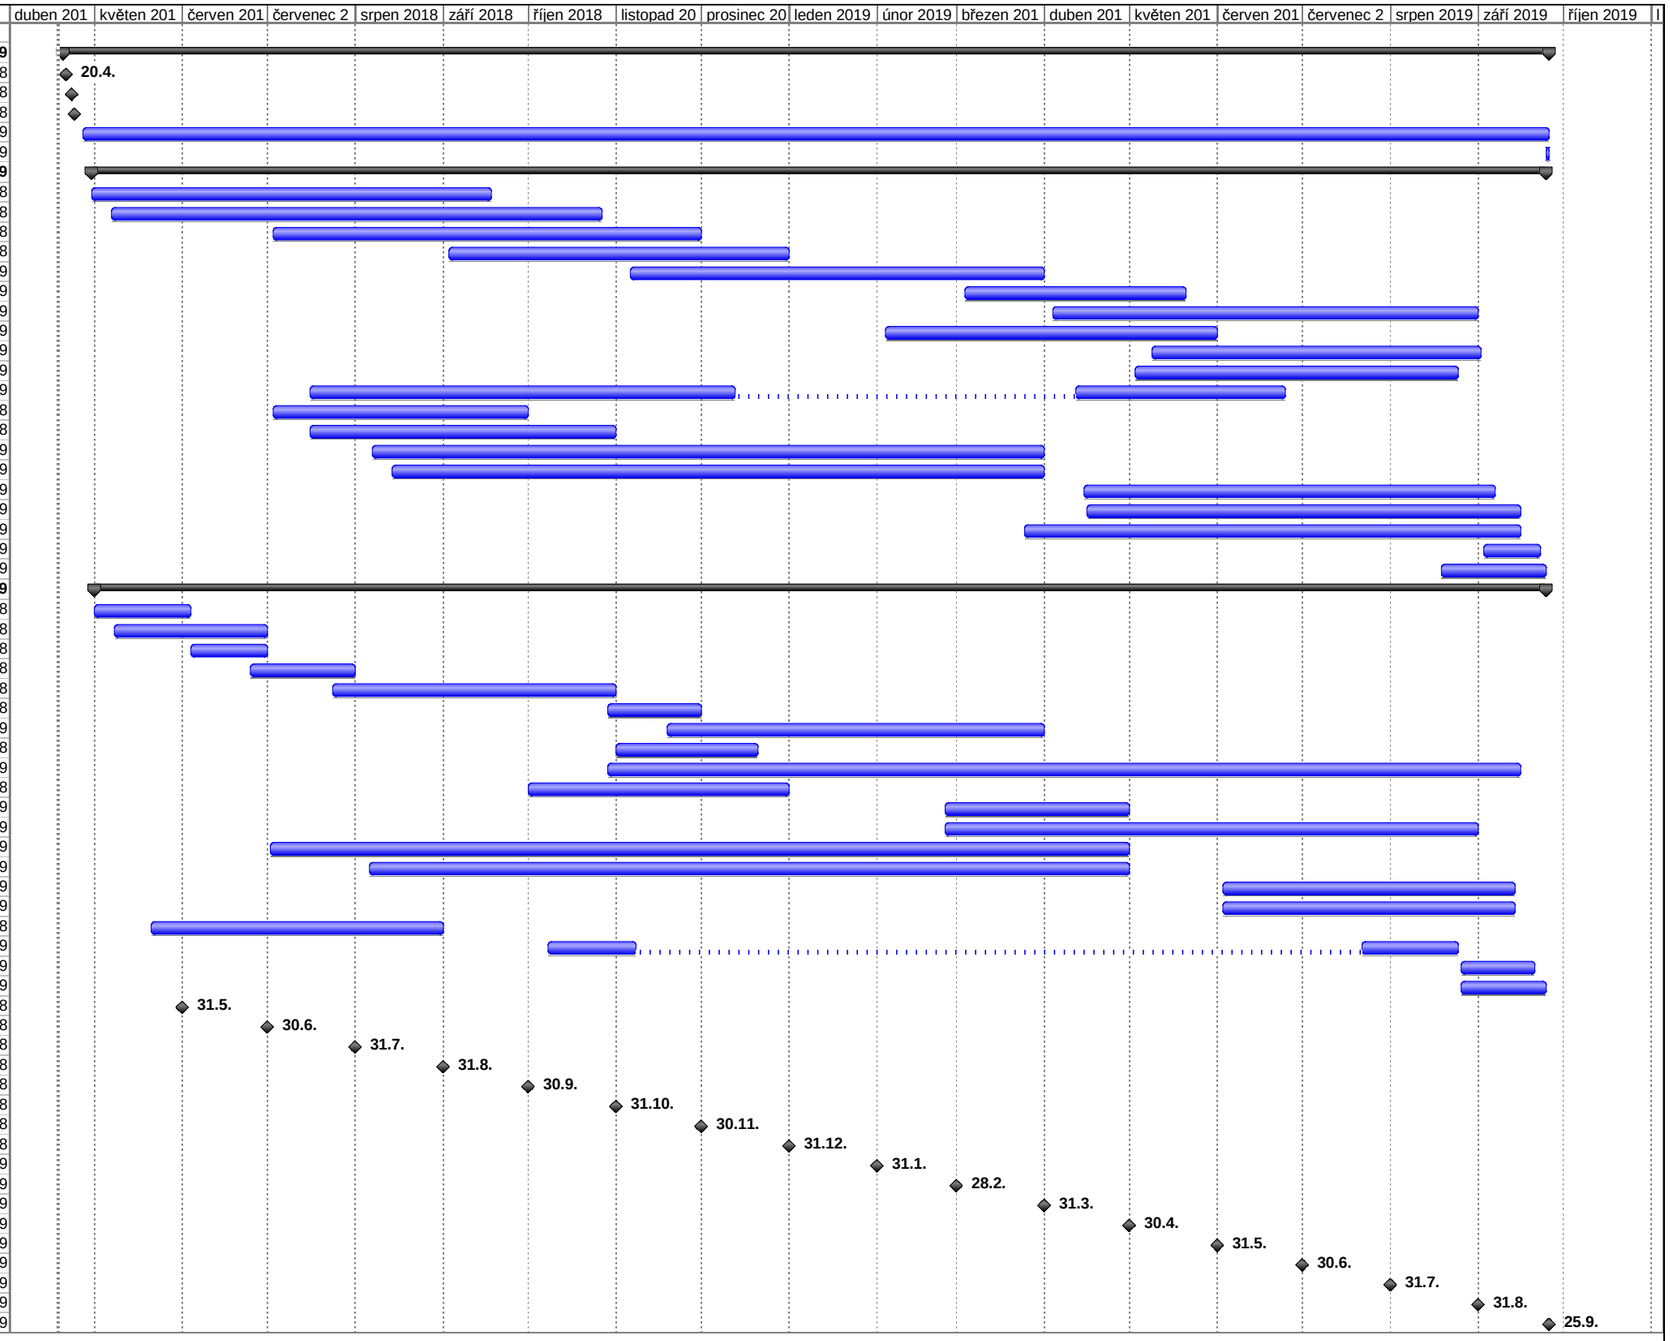

Projekt: VSPJ-výstavba výukového ce
Datum: 18.4. 18

Úkol | Průběh | Souhrnný | Vnější úkoly | Konečný termín
Rozdělení | Milník | Souhrn projektu | Vnější milník
