EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Doprava

Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní infrastruktury

SMLOUVA O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY

Název zakázky:
„Rekonstrukce železničního svršku a TV v km 17,200 – 18,000 trati Ústí nad Labem - Most“

Smluvní strany:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy

na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018

Korespondenční adresa:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: **E618-S-1557/2018/Svj**

ISPROFOND: 542 372 0016

a

EDIKT a.s.

se sídlem: Rudolfovská 461/95, 370 01 České Budějovice

IČO: 251 72 328, DIČ: CZ25172328

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích,

spisová značka B 904

bank.spojení: [redacted]

zastoupena: Pavlem Dolanským, předsedou představenstva

Korespondenční adresa: EDIKT a.s., Rudolfovská 461/95, 370 01 České Budějovice

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: **102/18 010/210**

uzavřely tuto smlouvu (dále jen „**Smlouva**") v souladu s ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**občanský zákoník**").

Objednatel si přeje, aby Dílo „Rekonstrukce železničního svršku a TV v km 17,200 – 18,000 trati Ústí nad Labem – Most" bylo provedeno Zhotovitelem, přijal Zhotovitelovu Nabídku na provedení a dokončení tohoto Díla a odstranění všech jeho vad, a proto se

Objednatel a **Zhotovitel** dohodli takto:

1. Platí, že následující dokumenty tvoří součást této Smlouvy o dílo (ve znění případných dodatků) a jako její součást musí být čteny a vykládány:

   a) Rozhodnutí a oznámení zadavatele o výběru dodavatele čj. 24493/2018 ze dne 11. 4. 2018
   b) Dopis nabídky datovaný 5. 3. 2018
   c) Smluvní podmínky [Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelem (FIDIC 1999)-Obecné podmínky; Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelem – Zvláštní podmínky pro stavby Správy železniční dopravní cesty, státní organizace č.j. 78/2017-910-IZD/1, Stavba: Rekonstrukce železničního svršku a TV v km 17,200 – 18,000
   d) trati Ústí nad Labem - Most
   e) Technická specifikace
   f) Výkresy a
   g) Formuláře:
      - Soupis prací,
      – Posuzovací protokol projektu stavby č.j. 23490/2017/SŽDC-SSZ-ÚT2-Ran ze dne 20.12.2017

2. Specifikace související dokumentace je uvedena ve Zvláštních technických podmínkách.

3. Za platby, které má Objednatel uhradit Zhotoviteli tak, jak je níže uvedeno, se Zhotovitel tímto zavazuje Objednateli, že provede a dokončí Dílo, včetně vypracování veškeré příslušné dokumentace související s Dílem a odstraní na něm všechny vady v souladu s ustanovením Smlouvy.

4. Objednatel se tímto zavazuje zaplatit Zhotoviteli za provedení a dokončení Díla a odstranění jeho vad Smluvní cenu v době a způsobem předepsaným ve Smlouvě.

5. V době podpisu této Smlouvy o dílo probíhá u Objednatele zavádění informačního systému na řízení a monitoring staveb v otevřeném datovém formátu XML. V této souvislosti se Strany dohodly na následujícím:

   5.1 Objednatel zašle Zhotoviteli do 7 dní po podpisu Smlouvy o dílo aktualizovaný Soupis prací v otevřeném datovém formátu XML, který bude mít strukturu dat dle datového předpisu XC4 (viz www.xc4.cz). Zhotovitel se zavazuje zaslat Objednateli do 14 dnů od obdržení tohoto Soupisu prací oceněný Soupis prací dle své Nabídky v listinné podobě a současně v elektronické podobě v otevřeném datovém formátu XML. Soupis prací v otevřeném formátu XML může Zhotovitel také vyplnit v modulu pro ocenění nabídkové ceny na zabezpečeném serveru https://www.xc4.cz/oceneni/. Zhotovitel odpovídá za shodu obsahu listinné a elektronické podoby oceněného Soupisu prací.

   5.2 Zhotovitel se zavazuje, že bude Objednateli předávat následující sestavy v otevřeném datovém formátu XML (viz datový předpis XC4, www.xc4.cz):
   - Faktura,

- souhrn fakturace,
- soupis zjišťovacích protokolů,
- zjišťovací protokoly.

6. Rekapitulace ceny je uvedena v příloze č. 1 této Smlouvy o dílo.

7. Strany se dohodly, že ujednání Pod-článku 14.6 (Vydání potvrzení průběžné platby) Zvláštních podmínek v části *„Dnem uskutečnění zdanitelného plnění se rozumí den odsouhlasení Vyúčtování. Daňový doklad k průběžné platbě lze vystavit až po odsouhlasení Vyúčtování."* a ujednání Pod-článku 14.11 (Žádost o potvrzení závěrečné platby) Zvláštních podmínek v části *„Dnem uskutečnění zdanitelného plnění se rozumí den odsouhlasení Závěrečného vyúčtování. Daňový doklad k závěrečné platbě lze vystavit až po odsouhlasení Závěrečného vyúčtování."* se nepoužije. Strany se dále dohodly, že za den uskutečnění zdanitelného plnění se považuje den vydání Potvrzení průběžné platby nebo den vydání Potvrzení závěrečné platby.

8. V případě Potvrzení průběžné platby nebo Potvrzení závěrečné platby, které je posledním Potvrzením průběžné platby nebo Potvrzením závěrečné platby před převzetí Díla, Sekce nebo jiné části Díla Objednatelem ve smyslu pod-článku 10.1 (Převzetí díla a sekcí) a Pod-článku 10.2 (Převzetí části díla) Zvláštních podmínek je Správce stavby povinen vydat Potvrzení průběžné platby nebo Potvrzení závěrečné platby nejpozději v den převzetí Díla, Sekce nebo části Díla Objednatelem.

9. Objednatel prohlašuje, že je ve vztahu k přijatým plněním v rozsahu předmětu Díla, týkajícího se výstavby, oprav a rekonstrukce železniční infrastruktury (zatříděných dle klasifikace produkce CZ-CPA pod kódy č. 41-43) na území České republiky, u nichž je mezi plátci v tuzemsku uplatňován režim přenesení daňové povinnosti dle § 92a zákona č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH"), osobou povinnou k dani dle § 5 odst. 1 zákona o DPH, neboť přijatá plnění použije pro svou ekonomickou činnost, a je tedy osobou povinnou přiznat a zaplatit DPH dle § 92 odst. 1 zákona o DPH.

10. Strany se dohodly, že stane-li se Zhotovitel nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a zákona o DPH, nebo daňový doklad Zhotovitele bude obsahovat číslo bankovního účtu, na který má být plněno, aniž by bylo uvedeno ve veřejném registru spolehlivých účtů vedeném správcem daně, je Objednatel oprávněn uhradit DPH z peněžního plnění přímo místně a věcně příslušnému správci daně Zhotovitele.

11. V případě jakékoliv nejistoty ohledně výkladu ustanovení Smlouvy budou její ustanovení vykládána tak, aby v co nejširší míře zohledňovala účel veřejné zakázky, vyjádřený Zadávací dokumentací.

12. Lhůty stanovené v odst 8.3.3 Všeobecných technických podmínek na realizaci a lhůty stanovené v pod-článku 7.9 Smluvních podmínek se nepoužijí a nahrazují se lhůtou 7 měsíců po dokončení konečného přejímacího řízení poslední Sekce, tj. do 7 měsíců ode dne podpisu posledního Potvrzení o převzetí části Díla.

13. Ukončením Smlouvy nejsou dotčena ustanovení Smlouvy ve znění dokumentů dle odst. 1 této Smlouvy o dílo a příloh dle odst. 19 této Smlouvy o dílo týkající se licencí, záruk, nároků z odpovědnosti za vady, nároky z odpovědnosti za škodu a nároky ze smluvních pokut, pokud vznikly před ukončením Smlouvy, ustanovení o ochraně informací, ani další ustanovení a nároky, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po ukončení účinnosti této Smlouvy.

14. Pokud by se kterékoliv ustanovení Smlouvy ukázalo být zdánlivým, neplatným nebo jinak nevymahatelným, nebo se jím stalo po uzavření této Smlouvy o dílo, pak tato skutečnost nepůsobí zdánlivosti, neplatnost ani nevymahatelnost ostatních ustanovení Smlouvy, nevyplývá-li z donucujících ustanovení Právních předpisů jinak. Strany se zavazují bez zbytečného odkladu po

výzvě kterékoliv Strany takové zdánlivé, neplatné či nevymahatelné ustanovení nahradit platným a vymahatelným ustanovením, které bude svým obsahem nejbližší účelu zdánlivého, neplatného či nevymahatelného ustanovení.

15. Objednatel si vyhrazuje možnost použít jednací řízení bez uveřejnění pro zajištění činnosti zahrnující následnou směrovou a výškovou úpravu koleje po uvedení do provozu včetně geodetického zaměření (dále též následná úprava GPK). Nebude-li jednací řízení bez uveřejnění ukončeno smluvním vztahem mezi Objednatelem a Zhotovitelem o zajištění činnosti zahrnující následnou směrovou a výškovou úpravu koleje, a Objednatel si tuto činnost bude muset zajistit jiným zhotovitelem, zavazuje se Zhotovitel projevit součinnost při následné úpravě GPK tak aby zůstala zachována záruka za jakost v Záruční době dle Pod-článku 11.1 Smluvních podmínek.
16. Změny závazků ze Smlouvy je možné měnit pouze písemnou dohodou Stran ve formě číslovaných dodatků této Smlouvy o dílo, podepsanou za každou Stranu osobou nebo osobami oprávněnými takový dodatek podepsat.
17. Neobsazeno.
18. Smlouva o dílo se vyhotovuje v sedmi vyhotoveních, z nich pět vyhotovení obdrží Objednatel a dvě vyhotovení Zhotovitel.
19. Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy o dílo:

Příloha č. 1	Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky
Příloha č. 2	Oprávněné osoby
Příloha č. 3	Seznam poddodavatelů
Příloha č. 4	Harmonogram postupu prací
Příloha č. 5	Zmocnění Vedoucího zhotovitele (Pro účely této Smlouvy o dílo se nepoužije)
Příloha č. 6	Žádost o poskytnutí zálohové platby

Na důkaz toho strany uzavírají tuto Smlouvu o dílo, která vstupuje v platnost dnem podpisu této Smlouvy o dílo oběma Stranami a účinnou se stává dnem uveřejnění v registru smluv.

V Praze dne - 4 -05- 2018

V Českých Budějovicích dne - 3 -05- 2018

Objednatel

Ing. Mojmír Nejezchleb

Zhotovitel
Pavel Dolanský
předseda představenstva EDIKT a.s.

stavba: Rekonstrukce železničního svršku v km 17,200 - 18,000 trati Ústí nad Labem - Most			Kontrolní součet [Kč] 108 149 981,00	Cena stavby [Kč] 108 149 981,00
Číslo objektu	Název objektu	Budoucí majitel	Cena objektu [Kč]	Cena typu objektů [Kč]
	Všeobecný objekt			[redacted]
SO 98-98	Všeobecný objekt	[redacted]	[redacted]	
	D.1 Železniční zabezpečovací zařízení			[redacted]
PS 10-10	Staniční zabezpečovací zařízení (SZZ)	[redacted]	[redacted]	
	D.3 Silnoproudá technoogie včetně DŘT			[redacted]
PS 30-30	Úprava trafostanice	[redacted]	[redacted]	
PS 30-31	Úprava DŘT	[redacted]	[redacted]	
	E.1.1 Železniční svršek a spodek			[redacted]
SO 10-10	Železniční svršek	[redacted]	[redacted]	
SO 10-11	Žel svršek - postradatelnost	[redacted]	[redacted]	
SO 11-10	Železniční spodek	[redacted]	[redacted]	
	E.1.4 Propustky, mosty, lávky a zdi			[redacted]
SO 10-40	Rekonstrukce mostu v kmk 17,705	[redacted]	[redacted]	
	E.3.1 Trakční vedení			[redacted]
SO 30 10	Trakční vedení	[redacted]	[redacted]	
	E.3.6 Rozvody vn, nn, osvětelní a dálkové ovládání odpojovačů			[redacted]
SO 30-60	Rozvody vn, nn, osvětlení a DOÚO	[redacted]	[redacted]	
	E.3.7 Ukolejnění kovových konstrukcí			[redacted]
SO 30-70	Ukolejnění vodivých konstrukcí	[redacted]	[redacted]	
	E.3.9 Ostatní kabelizace			[redacted]
SO 10-50	Přeložka sdělovacích kabelů ČD-T	[redacted]	[redacted]	
SO 10-51	Přeložky sdělovacích kabelů ČEZ,ICT	[redacted]	[redacted]	
	Dělení majetku:			
SŽDC	Budoucí majitel SŽDC [Kč]		[redacted]	
OSTATNÍ	Budoucí majitel OSTATNÍ [Kč]		[redacted]	
	Kontrolní součet [Kč]		108 149 981,00	

Příloha č. 2
Oprávněné osoby

1) Oprávněné osoby Objednatele:

- ve věcech smluvních mimo podpisu Smlouvy a jejích případných dodatků:

Jméno a příjmení	[redacted]
E-mail	[redacted]
Telefon	[redacted]
Fax	----------

- ve věcech technických:

Jméno a příjmení	[redacted]
E-mail	[redacted]
Telefon	[redacted]
Fax	----------

- správce stavby:

Jméno a příjmení	[redacted]
E-mail	[redacted]
Telefon	[redacted]
Fax	---------

- technický dozor stavebníka (TDS) – specialista na mosty:

Jméno a příjmení	[redacted]
E-mail	[redacted]
Telefon	[redacted]
Fax	---------

- technický dozor stavebníka (TDS) – specialista na železniční svršek a spodek:

Jméno a příjmení	[redacted]
E-mail	[redacted]
Telefon	[redacted]
Fax	---------

- technický dozor stavebníka (TDS) – specialista na sdělovací a zabezpečovací zařízení:

Jméno a příjmení	[redacted]
E-mail	[redacted]
Telefon	[redacted]

Fax	--------

- technický dozor stavebníka (TDS) – specialista na trakční vedení a silnoproud:

Jméno a příjmení	[redacted]
E-mail	[redacted]
Telefon	[redacted]
Fax	

- ve věcech geodetických:

Jméno a příjmení	[redacted]
E-mail	[redacted]
Telefon	[redacted]
Fax	

- osoba odpovědná za bezpečnost a ochranu zdraví při práci:

Jméno a příjmení	[redacted]
E-mail	[redacted]
Telefon	[redacted]
Fax	

2) Oprávněné osoby Zhotovitele

- ve věcech smluvních a obchodních:

Jméno a příjmení	**Pavel Dolanský**
Adresa	**Rudolfovská 461/95, 370 01 České Budějovice**
E-mail	[redacted]
Telefon	[redacted]
Fax	[redacted]

- ve věcech smluvních a obchodních:

Jméno a příjmení	[redacted]
Adresa	**Rudolfovská 461/95, 370 01 České Budějovice**
E-mail	[redacted]
Telefon	[redacted]
Fax	[redacted]

- ve věcech smluvních a obchodních:

Jméno a příjmení	[redacted]
Adresa	**Rudolfovská 461/95, 370 01 České Budějovice**
E-mail	[redacted]
Telefon	[redacted]
Fax	[redacted]

- ve věcech technických:

Jméno a příjmení	[redacted]
Adresa	**Rudolfovská 461/95, 370 01 České Budějovice**
E-mail	[redacted]
Telefon	[redacted]
Fax	[redacted]

- stavbyvedoucí:

Jméno a příjmení	[redacted]
Adresa	**Rudolfovská 461/95, 370 01 České Budějovice**
E-mail	[redacted]
Telefon	[redacted]
Fax	[redacted]

- zástupce stavbyvedoucího:

Jméno a příjmení	[redacted]
Adresa	**Rudolfovská 461/95, 370 01 České Budějovice**
E-mail	[redacted]
Telefon	[redacted]
Fax	[redacted]

- specialista (vedoucí prací) na železniční svršek a spodek:

Jméno a příjmení	[redacted]
Adresa	**Rudolfovská 461/95, 370 01 České Budějovice**
E-mail	[redacted]
Telefon	[redacted]
Fax	[redacted]

- specialista (vedoucí prací) na mosty a inženýrské konstrukce:

Jméno a příjmení	[redacted]
Adresa	**Rudolfovská 461/95, 370 01 České Budějovice**
E-mail	[redacted]
Telefon	[redacted]
Fax	[redacted]

- specialista (vedoucí prací) na sdělovací a zabezpečovací zařízení:

Jméno a příjmení	[redacted]
Adresa	[redacted]
E-mail	[redacted]
Telefon	[redacted]
Fax	[redacted]

- specialista (vedoucí prací) na trakční vedení a silnoproud:

Jméno a příjmení	[redacted]
Adresa	[redacted]
E-mail	[redacted]
Telefon	[redacted]
Fax	[redacted]

- specialista (vedoucí prací) na geotechniku:

Jméno a příjmení	[redacted]
Adresa	[redacted]
E-mail	[redacted]
Telefon	[redacted]
Fax	

- osoba odpovědná za kontrolu kvality:

Jméno a příjmení	[redacted]
Adresa	**Rudolfovská 461/95, 370 01 České Budějovice**
E-mail	[redacted]
Telefon	[redacted]
Fax	[redacted]

- osoba odpovědná za bezpečnost a ochranu zdraví při práci:

Jméno a příjmení	[redacted]
Adresa	**Rudolfovská 461/95, 370 01 České Budějovice**
E-mail	[redacted]
Telefon	[redacted]
Fax	[redacted]

- osoba odpovědná za ochranu životního prostředí:

Jméno a příjmení	[redacted]
Adresa	**Rudolfovská 461/95, 370 01 České Budějovice**
E-mail	[redacted]
Telefon	[redacted]
Fax	[redacted]

- osoba odpovědná za odpadové hospodářství:

Jméno a příjmení	[redacted]
Adresa	**Rudolfovská 461/95, 370 01 České Budějovice**
E-mail	[redacted]
Telefon	[redacted]
Fax	[redacted]

- úředně oprávněný zeměměřický inženýr:

Jméno a příjmení	[redacted]
Adresa	[redacted]
E-mail	[redacted]
Telefon	[redacted]
Fax	

- osoba odpovědná za projektovou dokumentaci zabezpečovacího zařízení:

Jméno a příjmení	[redacted]
Adresa	[redacted]
E-mail	[redacted]
Telefon	[redacted]
Fax	[redacted]

Příloha č. 3

Seznam poddodavatelů

Identifikace poddodavatele (obchodní firma, sídlo a IČO)	Věcný rozsah poddodávky	Hodnota poddodávky v % ze Smluvní ceny díla
FOXGeo s.r.o., Poděbradská 186/56, 198 00 Praha 9, IČ 050 90 709	**Geodetické práce**	1,3
EPLcond a.s., Purkyňova 2873/19a, 301 00 Plzeň IČ 263 46 575	**Elektrotechnické práce, práce na projektu zabezpečovacího zařízení**	3,6
Marius Pedersen a.s., Průběžná 1940/3, 500 09 Hradec Králové IČ 421 94 920	**Likvidace nebezpečných odpadů**	0,4
ELEKTRIZACE ŽELEZNIC PRAHA a.s. Nusle, nám. Hrdinů 1693/4a 140 00 Praha 4 IČ 471 15 921	**Elektrotechnické práce**	23,8

Příloha č. 4

Harmonogram postupu prací

AKCE: Rekonstrukce železničního svršku v km 17,200 - 18,000 trati Ústí nad Labem - Most

EDIKT

HARMONOGRAM

HARMONOGRAM / ETAPY / POPIS PRACÍ	TYP VÝLUK	DOBA TRVÁNÍ
ZAHÁJENÍ STAVBY	-	05/2018
PŘÍPRAVNÉ PRÁCE	bez "N" výluk	05-06/2018
0. ETAPA	3N - TV	05 -06/2018
1.ETAPA_1TK	75N	8. 6-21.8.2018
snesení kolejí a výhybek		
most km 17,705		
těžění KL		
odtěžení žel. spodku		
odvodnění		
konstrukční vrstvy žel. spodku		
předštěrkování		
pokládka kolejí a výhybek		
úprava GPK		
doplnění štěrků		
svařování a zřízení BK		
práce na TV		
práce na zabezpeč. zařízení		
dokončovací práce		
1.ETAPA (1.TK směr Krupka-Bohoudov)	17N	5.-21.8.2018
snesení kolejí a výhbky č.1		
odtěžení KL		
zřízení žel. spodku		
předštěrkování		
pokládka kolejí a výhybek č.1,5,6		
úprava GPK		
doplnění KL		
svařování a zřízení BK		
práce na TV		
práce na zabezpeč. zařízení		
dokončovací práce		
Všeobecný objekt		
2.ETAPA_2.TK	70N	22.8-30.10.2018
2.ETAPA (2.TK směr Krupka-Bohoudov)	30N	22.8-20.9.2018
snesení kolejí a výhybek		
most km 17,705		
těžění KL		
odtěžení žel. spodku		
odvodnění		
konstrukční vrstvy žel. spodku		
předštěrkování		
pokládka kolejí a výhybek		
úprava GPK		
doplnění štěrků		
svařování a zřízení BK		
práce na TV		
práce na zabezpeč. zařízení		
dokončovací práce		
žel. práce na mostě v km 17,705		
práce na žel. spodku		
předštěrkování		
pokládka kolejí na mostě v km 17,705		
úprava GPK		
doplnění štěrků		
svařování a zřízení BK		
práce na TV		
práce na zabezpeč. zařízení		
dokončovací práce		
DOKONČOVACÍ PRÁCE	bez "N" výluk (20 dní)	11/2018
Všeobecný objekt		
UKONČENÍ STAVBY	-	15 měsíců od zahájení SP

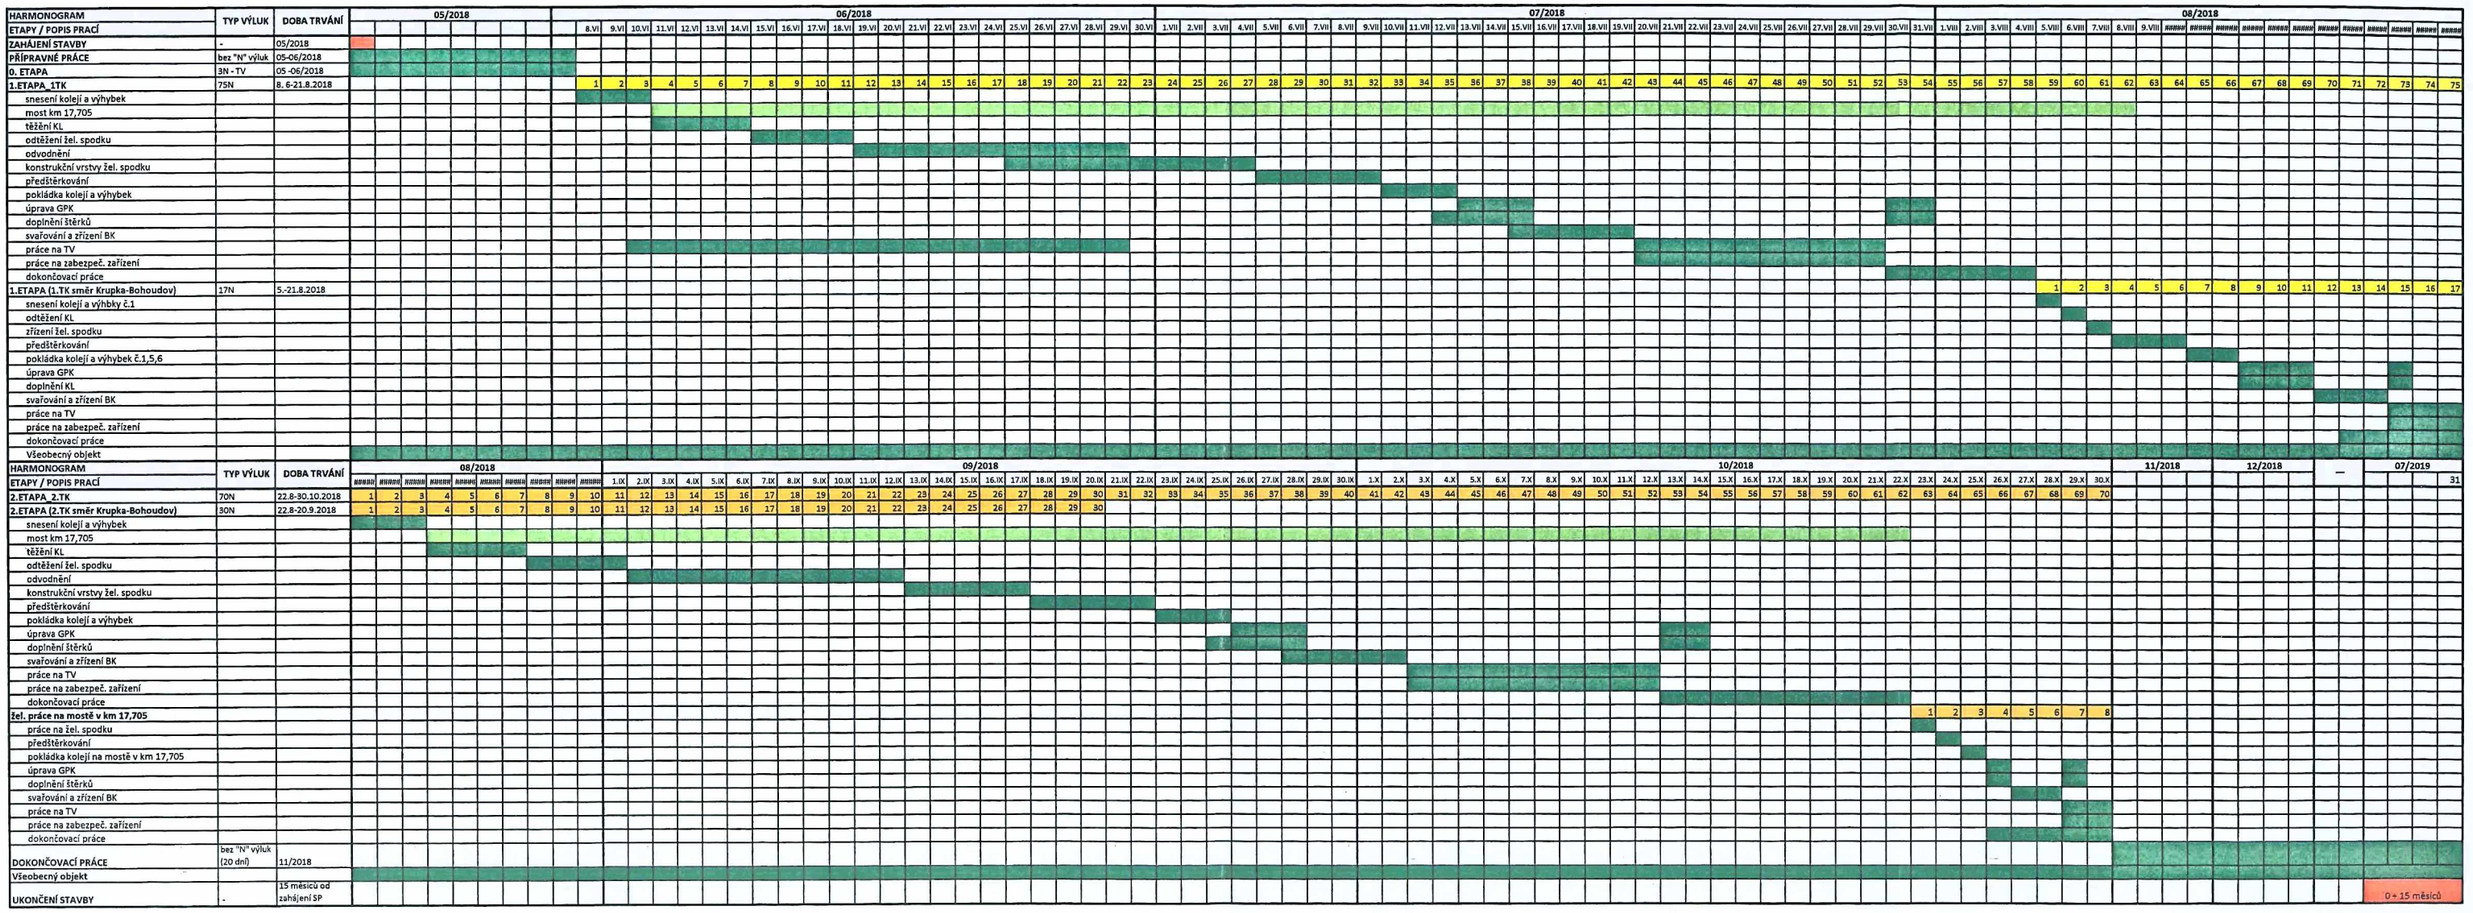

AKCE: Rekonstrukce železničního svršku v km 17,200 - 18,000 trati Ústí nad Labem - Most

FINANČNÍ HARMONOGRAM

SO/PS	POPIS	05/2018	06/2018	07/2018	08/2018	09/2018	10/2018	11/2018	12/2018	ROK 2019 01/2019	02/2019	03/2019	04/2019	05/2019	06/2019	07/2019	CENA CELKEM SO/PS
SO 98-98	Všeobecný objekt																
PS 10-10	Staniční zabezpečovací zařízení (SZZ)																
PS 30-30	Úprava trafostanice																
PS 30-31	Úprava DŘT																
SO 10-10	Železniční svršek																
SO 10-11	Žel svršek - postradatelnost																
SO 11-10	Železniční spodek																
SO 10-40	Rekonstrukce mostu v kmk 17,705																
SO 30 10	Trakční vedení																
SO 30-60	Rozvody vn, nn, osvětlení a DOÚO																
SO 30-70	Ukolejnění vodivých konstrukcí																
SO 10-50	Přeložka sdělovacích kabelů ČD-T																
SO 10-51	Přeložky sdělovacích kabelů ČEZ,ICT																
	CENA [kč bez DPH] / měsíc																
	CENA [kč bez DPH] / rok																
	CENA [kč bez DPH] / AKCE																

Příloha č. 5

Zmocnění Vedoucího zhotovitele
(Pro účely této Smlouvy o dílo se nepoužije)

Příloha č. 6

Žádost o poskytnutí zálohové platby

V souladu s ustanovením pod-článku 14.2 Smluvních podmínek ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby „Rekonstrukce železničního svršku a TV v km 17,200 – 18,000 trati Ústí nad Labem – Most" žádáme o poskytnutí **zálohové platby na finanční plnění** výši: VLOŽÍ ZHOTOVITEL Kč.

Záloha bude využita na pokrytí nákladů stavebních prací a dodávek materiálů v Souladu s výše uvedenou Smlouvou o dílo v období: **MM/RR – MM/RR** VYPLNÍ ZHOTOVITEL včetně.

Součástí této žádosti je:

- aktuální správcem stavby písemně potvrzený finanční harmonogram stavby (smluvní hodnota prací předpokládaných k realizaci pro příslušný kalendářní rok dle podrobného Harmonogramu Pod-článek 8.3 Smluvních podmínek), do kterého je v souladu s výše uvedenými údaji promítnuto plánované využití zálohové faktury na krytí nákladů Díla, zajišťující vypořádání zálohové faktury v předepsaném období, které musí korespondovat s věcným plněním Díla.
- zálohová faktura č.....VYPLNÍ ZHOTOVITEL

V ..... dne .....

.....

Zhotovitel

Ověřovací doložka transformace komponenty

Ověřuji pod pořadovým číslem **56813**, že tato komponenta je konverzí původní komponenty do PDF/A.

UUID původní komponenty: f5c43ae5-efd6-4fa5-a863-c635b6193f3d

Ověřující osoba: **Systém**

Vystavil: **Správa železniční dopravní cesty, státní organizace**

Datum: **10.05.2018 07:50:01**
