Časový plán výstavby - Harmonogram postupu prací

Dílčí rekonstrukce třídírny v Terminálu 2 - platný k (14.2.2018)
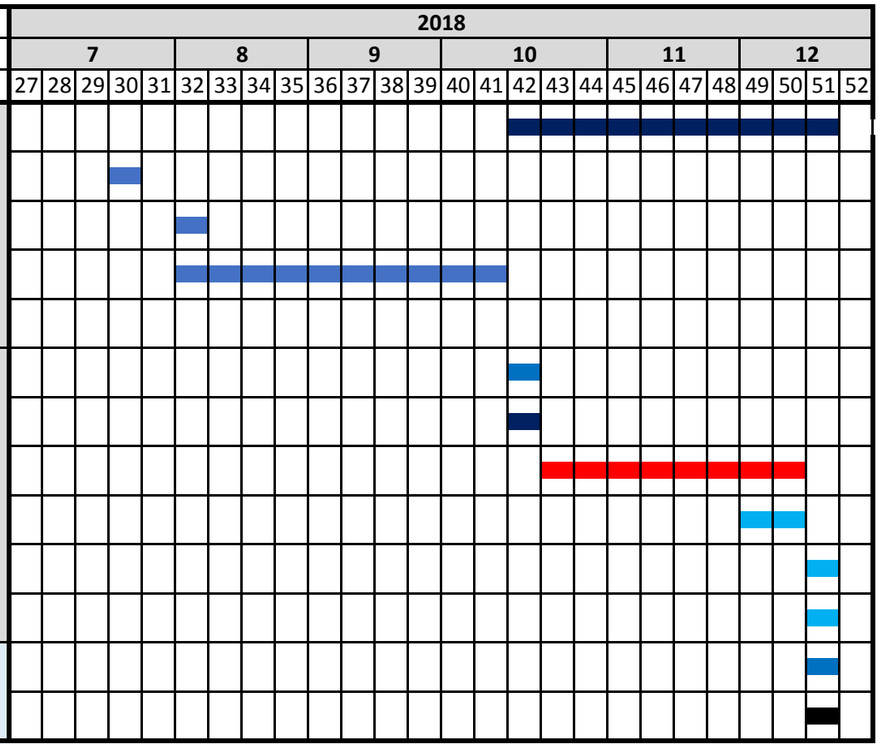
P.č.	Etapa	Položka	Začátek	Konec	Délka trvání
0.	E0	Dočasný zábor pro uskladnění techniky a materiálu	15.10.2018	21.12.2018	68 dní
1.		Podpis SoD	23.7.2018	23.7.2018	1 den
2.1.		DPS, včetně připomínek OJ	1.8.2018	7.8.2018	7 dní
2.2.		Výroba komponent / nákup technologie	1.8.2018	14.10.2018	74 dní
2.3.		Předání staveniště zhotoviteli	14.10.2018	14.10.2018	1 den
2.5.	E2	**OPRAVA SORTERU - REALIZACE**	15.10.2018	21.12.2018	68 dní
2.5.1.		Demontáže	15.10.2018	22.10.2018	8 dní
2.5.2.		Instalace mechanická část	22.10.2018	15.12.2018	55 dní
2.5.3.		Instalace elektrická část	1.12.2018	15.12.2018	15 dní
2.5.4.		Testy, uvedení do provozu	15.12.2018	19.12.2018	5 dní
2.5.5.		Předání díla Objednateli	21.12.2018	21.12.2018	1 den
70.		Demontáže záborů úklid staveniště	20.12.2018	20.12.2018	1 den
71.		Předání celého díla	21.12.2018	21.12.2018	1 den
