Příloha č. 1

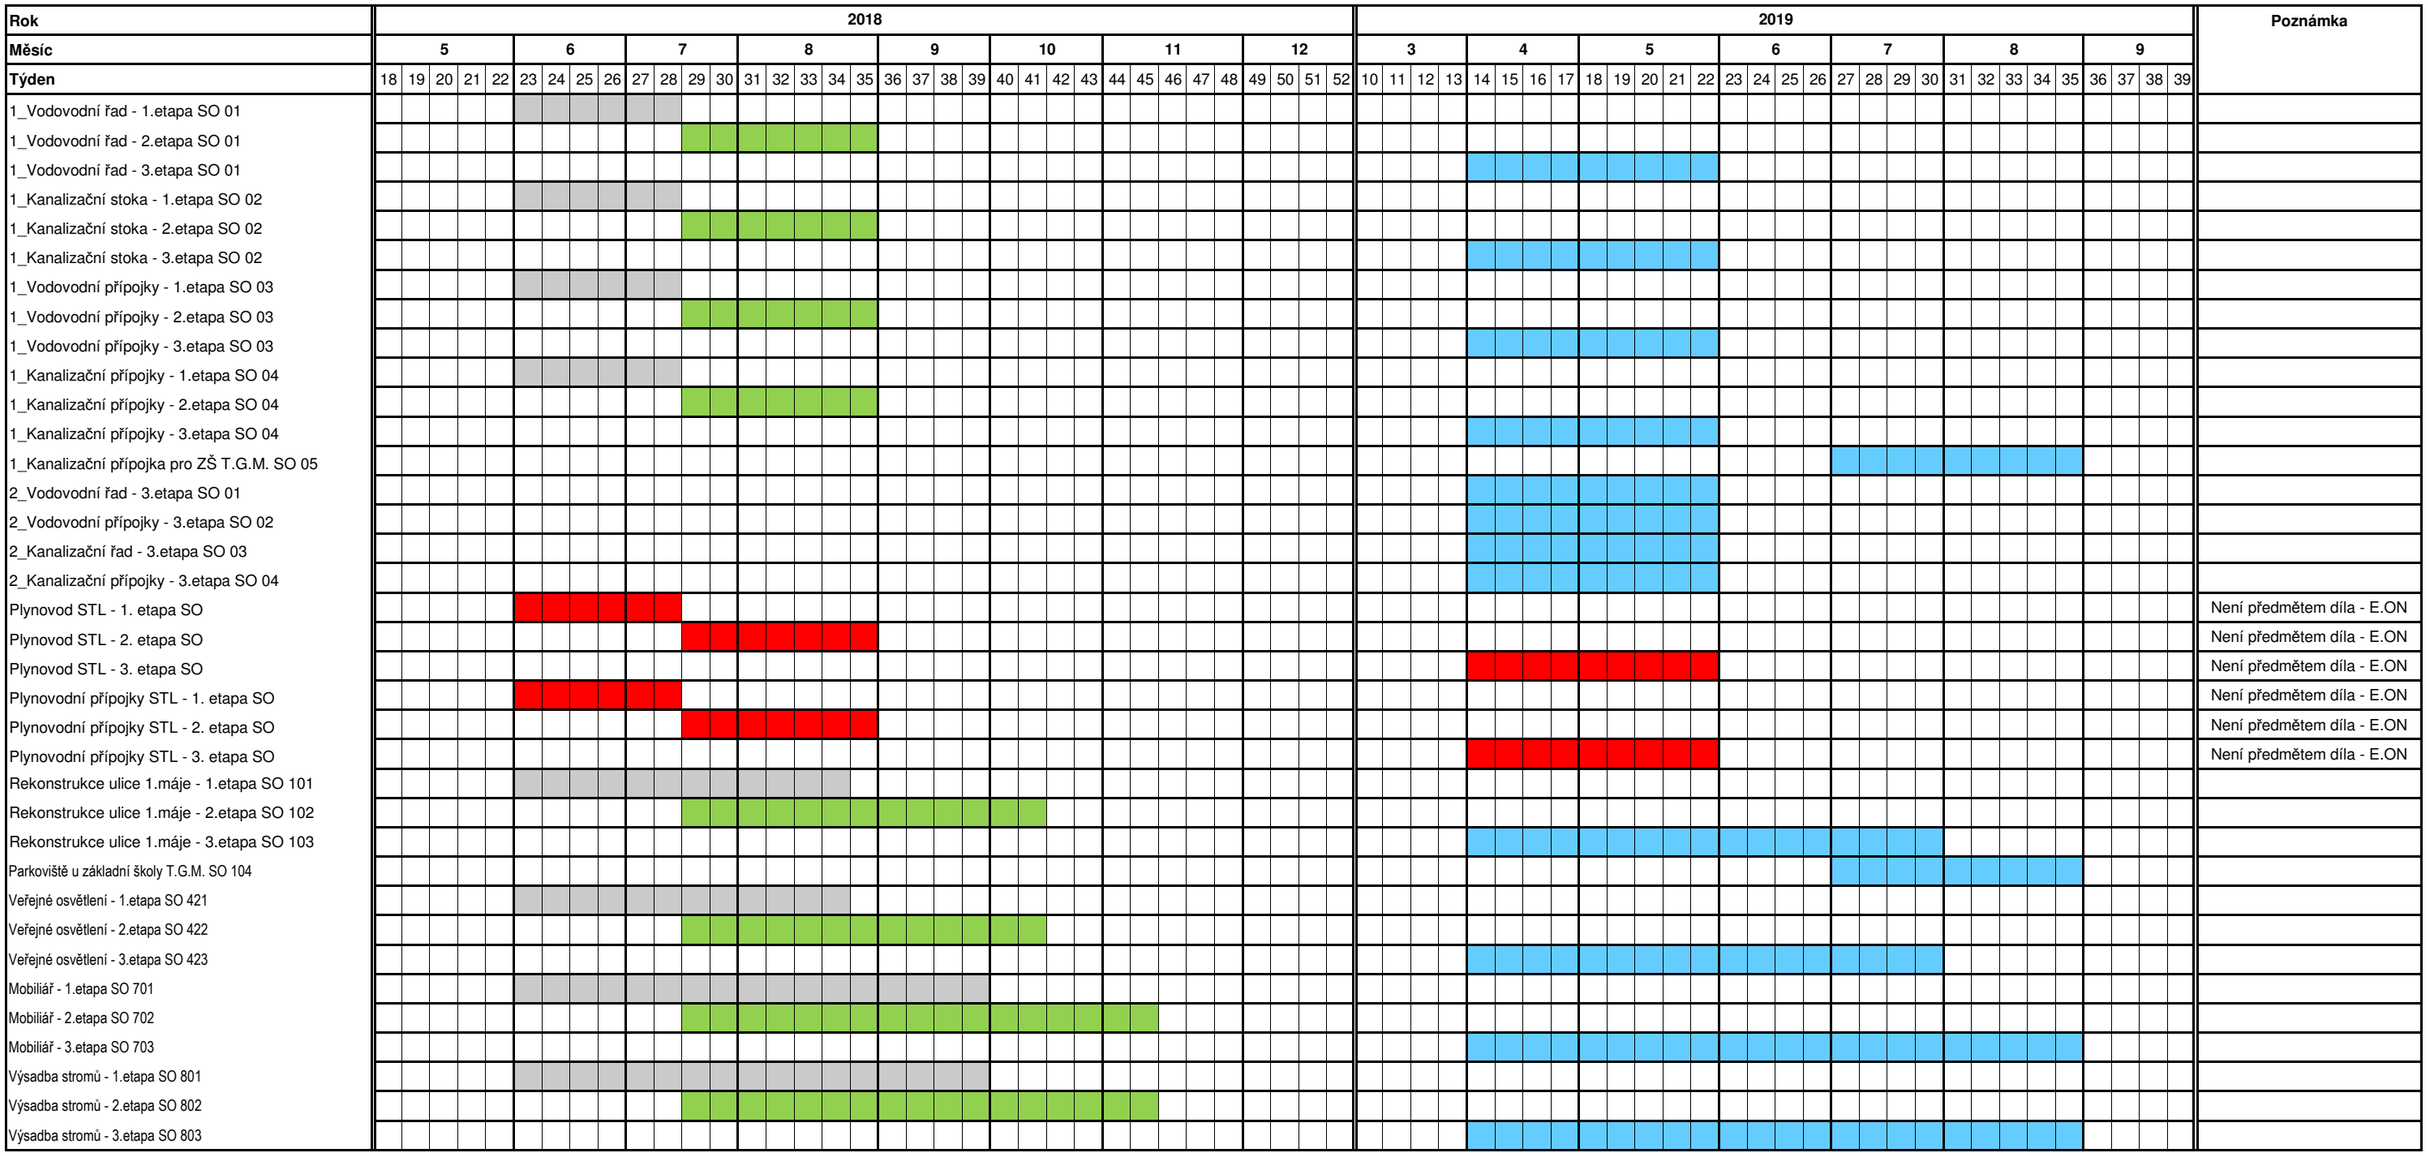
Rok
2018
2019
Poznámka
Měsíc
5 6 7 8 9 10 11 12
3 4 5 6 7 8 9
Týden
18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
1_Vodovodní řad - 1.etapa SO 01
1_Vodovodní řad - 2.etapa SO 01
1_Vodovodní řad - 3.etapa SO 01
1_Kanalizační stoka - 1.etapa SO 02
1_Kanalizační stoka - 2.etapa SO 02
1_Kanalizační stoka - 3.etapa SO 02
1_Vodovodní přípojky - 1.etapa SO 03
1_Vodovodní přípojky - 2.etapa SO 03
1_Vodovodní přípojky - 3.etapa SO 03
1_Kanalizační přípojky - 1.etapa SO 04
1_Kanalizační přípojky - 2.etapa SO 04
1_Kanalizační přípojky - 3.etapa SO 04
1_Kanalizační přípojka pro ZŠ T.G.M. SO 05
2_Vodovodní řad - 3.etapa SO 01
2_Vodovodní přípojky - 3.etapa SO 02
2_Kanalizační řad - 3.etapa SO 03
2_Kanalizační přípojky - 3.etapa SO 04
Plynovod STL - 1. etapa SO
Není předmětem díla - E.ON
Plynovod STL - 2. etapa SO
Není předmětem díla - E.ON
Plynovod STL - 3. etapa SO
Není předmětem díla - E.ON
Plynovodní přípojky STL - 1. etapa SO
Není předmětem díla - E.ON
Plynovodní přípojky STL - 2. etapa SO
Není předmětem díla - E.ON
Plynovodní přípojky STL - 3. etapa SO
Není předmětem díla - E.ON
Rekonstrukce ulice 1.máje - 1.etapa SO 101
Rekonstrukce ulice 1.máje - 2.etapa SO 102
Rekonstrukce ulice 1.máje - 3.etapa SO 103
Parkoviště u základní školy T.G.M. SO 104
Veřejné osvětlení - 1.etapa SO 421
Veřejné osvětlení - 2.etapa SO 422
Veřejné osvětlení - 3.etapa SO 423
Mobiliář - 1.etapa SO 701
Mobiliář - 2.etapa SO 702
Mobiliář - 3.etapa SO 703
Výsadba stromů - 1.etapa SO 801
Výsadba stromů - 2.etapa SO 802
Výsadba stromů - 3.etapa SO 803
