Harmonogram postupu stavby

Stavba: **Výstavba areálu ÚO Chrudim - KŘP Pardubického kraje - Realizace strukturované kabeláže, bezpečnostních systémů**

Stavení objekt, činnost / měsíc, týden	1				2				3				4				5				6				7				8				9			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
převzetí a zařízení staveniště																																				
SO 14 - PŘÍPOJKY SLABOPROUDU																																				
Metalická a optická přípojka na SEK																																				
Ochrana stávajícího vedení SEK																																				
Přípojka na metropolitní opickou síť																																				
Mikrovlnný spoj																																				
Příprava pro přípojku ČD Telematika																																				
Příprava pro optické areálové rozvody																																				
SO 02 - ADMINISTRATIVNÍ OBJEKT - A, B, C																																				
Kabelové trasy a rozvody																																				
Pasivní koncové prvky a zařízení																																				
Aktivní koncové prvky a zařízení																																				
SO 03 - MYTÍ VOZIDEL - D																																				
Kabelové trasy a rozvody																																				
Pasivní koncové prvky a zařízení																																				
Aktivní koncové prvky a zařízení																																				
SO 04 - TECHNICKÁ OŠETŘOVNA VOZIDEL - E																																				
Kabelové trasy a rozvody																																				
Pasivní koncové prvky a zařízení																																				
Aktivní koncové prvky a zařízení																																				
SO 05 - OBJEKT KYNOLOGIE - F																																				
Kabelové trasy a rozvody																																				
Pasivní koncové prvky a zařízení																																				
Aktivní koncové prvky a zařízení																																				
Hrubé instalace																																				
Kompletace																																				
Oživení, nastavení, revize																																				
Zaškolení obsluhy																																				
Předání díla objednateli																																				
Měsíční fakturace bez DPH	400 000,00				632 000,00				500 000,00				500 000,00				500 000,00				500 000,00				700 000,00				700 000,00				700 000,00			

ů a ICT vybavení

10				11				12				13				14				15				16				17				18				19				20				21		
37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83
700 000,00				955 000,00				955 000,00				955 000,00				955 000,00				1 460 000,00				1 460 000,00				1 460 000,00				1 460 000,00				3 745 000,00				3 745 000,00				4 245 000,0		

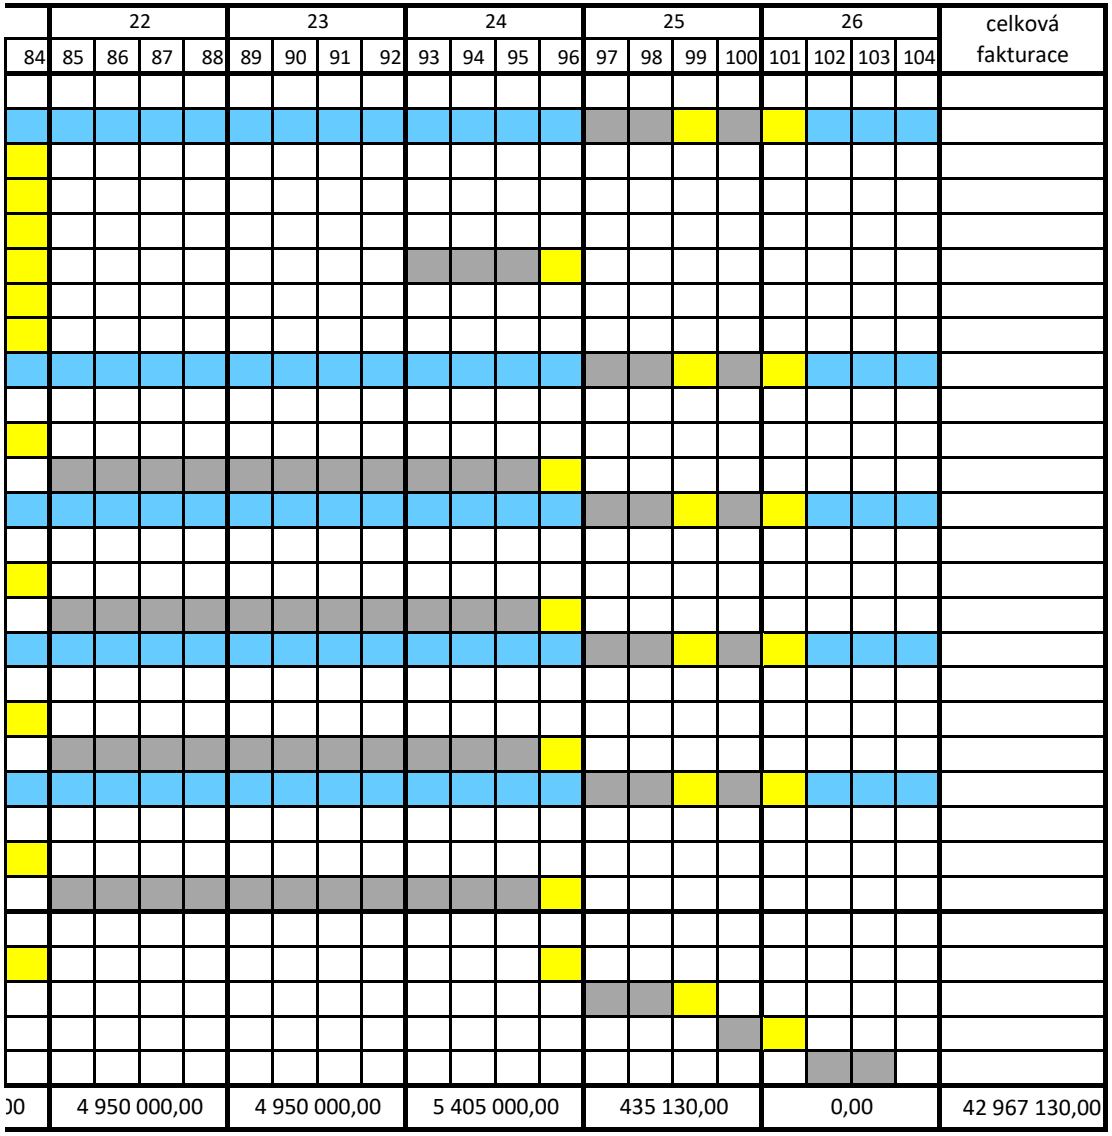
22
23
24
25
26
celková fakturace
84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104
00
4 950 000,00
4 950 000,00
5 405 000,00
435 130,00
0,00
42 967 130,00
