LANEX Olomouc s.r.o.	Tiskopis	Strana : 1/1
	Harmonogram stavebních prací	Zpracoval: [redacted]
		Datum : 29.8.2018

Elektronický podpis - 23.11.2018
Certifikát autora podpisu :
Jméno : Ing. Jakub Jirgl
Vydal : PostSignum Qualified C...
Platnost do : 8.11.2019

Název akce :

Energetické úspory budovy jídelny ZŠ Vrchlického

ROK 2019

časový plán úkolů, termín splnění úkolů

čís.	popis úkolu		týden plán	týden skut.
1.	Převzetí staveniště - zahájení prací		3.6. 2019	
2.	Výměna výplní otvorů - přesný HMG bude doplněn		24.6.	
3.	Rekonstrukce elektroinstalace a slaboproudé rozvody		24.6.	
4.	Rekonstrukce střechy			
5.	Zateplení obvodového pláště			
6.	Zateplení podlah podkroví			
7.	Zateplení stropu 1.PP			
8.	Stavební práce, úklid staveniště			
9.	Předání díla dle SoD - ukončení prací		24.9. 2019	

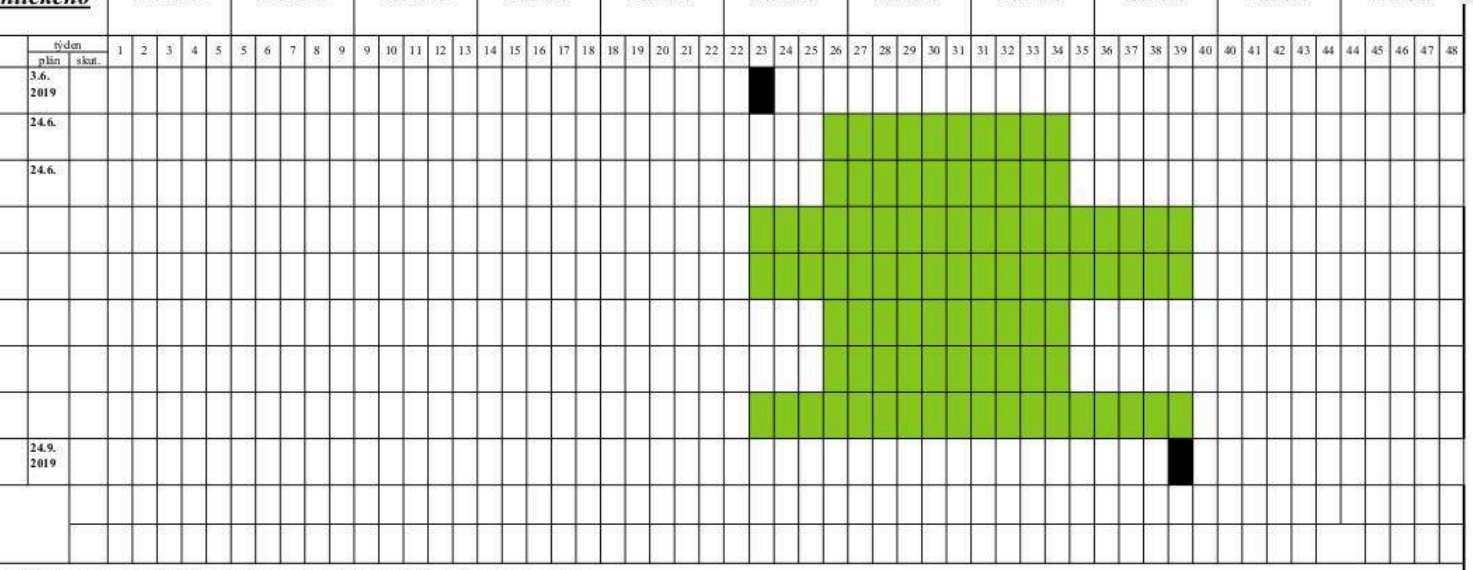

Jednotlivé úseky budou realizovány po předem avizovaných částech, nikoli jako celek po celou dobu plnění dle harmonogramu.
V případě uspíšení prací a potřeby zahájit další etapu bude investor v dostatečném časovém předstihu informován a upozorněn.

Legenda:

- jednou naplánovaná událost
- 2 znovu naplánovaná událost
- číslo udává pořadí změny
- dokončená událost
- doba trvání mezi plánovanými událostmi
- postup v čase
- pokračující činnost
- pokračující činnost
- předpokládaný skluz
- skutečný skluz

Vypracoval:
Pavel Sojka
vedoucí výroby

Poznámka: Termíny uvedené v harmonogramu jsou orientační a závislé na vhodných klimatických podmínkách a vyřízení písemných formalit (např podpis SoD, atd.).

[redacted]

Příloha č.2
