



MHMPXP9LVD8K

Stejnopis č. 1

SMLOUVA O DÍLO

k provedení stavby č.. 42812 Celková přestavba Císařského ostrova,
etapa 0001 - Likvidace starých zátěží, Odvoz zeminy

číslo smlouvy objednatele: DIL/22/04/000434/2018

číslo smlouvy zhotovitele:

uzavřená podle ustanovení §§ 2586-2635 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“), níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi:

1. Hlavní město Praha

se sídlem: Mariánské náměstí 2, 110 01 Praha 1
IČO: 00064581,
DIČ: CZ 00064581, registr. dle §94 zák. č. 235/2004 Sb. v platném znění
bankovní spojení: [REDACTED]
číslo účtu: [REDACTED]
zastoupeno: Ing. Karlem Prajerem, ředitelem odboru strategických investic Magistrátu hlavního města Prahy

(dále jen „Objednatel“)

a

2. CETUS PLUS, a.s.

se sídlem: Plzeňská 183/181, 150 00 Praha 5
IČO: 26419823
DIČ: CZ 264 19 823
zapsána: v obchodním rejstříku vedeném Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 6931
bankovní spojení: [REDACTED]
číslo účtu: [REDACTED]
zastoupen: Karlem Muzikou, statutárním ředitelem

(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále též „Smluvní strany“ nebo jednotlivě „Smluvní strana“)

Závazné podklady pro uzavření smlouvy

1. Závaznými podklady pro uzavření této smlouvy (dále jen „Závazné podklady“) se rozumí:
Nabídka Zhotovitele ze dne 4.10.2018 pod č.j. MHMP 1550043/2018
Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky OSI/MZ/0053/18 ze dne 5.10.2018 pod č.j. MHMP 1567402/2018

Projektová dokumentace z 6/2018

2. Zhotovitel podpisem této Smlouvy potvrzuje, že převzal od Objednatele všechny výše uvedené Závazné poklady, že se seznámil s jejich obsahem a že vůči obsahu a podobě těchto podkladů nemá žádné výhrady.

I.

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O STAVBĚ

Číslo stavby: **42812**

Název stavby: **Celková přestavba Císařského ostrova, etapa 0001 - Likvidace starých zátěží, Odvoz zeminy**

II.

PŘEDMĚT SMLOUVY O DÍLO

1. Zhotovitel se zavazuje na svůj náklad, odpovědnost a nebezpečí řádně a včas provést Dílo spočívající v odvozu zeminy v rámci stavby č. 42812 Celková přestavba Císařského ostrova, etapa 0001 - Likvidace starých zátěží a poskytnutí veškerých s tím souvisejících činností, tj. zejména i provedení takových prací, které nejsou ve Smlouvě o Dílo výslovně uvedeny, avšak jejichž provedení Zhotovitelem je nezbytné pro dosažení účelu Smlouvy o Dílo. Účelem smlouvy je řádné dokončení Díla. Zhotovitel se zavazuje řádně dokončené Dílo předat Objednateli ve lhůtě dohodnuté ve Smlouvě o Dílo bez vad.
2. Dílo bude provedeno v souladu s projektovou dokumentací, pravomocným ohlášením stavby, právními a technickými požadavky platnými v době podpisu smlouvy, se stavebním zák. č. 183/2006 Sb., v platném znění a předpisy souvisejícími a v rozsahu stanoveném v zadávací dokumentaci zadávacího řízení.
3. Zhotovitel zhotoví dílo svým jménem a na vlastní odpovědnost. Provedením části díla, může Zhotovitel pověřit třetí osobu, přičemž za výsledek těchto činností, tj. za plnění díla včetně odpovědnosti za škody, odpovídá Objednateli stejně, jako by je provedl sám.
4. Specifikace rozsahu díla je vymezena v příloze č. 1. - oceněný výkaz výměr.
5. V ceně díla, která je uvedena v čl. IV, musí být zahrnuty veškeré související ostatní náklady spojené se zhotovením díla, i ty, které nejsou obsaženy v položkovém rozpočtu samostatně, a to zejména:
 - a) náklady na skládky přebytečného materiálu, vybouraných konstrukcí a hmot, uložené ornice, případně nutné biologické rekultivace
 - b) náklady na zřízení staveniště včetně potřebných energií a přístup na staveniště
 - c) atesty materiálů, potřebné zkoušky, měření a revize, provozní předpisy a řády, zaškolení obsluhy, výstražné tabulky, informační zařízení a schémata
 - d) výkon geodetických prací souvisejících se zhotovením stavby
 - e) veškeré potřebné průzkumné práce ve fázi realizace stavby
 - f) nezbytné úkony vyplývající ze zák. č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči
 - g) zpracování geodetického zaměření digitální formou podle pravidel IMIP ve trojím vyhotovení
 - h) projednání záborů veřejných prostranství a jejich úhrada
 - i) projednání dopravních opatření a jejich realizace
 - j) projednání a realizace napojení a odpojení inženýrských sítí
 - k) vytýčení podzemních sítí vymezených projektem
 - l) zajištění pasportizace stávajících objektů (pasport a dokumentace výchozího stavu
 - m) náklady na pojištění díla a odpovědnosti za škody

n) náklady na zajištění péče o zhotovené dílo, až do jeho převzetí uživatelem

6. Objednatel se zavazuje dílo prosté vad a nedodělků převzít a zaplatit Zhotoviteli cenu za jeho provedení za podmínek stanovených touto smlouvou.

III. DOBA PLNĚNÍ

1. Dílo bude dokončeno a předáno do dvou měsíců ode dne předání staveniště, přičemž staveniště je Zhotovitel povinen převzít do 30 dnů ode dne doručení výzvy Objednatele. Termín zahájení stavby může být v protokolu o předání staveniště upřesněn. O předání staveniště zhotoviteli bude proveden zápis podepsaný zástupci smluvních stran.

IV. CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Celková cena za zhotovení díla (stavby) a dalších činností zhotovitele v rozsahu čl. II. této smlouvy je stanovena na základě rozhodnutí Objednatele o výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku ze dne **5.10.2018 pod č.j. MHMP 1567402/2018** a činí:

Základní cena bez DPH	5 849 153,03
DPH	1 228 322,14
Cena včetně DPH	7 077 475,17

Zhotovitel je povinen účtovat DPH v zákonem stanovené výši platné v den uskutečnění zdanitelného plnění. Zhotovitel je povinen uvádět na fakturách – daňových dokladech za názvem stavby event. etapy, kontrolní číslo vyznačené na první straně smlouvy o dílo. Číslo je umístěno vpravo nahoře (razítko) pod označením KČ..... Pokud faktura nebude obsahovat kontrolní číslo, bude neuhrazená a vrácena zhotoviteli. Smluvní strany se dohodly na tom, že úhrada základní ceny díla bude uskutečňována postupně formou měsíčního dílčího plnění Zhotovitele pro Objednatele maximálně do výše 90% základní ceny. Dílčím plněním se rozumí rozsah a cena skutečně provedených prací a dodávek uskutečněných Zhotovitelem v běžném měsíci a zjištěných k poslednímu pracovnímu dni tohoto měsíce. Zjišťování rozsahu a ceny dílčího plnění se provádí zjišťovacím protokolem, doloženým soupisem provedených prací a dodávek v členění dle specifikace s uvedením jednotkové ceny, množství a výsledné ceny za příslušnou položku. Podpisem předávacího protokolu a soupisu provedených prací zástupci smluvních stran vzniká Zhotoviteli právo fakturovat odsouhlasenou cenu dílčího plnění daňovým dokladem a tento den se stává dnem uskutečněného zdanitelného plnění. Dohodou o dílčím plnění nejsou dotčena práva a povinnosti obou smluvních stran týkající se předání a převzetí celého díla, odstranění vad a záruční lhůty. Hlavní město Praha v této smlouvě nevystupuje v postavení osoby povinné k dani, neboť přijaté stavební a montážní práce nepoužije ke své ekonomické činnosti. Z tohoto důvodu nebude při fakturaci použit režim přenesení daňové povinnosti dle § 92a a 92e zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ale bude použit standardní režim – daňové doklady budou obsahovat i výši daně.

2. Konečná faktura bude vystavena na základě „Protokolu o předání a převzetí díla“ po odstranění všech vad a nedodělků. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění bude den převzetí díla, tj. datum podpisu „Protokolu“. Konečná faktura ve výši 10 % základní ceny s DPH bude Objednatelem uhrazena v plné výši v případě, že dílo bude dokončeno bez vad a nedodělků. Pokud budou zjištěny vady a nedodělky, faktura bude uvolněna až po předložení „Protokolu o odstranění vad a nedodělků“.

3. Veškeré faktury budou vystaveny ve dvojím vyhotovení a odeslány na adresu objednatele: Hlavní město Praha, Mariánské nám. 2, 110 00 Praha 1. Faktury je možné doručit i osobně nebo kurýrem do podatelny MHMP Mariánské nám 2, Praha 1 nebo Jungmannova 35/29, Praha 1.

4. Lhůta splatnosti dílčích faktur je 30 dní od doručení Objednateli. Termín úhrady se rozumí den odpisu platby z účtu objednatele.

5. Oprávněně vystavená faktura - daňový doklad - musí mít veškeré náležitosti daňového dokladu ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb. „o dani z přidané hodnoty“ ve znění pozdějších předpisů i další náležitosti požadované objednatelem. Musí tedy obsahovat tyto údaje:

- údaje Objednatele, sídlo, IČO, DIČ
- údaje Zhotovitele, sídlo, IČO, DIČ
- evidenční číslo daňového dokladu
- bankovní spojení Zhotovitele
- datum vystavení daňového dokladu
- datum uskutečnění zdanitelného plnění
- rozsah a předmět fakturovaného plnění
- číslo smlouvy
- kontrolní číslo (vyznačené vpravo nahoře na první straně smlouvy pod označením KČ)
- číslo a název stavby, popř. číslo a název etapy
- fakturovanou částku ve složení základní cena, DPH a cena celkem
- zápis v obchodním rejstříku (číslo vložky, oddíl)
- razítko a podpis oprávněné osoby, stvrzující oprávněnost, formální a věcnou správnost faktury.

6. V případě, že faktura nebude vystavena oprávněně, či nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě, je Objednatel oprávněn ji vrátit Zhotoviteli k doplnění. V takovém případě se začne počítat nová lhůta splatnosti dnem doručení opravené či oprávněně vystavené faktury.

7. Zhotovitel se zavazuje spolu s každou fakturou jako její přílohu vyhotovit soupis provedených prací účtovaných touto fakturou, a to ve formátu .xml XC4 (ve stejném formátu, v jakém v rámci zadávací dokumentace převzal projektovou dokumentaci, zjišťovací protokoly, převedené rozpočty, kontrolní rozpočty a další dokumenty); zjišťovací protokol a soupis provedených prací bude předán kromě tištěné podoby také v elektronické verzi na mediu, které Zhotoviteli specifikuje na jeho žádost Objednatel nebo jeho zástupce.

V.

DODATEČNÉ STAVEBNÍ PRÁCE

1. Veškeré dodatečné práce nezbytné pro dokončení stavby, nebo požadované na základě, kolaudačního řízení, musí být písemně dohodnuty osobami oprávněnými jednat ve věcech této smlouvy a v souladu se zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění. V tomto případě je zhotovitel srozuměn s tím, že proces projednání těchto prací a jejich schválení se může prodloužit na několik měsíců. Bez tohoto schvalovacího procesu však nelze výše uvedené práce proplatit.

Ceny dodatečných prací nezbytných pro dokončení díla, nebo požadovaných na základě kolaudace budou tvořeny takto:

- a) dodatečné práce, které lze zařadit do kalkulovaných položek obsažených v kalkulaci základní ceny díla,

b) u dodatečných prací neobsažených v kalkulaci základní ceny díla bude provedena kalkulace ceny dodatečných prací na základě ceníku URS platného v době provádění těchto dodatečných prací, případně dle cen obvyklých u dalších, v ceníku neuvedených činností.

2. Práce, které nejsou předmětem této smlouvy, provedené Zhotovitelem bez písemného souhlasu Objednatele a v rozporu s čl. IV odst. 7 této smlouvy, nebudou Zhotoviteli uhrazeny a Zhotovitel se zavazuje na výzvu Objednatele takovéto části díla odstranit.

3. Strany se dohodly, že veškeré změny budou prováděny pouze po projednání a odsouhlasení objednatel. Náklady na odvozní vzdálenosti uvedené v nabídce jsou konečné bez ohledu na skutečné kilometry.

VI.

PRÁVA A POVINNOSTI OBJEDNATELE

1. Objednatel má právo pověřit svým zastupováním odbornou firmu provádějící inženýrskou činnost (tj. příkazníka), na základě plné moci pro tuto firmu.

2. Objednatel předá Zhotoviteli protokolárně staveniště.

3. Objednatel do doby předání staveniště předá Zhotoviteli veškeré doklady, které získal a jsou nezbytné k realizaci předmětu smlouvy a projektovou dokumentaci v 1 vyhotovení.

4. Objednatel do doby zahájení prací zápisem do stavebního deníku jmenuje odpovědné zástupce pověřené výkonem technického dozoru (TDI).

5. Objednatel bude řádně a včas plnit své závazky vyplývající z požadavků na vzájemnou součinnost při realizaci díla jak jsou dány platnými právními předpisy a touto smlouvou.

6. Objednatel od Zhotovitele převezme řádně dokončený předmět smlouvy bez vad a nedodělků, a za zhotovené dílo zaplatí cenu dle čl. IV. této smlouvy.

VII.

PRÁVA A POVINNOSTI ZHOTOVITELE

1. Zhotovitel provede práce dle této smlouvy kompletně, kvalitně a ve smluvním termínu. Kvalita prováděných prací bude odpovídat systému jakosti daného ČSN EN ISO. Veškeré materiály a dodávky ke zhotovení díla zajistí zhotovitel tak, aby odpovídaly platným technickým normám.

2. Zhotovitel se bude při své činnosti řídit ujednáními této smlouvy, výchozími podklady Objednatele, jeho pokyny, zápisy a dohodami na úrovni statutárních orgánů a rozhodnutími a vyjádřeními veřejnoprávních orgánů.

3. Zhotovitel bude řádně udržovat veřejné komunikace v prostoru staveniště a okolí, neprodleně odstraní veškerá jejich zničení a poškození.

4. Zhotovitel bude při své činnosti minimalizovat negativní dopady ze své stavební činnosti na okolí.

5. Zhotovitel zajistí pro vlastní provoz zařízení staveniště, které vyklidí do 30-ti dnů od předání a převzetí díla. Po tomto termínu je Zhotovitel oprávněn ponechat na staveništi pouze zařízení a materiál, nutný k odstranění vad a nedodělků, bude-li s nimi dílo Objednavatelem převzato, případně zařízení a materiál potřebný ke splnění podmínek kolaudačního řízení.

6. Zhotovitel zajistí na své náklady veškeré provozní i komplexní zkoušky.

7. Zhotovitel souhlasí s tím, že si ponechá dílo ve své péči až do převzetí Objednatel.

8. Zhotovitel zajistí účast svých zmocněných odpovědných zástupců na pravidelných kontrolních poradách, jejichž termíny budou oznámeny přípisem technickým dozorem Objednatele.
9. Zhotovitel se zavazuje dodržovat platební povinnost vůči svým podzhotovitelům.
10. Zhotovitel je povinen si sám a na své náklady zajistit projednání záborů veřejného prostranství a dopravních opatření spojených s realizací díla (DIR).
11. Povinností Zhotovitele je na vlastní náklady označit staveniště info tabulemi dle manuálu kodifikujícího standardy tvorby informačních panelů pro stavby, jejichž investorem je Hlavní město Praha.
12. Zhotovitel se zavazuje, že až do dokončení a předání díla bez vad a nedodělků bude mít veškerá oprávnění nezbytná k realizaci díla.

VIII. ŘÍZENÍ STAVBY, STAVEBNÍ DENÍK, TECHNICKÝ DOZOR

1. Stavbyvedoucím Zhotovitele je Ing. Václav Hrbáček který zabezpečuje zejména tyto činnosti:
 - a) řídí a odpovídá za komplexní realizaci prací Zhotovitele a jeho subdodavatelů
 - b) vystavuje faktury za provedené práce, včetně příslušných dokladů
 - c) provádí předávání stavebních prací, projektů a díla Objednateli
 - d) projednává a odsouhlasuje změny projektu, materiálů a dodávek
 - e) projednává a odsouhlasuje změny množství a cen realizovaných prací a dodávek materiálů
 - f) vede stavební deník a deník dodatečných stavebních prací – méně prací
 - g) zastupuje Zhotovitele při jednáních ve věci předmětu této smlouvy při projednávání záborů a dopravních opatření. (Za tímto účelem je Zhotoviteli Objednavatelem vystavena plná moc, kterou Zhotovitel obdrží při předání a převzetí staveniště).
2. Zhotovitel je povinen ode dne převzetí staveniště vést na stavbě stavební deník dle zák. č. 183/2006 Sb., v platném znění Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a překážkách, které brání jejich plynulému postupu. Objednatel je povinen prostřednictvím svého zástupce sledovat obsah zápisů v deníku a k zápisům připojovat svá stanoviska.
3. Mimo stavbyvedoucího Zhotovitele může provádět potřebné záznamy v deníku odpovědný zástupce Objednatele, zástupce projektanta pověřený autorským dozorem, příp. orgán státního stavebního dohledu. Je zakázáno zápisy v deníku přepisovat, škrtnat a nelze z něj též vytrhávat originály jednotlivých strany. Vedení deníku končí odstraněním poslední vady oznámené (reklamované) v zápise o předání a převzetí stavby. Jestliže stavbyvedoucí nesouhlasí s provedeným záznamem Objednatele nebo projektanta, je povinen do 3 pracovních dnů připojit svoje vyjádření, jinak se má za to, že s obsahem záznamu souhlasí.
4. Nesouhlasí-li odpovědný zástupce Objednatele s obsahem zápisu, který provedl stavbyvedoucí Zhotovitele, zapíše svůj nesouhlas do deníku do 3 pracovních dnů s uvedením důvodů, jinak se má za to, že s obsahem záznamu souhlasí.
5. **Technický dozor objednatel zejména:**
 - a) Průběžně sleduje, zda jsou práce prováděny podle schváleného projektu, podle smlouvy o dílo, technických norem a jiných předpisů.
 - b) Potvrzuje soupisy provedených prací a zjišťovací protokoly. Přebírá dodávky stavebních prací a celé dílo podle smlouvy.

- c) Je zmocněn projednávat drobné změny a dodatečné práce, které musí následně předložit k odsouhlasení Objednateli. Uvedené změny nemají vliv na cenu díla.
 - d) Je oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práci, pokud odpovědný zástupce Zhotovitele není dosažitelný a je-li ohroženo zdraví pracovníků nebo hrozí vznik hmotné škody. Není oprávněn zasahovat do hospodářské činnosti Zhotovitele.
 - e) Pravidelně kontroluje a svým podpisem potvrzuje stavební deník.
6. Zhotovitel bude průběžně informovat Objednatele o stavu rozpracovaného díla.
7. Zápis zapsaný do stavebního deníku, podepsaný stavbyvedoucím a technickým dozorem, je důkazem o zapsané skutečnosti a podkladem pro případné soudní spory.
8. Zhotovitel je povinen po odstranění vad a nedodělků zjištěných při přejímacích řízeních stavby odevzdat Objednateli originál stavebního deníku k archivaci dle zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, ve znění pozdějších předpisů.

IX.

PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

1. Řádně provedená stavba se předává a přejímá v rozsahu projektové dokumentace stavby. Veškerá předání a převzetí budou prováděna v rozsahu a způsobem stanoveným platnými předpisy a touto smlouvou.
2. Zhotovitel je povinen zajistit předložení veškerých atestů, zpráv a protokolů o zkouškách stanovených platnými předpisy a geodetického zaměření.

Dále připraví podklady:

- geodetické zaměření včetně dokladu o odevzdání příslušnému institutu
- stavební deník

3. K převzetí dokončeného díla vyzve Zhotovitel písemně alespoň 14 dnů před zahájením předávacího řízení a to způsobem uvedeným v čl. XVI.
4. O předání a převzetí sestaví smluvní strany „protokol o předání a převzetí“, který bude obsahovat vedle základních a technických údajů zejména zhodnocení kvality provedených prací, soupis případných vad a nedodělků, bude-li s nimi dílo převzato, a dohodu o termínech odstranění vad a nedodělků.
5. Dnem podpisu protokolu o předání a převzetí díla začíná běžet záruční lhůta.
6. Odmítne-li objednatel dílo převzít, sepíše o tom zápis, v němž smluvní strany uvedou svá stanoviska a jejich zdůvodnění včetně návrhu na další postup.
7. Objednatel není oprávněn odmítnout převzetí díla pro závady, jejichž původ je ve schválené projektové dokumentaci ke stavebnímu řízení, nebo jestliže sám způsobil, že dílo nevyhovuje.
8. Zhotovitel je však povinen upozornit Objednatele na vady projektu, o kterých věděl nebo vědět mohl a to bezodkladně potom, co tyto vady zjistil nebo zjistit mohl.
9. Zhotovitel je povinen odstranit na své náklady veškeré zjištěné kolaudační vady, a to ve lhůtách stanovených správním orgánem.
10. Zhotovitel souhlasí s případným převodem práv Objednatele z odpovědnosti za vady v záruční lhůtě na provozovatele (uživatele) dokončeného díla.

X.

ODPOVĚDNOST ZA VADY

1. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotovený podle podmínek smlouvy, a že po dobu záruky bude mít dílo vlastnosti dohodnuté v této smlouvě a vlastnosti stanovené právními předpisy, technickými normami, případně vlastnosti obvyklé.

2. Záruční doba na dílo je 60 měsíců ode dne předání celého díla. Dílem se rozumí veškeré provedené práce a dodávky bez ohledu na záruční doby poskytnuté jejich výrobcí či pod Zhotoviteli.

3. Zhotovitel neodpovídá za vady vzniklé v důsledku neodborného zásahu, neodborného užívání ze strany Objednatele (uživatele) a zásahem třetích osob.

4. Reklamace vad je uplatněna včas, pokud jí Objednatel uplatní písemně nejpozději do uplynutí záruční doby, a to způsobem uvedeným v čl. XVI. Objednatel je povinen vady reklamovat bezodkladně po jejich zjištění. Zhotovitel má povinnost reklamované vady díla bezplatně odstranit ve lhůtě do 30-ti dnů od uplatnění písemné výzvy – reklamace Objednatelem.

5. Za škodu vzniklou porušením povinností dle odst. 1 Zhotovitel neodpovídá jen v případě, že prokáže, že škoda byla způsobena okolnostmi vylučujícími jeho odpovědnost.

XI.

SMLUVNÍ POKUTY A NÁHRADA ŠKODY

1. Za prodlení s předáním díla či jeho části zaplatí Zhotovitel smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý započatý den prodlení.

2. Za prodlení s odstraněním vad a nedodělků, bude-li s nimi dílo či jeho část předáno a převzato, zaplatí Zhotovitel smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý den prodlení a za každou vadu a nedodělek.

3. Za nedodržení lhůty stanovené pro převzetí staveniště uvedené v čl. III. odst. 1 je povinen Zhotovitel zaplatit smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý den prodlení.

4. Neodstraní-li Zhotovitel reklamovanou vadu do 30-ti dní ode dne doručení písemné výzvy způsobem uvedeným v čl. XVI. Nebo v jiném dohodnutém termínu, je Zhotovitel povinen Objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každou vadu a den prodlení. V případě prodlení Zhotovitele s odstraněním reklamovaných vad dle předchozí věty, má Objednatel vedle vyúčtování smluvní pokuty právo pověřit tímto třetí osobu na náklady Zhotovitele a to v případě, že Zhotovitel neodstraní vady ani po opětovné výzvě se stanovením dostatečné lhůty pro odstranění vad.

5. Smluvní strany výslovně sjednávají, že Objednatel je oprávněn smluvní pokutu, případně vzniklou náhradu škody, na které mu v důsledku porušení závazku vznikl nárok, započíst do kterékoliv úhrady, která přísluší Zhotoviteli dle příslušných ustanovení této smlouvy.

6. Smluvní pokuta sjednaná dle čl. XI. je splatná do 30-ti kalendářních dnů od okamžiku každého jednotlivého porušení specifikovaného v čl. XI. této smlouvy, a to na účet Objednatele.

XII.

VYŠŠÍ MOC

1. Smluvní strany se osvobozují od odpovědnosti za částečné nebo úplné nesplnění smluvních závazků, jestliže se tak stalo v důsledku vyšší moci.

2. Za vyšší moc se pokládají okolnosti, které vznikly po uzavření této smlouvy o dílo v důsledku stranami nepředvídaných a neodvratitelných událostí, mimořádné a neodvratitelné povahy a mají bezprostřední vliv na plnění předmětu této smlouvy, jedná se především o živelné pohromy, válečné události, případně opatření příslušných správních orgánů na území ČR.

3. Nastanou-li okolnosti vyšší moci dle odst. 1., prodlužuje se doba plnění o dobu, po kterou budou okolnosti vyšší moci působit. Tato doba bude vzájemně odsouhlasena dodatkem k této smlouvě.

XIII.

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

1. Práce Zhotovitele, které vykazují již v průběhu provádění nedostatky nebo jsou prováděny v rozporu s touto smlouvou, je Zhotovitel povinen nahradit bezvadným plněním. Pokud Zhotovitel ve lhůtě, dohodnuté s Objednatelem, takto zjištěné nedostatky neodstraní, může Objednatel od smlouvy odstoupit. Vznikne-li z těchto důvodů Objednateli škoda, je Zhotovitel průkazně vyčíslenou škodu povinen uhradit.
2. Jestliže Objednatel v průběhu plnění předmětu smlouvy zjistí, že dochází k prodlení se zahájením nebo prováděním prací oproti harmonogramu z důvodů na straně Zhotovitele, nebo že na stavbě nejsou potřebné kapacity strojů, materiálů či pracovníků, či došlo ze strany Zhotovitele k porušení ustanovení čl. II odst. 3 smlouvy, stanoví Zhotovitel lhůtu, do kdy má nedostatky odstranit. V případě, že Zhotovitel neodstraní nedostatky ve stanovené lhůtě, může Objednatel od smlouvy odstoupit. Objednatel má právo od smlouvy odstoupit i v případě, že k porušení ustanovení čl. II odst. 3 smlouvy Zhotovitelem došlo opakovaně. Škodu, která Objednateli z těchto důvodů vznikne, je Zhotovitel povinen uhradit.
3. Pokud Zhotovitel nesplní povinnost uvedenou v čl. XV. odst. 3 a odst. 4, vyzve Objednatel Zhotovitele ke splnění této povinnosti písemně v souladu s ustanovením čl. XVI., pokud Zhotovitel tuto povinnost nesplní nejdéle do 5 pracovních dnů, je Objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit (s účinky EX NUNC), toto odstoupení vyžaduje písemnou formu a bude Zhotoviteli doručeno v souladu s ustanovením čl. XVI.
4. Bude-li Zhotovitel nucen z důvodů na straně Objednatele přerušit práce na dobu delší jak pět měsíců, může od smlouvy odstoupit, nebude-li dohodnuto jinak.
5. Každá ze smluvních stran je oprávněna písemně odstoupit od smlouvy, pokud:
 - a) na majetek druhé smluvní strany byl prohlášen konkurs nebo povoleno vyrovnání,
 - b) návrh na prohlášení konkursu byl zamítnut pro nedostatek majetku druhé smluvní strany,
 - c) druhá smluvní strana vstoupí do likvidace,
 - d) nastane vyšší moc uvedená v článku smlouvy, kdy dojde k okolnostem, které nemohou smluvní strany ovlivnit a které zcela a na dobu delší než 90 dnů znemožní některé ze smluvních stran plnit své závazky ze smlouvy.
6. Vznik některé ze skutečností uvedených v odstavci 6 je každá smluvní strana povinna oznámit druhé smluvní straně. Pro uplatnění práva na odstoupení od smlouvy však není rozhodující, jakým způsobem se oprávněná smluvní strana dozvěděla o vzniku skutečností opravňujících k odstoupení od smlouvy.
7. Pokud odstoupí od smlouvy Objednatel z důvodů uvedených v odstavci 1 a 2 nebo některá ze smluvních stran z důvodů uvedených v odstavci 6, smluvní strany sepíší protokol o stavu provedení díla ke dni odstoupení od smlouvy; protokol musí obsahovat zejména soupis veškerých uskutečněných prací a dodávek ke dni odstoupení od smlouvy. Závěrem protokolu smluvní strany uvedou finanční hodnotu dosud provedeného díla. V případě, že se smluvní strany na finanční hodnotě díla neshodnou, nechají vypracovat příslušný znalecký posudek soudním znalcem. Smluvní strany se zavazují přijmout tento posudek jako konečný ke stanovení finanční hodnoty díla. K určení znalce, jakož i k úhradě ceny za zpracování posudku je příslušný Objednatel.
8. Vzájemné pohledávky smluvních stran vzniklé ke dni odstoupení od smlouvy podle odstavců 1, 2 a 4 se vypořádají vzájemným zápočtem, přičemž tento zápočet provede Objednatel.

9. Za den odstoupení od smlouvy se považuje den, kdy bylo písemné oznámení o odstoupení oprávněné smluvní strany doručeno druhé smluvní straně, a to způsobem uvedeným v čl. XVI. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena práva smluvních stran na úhradu splatné smluvní pokuty a na náhradu škody.

10. V případě odstoupení od smlouvy jednou ze smluvních stran, bude k datu účinnosti odstoupení vyhotoven protokol o předání a převzetí nedokončeného díla, který popíše stav nedokončeného díla a vzájemné nároky smluvních stran.

11. Do doby vyčíslení oprávněných nároků smluvních stran a do doby dohody o vzájemném vyrovnání těchto nároků, je Objednatel oprávněn zdržet veškeré fakturované a splatné platby Zhotoviteli.

12. V dalším se v případě odstoupení od smlouvy postupuje dle příslušných ustanovení obchodního zákoníku.

13. Odstoupení od této smlouvy je vždy s účinky EX NUNC (tedy od okamžiku zániku smlouvy).

XIV. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

1. Vlastníkem stavby je od počátku Objednatel, a to od samého počátku. Objednatel má rovněž vlastnické právo ke všem věcem k provedení díla, které Zhotovitel opatřil a dodal na místo provedení díla.

2. Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel nese nebezpečí školy na zhotovovaném díle až do doby odstranění poslední vady a nedodělků i v případě, pokud s nimi bylo dílo protokolárně předáno a převzato.

3. Pro případ odpovědnosti za škodu na díle je Zhotovitel povinen mít uzavřenou pojistnou smlouvu, a to po celou dobu zhotovování díla až do okamžiku předání a převzetí celého díla Objednatelem. Výše pojistné částky musí být v minimální výši ceny díla dle čl. IV. odst. 1 (celková cena díla včetně DPH) a na následující rozsah typů pojistných událostí:

Pojištění bude sjednáno pro případ škody vzniklé na pojištěných věcech jejich ztrátou, zničením nebo poškozením a škody vzniklé třetím osobám v souvislosti s činností nebo vztahem pojištěného, vyplývajícím ze stavebně montážních rizik budovaného díla, pokud pojištěný za škodu odpovídá v důsledku svého jednání nebo vztahu z doby trvání pojištění.

Pojištění je dále sjednáno pro případ poškození nebo zničení pojištěné věci (díla):

- požárem,
- záplavou,
- povodní,
- vichřicí,
- krupobitím,
- výbuchem,
- sesuvem půdy,
- zemětřesením,
- tíhou sněhu nebo námrazy,
- pádem stromů, stožárů a jiných předmětů, nejsou-li součástí téhož souboru jako poškozená věc

přičemž nesmí být na žádný typ pojistné události sníženo pojistné plnění.

Originál nebo ověřenou kopii této pojistné smlouvy je dodavatel povinen doložit Objednateli nejpozději v den předání staveniště Objednatelem Zhotoviteli.

4. Pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám při výkonu podnikatelské činnosti je dodavatel povinen mít uzavřenou pojistnou smlouvu na škodu způsobenou v souvislosti s výkonem jeho podnikatelské činnosti nebo vztahem pojištěného, vyplývajícím ze stavebně montážních rizik budovaného díla, včetně škody následné, pokud dodavatel za škodu odpovídá v důsledku svého jednání. Tuto pojistnou smlouvu je dodavatel povinen mít uzavřenou po celou dobu zhotovování díla. Výše pojistné částky musí být v minimální výši 10 milionů Kč. Originál nebo ověřenou kopii této pojistné smlouvy je dodavatel povinen doložit Objednateli nejpozději v den předání staveniště Objednatelem zhotoviteli dle čl. III. odst.1.
5. Zhotovitel se zavazuje, že při provádění všech prací bude dodržovat předpisy o bezpečnosti a ochraně života a zdraví pracovníků na stavbě. Rovněž prohlašuje, že bude dbát, aby nedocházelo ke škodám na majetku soukromých osob ani na majetku obce či státu a životním prostředí.
6. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v Centrální evidenci smluv (CES) vedené hl. m. Prahou, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o smluvních stranách, číselné označení této smlouvy, datum jejího podpisu a text této smlouvy. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu §504 zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
7. Účastníci Smlouvy v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a změně některých zákonů, v platném znění, berou na vědomí, že Smlouva obsahuje jejich osobní údaje, a ujednávají si, že s jejich uvedením souhlasí. Účastníci této Smlouvy berou zároveň na vědomí, že s účinností od 25. května 2018 nahradilo uvedený zákon o ochraně osobních údajů Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení na ochranu osobních údajů). Ochrana osobních údajů v této Smlouvě obsažených se řídí právy a povinnostmi vyplývajícími z tohoto nařízení.
8. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel je povinen na dotaz třetí osoby poskytovat informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. v platném znění a souhlasí s tím, aby veškeré informace obsažené v této smlouvě byly bez výjimky poskytnuty třetím osobám, pokud o ně požádají.
9. Smluvní strany se dohodly na tom, že žádná ze smluvních stran není oprávněna postoupit práva a závazky z této smlouvy třetí osobě, bez výslovného písemného souhlasu druhé smluvní strany.
10. Zhotovitel je povinen vést účtování o stavbě samostatně, odděleně od ostatních jím realizovaných akcí a je povinen umožnit na základě žádosti Objednatele provedení auditu realizace této stavby.
11. Objednatel je oprávněn u Zhotovitele provést audit realizace stavby, zda byla provedena dle předložené nabídky a této smlouvy, a to buď svými pracovníky, nebo prostřednictvím jím pověřené třetí osoby. Objednatel je povinen o veškerých informacích, které se v souvislosti s tímto auditem dozví zachovávat mlčenlivost, vyjma těch zjištění, kdy ze strany Zhotovitele dojde k porušení závazků a povinností k nimž se Zhotovitel zavázal ve své nabídce a této smlouvě.
12. Objednatel je povinen zaslat vyrozumění o provedení auditu Zhotoviteli nejpozději 10 dnů před zahájením auditu, a to v souladu s čl. XVI. této smlouvy.

13. Objednatel se zavazuje poskytnout Zhotoviteli zprávu auditu k vyjádření, a to nejpozději do 10 dnů ode dne obdržení auditorské zprávy. Předání auditorské zprávy Zhotoviteli k vyjádření bude provedeno oproti podpisu zástupce Zhotovitele ve věcech smluvních.

14. Zhotovitel je povinen se vyjádřit k obdržené zprávě auditora nejpozději do 5-ti dnů ode dne jejího obdržení. Vyjádření ke zprávě auditora bude Zhotovitelem předáno oproti podpisu zástupce zadavatele ve věcech smluvních. V případě, že se Zhotovitel v daném termínu ke zprávě auditora nevyjádří, má se za to, že se zprávou ve všech bodech souhlasí.

15. Ve věcech souvisejících s plněním podle této smlouvy je za Objednatele oprávněn jednat:

- ve věcech smluvních: [REDACTED]

- ve věcech technických: [REDACTED]

16. Ve věcech souvisejících s plněním podle této smlouvy je za Zhotovitele oprávněn jednat:

- ve věcech smluvních: [REDACTED]

- ve věcech technických: [REDACTED]

XV.

USTANOVENÍ O DORUČOVÁNÍ

1. Veškeré písemnosti a výzvy a reklamace se doručují na adresu Objednatele nebo Zhotovitele uvedenou v této smlouvě. Pokud v průběhu plnění této smlouvy dojde ke změně adresy některého z účastníků je povinen tento účastník neprodleně písemně oznámit druhému účastníkovi tuto změnu, a to způsobem uvedeným v tomto článku.
2. Nebyl-li objednatel nebo Zhotovitel na uvedené adrese zastižen, písemnost se prostřednictvím poštovního doručovatele uloží na poště. Nevyzvedne-li si účastník zásilku do deseti kalendářních dnů od uložení, považuje se poslední den této lhůty za den doručení, i když se účastník o doručení nedozvěděl.

XVI.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Smlouvou neupravené vztahy se řídí obecně platnými právními předpisy platnými na území České republiky.
2. Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných, oboustranně odsouhlasených dodatků.
3. Tuto smlouvu lze ukončit dohodou smluvních stran. Při ukončení smlouvy jsou smluvní strany povinny vzájemně vypořádat své závazky, zejména si vrátit věci předané k provedení díla, vyklidit prostory poskytnuté k provedení díla a místo provedení díla a uhradit veškeré splatné peněžité závazky podle smlouvy; zánikem smlouvy rovněž nezanikají práva na již vzniklé (splatné) majetkové pokuty podle smlouvy.
4. Jednotlivá ustanovení smlouvy jsou oddělitelná v tom smyslu, že neplatnost některého z nich nepůsobí neplatnost smlouvy jako celku. Pokud by se v důsledku změny právní úpravy některé ustanovení smlouvy dostalo do rozporu s českým právním řádem (dále jen „kolizní ustanovení“) a předmětný rozpor by působil neplatnosti smlouvy jako takové, bude smlouva posuzována, jakoby kolizní ustanovení nikdy neobsahovala a vztah smluvních stran se bude v této záležitosti řídit obecně závaznými právními

předpisy, pokud se smluvní strany nedohodnou na znění nového ustanovení, jež by nahradilo kolizní ustanovení.

5. Smlouva je vyhotovena v osmi stejnopisech s platností originálu, z nichž šest obdrží Objednatel a dva Zhotovitel.
6. Tato Smlouva nabývá platnosti podpisem smluvních stran a účinnosti uveřejnění této Smlouvy v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
7. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu řádně přečetly, jejímu obsahu porozuměly, její obsah je srozumitelný a určitý, že jim nejsou známy žádné důvody, pro které by tato smlouva nemohla být řádně plněna nebo které by způsobovaly neplatnost této smlouvy a že je projevem jejich pravé, svobodné a vážné vůle prosté omylu, projevené při plné způsobilosti právně jednat, a dále že tato smlouva nebyla ujednána v rozporu se zákonem a nepříčí se dobrým mravům a veškerá prohlášení v této smlouvě odpovídají skutečnosti, což vše níže stvrzují svými podpisy.
8. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění této smlouvy v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí hl.m. Praha.

Přílohy:

- č. 1 Kalkulace ceny (oceněný výkaz výměr)
- č. 2 Čestné prohlášení Zhotovitele o subdodavatelích s uvedením jejich procentuálního podílu na díle a specifikace jimi prováděných prací

V Praze dne

V Praze dne


- 3 -12- 2018

za Objednatele

za Zhotovitele



In
Ředitel odboru strategických investic
Magistrátu hlavního města Prahy

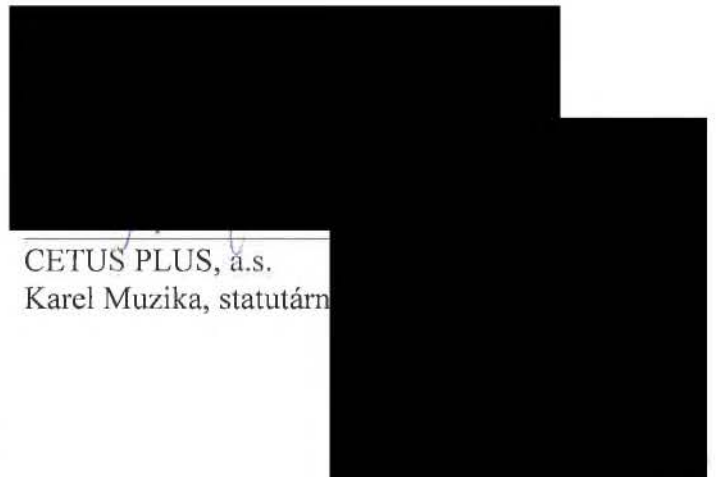

CETUS PLUS, a.s.
Karel Muzika, statutárně

Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.

Příloha č. 1 Kalkulace ceny (oceněný výkaz výměr)

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 42812_0001

Stavba: Celková přestavba Císařského ostrova

JKSO:

CC-CZ:

Místo:

Datum: 10. 7. 2018

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů	5 849 153,03
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00

Cena bez DPH	5 849 153,03
---------------------	---------------------

DPH: základní	21,00%	ze	5 849 153,03	1 228 322,14
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	7 077 475,17
-------------------	--------------	---------------------

Projektant

Datum a podpis: _____ Razítko _____

Zpracovatel

Datum a podpis: _____ Razítko _____

Objednavatel

Datum a podpis: _____ Razítko _____

Zhotovitel

Datum a podpis: _____ Razítko _____

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 42812_0001

Stavba: Celková přestavba Císařského ostrova

Místo:

Datum: 10. 7. 2018

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	5 849 153,03	7 077 475,17
0001	Likvidace starých zátěží	5 849 153,03	7 077 475,17
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00	0,00
	Ostatní náklady	0,00	0,00
	Vyplň vlastní	0,00	0,00
	Vyplň vlastní	0,00	0,00
	Vyplň vlastní	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		5 849 153,03	7 077 475,17

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Celková přestavba Císařského ostrova

Objekt: 0001 - Likvidace starých zátěží

JKSO:

CC-CZ:

Místo:

Datum: 10. 7. 2018

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ: Vyplň údaj

Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	5 849 153,03
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	5 849 153,03
---------------------	---------------------

DPH základní	21,00%	ze	5 849 153,03	1 228 322,14
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	7 077 475,17
-------------------	--------------	---------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Celková přestavba Císařského ostrova

Objekt: 0001 - Likvidace starých zátěží

Místo: Datum: 10. 7. 2018

Objednatel: Projektant:

Zhotovitel: Vypíň údaj Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	5 849 153,03
HSV - Práce a dodávky HSV	5 849 153,03
1 - Zemní práce	2 292 049,28
997 - Přesun sutě a zeminy	3 557 103,75
2) Ostatní náklady	0,00
Zařízení staveniště	0,00
Projektové práce	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Jiné VRN	0,00
Kompletační činnost	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	5 849 153,03

ROZPOČET

Stavba: Celková přestavba Císařského ostrova

Objekt: 0001 - Likvidace starých zátěží

Místo: Datum: 10. 7. 2018

Objednatel: Projektant:

Zhotovitel: Vypln údaj Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

5 849 153,03

HSV - Práce a dodávky HSV

5 849 153,03

1 - Zemní práce

2 292 049,28

1	K	122201104	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem přes 5000 m ³ 242+363,5+725,3+5754,7	m ³	7 085,500	45,20	320 264,60
					7 085,500		
2	K	122201109	Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3 7085,500/2	m ³	3 542,750	34,70	122 933,43
					3 542,750		
3	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 (Příplatek k vodorovnému přemístění	m ³	7 085,500	177,00	1 254 133,50
4	K	162701109	výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m N odpad (242+363,5)*35	m ³	21 192,500	9,90	209 805,75
					21 192,500		
5	K	162701109	(Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m O odpad (725,3+5754,7)*6	m ³	38 880,000	9,90	384 912,00
					38 880,000		

997 - Přesun sutě a zeminy

3 557 103,75

6	K	997013841	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu 19 08 12 Kaaly z biologického čištění průmyslových odpadních vod (242+363,5)*1,5	t	908,250	1 455,00	1 321 503,75
					908,250		
7	K	997223855	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva kód odpadu 170 504 (725,3+5754,7)*1,5	t	9 720,000	230,00	2 235 600,00
					9 720,000		

Příloha č. 2 Čestné prohlášení Zhotovitele o subdodavatelích s uvedením jejich procentuálního podílu na díle a specifikace jimi prováděných prací

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

Společnost **CETUS PLUS, a.s.**, IČ: 26419823, se sídlem Plzeňská 183/181, 150 00 Praha 5 (dál jen „**dodavatel**“) jakožto uchazeč o veřejnou zakázku


Stavba č.42812 Celková přestavba Císařského ostrova, etapa 0001 – Likvidace starých zátěží; Odvoz zemniny

tímto čestně prohlašuje, že

dílo provede bez pomoci subdodavatelů i subdodavatelů pro splnění kvalifikace.

V Praze, dne

Za dodavatele

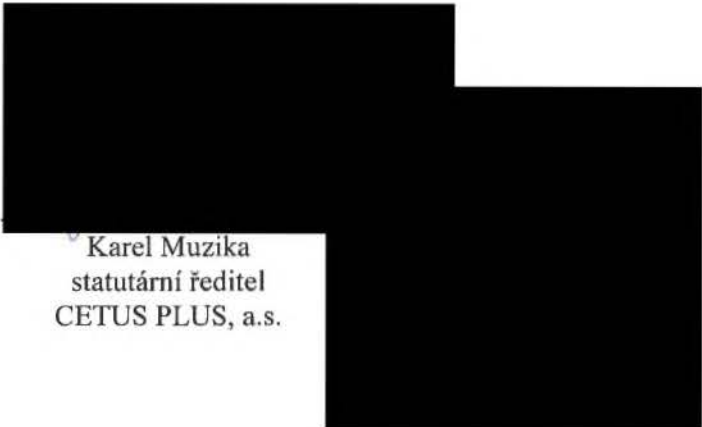

Karel Muzika
statutární ředitel
CETUS PLUS, a.s.

