

SMLOUVA O DÍLO

číslo smlouvy objednatele: 14PU-000903

číslo smlouvy zhotovitele: 007/2019

Tato Smlouva o dílo byla sepsána mezi následujícími smluvními stranami:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČO, DIČ: 65993390, CZ65993390
bankovní spojení: ČNB, č. ú. [REDACTED]
zastoupeno: [REDACTED] generální ředitel
kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED]
kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]
(dále jen „objednatel“)

a

název: SIGVIA CZ s.r.o.
se sídlem: Hanácká 346/25, 620 00 Brno
IČO, DIČ: 038 64 430, CZ03864430
bankovní spojení: Sberbank a.s., č.ú: [REDACTED]
zastoupen: [REDACTED] jednatel společnosti
kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED] jednatel společnosti
kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED] jednatel společnosti
(dále jen „dodavatel“ nebo „zhotovitel“)
(dále společně jen „smluvní strany“, jednotlivě jako „smluvní strana“)

Protože si objednatel přeje, aby stavba **I/35 Hustopeče nad Bečvou - doplnění svodidel a ostatních dopravních zařízení pro zvýšení BESIP**, Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND) 5001560002 byla realizována dodavatelem/zhotovitelem a přijal dodavatelovu/zhotovitelovu nabídku na provedení a dokončení této stavby a na odstranění všech vad na ní za cenu ve výši 2.267.028,00,- Kč bez DPH, kalkulovanou takto:

Název stavby	Přijatá smluvní částka bez DPH v Kč	DPH v Kč	Přijatá smluvní částka včetně DPH v Kč
	(a)	(b) = DPH z částky (a)	(c) = (a) + (b)
I/35 Hustopeče nad Bečvou - doplnění svodidel a ostatních dopravních zařízení pro zvýšení BESIP	2.267.028,00,-	476.075,88,-	2.743.103,88,-

kterážto cena byla spočtena na základě závazných položkových cen dle oceněného soupisu prací (výkazu výměr), dohodli se objednatel a dodavatel/zhotovitel takto:

V této Smlouvě o dílo budou mít slova a výrazy stejný význam, jaký je jim připisován zadávacími podmínkami veřejné zakázky na stavební práce s názvem **I/35 Hustopeče nad Bečvou - doplnění svodidel a ostatních dopravních zařízení pro zvýšení BESIP**, číslo veřejné zakázky 14PU-000903.

Potvrzujeme, že následující dokumenty tvoří součást obsahu Smlouvy:

- a) Smlouva o dílo
- b) Dopis o přijetí nabídky (Oznámení o výběru dodavatele)
- c) Příloha a Oceněný soupis prací - výkaz výměr
- d) Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu – Obecné podmínky¹
- e) Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu – Zvláštní podmínky²
- f) Technická specifikace³
- g) Výkresy
- h) Formuláře a ostatní dokumenty, které zahrnují:
Smlouva o zpracování osobních údajů (vzor)⁴

Vzhledem k platbám, které má objednatel uhradit dodavateli/zhotoviteli, tak jak je zde uvedeno, se dodavatel/zhotovitel tímto zavazuje objednateli, že provede a dokončí stavbu a odstraní na ní všechny vady, v souladu s ustanoveními Smlouvy.

Objednatel se tímto zavazuje zaplatit dodavateli/zhotoviteli, vzhledem k provedení a dokončení stavby a odstranění vad na ní, cenu díla v době a způsobem předepsaným ve Smlouvě.

Dodavatel/zhotovitel tímto poskytuje souhlas s jejím uveřejněním v registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv“), přičemž bere na vědomí, že uveřejnění Smlouvy v registru smluv zajistí objednatel. Do registru smluv bude vložen elektronický obraz textového obsahu Smlouvy v otevřeném a strojově čitelném formátu a rovněž metadata Smlouvy.

Dodavatel/zhotovitel bere na vědomí a výslovně souhlasí, že Smlouva bude uveřejněna v registru smluv bez ohledu na skutečnost, zda spadá pod některou z výjimek z povinnosti uveřejnění stanovenou v zákoně o registru smluv. V rámci Smlouvy nebudou uveřejněny informace stanovené v § 3 odst. 1 zákona o registru smluv námi označené před podpisem Smlouvy.

Případné spory mezi smluvními stranami projedná a rozhodne příslušný obecný soud České republiky v souladu s obecně závaznými předpisy České republiky.

Pokud se na jakoukoliv část plnění poskytovanou dodavatelem/zhotovitelem vztahuje GDPR (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně

¹ Tuto přílohu Smlouvy o dílo předkládá dodavatel na datovém nosiči.

² Tuto přílohu Smlouvy o dílo předkládá dodavatel na datovém nosiči.

³ Tuto přílohu Smlouvy o dílo předkládá dodavatel na datovém nosiči.

⁴ Tuto přílohu Smlouvy o dílo předkládá dodavatel na datovém nosiči.

fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)), je dodavatel/zhotovitel povinen zajistit plnění svých povinností v GDPR stanovených. V případě, kdy bude dodavatel/zhotovitel v kterémkoliv okamžiku plnění svých smluvních povinností zpracovatelem osobních údajů poskytnutých objednatelem nebo získaných pro objednatele, je povinen na tuto skutečnost objednatele upozornit a bezodkladně (vždy však před zahájením zpracování osobních údajů) s ním uzavřít Smlouvu o zpracování osobních údajů, která tvoří součást této Smlouvy. Smlouvu dle předcházející věty je dále dodavatel/zhotovitel s objednatelem povinen uzavřít vždy, když jej k tomu objednatel písemně vyzve.

Tato Smlouva o dílo je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva obdrží dodavatel/zhotovitel.

Smlouva nabývá účinnosti uveřejněním v registru smluv.

Na důkaz toho smluvní strany uzavírají tuto Smlouvu o dílo, která vstupuje v platnost podpisem obou smluvních stran.

PŘÍLOHA

Název stavby: I/35 Hustopeče nad Bečvou - doplnění svodidel a ostatních dopravních zařízení pro zvýšení BESIP

Následující tabulka odkazuje na Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu – Obecné podmínky ve znění Smluvních podmínek pro stavby menšího rozsahu – Zvláštní podmínky (dále jen „Smluvní podmínky“).

Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Pod-článku Smluvních podmínek	Údaje
Název a adresa Objednatele	1.1.4	ŘSD ČR, Správa Olomouc, Wolkerova 24a, 779 00 Olomouc
Název a adresa Zhotovitele	1.1.5	SIGVIA CZ s.r.o., Hanácká 346/25, 620 00 Brno
Doba pro dokončení	1.1.9	3 měsíce
Doba pro uvedení do provozu	1.1.22	Nepoužije se
Sekce	1.1.26	Nepoužije se
Hierarchie smluvních dokumentů	1.3	(a) Smlouva o dílo (b) Příloha (c) Zvláštní podmínky (d) Obecné podmínky (e) Technická specifikace (f) Výkresy (g) Výkaz výměr
Právo	1.4	Právo České republiky
Komunikace	1.5	Čeština
Poskytnutí staveniště	2.1	Od Data zahájení prací oznámeného dle Pod-článku 1.1.7
Pověřená osoba	3.1	
Zástupce objednatele	3.2	
Jmenování podzhotovitelé	4.3	Nepoužije se
Zajištění splnění smlouvy	4.4	Nepoužije se
Záruka za odstranění vad	4.6.	Nepoužije se
Projektová dokumentace Zhotovitele	5.1	Dokumentace skutečného provedení stavby
Harmonogram	7.2	Do 14 dnů po datu zahájení prací
Postupně závazné milníky	7.5	Nepoužije se
Odstranění vad	9.1	Záruční doba stanovená objednatelem činí - svodidla – 60 měsíců - ostatní stavební práce – 36 měsíců

Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Pod-článku Smluvních podmínek	Údaje
Oprávnění k Variaci	10.1	Postup při Variacích je součástí této Přílohy
Průběžné platby	11.3	a) je v prodlení s udržováním v platnosti bankovní záruky podle Pod-článku 4.4 (Zajištění splnění smlouvy) 10 % průběžné platby
	11.3	b) přes pokyn Objednatele ke zjednání nápravy neplní povinnosti podle Pod-článku 4.8 (Bezpečnost a ochrana zdraví při práci) 10 % průběžné platby
	11.3	c) nepředloží na základě pokynu Objednatele ve stanoveném termínu aktualizovaný Harmonogram podle Pod-článku 7.2 (Harmonogram) 10 % průběžné platby
	11.3	d) nepředloží nebo neudrhuje v platnosti pojistné smlouvy podle Článku 14 (Pojištění) 10 % průběžné platby
Měna	11.7	Koruna česká
Povinnost Zhotovitele zaplatit smluvní pokutu	12.5 a)	Zhotovitel nedodrží lhůty (a další časová určení) stanovené jemu v rozhodnutí příslušného veřejnoprávního orgánu podle pod-odstavce 4.1.8 Pod-článku 4.1 (Obecné povinnosti) 30.000,- Kč za každý případ porušení
	12.5 b)	Zhotovitel poruší povinnost podle Pod-článku 4.3 (Subdodávky) 5.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení
	12.5 c)	Zhotovitel nedodrží Doba pro dokončení podle Článku 7 (Doba pro dokončení) 1.000,- Kč za každý započatý den prodlení Zhotovitele s dokončením Díla v Době pro dokončení
	12.5 d)	Nepoužije se
	12.5 e)	Nepoužije se
	12.5 f)	Zhotovitel neodstraní vadu nebo poškození do data oznámeného Objednatelem podle Pod-článku 9.1.

Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Pod-článku Smluvních podmínek	Údaje
		200,- Kč za každý započatý den prodlení
Maximální celková výše smluvních pokut	12.5	30 % Přijaté smluvní částky bez DPH
Výše pojistného plnění	14.2	1 % z Přijaté smluvní částky bez DPH
Rozsah stavebně montážního pojištění	14.2.	Nepoužije se
Způsob rozhodování sporů	15	Použije se varianta B: Rozhodování před obecným soudem



Č.j.: 765/19 -II/Kol

Vyřizuje:

ROZHODNUTÍ A OZNÁMENÍ O VÝBĚRU DODAVATELE

Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4, IČO: 65993390, jakožto zadavatel veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „**I/35 Hustopeče nad Bečvou - doplnění svodidel a ostatních dopravních zařízení pro zvýšení BESIP**“, interní číslo zakázky 14PU-000903, evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): 5001560002, na základě výzvy k podání nabídky rozhodl o výběru nabídky účastníka

SIGVIA CZ s.r.o.


Hanácká 346/25, 620 00 Brno


IČO: 03864430


Odůvodnění:

Vybraný účastník splnil všechny požadavky zadavatele vymezené ve výzvě k podání nabídky a předložil nabídku s nejnižší nabídkovou cenou v Kč bez DPH.

V Olomouci dne 13.2.2019

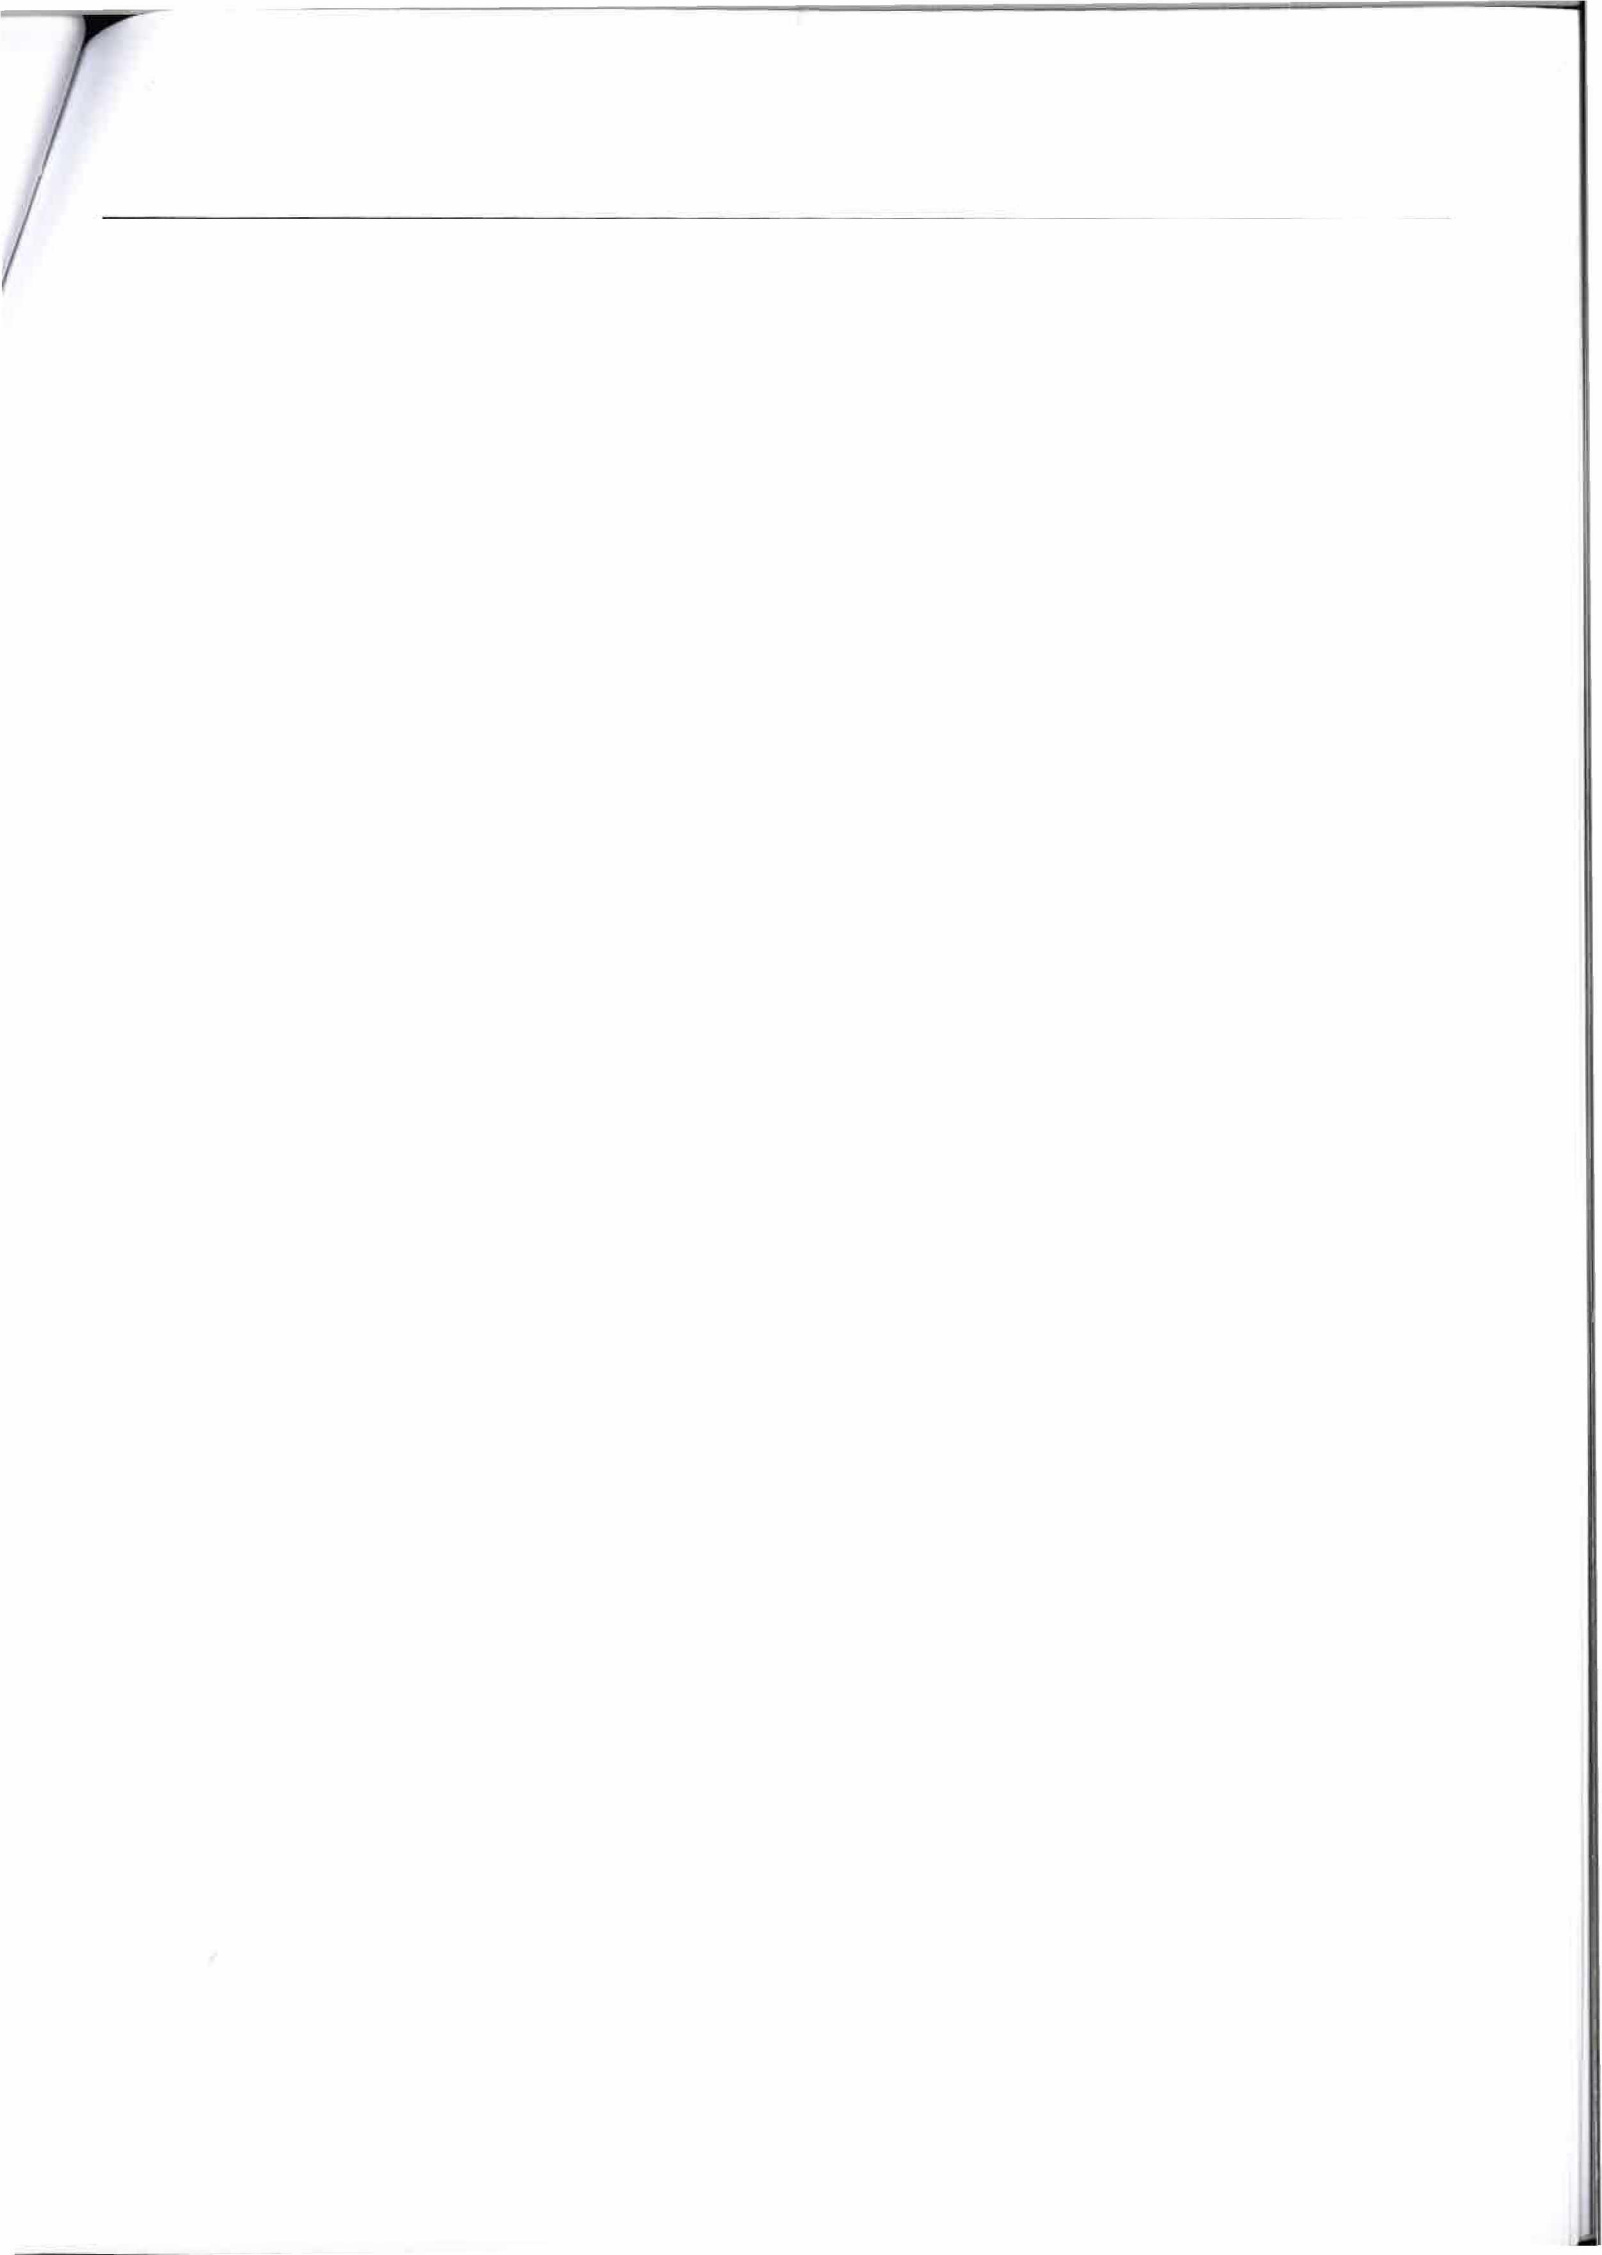

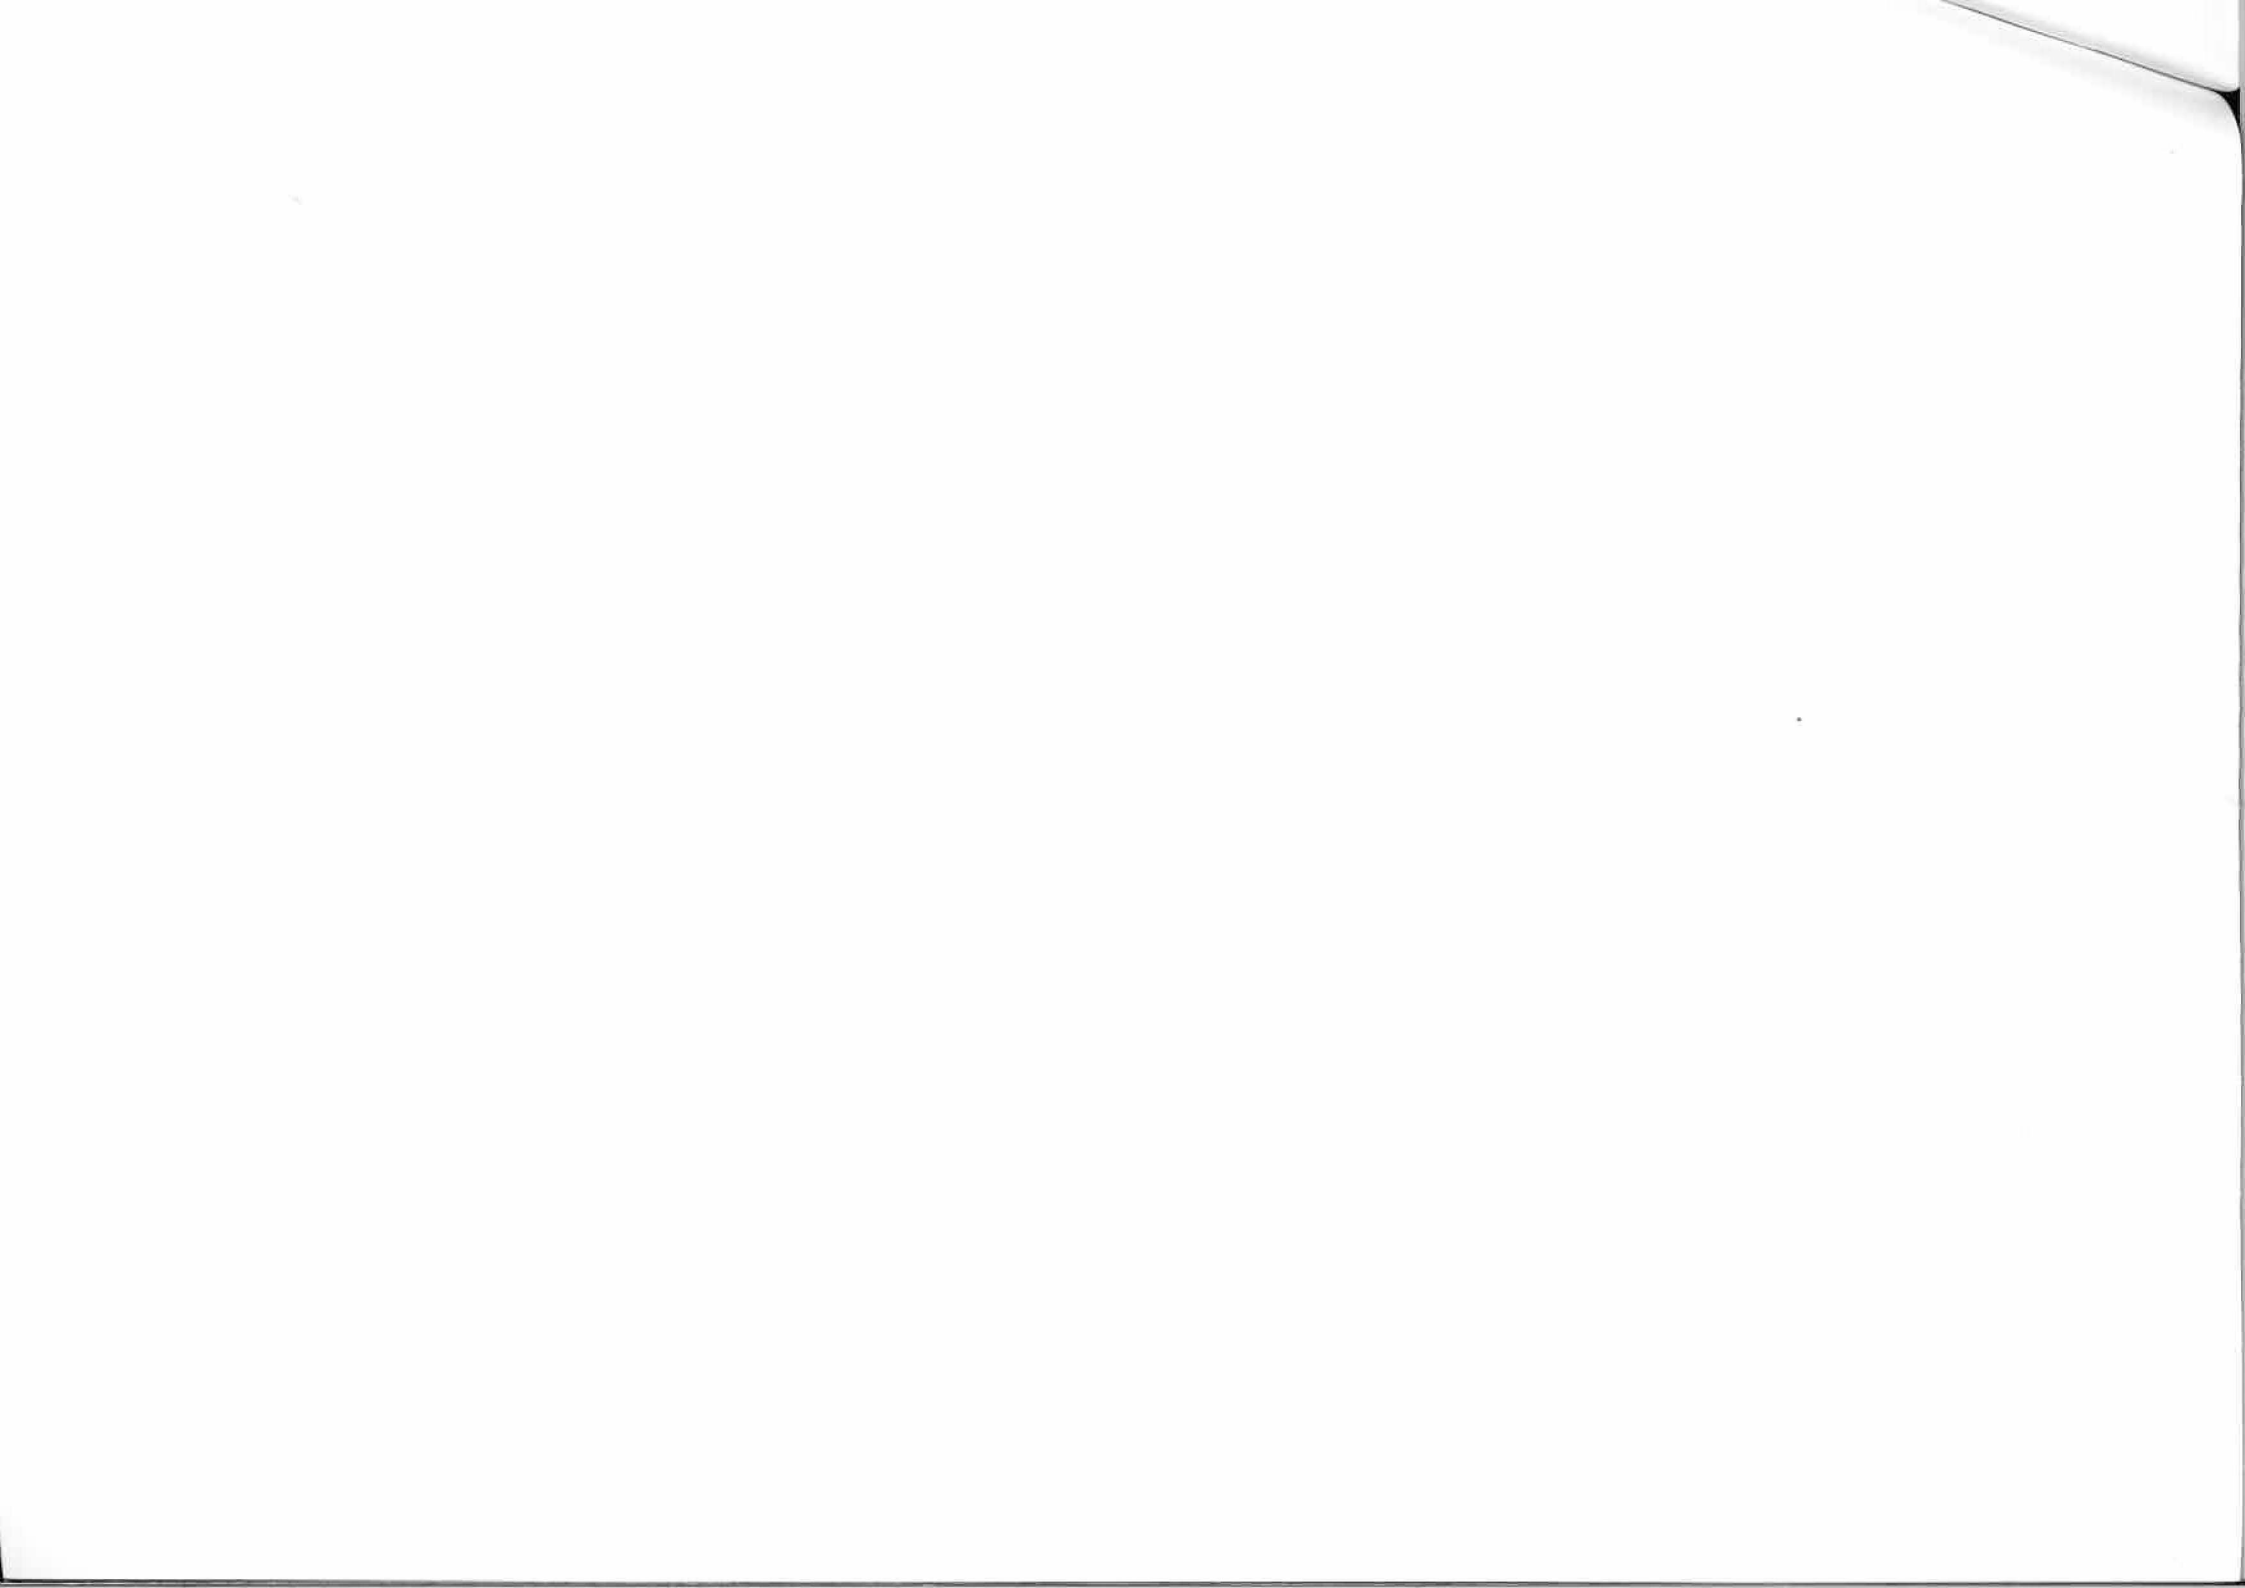

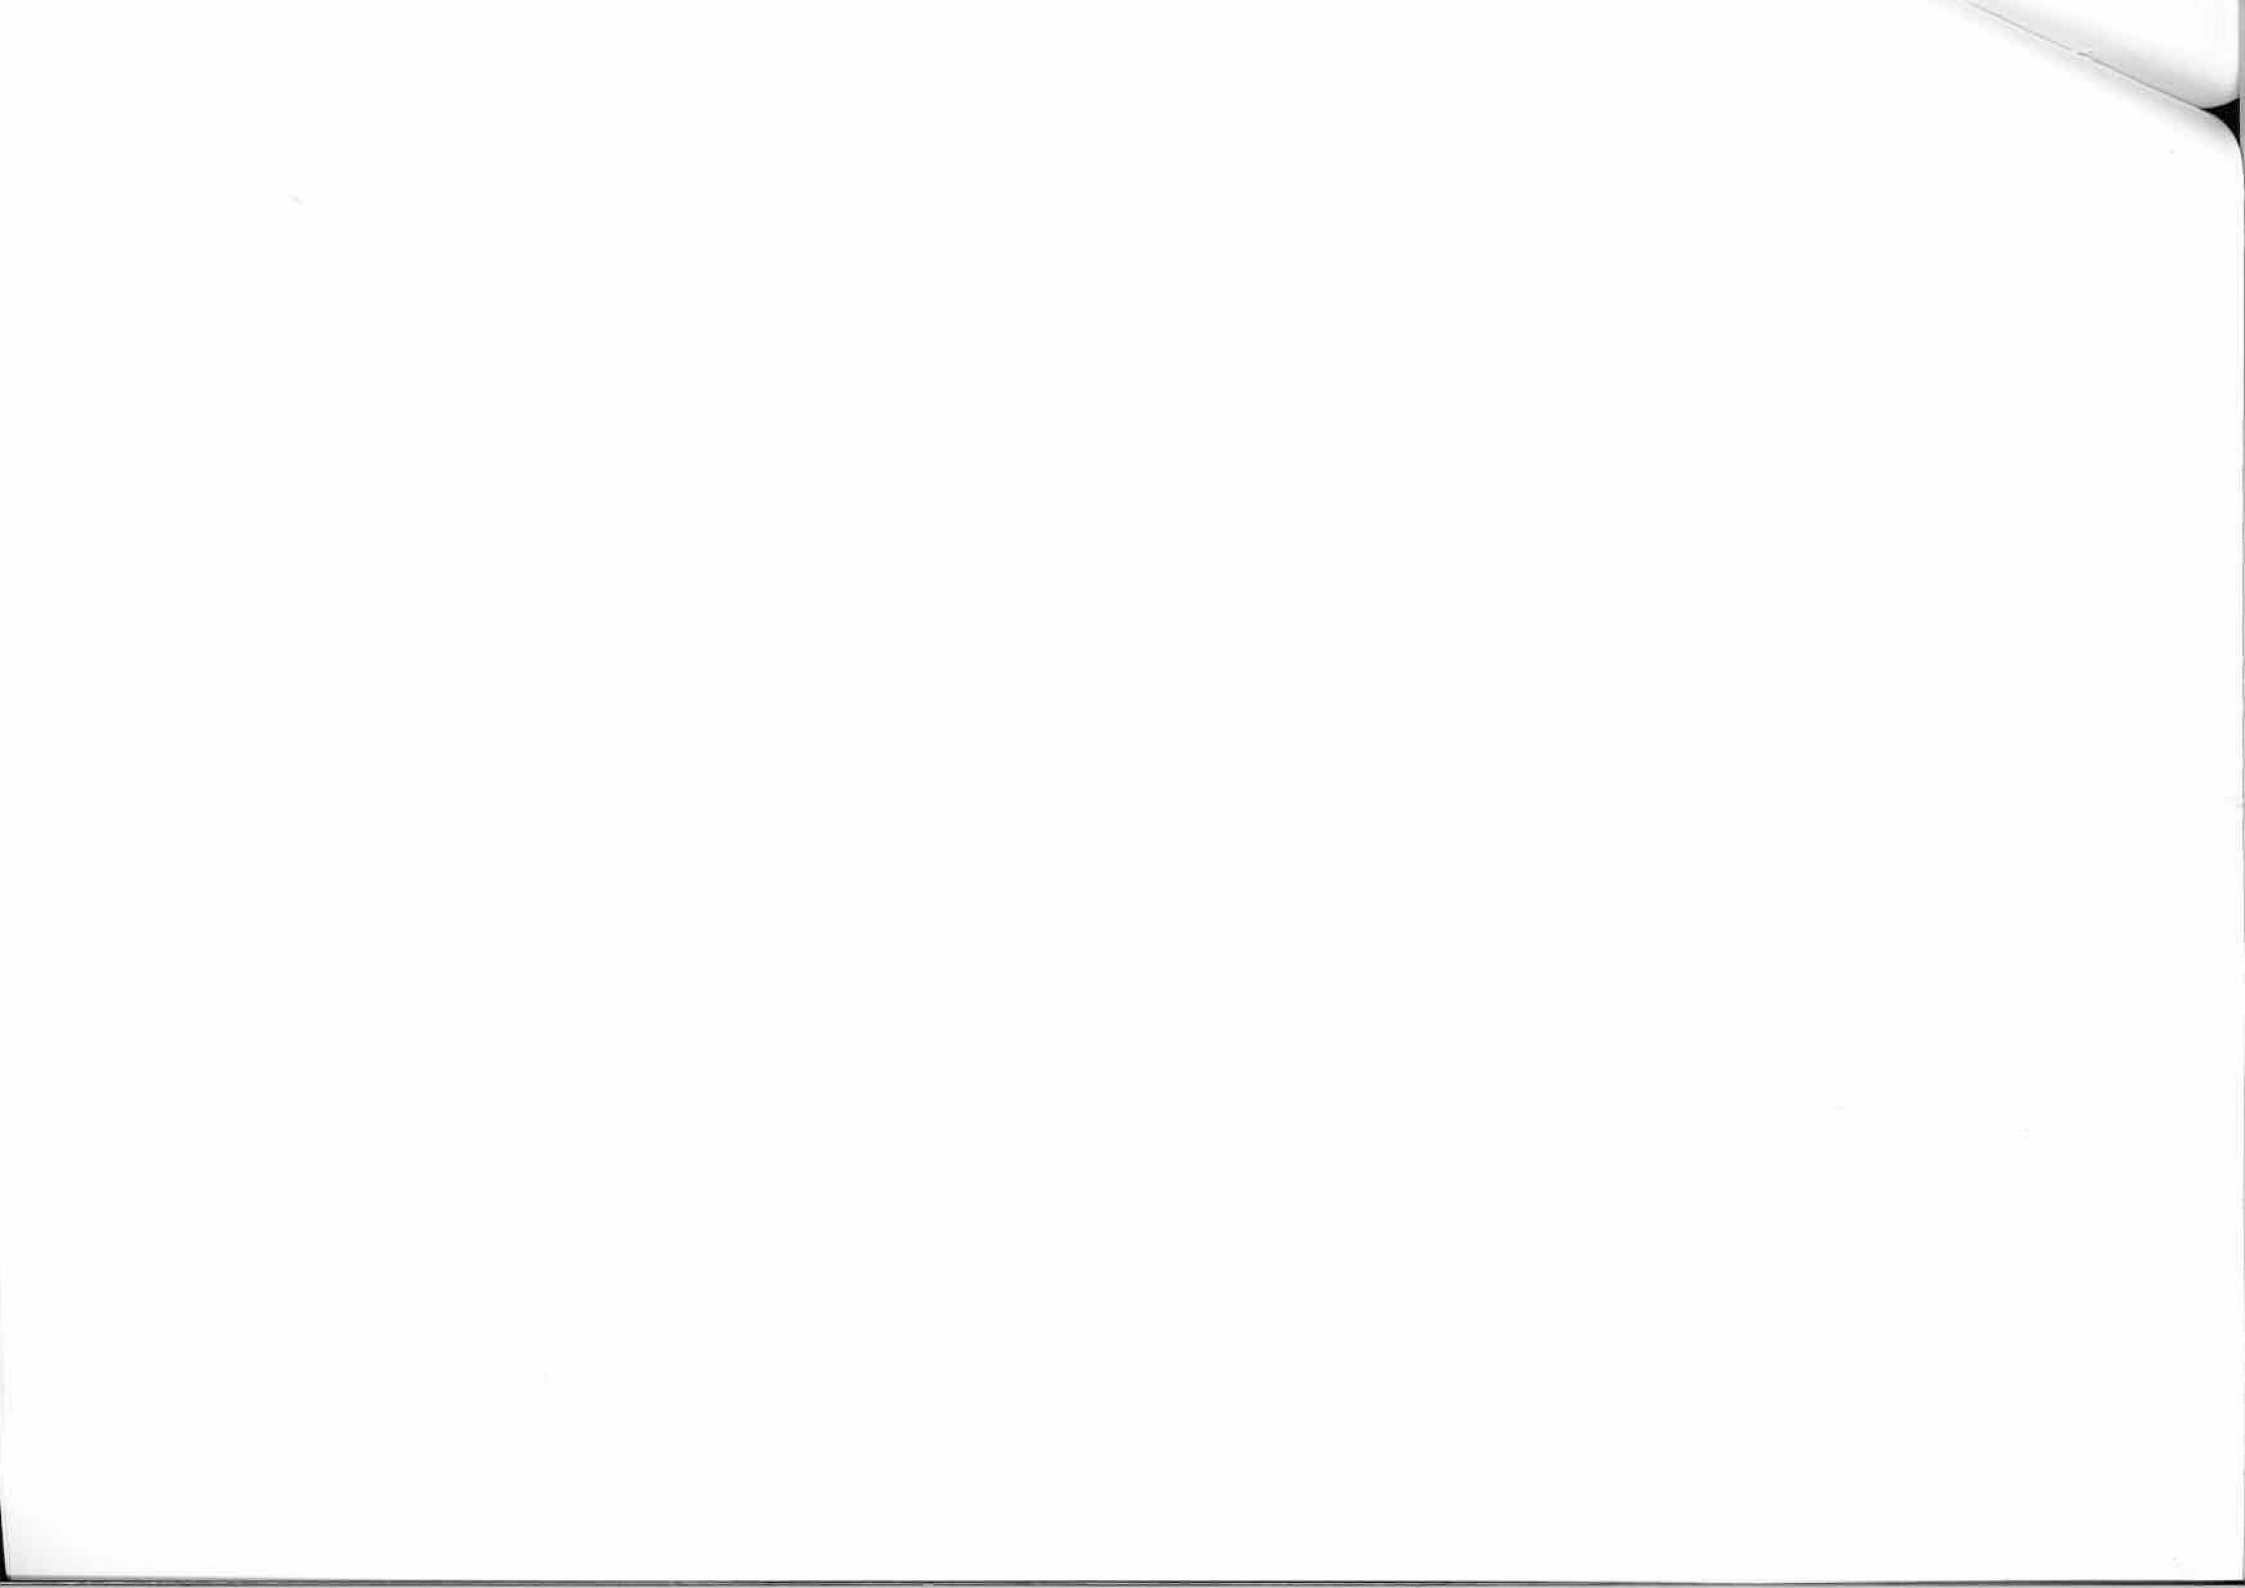






ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR¹

Správa Olomouc

Wolkerova 24a, 779 11 Olomouc

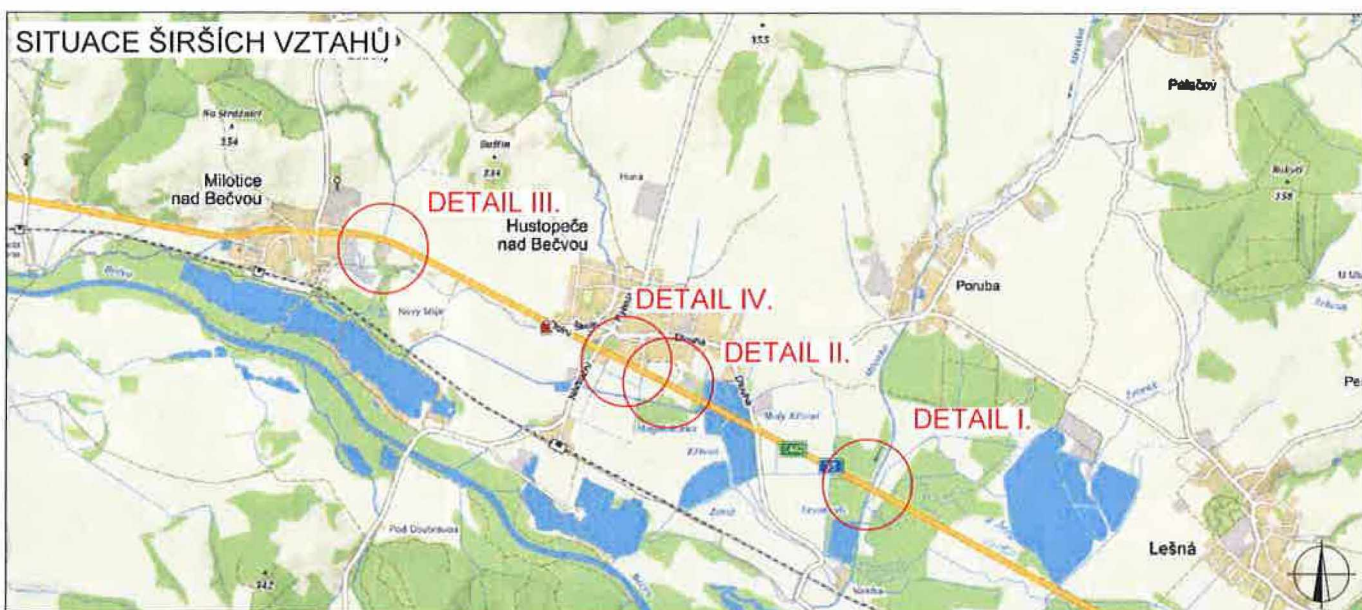

LEGENDA

-  DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍCH NEVYHOVUJÍCÍCH SVODIDEL
-  DOPLNĚNÍ OCELOVÝCH SVODIDEL JEDNOSTRANÝCH, ZÁDRŽNOST N2
-  DOPLNĚNÍ OCELOVÝCH SVODIDEL JEDNOSTRANÝCH, ZÁDRŽNOST H1
-  DOPLNĚNÍ OCELOVÝCH SVODIDEL JEDNOSTRANÝCH, ZÁDRŽNOST H2
-  HOSPODÁŘSKÝ SJEZD

SVODIDLA BUDOU DOPLNĚNA O SVODIDLOVÉ NÁDSTAVCE.

NA LÍCOVÉSTRANĚ SVODIDLOVÝCH NÁDSTAVCŮ BUDE DOPLNĚN PLAŠIČ ZVĚŘE VODOROVNÝ.

U HOSPODÁŘSKÝCH SJEZDŮ BUDE DOPLNĚN SMĚROVÝ SLOUPEK ČERVENÝ Z11g.

SOUČÁSTÍ ZVÝŠENÍ BEZPEČNOSTI NA SILNICI I/35 BUDE STRŽENÍ KRAJNICE V ŠÍŘI 0,5 m A DOSYPÁNÍ RECYKLÁTEM SE ZHTNĚNÍM

DETAIL I. - SITUACE DIO



DETAIL I. - FOTODOKUMENTACE




DETAIL II. - SITUACE DIO



DETAIL II. - FOTODOKUMENTACE



DETAIL III. - SITUACE DIO

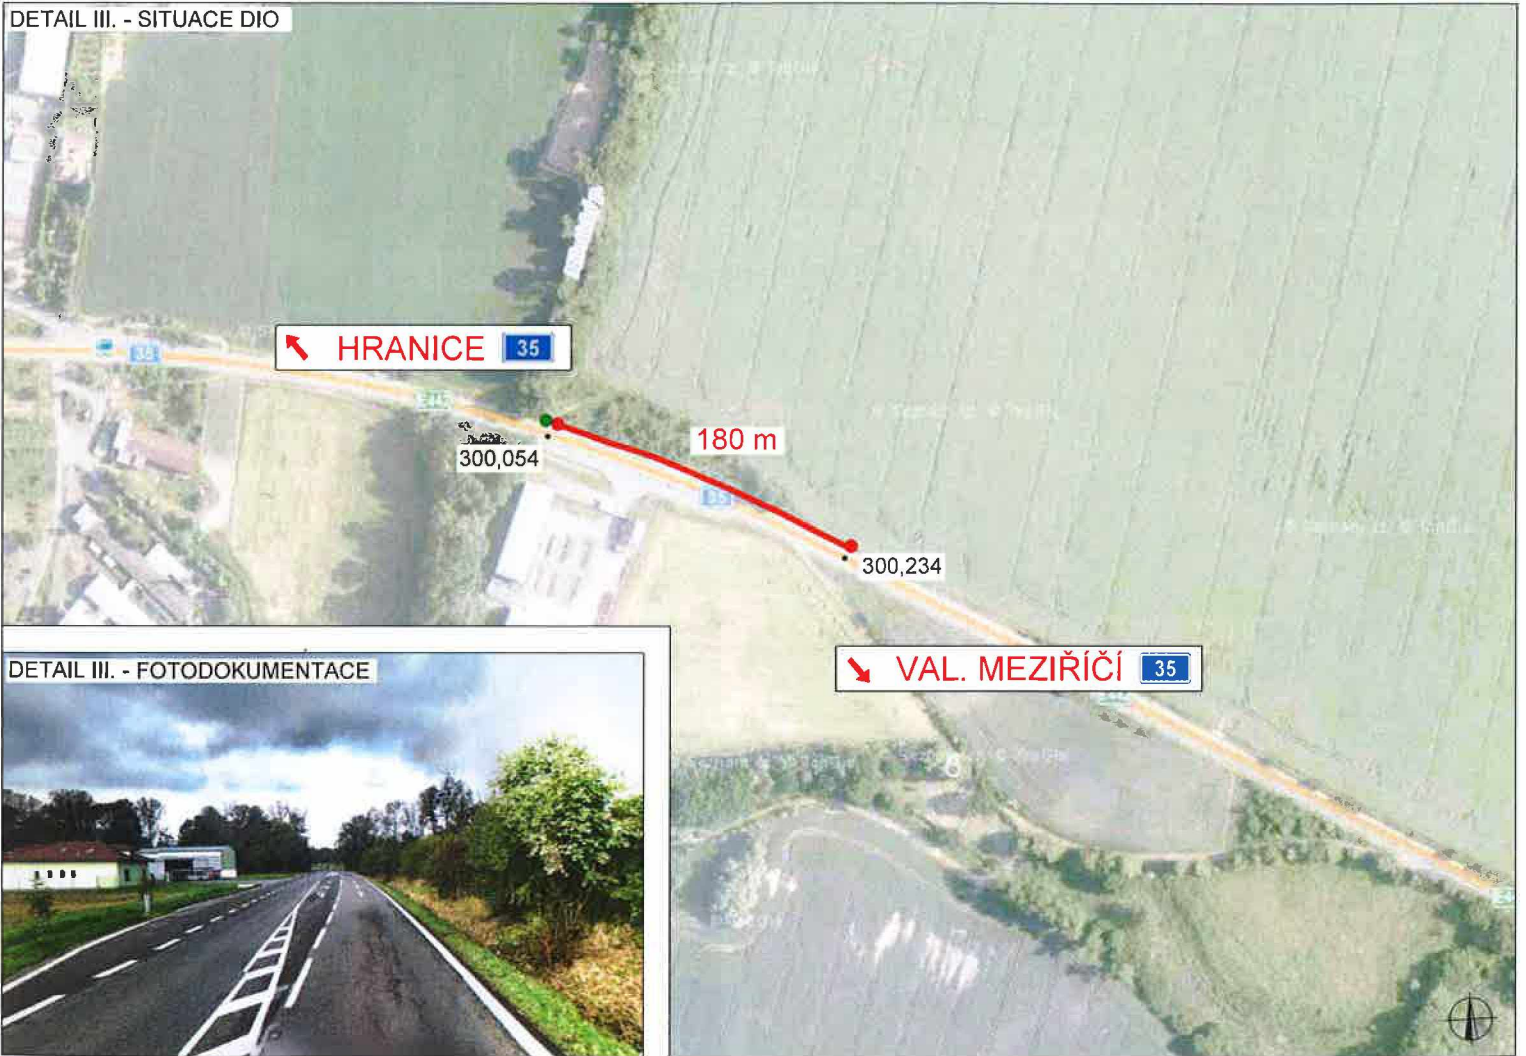

DETAIL III. - FOTODOKUMENTACE



DETAIL IV. - SITUACE DIO



DETAIL IV. - FOTODOKUMENTACE

