

Smlouva o dílo na ZHOTOVENÍ STAVBY**Název zakázky: „Zvýšení traťové rychlosti v úseku Golčův Jeníkov - Čáslav“**

Smluvní strany:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

oddíl A, vložka 48384

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy
na základě Pověření č. 1616 ze dne 12.7.2013

Korespondenční adresa:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9

(dále jen „Objednatel“)

číslo smlouvy: E618-S-1672/2016/Šim

ISPROFOND: 500 372 0049

a

„Společnost Čáslav“

Společník 1 nebo Správce

EUROVIA CS, a.s.

se sídlem: Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1

IČO: 45274924, DIČ: CZ45274924

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

oddíl B, vložka 1561

zastoupena: Ing. Miroslavem Trnkou, na základě plné moci

a

Společník 2

GJW Praha spol. s r.o.

se sídlem: Mezitraťová 137, 198 21 Praha 9 – Hloubětín

IČ: 41192869, DIČ: CZ41192869

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka č. 4528

Zastoupená: Ing. Milanem Koudelkou, jednatelem společnosti

a Ing. Zdeňkem Synáčkem, jednatelem společnosti

a

Společník 3

Porr a.s.

se sídlem: Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10

IČ: 43005560, DIČ: CZ43005560

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1006

zastoupená: Ing. Antonínem Daňou, členem představenstva

a Josefem Husarem, členem představenstva

Kontaktní a doručovací adresa a sídlo „Společnosti Čáslav“: EUROVIA ČS, a.s., odštěpný závod oblast Železniční stavby a mosty, závod Železniční stavby, Brožíkova 564, 530 09 Pardubice

(dále všichni též společně označováni jako jen „Zhotovitel“)

číslo smlouvy: 1524.6120380/ST

dnešního dne uzavřely tuto smlouvu (dále jen „Smlouva“) v souladu s ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“).

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v této Smlouvě obsažených a s úmyslem být touto Smlouvou vázány, dohodly se na následujícím znění Smlouvy:

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1 Objednatel prohlašuje, že je státní organizací, která vznikla k 1. 1. 2003 na základě zákona č. 77/2002 Sb., o akciové společnosti České dráhy, státní organizaci Správa železniční dopravní cesty, ve znění pozdějších předpisů, splňuje veškeré podmínky a požadavky v této Smlouvě stanovené a je oprávněn tuto Smlouvu uzavřít a řádně plnit povinnosti v ní obsažené.
- 1.2 Zhotovitel prohlašuje, že splňuje veškeré podmínky a požadavky v této Smlouvě stanovené a je oprávněn tuto Smlouvu uzavřít a řádně plnit povinnosti v ní obsažené.

- 1.3 Zhotovitel dále prohlašuje, že ke dni uzavření této Smlouvy není vůči němu vedeno řízení dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zavazuje se Objednatele bezodkladně informovat o všech skutečnostech o hrozícím úpadku, popř. o prohlášení úpadku jeho společnosti, stejně jako o změnách v jeho kvalitaci, kterou prokázal v rámci své nabídky na plnění Veřejné zakázky v dále uvedeném smyslu.
- 1.4 Zhotovitel dále prohlašuje, že se ke dni uzavření této Smlouvy řádně seznámil se všemi Interními předpisy Objednatele, které se týkají předmětného Díla, které jsou vymezeny v Technických kvalitativních podmínkách staveb státních drah.
- 1.5 Pojmy s velkým počátečním písmenem, které nejsou definovány v této Smlouvě, mají význam uvedený v obchodních podmínkách, které tvoří Přílohu č. 1 této Smlouvy (dále jen „**Obchodní podmínky**“).
- 1.6 V době uzavírání této Smlouvy probíhá u Objednatele zavádění informačního systému na řízení a monitoring staveb v otevřeném datovém formátu XML.
 - 1.6.1 Objednatel zašle Zhotoviteli do 7 dnů po uzavření Smlouvy aktualizovaný soupis prací v otevřeném datovém formátu XML, který bude mít strukturu dat dle datového předpisu XC4 (viz www.xc4.cz). Zhotovitel se zavazuje zaslat Objednateli do 14 dnů od obdržení tohoto soupisu prací oceněný soupis prací dle své Nabídky Zhotovitele (v listinné formě) v otevřeném datovém formátu XML. Soupis prací v otevřeném formátu XML může Zhotovitel také vyplnit v modulu pro ocenění nabídkové ceny na zabezpečeném serveru <https://www.xc4.cz/oceneni/>. Zhotovitel odpovídá za shodu obsahu listinné a elektronické formy oceněného soupisu prací.
 - 1.6.2 Zhotovitel se zavazuje, že bude Objednateli předávat následující sestavy v otevřeném datovém formátu XML (viz datový předpis XC4, www.xc4.cz):
 - daňový doklad,
 - souhrn fakturace,
 - soupis zjišťovacích protokolů,
 - zjišťovací protokoly.

2. ÚČEL SMLOUVY

- 2.1 Objednatel oznámil uveřejněním oznámení o zakázce ve Věstníku veřejných zakázek dne **7.12.2015** pod evidenčním číslem **527728** svůj úmysl zadat v otevřeném řízení veřejnou zakázku s názvem „**Zvýšení traťové rychlosti v úseku Golčův Jeníkov - Čáslav**“ (dále jen „**Veřejná zakázka**“). Na základě tohoto zadávacího řízení byla pro plnění Veřejné zakázky vybrána jako nejvhodnější nabídka Zhotovitele.
- 2.2 Účelem této Smlouvy je realizace předmětu plnění Veřejné zakázky dle zadávací dokumentace Veřejné zakázky (dále jen „**Zadávací dokumentace**“) a stanovení způsobu a podmínek její realizace pro Objednatele.
- 2.3 Zhotovitel touto Smlouvou garantuje Objednateli splnění předmětu Veřejné zakázky a všech z toho vyplývajících podmínek a povinností podle Zadávací dokumentace a Nabídky Zhotovitele. Tato garance je nadřazena ostatním

podmínkám a garancím uvedeným v této Smlouvě. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností to znamená, že:

- 2.3.1 v případě jakékoliv nejistoty ohledně výkladu ustanovení této Smlouvy budou tato ustanovení vykládána tak, aby v co nejširší míře zohledňovala účel Veřejné zakázky vyjádřený Zadávací dokumentací,
- 2.3.2 v případě chybějících ustanovení této Smlouvy budou použita dostatečně konkrétní ustanovení Zadávací dokumentace nebo Nabídky Zhotovitele,
- 2.3.3 Zhotovitel je vázán svou Nabídkou předloženou Objednateli v rámci zadávacího řízení na zadání Veřejné zakázky, která se pro úpravu vzájemných vztahů vyplývajících z této Smlouvy použije subsidiárně.

3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ SMLOUVY

- 3.1 Zhotovitel se zavazuje v souladu s touto Smlouvou zhotovit stavbu a vypracovat veškerou příslušnou dokumentaci související s prováděnou stavbou (dále jen „Dílo“).
- 3.2 Objednatel se zavazuje Zhotoviteli poskytnout veškerou nezbytnou součinnost k provedení Díla.
- 3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Díla, přičemž maximální Cena Díla zaokrouhlená na dvě desetinná místa je:

Cena Díla bez DPH: **724 254 504,40 Kč**

slovy: **sedmsetdvacetčtyřimilionydvěstěpadesátčtyřitisícipětsetčtyřikoruny české 40/100**

Rozpis Ceny Díla dle stavebních objektů (SO) a provozních souborů (PS) je uveden v Příloze č. 4 této Smlouvy.

- 3.4 Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ust. § 1765 odst. 2 a § 2620 odst. 2 občanského zákoníku. Tzn., že Zhotoviteli nevznikne vůči Objednateli při změně okolností právo domáhat se obnovení jednání o Smlouvě ani zvýšení Ceny za Dílo ani zrušení Smlouvy.
- 3.5 Objednatel prohlašuje, že je ve vztahu k přijatým plněním v rozsahu předmětu Díla, týkajících se výstavby, oprav a rekonstrukce železniční infrastruktury (zatříděných dle klasifikace produkce CZ-CPA pod kódy č. 41-43) na území České republiky, u nichž je mezi plátcí v tuzemsku uplatňován režim přenesení daňové povinnosti dle ust. § 92a, zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“), osobou povinnou k dani dle ust. § 5 odst. 1 zákona o DPH, neboť přijatá plnění použije pro svou ekonomickou činnost, a je tedy osobou povinnou přiznat a zaplatit DPH dle ust. § 92a odst. 1 zákona o DPH.

Smluvní strany se dohodly, že stane-li se Zhotovitel nespolehlivým plátcem, ve smyslu ust. § 106a, zákona o DPH, nebo daňový doklad Zhotovitele bude obsahovat číslo bankovního účtu, na který má být plněno, aniž by bylo uvedeno ve veřejném registru spolehlivých účtů, vedeném správcem daně, je Objednatel oprávněn z finančního plnění uhradit DPH přímo místně a věcně příslušnému správci daně Zhotovitele.

- 3.6 Zhotovitel se v souladu se svou nabídkou zavazuje dokončit a předat Objednateli Dílo nebo jeho jednotlivé části v termínech uvedených v harmonogramu obsaženém v Příloze č. 5 této Smlouvy (dále jen „**Harmonogram postupu prací**“), který je rozdělen dle jednotlivých stavebních objektů, provozních souborů či jiných částí plnění, přičemž zásadními termíny Harmonogramu postupu prací jsou následující:

Zahájení stavebních prací: po nabytí účinnosti Smlouvy

Celková lhůta pro provedení Díla činí celkem **15 měsíců** od zahájení stavebních prací (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil celé Dílo, je Předávací protokol dle odst. 10.4 Obchodních podmínek).

Lhůta pro dokončení stavebních prací činí celkem **13 měsíců** ode dne zahájení stavebních prací (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil stavební práce a předal Objednateli veškerá plnění připadající na tuto část Díla, je poslední Zápis o předání a převzetí Díla).

Předání posouzení interoperability, včetně zajištění všech souvisejících dokladů, podle ust. § 49b zákona 266/1994 Sb. ve znění pozdějších předpisů, předání osvědčení o bezpečnosti zpracovaného nezávislým posuzovatelem podle prováděcího nařízení Komise (EU) č. 402/2013 ze dne 30. dubna 2013 o společné bezpečnostní metodě pro hodnocení a posuzování rizik a o zrušení nařízení (ES) č. 352/2009, předání souborného zpracování geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby a kompletní technické části dokumentace skutečného provedení stavby bude provedeno nejpozději do **2 měsíců** ode dne podpisu posledního Zápisu o předání a převzetí Díla.

Lhůty stanovené v odst. 6.3.5 a 8.3.3 Všeobecných technických podmínek na realizaci a lhůty stanovené v odst. 2.10 a 2.11 Obchodních podmínek se v případě této Smlouvy nepoužijí.

- 3.7 Práva a povinnosti smluvních stran se řídí touto Smlouvou včetně jejích příloh. V případě jakéhokoli rozporu mezi textem této Smlouvy a textem jejích příloh se použije zvláštní úprava obsažená v textu této Smlouvy.
- 3.8 Ust. § 2605 odst. 1 a ust. § 2628 občanského zákoníku se nepoužije. Dílo je provedeno tehdy, je-li dokončeno řádně a včas a Objednatelům převzato sjednaným způsobem.
- 3.9 Místo plnění je dáno místem, v němž má být Dílo dle Projektu a příslušných veřejnoprávních povolení umístěno.

4. ZÁRUKY A DALŠÍ USTANOVENÍ

- 4.1 Bankovní záruka za provedení Díla dle čl. 14 Obchodních podmínek činí 3 % z Ceny Díla bez DPH uvedené v odst. 3.3 této Smlouvy, tj. **21 727 635,13 Kč**.
- 4.2 Písemný příslib banky dle odst. 2.15 Obchodních podmínek, kterým Zhotovitel prokáže, že má přístup k úvěrům a dalším finančním zdrojům činí minimálně 50 milionů Kč.
- 4.3 Částky za Dodatečné výluky dle odst. 3.16 Obchodních podmínek, které Zhotovitel musí uhradit Objednateli dle podmínek uvedených v Obchodních podmínkách, činí:

výluka trakčního vedení traťové koleje	5.000,-- Kč/ započatá hodina
výluka traťové koleje	10.000,-- Kč/ započatá hodina
výluka dvou a více traťových kolejí	20.000,-- Kč/ započatá hodina
výluka staničních kolejí – dopravní	5.000,-- Kč/ započatá hodina
výluka ostatních kolejí	1.000,-- Kč/ započatá hodina

5. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 5.1 Práva a povinnosti smluvních stran vyplývající z této Smlouvy se řídí občanským zákoníkem a ostatními příslušnými právními předpisy českého právního řádu.
- 5.2 Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
- 5.3 Tuto Smlouvu je možné měnit pouze písemnou dohodou smluvních stran ve formě číselovaných dodatků této Smlouvy, podepsaných za každou smluvní stranu osobou nebo osobami oprávněnými jednat za smluvní stranu.
- 5.4 Smluvní strany podpisem této smlouvy vylučují, že se při právním styku mezi smluvními stranami přihlíží k obchodním zvyklostem, které tak nemají přednost před ustanoveními zákona dle ust. § 558 odst. 2 občanského zákoníku.
- 5.5 Smluvní strany se dohodly, že možnost zhojení nedostatku písemné formy právního jednání se vylučuje, a že neplatnost právního jednání, pro něž si smluvní strany sjednaly písemnou formu, lze namítnout kdykoliv. Tzn., že mezi smluvními stranami neplatí ust. § 582 odst. 1 první věta a odst. 2 občanského zákoníku.
- 5.6 Žádné úkony či jednání ze strany Objednatele nelze považovat za příslib uzavření Smlouvy nebo dodatku k ní. V souladu s ust. § 1740 odst. 3 občanského zákoníku Objednatel nepřipouští přijetí návrhu na uzavření Smlouvy s dodatkem nebo odchylkou, čímž druhá smluvní strana podpisem Smlouvy souhlasí.
- 5.7 Veškerá práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy přecházejí, pokud to povaha těchto práv a povinností nevylučuje, na právní nástupce smluvních stran. Žádná ze stran není oprávněna převést jakákoliv práva či povinnosti nebo jejich část na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany.
- 5.8 Ukončením účinnosti této Smlouvy nejsou dotčena ustanovení Smlouvy ve znění jejích příloh týkající se licencí, záruk, nároků z odpovědnosti za vady, nároky z odpovědnosti za škodu a nároky ze smluvních pokut, pokud vznikly před ukončením účinnosti Smlouvy, ustanovení o ochraně informací, ani další ustanovení a nároky, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po zániku účinnosti této Smlouvy.
- 5.9 Pokud by se kterékoliv ustanovení této Smlouvy ukázalo být neplatným nebo nevynutitelným, nebo se jím stalo po uzavření této Smlouvy, pak tato skutečnost nepůsobí neplatnost ani nevynutitelnost ostatních ustanovení této Smlouvy, nevyplyvá-li z donucujících ustanovení právních předpisů jinak. Smluvní strany se zavazují bez zbytečného odkladu po výzvě kterékoliv strany takové neplatné či nevynutitelné ustanovení nahradit platným a vynutitelným ustanovením, které je svým obsahem nejbližší účelu neplatného či nevynutitelného ustanovení.
- 5.10 Tato Smlouva je vyhotovena v jedenácti vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží pět vyhotovení a Zhotovitel obdrží šest vyhotovení.

5.11 Zhotovitel podpisem této Smlouvy výslovně stvrzuje, že souhlasí se zveřejněním těla Smlouvy (tzn. bez jejích příloh s výjimkou Obchodních podmínek) na internetových stránkách Objednatele.

5.12 Součástí Smlouvy tvoří tyto přílohy:

Příloha č. 1: Obchodní podmínky – OP/R/07/15

Příloha č. 2: Technické podmínky:
a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb)

b) Všeobecné technické podmínky realizace stavby – VTP/R/06/15

c) Zvláštní technické podmínky

Příloha č. 3: Související dokumenty

Příloha č. 4: Rozpis Ceny Díla

Příloha č. 5: Harmonogram postupu prací

Příloha č. 6: Oprávněné osoby

Příloha č. 7: Seznam požadovaných pojištění

Příloha č. 8: Seznam subdodavatelů

Příloha č. 9: Kopie plné moci pro pana Ing. Miroslava Trnku

Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho k ní připojují svoje podpisy.

V Praze dne 21. 6. 2016

V Pardubicích dne - 9 -06- 2016






Příloha č. 3
Související dokumenty

- projekt stavby – METROPROJEKT a.s. (aktualizovaný 12/2015)
- posuzovací protokol projektu stavby č.j. 17411/2015-SŽDC-SSZ-ÚT1-Sei ze dne 19.10.2015

Výše uvedené dokumenty jsou na přiloženém DVD, které je nedílnou součástí této Smlouvy.

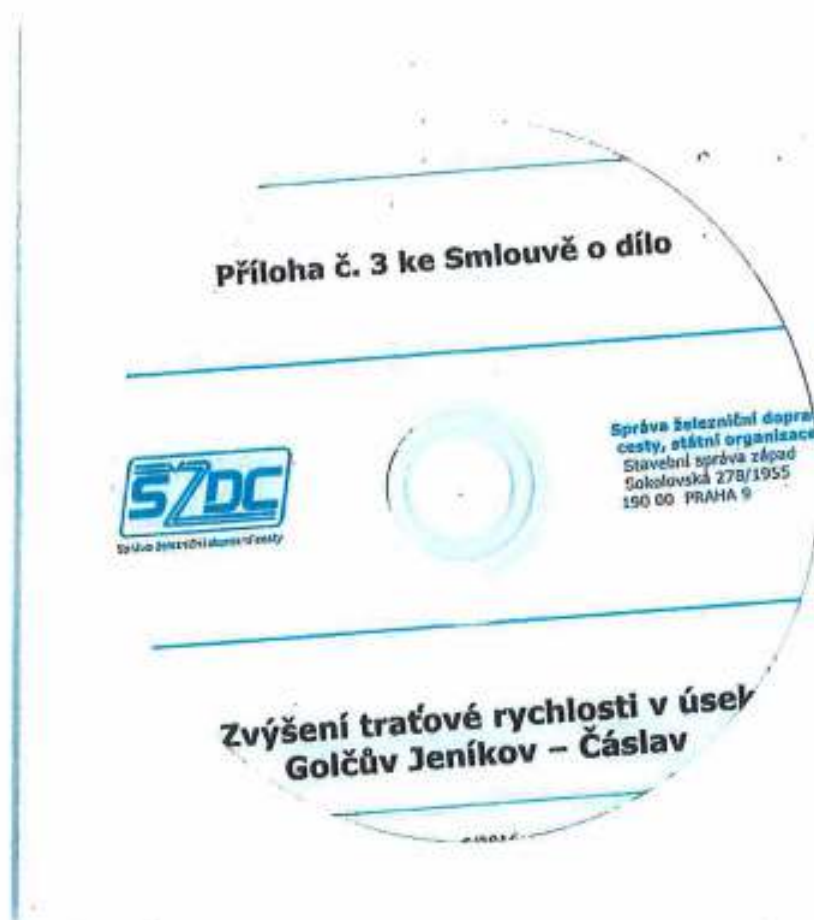

Příloha č. 4
Rozpis Ceny Díla

- **Rozpis Ceny Díla dle stavebních objektů (SO) a provozních souborů (PS):**

stavba			Investiční rozpočet [Kč]	Cum stavby [Kč]
Zvýšení traťové rychlosti v úseku Golčův Jeníkov - Čáslav			724 254 504,40	724 254 504,40
Číslo objektu	Název objektu	Budoucí majitel	Cena objektu [Kč]	Cena typu objektu [Kč]
D.1 Železniční zabezpečovací zařízení				135 396 920,43
PS 01-01-01	ZST Golčův Jeníkov, úprava stávajícího zabezpečovacího zařízení			
PS 03-01-01	ZST Čáslav, úprava stávajícího zabezpečovacího zařízení			
PS 02-01-01A	Golčův Jeníkov - Čáslav, traťové zab. zařízení, Část A - definiční TZZ			
PS 02-01-01B	Golčův Jeníkov - Čáslav, traťové zab. zařízení, Část B - provozní TZZ			
PS 02-01-01C	Golčův Jeníkov - Čáslav, traťové zab. zařízení, Část C - kóvalizace			
D.2 Železniční sdělovací zařízení				7 849 477,26
PS 02-02-01	Golčův Jeníkov - Čáslav, výměna TK			
PS 02-02-02	Golčův Jeníkov - Čáslav, doplnění přenosového systému			
PS 02-07-01	Golčův Jeníkov - Čáslav, zastávka Hroky u Čáslavi, rozlišovací zařízení			
PS 02-07-02	Golčův Jeníkov - Čáslav, zastávka Hroky u Čáslavi, informační systém pro cestující			
E.1.1 Železniční svršek a spodek				421 275 739,80
SO 02-10-01	Golčův Jeníkov - Čáslav, železniční svršek			
SO 02-11-01	Golčův Jeníkov - Čáslav, železniční spodek			
SO 02-10-01	Golčův Jeníkov - Čáslav, výškoví a značení svršk			
E.1.2 Nástupiště, rampy				5 053 814,35
SO 02-14-01	Golčův Jeníkov - Čáslav, zastávka Hroky u Čáslavi, vnější nástupiště			
E.1.3 Železniční přejezdy				12 660 919,72
SO 02-13-01	Golčův Jeníkov - Čáslav, železniční přejezd ev. km 268,327 (silnice III/33726), část SŽDC			
SO 02-13-02	Golčův Jeníkov - Čáslav, železniční přejezd ev. km 268,327 (silnice III/33726), část KSOÚK SK			
SO 02-13-11	Golčův Jeníkov - Čáslav, železniční přejezd ev. km 268,797 (silnice III/33726), část SŽDC			
SO 02-13-12	Golčův Jeníkov - Čáslav, železniční přejezd ev. km 268,797 (silnice III/33726), část KSOÚK SK			
SO 02-13-21	Golčův Jeníkov - Čáslav, železniční přejezd ev. km 270,160 (silnice III/33727), část SŽDC			
SO 02-13-22	Golčův Jeníkov - Čáslav, železniční přejezd ev. km 270,160 (silnice III/33727), část KSOÚK SK			
SO 02-13-31	Golčův Jeníkov - Čáslav, železniční přejezd ev. km 271,861 (silnice III/33825), část SŽDC			
SO 02-13-32	Golčův Jeníkov - Čáslav, železniční přejezd ev. km 271,861 (silnice III/33825), část KSOÚK SK			
SO 02-13-41	Golčův Jeníkov - Čáslav, železniční přejezd ev. km 273,272 (účelová komunikace), část SŽDC			
SO 02-13-51	Golčův Jeníkov - Čáslav, železniční přejezd ev. km 275,224 (silnice III/33723), část SŽDC			
SO 02-13-52	Golčův Jeníkov - Čáslav, železniční přejezd ev. km 275,224 (silnice III/33723), část KSOÚK SK			
E.1.4 Propustky, mosty, lávky a zdi				22 965 905,38
SO 02-20-01	Golčův Jeníkov - Čáslav, most v ev. km 270,854			
SO 02-21-01	Golčův Jeníkov - Čáslav, propustek v ev. km 268,219			
SO 02-21-02	Golčův Jeníkov - Čáslav, propustek v ev. km 268,792			
SO 02-21-03	Golčův Jeníkov - Čáslav, propustek v ev. km 268,802			
SO 02-21-04	Golčův Jeníkov - Čáslav, propustek v ev. km 269,015			
SO 02-21-05	Golčův Jeníkov - Čáslav, propustek v ev. km 270,142			
SO 02-21-06	Golčův Jeníkov - Čáslav, propustek v ev. km 271,432			
SO 02-21-07	Golčův Jeníkov - Čáslav, propustek v ev. km 272,413			
SO 02-21-08	Golčův Jeníkov - Čáslav, propustek v ev. km 274,856			
SO 02-21-09	Golčův Jeníkov - Čáslav, propustek v ev. km 275,611			
SO 02-21-10	Golčův Jeníkov - Čáslav, propustek v ev. km 276,255			
E.1.5 Ostatní inženýrské objekty				14 999 533,39
SO 02-73-01	Golčův Jeníkov - Čáslav, ochrana DK SŽDC Havlíčkův Brod - Kolín během stavby			
SO 02-73-02	Golčův Jeníkov - Čáslav, zařízení provozu ŽOK ČD-Trnava			
SO 02-73-03	Golčův Jeníkov - Čáslav, ochrana sdělovacího kabelu Telefonica v km 270,601, během stavby			
SO 02-73-05	Golčův Jeníkov - Čáslav, ochrana DOK SŽDC (GSM-R) během stavby			
SO 02-73-06	Golčův Jeníkov - Čáslav, ochrana sdělovacího kabelu Telefonica v km 271,600, během stavby			
SO 02-73-07	Golčův Jeníkov - Čáslav, ochrana sdělovacích kabelů METRO a UPC v km 273,068 během stavby			
SO 02-73-08	Golčův Jeníkov - Čáslav, ochrana sdělovacího kabelu Telefonica v km 275,271 během stavby			
E.1.6 Potrubní vedení				366 074,66
SO 02-70-01	Golčův Jeníkov - Čáslav, ochrana kanalizace VHS Kutná Hora v km 275,105 během stavby			
SO 02-71-01	Golčův Jeníkov - Čáslav, ochrana vodovodu VHS Kutná Hora v km 272,958 během stavby			
SO 02-71-02	Golčův Jeníkov - Čáslav, ochrana vodovodu VHS Kutná Hora v km 275,108 během stavby			
SO 02-72-01	Golčův Jeníkov - Čáslav, ochrana STL plynovodu RWE v km 271,860 během stavby			
SO 02-72-03	Golčův Jeníkov - Čáslav, ochrana STL plynovodu RWE v km 275,201 během stavby			
SO 02-75-01	Golčův Jeníkov - Čáslav, ochrana ropovodu Družba (MERCO) v km 273,064 během stavby			
E.2.1 Pozemní objekty budov				227 676,50
SO 02-40-01	Golčův Jeníkov - Čáslav, doplnění oplotení			
SO 03-40-01	ZST Čáslav, modernizace mělnosti měrných v provozní budově			
E.2.2 Přístřešky na nástupištích				387 860,44
SO 02-41-01	Golčův Jeníkov - Čáslav, zastávka Hroky u Čáslavi, přístřešky pro cestující			

Číslo objektu	Název objektu	Budoucí majitel	Cena objektu [Kč]	Cena typu objektu [Kč]
E.2.3 Individuální protihluková opatření				367 916,32
SO 02-51-01	Gočův Jarůvek - Čáslav, individuální protihluková opatření	OSTATNÍ	367 916,32	
E.2.4 Orientační systém				153 506,20
SO 02-43-01	Gočův Jarůvek - Čáslav, zastávka Horky u Čáslavi, orientační systém	SŽDC	153 506,20	
E.2.5 Demolice				209 242,63
SO 02-45-01	Gočův Jarůvek - Čáslav, demolice	SŽDC	209 242,63	
E.3.1 Trakční vedení				85 395 379,74
SO 02-60-01	Gočův Jarůvek - Čáslav, trakční vedení koleje č. 1			
SO 02-60-02	Gočův Jarůvek - Čáslav, trakční vedení koleje č. 2			
E.3.6 Rozvody vn, nn, osvětlení a dálkové ovládání odpojovačů				4 706 889,15
SO 01-62-01	ZST Gočův Jarůvek, nn napájení RD v km 297,532			
SO 02-62-01	Gočův Jarůvek - Čáslav, nn napájení PZS v km 259,327			
SO 02-62-02	Gočův Jarůvek - Čáslav, nn napájení PZS v km 268,797			
SO 02-62-03	Gočův Jarůvek - Čáslav, nn napájení PZS v km 270,150			
SO 02-62-04	Gočův Jarůvek - Čáslav, zastávka Horky u Čáslavi, obnova venkovního osvětlení a rozvodů nn			
SO 02-62-05	Gočův Jarůvek - Čáslav, nn napájení PZS v km 271,891			
SO 02-62-06	Gočův Jarůvek - Čáslav, nn napájení PZS v km 273,272			
SO 02-62-07	Gočův Jarůvek - Čáslav, nn napájení PZS v km 275,224			
SO 02-63-01	Gočův Jarůvek - Čáslav, rozvod 6 kV			
E.3.7 Uklejování kovových konstrukcí				4 248 380,72
SO 02-61-01	Gočův Jarůvek - Čáslav, uklejování vodních konstrukcí	SŽDC	4 248 380,72	
E.3.8 Vnější uzemnění				188 525,33
SO 01-61-11	ZST Gočův Jarůvek, uzemnění provozní budovy			
SO 03-61-11	ZST Čáslav, uzemnění provozní budovy			
E.4 Ostatní stavební objekty				3 137 468,85
SO 99-80-01	Odstavení železničního vozidla			
Všeobecný objekt				4 663 273,53
SO 99-98-00	Všeobecný objekt	SŽDC	4 663 273,53	
Dělení majetku:				
0200				
0017110				
Kontrolní součet [Kč]			724 254 504,40	

Příloha č. 5**Harmonogram postupu prací**

Do přílohy smlouvy bude vloženo grafické znázornění postupu prací (Harmonogram postupu prací) předložené v nabídce uchazeče podle odst. 10.1 Pokynů pro dodavatele.

Příloha č. 6
Oprávněné osoby

Za Objednatele:

- ve věcech smluvních a obchodních:

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	SŽDC s.o., Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955, Praha 9
E-mail	██████████
Telefon	██████████

- ve věcech technických:

Jméno a příjmení	██████████
E-mail	██████████
Telefon	██████████
Fax	██████████

- technický dozor stavebníka (TDS):

Jméno a příjmení	██████████
E-mail	██████████
Telefon	██████████
Fax	██████████

- ve věcech geodetických:

Jméno a příjmení	██████████
E-mail	██████████
Telefon	██████████

- koordinátor BOZP:

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	SŽDC s.o., Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955, Praha 9
E-mail	██████████
Telefon	██████████

Za Zhotovitele:

- ve věcech smluvních a obchodních:

Jméno a příjmení	Ing. Miroslav Trnka, ředitel odštěpného závodu oblast Železniční stavby a mosty
Adresa	Brožíkova 564, 530 09 Pardubice
E-mail	██████████
Telefon	██████████
Fax	██████████

- ve věcech technických:

Jméno a příjmení	I ██████████
Adresa	Brožíkova 564, 530 09 Pardubice
E-mail	██████████
Telefon	██████████
Fax	██████████

- stavbyvedoucí:

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	Brožíkova 564, 530 09 Pardubice
E-mail	██████████
Telefon	██████████
Fax	██████████

- zástupce stavbyvedoucího:

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	Porr a.s., Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10
E-mail	██████████
Telefon	██████████
Fax	—

- specialista (vedoucí prací) na železniční svršek a spodek:

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	Mezitraťová 137/46, 198 21 Praha 9 - Hloubětín
E-mail	██████████
Telefon	██████████

Fax	---
-----	-----

- specialista (vedoucí prací) na mosty a inženýrské konstrukce:

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	Brožíkova 564, 530 09 Pardubice
E-mail	██████████
Telefon	██████████
Fax	██████████

- specialista na pozemní stavby (vedoucí prací):

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	Brožíkova 564, 530 09 Pardubice
E-mail	██████████
Telefon	██████████
Fax	██████████

- specialista (vedoucí prací) na sdělovací a zabezpečovací zařízení:

Jméno a příjmení	I ██████████
Adresa	████████████████████
E-mail	██████████
Telefon	██████████
Fax	---

- specialista (vedoucí prací) na trakční vedení a silnoproud:

Jméno a příjmení	I ██████████
Adresa	Elektrizace železnic Praha a.s., nám. Hrdinů 1693/4a, 140 00 Praha 4 - Nusle
E-mail	██████████
Telefon	██████████
Fax	██████████

- osoba odpovědná za kontrolu kvality:

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	Brožíkova 564, 530 09 Pardubice
E-mail	██████████
Telefon	██████████

Fax	
-----	--

- osoba odpovědná za oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci:

Jméno a příjmení	
Adresa	Brožíkova 564, 530 09 Pardubice
E-mail	
Telefon	
Fax	

- osoba odpovědná za ochranu životního prostředí:

Jméno a příjmení	
Adresa	Brožíkova 564, 530 09 Pardubice
E-mail	
Telefon	
Fax	

- osoba odpovědná za odpadové hospodářství:

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	
Fax	

- úředně oprávněný zeměměřický inženýr:

Jméno a příjmení	
Adresa	Brožíkova 564, 530 09 Pardubice
E-mail	
Telefon	
Fax	

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních a obchodních jsou oprávněny v rámci této Smlouvy vést s druhou stranou jednání obchodního a smluvního charakteru.

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických a realizačních jsou oprávněny v rámci této Smlouvy vést s druhou stranou jednání technického charakteru. Dále jsou oprávněny provádět činnosti a úkony, o nichž to stanoví tato Smlouva.

Příloha č. 7
Seznam požadovaných pojištění

- Objednatel vyžaduje, aby Zhotovitel v souladu se Smlouvou prokázal následující pojištění:

DRUH POJIŠTĚNÍ	MINIMÁLNÍ VÝŠE POJISTNÉHO PLNĚNÍ
Pojištění Díla minimálně proti poškození nebo zničení požárem, výbuchem, úderem blesku a nárazem nebo zřícením letadla, povodní, záplavou, víchřicí, krupobitím, sesuvem půdy, zřícením skal či zemin, lavinami, pádem stromů, stožárů a jiných předmětů, zemětřesením, tíhou sněhu a námrazy, vodou vytékající z vodovodních zařízení a dále pro případ odcizení nebo úmyslného poškození stavebních součástí, a to včetně pojištění stavebních a montážních výkonů.	724.254.504,40 Kč
Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Zhotovitelem při výkonu podnikatelské činnosti třetím osobám	50.000.000,00 Kč

Příloha č. 8
Seznam subdodavatelů

IDENTIFIKACE SUBDODAVATELE (obchodní firma, sídlo a IČO)	VĚCNÝ ROZSAH SUBDODÁVKY	HODNOTA SUBDODÁVKY V % Z CELKOVÉ CENY DÍLA
ŽSD a.s., Brněnská 1050, 664 42 Modřice, IČ: 64511359	Odpadové hospodářství	4,78
EUROVIA Services, s.r.o., Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČ: 61250210	Laboratorní zkoušky, technická pomoc	0,05
První SaZ Plzeň a.s., Wenzigova 8, 301 00 Plzeň, IČ: 26329921	Železniční zabezpečovací a sdělovací zařízení	19,58
Elektrizace železnic Praha a.s., nám. Hrdinů 1693/4a, 140 00 Praha; IČ: 47115921	Trakční vedení, rozvody VN, NN	11,47
Ecological Consulting a.s., Na Střelnici 343/48, 449 00 Olomouc – Lazce, IČ: 25873962	Posouzení bezpečnosti, analýza a hodnocení rizik, hlukové měření	0,023
CELKEM %		35,903

Příloha č. 9**Plná moc**

Kopie plné moci pro pana Ing. Miroslava Trnku



PLNÁ MOC

EUROVIA CS, a.s.

se sídlem Národní 138/10, 110 00 Praha 1, IČO 45274924,
zapsané do Obchodního rejstříku vedeným Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1561

udělují plnou moc pro svého zaměstnance, ředitele odštěpného závodu oblast Železniční
stavby a mosty

Ing. Miroslava Trnku
[Redacted Signature]

k zastupování ve věci zakázky

„Zvýšení traťové rychlosti v úseku Golčův Jeníkov - Čáslav ”

Jmenovaný je oprávněn ke všem úkonům, které souvisejí se získáním a realizací výše
uvedené zakázky včetně uzavření smlouvy o dílo a jejich případných dodatků.

V Praze dne

[Redacted Signature]
