

**Smlouva o dílo na ZHOTOVENÍ PROJEKTU STAVBY, VÝKON
AUTORSKÉHO DOZORU PROJEKTANTA PŘI REALIZACI STAVBY A
REALIZACI STAVBY**

**„Doplnění počítačů náprav pro zajištění volnosti v lokalitě
Praha“**

Smluvní strany:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

se sídlem: Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

oddíl A, vložka 48384

zastoupena: Ing. Luborem Hrubešem, ředitelem Stavební správy Západ

Korespondenční adresa:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9

(dále jen „Objednatel“)

číslo smlouvy: E 618-S-5018/2014

ISPROFIN: 327 321 4993/5003540010

a

AŽD Praha s.r.o.

se sídlem: Žirovnická 2/3146, 106 17 Praha 10

IČO: 48029483, DIČ: CZ48029483

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

oddíl C, vložka 14616

zastoupena: Ing. Petrem Faltusem, obchodním ředitelem, na základě plné moci

(dále jen „Zhotovitel“)

číslo smlouvy: 140 - PVO/2014

dnešního dne uzavřely tuto smlouvu (dále jen „Smlouva“) v souladu s ust. § 2586 a násl. zákona
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“).

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v této Smlouvě obsažených a s úmyslem být touto Smlouvou vázány, dohodly se na následujícím znění Smlouvy:

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1 Objednatel prohlašuje, že je státní organizací, která vznikla k 1.1.2003 na základě zákona č. 77/2002 Sb., o akciové společnosti České dráhy, státní organizaci Správa železniční dopravní cesty, ve znění pozdějších předpisů, splňuje veškeré podmínky a požadavky v této Smlouvě stanovené a je oprávněn tuto Smlouvu uzavřít a řádně plnit povinnosti v ní obsažené.
- 1.2 Zhotovitel prohlašuje, že splňuje veškeré podmínky a požadavky v této Smlouvě stanovené a je oprávněn tuto Smlouvu uzavřít a řádně plnit povinnosti v ní obsažené.
- 1.3 Zhotovitel dále prohlašuje, že ke dni uzavření této Smlouvy není vůči němu vedeno řízení dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů a zavazuje se Objednatele bezodkladně informovat o všech skutečnostech o hrozícím úpadku, popř. o prohlášení úpadku jeho společnosti, stejně jako o změnách v jeho kvalifikaci, kterou prokázal v rámci své nabídky na plnění Veřejné zakázky v dále uvedeném smyslu.
- 1.4 Zhotovitel dále prohlašuje, že se ke dni uzavření této Smlouvy řádně seznámil se všemi Interními předpisy Objednatele, které se týkají předmětného Díla, které jsou vymezeny v Technických kvalitativních podmínkách staveb státních drah.
- 1.5 Pojmy s velkým počátečním písmenem, které nejsou definovány v této Smlouvě, mají význam uvedený v obchodních podmínkách, které tvoří Přílohu č. 1 této Smlouvy (dále jen „**Obchodní podmínky**“).

2. ÚČEL SMLOUVY

- 2.1 Objednatel oznámil uveřejněním výzvy vč. obeslání 5 zájemcům na webu zadavatele dne 4.11.2014 pod evidenčním číslem ID 4904 svůj úmysl zadat podlimitní veřejnou zakázku s názvem „**Doplnění počítačů náprav pro zajištění volnosti v lokalitě Praha**“ (dále jen „**Veřejná zakázka**“). Na základě tohoto zadávacího řízení byla pro plnění Veřejné zakázky vybrána jako nejvhodnější nabídka Zhotovitele.
- 2.2 Účelem této Smlouvy je realizace předmětu plnění Veřejné zakázky dle zadávací dokumentace Veřejné zakázky (dále jen „**Zadávací dokumentace**“) a stanovení způsobu a podmínek její realizace pro Objednatele.
- 2.3 Zhotovitel touto Smlouvou garantuje Objednateli splnění předmětu Veřejné zakázky a všech z toho vyplývajících podmínek a povinností podle Zadávací dokumentace a Nabídky Zhotovitele. Tato garance je nadřazena ostatním podmínkám a garancím uvedeným v této Smlouvě. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností to znamená, že:
 - 2.3.1 v případě jakékoliv nejistoty ohledně výkladu ustanovení této Smlouvy budou tato ustanovení vykládána tak, aby v co nejširší míře zohledňovala účel Veřejné zakázky vyjádřený Zadávací dokumentací,
 - 2.3.2 v případě chybějících ustanovení této Smlouvy budou použita dostatečně konkrétní ustanovení Zadávací dokumentace nebo Nabídky Zhotovitele,

- 2.3.3 Zhotovitel je vázán svou Nabídkou předloženou Objednateli v rámci zadávacího řízení na zadání Veřejné zakázky, která se pro úpravu vzájemných vztahů vyplývajících z této Smlouvy použije subsidiárně.

3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ SMLOUVY

- 3.1 Zhotovitel se zavazuje v souladu s touto Smlouvou zhotovit Projekt stavby, zhotovit stavbu a vypracovat veškerou příslušnou dokumentaci související s prováděnou stavbou (dále jen „Dílo“).
- 3.2 Předmětem plnění veřejné zakázky jsou stavební práce, jejichž součástí je projektová a inženýrská činnost.

Projektem se ve smyslu přílohy č. 5 vyhlášky č. 146/2008 Sb., ve znění pozdějších předpisů, rozumí projektová dokumentace, která pro stavby drah a na dráze v jednom stupni zahrnuje dokumentaci pro stavební povolení nebo k oznámení ve zkráceném řízení a dokumentaci pro provádění stavby. Součástí projekčních prací jsou veškeré činnosti a doklady zajišťující komplexní veřejnoprávní projednání, projednání s vlastníky dotčených nemovitostí a zajištění všech potřebných podkladů a certifikátů nutných k vydání stavebního povolení, a to na základě plné moci Objednatele. Součástí povinností Zhotovitele dle této Smlouvy je i výkon autorského dozoru projektanta, kterým bude zajištěn soulad provádění stavby s ověřenou a projednanou projektovou dokumentací, ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů za podmínek stanovených v této Smlouvě.

Projekt bude detailně určovat stavbu do technických, ekonomických a architektonických podrobností, hmotové, materiálové, stavebnětechnické, technologické, dispoziční a provozní vlastnosti a jakost, dále bude zohledňovat vliv stavby na životní prostředí a umožní vyhotovení soupisu prací s výkazem výměr a podrobný položkový rozpočet jednotlivých SO a PS a souhrnný rozpočet jako podklad pro schválení Projektu ve stupni dokumentace pro stavební povolení.

Zhotovitel v rámci zpracování Projektu zajistí zpracování podkladů pro realizaci stavby v potřebném množství a podobě (projektová dokumentace ve schválené podobě, soupisy prací).

Zhotovitel stavby zajistí zpracování žádostí o potřebná stavební povolení a zajistí vydání stavebního povolení, nebo oznámení ve zkráceném řízení.

Zhotovitel zpracuje potřebné podklady a zajistí posouzení a prohlášení o shodě notifikovanou osobou (subsystém energie, infrastruktury a traťového řízení a zabezpečení) dle dopisu MD ČR č. j. 15/2012-130-INF/1 ze dne 22.10.2012 a jeho přílohy č. 1.

- 3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Díla, přičemž maximální Cena Díla je:

Cena Díla bez DPH: **20 981 292,- Kč**

slovy: **dvacetmilionůdevětsetosmdesátjednatísícdvěstědevadesátdvakorun českých**

Rozpis Ceny Díla dle ceny za zpracování Projektu, spolu se samostatně uvedenou cenou autorského dozoru projektanta a ceny za provedení stavby dle stavebních objektů (SO) a provozních souborů (PS) je uveden v Příloze č. 4 této Smlouvy.

- 3.4 Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ust. § 1765 odst. 2 a § 2620 odst. 2 občanského zákoníku. Tzn., že Zhotoviteli nevznikne vůči Objednateli při změně okolností právo domáhat se obnovení jednání o Smlouvě ani zvýšení Ceny za Dílo ani zrušení Smlouvy.
- 3.5 Objednatel prohlašuje, že je ve vztahu k přijatým plněním v rozsahu předmětu Díla, týkajících se výstavby, oprav a rekonstrukce železniční infrastruktury (zatříděných dle klasifikace produkce CZ-CPA pod kódy č. 41-43) na území České republiky, u nichž je mezi plátcí v tuzemsku uplatňován režim přenesení daňové povinnosti dle ust. § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“) osobou povinnou k dani dle ust. § 5 odst. 1 zákona o DPH, neboť přijatá plnění použije pro svou ekonomickou činnost, a je tedy osobou povinnou přiznat a zaplatit DPH dle ust. § 92a odst. 1 zákona o DPH.
- 3.6 Smluvní strany se dohodly, že stane-li se Zhotovitel nespolehlivým plátcem, ve smyslu ust. § 106a, zákona o DPH nebo daňový doklad Zhotovitele bude obsahovat číslo bankovního účtu, na který má být plněno, aniž by bylo uvedeno ve veřejném registru spolehlivých účtů, vedeném správcem daně, je Objednatel oprávněn z finančního plnění uhradit DPH přímo místně a věcně příslušnému správci daně Zhotovitele.
- 3.7 Zhotovitel je povinen postupovat při provádění Díla s odbornou péčí, na vlastní nebezpečí a s výjimkami plynoucími z této Smlouvy na svůj náklad a samostatně. Tato povinnost se vztahuje k Dílu jako k celku. Zhotovitel není oprávněn požadovat jakékoliv změny Smlouvy ve vztahu k rozsahu a povaze Díla či jeho Ceně pokud by plynuly z porušení jeho povinností při provádění dříve realizovaných částí Díla. Zhotovitel zejména není oprávněn žádat změny Díla v podobě víceprací, jejichž potřeba vyvstane v důsledku vad, chyb nepřesností či jiných nedostatků Projektu. Veškeré překážky a obtíže vzniklé z důvodů popsaných v tomto odstavci je Zhotovitel povinen překonat samostatně, na vlastní nebezpečí a na vlastní náklad a bez nároku na přiměřené zvýšení Ceny Díla, přerušení prací na Díle či úpravu Harmonogramu postupu prací, ust. § 2594 a § 2627 občanského zákoníku se pro tyto případy nepoužijí.
- 3.8 Zhotovitel se v souladu se svou nabídkou zavazuje dokončit a předat Objednateli Dílo nebo jeho jednotlivé části v termínech uvedených v harmonogramu obsaženém v Příloze č. 5 této Smlouvy (dále jen „**Harmonogram postupu prací**“), který je rozdělen na část zahrnující zpracování Projektu, včetně zajištění vydání stavebního povolení s nabytím právní moci, a na část zahrnující realizaci stavby dle jednotlivých stavebních objektů, provozních souborů či jiných částí plnění, přičemž zásadní termíny Harmonogramu postupu prací jsou následující:

Zahájení činnosti Zhotovitele: po nabytí účinnosti Smlouvy

Lhůta pro dokončení projektu stavby: do 30.1.2015

Zahájení stavebních prací: od 27.02.2015

Lhůta pro dokončení stavebních prací: do **30.11.2015** (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil práce na Díle a předal Objednateli veškerá plnění připadající na Dílo, je poslední Zápis o předání a převzetí Díla). Tato lhůta zůstane zachována i v případě, že Zhotoviteli vznikne nárok na změnu Harmonogramu postupu prací podle odst. 3.5.5.2 Obchodních podmínek.

- 3.9 Objednatel se zavazuje Zhotoviteli poskytnout veškerou nezbytnou součinnost k provedení Díla.
- 3.10 Práva a povinnosti smluvních stran se řídí touto Smlouvou včetně jejích příloh. V případě jakéhokoliv rozporu mezi textem této Smlouvy a textem jejích příloh se použije zvláštní úprava obsažená v textu této Smlouvy.
- 3.11 Ust. § 2605 odst. 1 a ust. § 2628 občanského zákoníku se nepoužije. Dílo je provedeno tehdy, je-li dokončeno řádně a včas a Objednatelem převzato sjednaným způsobem.

4. ZÁRUKY A DALŠÍ USTANOVENÍ

- 4.1 Záruka za provedení díla se nevyžaduje. Ustanovení dle čl. 14 Obchodních podmínek se v případě této Smlouvy nepoužijí.
- 4.2 Písemný příslib banky dle odst. 2.15 Obchodních podmínek, kterým Zhotovitel prokáže, že má přístup k úvěrům a dalším finančním zdrojům činí minimálně 20 milionů Kč.
- 4.3 Částky za Dodatečné výluky dle odst. 3.16 Obchodních podmínek, které Zhotovitel musí uhradit Objednateli dle podmínek uvedených v Obchodních podmínkách, činí:

výluka trakčního vedení traťové koleje	5.000,-- Kč/ započatá hodina
výluka traťové koleje	10.000,-- Kč/ započatá hodina
výluka dvou a více traťových kolejí (přerušen provoz)	20.000,-- Kč/ započatá hodina
výluka staničních kolejí - dopravní	5.000,-- Kč/ započatá hodina
výluka ostatních kolejí	1.000,-- Kč/ započatá hodina

5. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 5.1 Práva a povinnosti smluvních stran vyplývající z této Smlouvy se řídí občanským zákoníkem a ostatními příslušnými právními předpisy českého právního řádu.
- 5.2 Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího uzavření.
- 5.3 Tuto Smlouvu je možné měnit pouze písemnou dohodou smluvních stran ve formě číslovaných dodatků této Smlouvy, podepsaných za každou smluvní stranu osobou nebo osobami oprávněnými jednat za smluvní stranu.
- 5.4 Smluvní strany podpisem této smlouvy vylučují, že se při právním styku mezi smluvními stranami přihlíží k obchodním zvyklostem, které tak nemají přednost před ustanoveními zákona dle ust. § 558 odst. 2 občanského zákoníku.
- 5.5 Smluvní strany se dohodly, že možnost zhojení nedostatku písemné formy právního jednání se vylučuje, a že neplatnost právního jednání, pro nějž si smluvní strany sjednaly písemnou formu, lze namítnout kdykoliv. Tzn., že mezi smluvními stranami neplatí ust. § 582 odst. 1 první věta a odst. 2 občanského zákoníku.
- 5.6 Žádné úkony či jednání ze strany Objednatele nelze považovat za příslib uzavření Smlouvy nebo dodatku k ní. V souladu s ust. § 1740 odst. 3 občanského zákoníku

Objednatel nepřipouští přijetí návrhu na uzavření Smlouvy s dodatkem nebo odchylkou, čímž druhá smluvní strana podpisem Smlouvy souhlasí.

- 5.7 Veškerá práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy přecházejí, pokud to povaha těchto práv a povinností nevylučuje, na právní nástupce smluvních stran. Žádná ze stran není oprávněna převést jakákoliv práva či povinnosti, nebo jejich část na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany.
- 5.8 Ukončením účinnosti této Smlouvy nejsou dotčena ustanovení Smlouvy ve znění jejích příloh týkající se licencí, záruk, nároků z odpovědnosti za vady, nároky z odpovědnosti za škodu a nároky ze smluvních pokut, pokud vznikly před ukončením účinnosti Smlouvy, ustanovení o ochraně informací, ani další ustanovení a nároky, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po zániku účinnosti této Smlouvy.
- 5.9 Pokud by se kterékoliv ustanovení této Smlouvy ukázalo být neplatným nebo nevynutitelným, nebo se jím stalo po uzavření této Smlouvy, pak tato skutečnost nepůsobí neplatnost ani nevynutitelnost ostatních ustanovení této Smlouvy, nevyplyvá-li z donucujících ustanovení právních předpisů jinak. Smluvní strany se zavazují bez zbytečného odkladu po výzvě kterékoliv strany takové neplatné či nevynutitelné ustanovení nahradit platným a vynutitelným ustanovením, které je svým obsahem nejbližší účelu neplatného či nevynutitelného ustanovení.
- 5.10 Tato Smlouva je vyhotovena v šesti vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží čtyři vyhotovení a Zhotovitel obdrží dvě vyhotovení.
- 5.11 Zhotovitel podpisem této Smlouvy výslovně stvrzuje, že souhlasí se zveřejněním těla Smlouvy (tzn. bez jejích příloh s výjimkou Obchodních podmínek) na internetových stránkách Objednatele.
- 5.12 Součástí Smlouvy tvoří tyto přílohy:

Příloha č. 1: Obchodní podmínky – OP/PR/05/14

Příloha č. 2: Technické podmínky:

a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb)

b) Všeobecné technické podmínky část 1 - projekt stavby VTP/P-PR/02/14

c) Všeobecné technické podmínky část 2 - realizace stavby VTP/R-PR/04/14

d) Zvláštní technické podmínky

Příloha č. 3: Související dokumenty

Příloha č. 4: Rozpis Ceny Díla

Příloha č. 5: Harmonogram postupu prací

Příloha č. 6: Oprávněné osoby

Příloha č. 7: Seznam požadovaných pojištění

Příloha č. 8: Seznam subdodavatelů

Příloha č. 9: Ověřená kopie plné moci obchodního ředitele


Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho k ní připojují svoje podpisy.

V Praze dne 2. 12. 2014



Příloha č. 3
Související dokumenty

- Přípravné dokumentace staveb zpracované společností - První SaZ Plzeň a.s.,
- posuzovací protokol přípravné dokumentace stavby, č.j.: 13933/2014/SSZ-ÚT2-TM ze dne 16.09.2014.
- posuzovací protokol přípravné dokumentace stavby, č.j.: 13934/2014/SSZ-ÚT2-TM ze dne 16.09.2014.

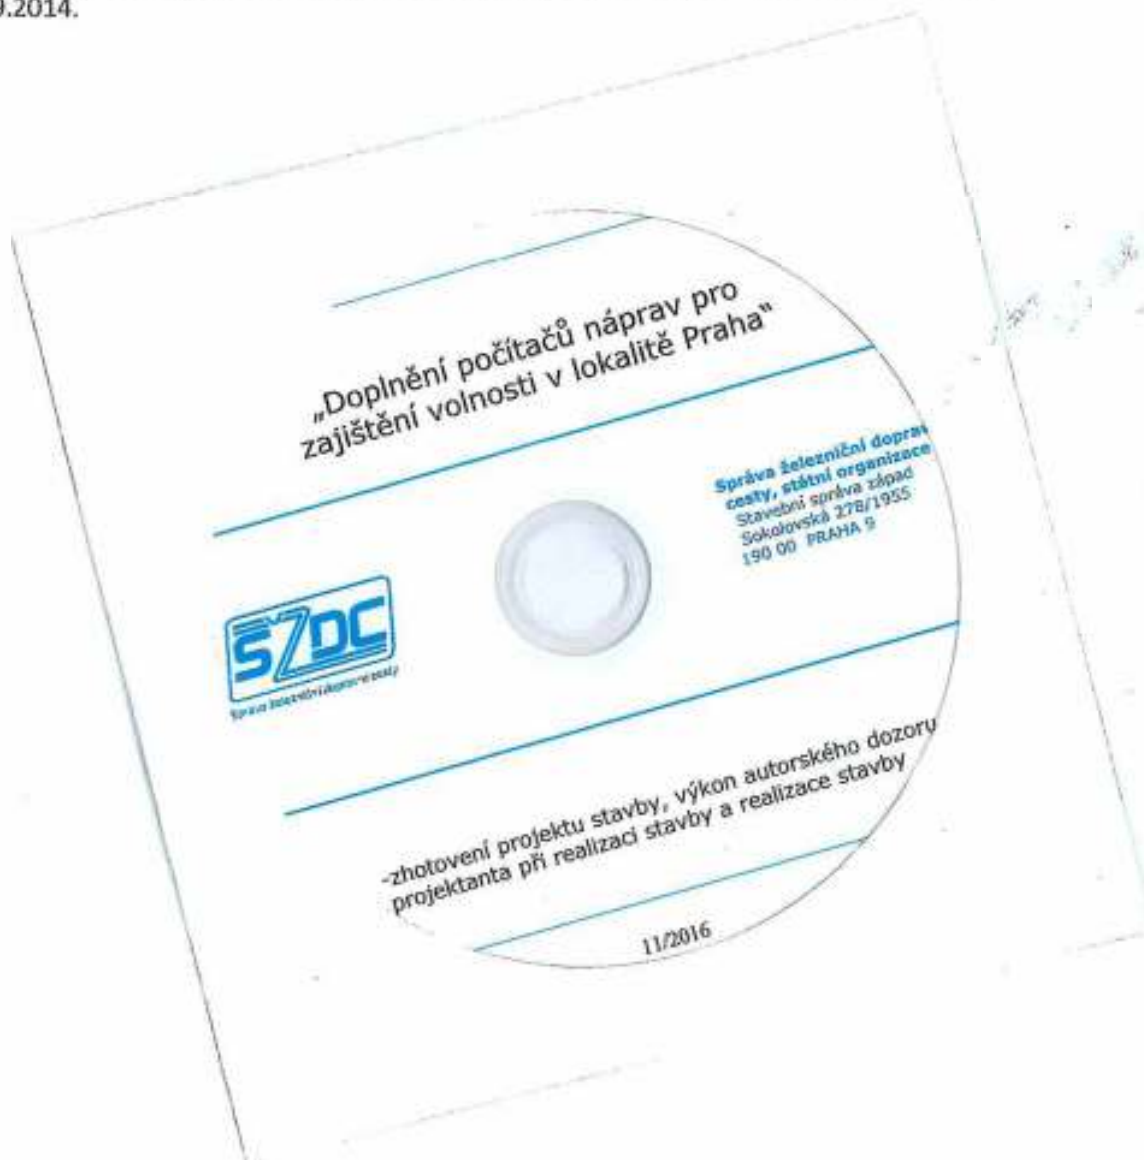

Příloha č. 4
Rozpis Ceny Díla

- Rozpis Ceny Díla na cenu za zpracování Projektu stavby (P), cenu za výkon autorského dozoru (AD) a cenu za zhotovení stavby (RS) dle stavebních objektů (SO) a provozních souborů (PS):

Do přílohy Smlouvy bude vložena tabulka Rozpis Ceny Díla předložená v nabídce uchazeče podle požadavku zadavatele stanoveného v článku 7 Výzvy k podání nabídky.

U ceny za výkon autorského dozoru Zhotovitel uvede maximální a nepřekročitelnou cenu za výkon autorského dozoru s uvedením hodinové sazby po celou dobu výkonu.

- **CENA DÍLA - REKAPITULACE**

Smluvní cena celkem bez DPH ve výši 20 981 292 Kč

Část z Ceny Díla za zpracování Projektu stavby (dále též „P“):

Smluvní cena za P bez DPH 1 404 000 Kč

Část z Ceny Díla za výkon autorského dozoru (dále též „AD“):

Smluvní cena za AD bez DPH 126 000 Kč při sazbě 650 Kč/h

Část z Ceny Díla za zhotovení stavby (dále též „RS“):

Smluvní cena za RS bez DPH 19 451 292 Kč

Rozpis jednotlivých
položek Ceny Díla podle
členění na Dílčí etapy
zpracování Projektu a
výkon autorského dozoru

<u>Specifikace položky</u>	<u>Cena položky Kč (bez DPH)</u>	<u>Cena položky Kč (s DPH)</u>	<u>Podíl z Ceny díla</u>
1. Dílčí etapa	1 404 000,-	1 698 840,-	6,7%
Z toho:			
Stavba č. 1	874 400,-	1 058 024,-	
Stavba č. 2	529 600,-	640 816,-	
2. Dílčí etapa	bez fakturace	bez fakturace	
3. Dokončení díla	19 577 292,-	23 688 523,-	93,3%
Z toho:			
Stavba č. 1	12 192 599,-	14 753 045	
Stavba č. 2	7 384 693,-	8 935 478	
Celkem:	20 981 292,-	25 387 363,-	100%

DPH: 21%

Harmonogram plnění

<u>Část Díla</u>	<u>Termín plnění</u> (nejzazší termín pro předání příslušné části Díla)	<u>Popis činnosti prováděných v Dílčí etapě</u>	<u>Podmínky dokončení Dílčí etapy</u>
Datum zahájení prací	ihned po podpisu SOD	-	-
1. Dílčí etapa	do 30.1.2015	Předání kompletního Projektu ke stavebnímu povolení	Protokol o provedení Díla,
2. Dílčí etapa	do 27.02.2015	Nabytí právní moci ohlášení stavby	Ohlášení stavby v právní moci, předané Objednateli
Termín dokončení Díla	do 30.11.2015	Předání díla objednavateli. Zahájení i zkušebního provozu	Po ukončení přejímacího řízení Stavby a předložení výkazu poskytnutých služeb (o výkonu autorského dozoru projektanta)

Stavba č. 1: Doplnění počítačů náprav pro zajištění volnosti v lokalitě Praha, 1. Stavba

Stavba č. 2: Doplnění počítačů náprav pro zajištění volnosti v lokalitě Praha, 2. Stavba

Stavba: Doplnění počítačů náprav pro zajištění volnosti v lokalitě Praha, 1. stavba

Obor	PS, SO	Číslo objektu	Název objektu	Vlastník	Cena bez DPH
D	TECHNOLOGICKÁ ČÁST				
	PS	2011	ŽST Choceň, doplnění PN z důvodu EZŠ	SŽDC	
	PS	2021	ŽST Záběh nad Labem, doplnění PN z důvodu EZŠ	SŽDC	
	PS	2031	ŽST Poděbrady, doplnění PN z důvodu EZŠ	SŽDC	
	PS	2041	ŽST Bohušovice nad Ohří, doplnění PN z důvodu EZŠ	SŽDC	
	PS	2051	ŽST Teplice v Čechách, doplnění PN z důvodu EZŠ	SŽDC	
	PS	2061	ŽST Hoštejn, doplnění PN z důvodu EZŠ	SŽDC	
			Celkem Technologická část		11 660 699,24
E	STAVEBNÍ ČÁST				
			Celkem Stavební část		0,00

Stavba: Doplnění počítačů náprav pro zajištění volnosti v lokalitě Praha, 2. stavba

Obor	PS, SO	Číslo objektu	Název objektu	Vlastník	Cena bez DPH
D	TECHNOLOGICKÁ ČÁST				
	PS	2111	ŽST Krasíkov, doplnění PN z důvodu EZŠ	SŽDC	
	PS	2121	ŽST Strančice, doplnění PN z důvodu EZŠ	SŽDC	
	PS	2131	ŽST Hluboká nad Vltavou, doplnění PN z důvodu EZŠ	SŽDC	
			Celkem Technologická část		7 062 592,31
E	STAVEBNÍ ČÁST				
			Celkem Stavební část		0,00

	REKAPITULACE				
D	Celkem Technologická část celého souboru staveb (PS)				18 723 291,55
E	Celkem Stavební část celého souboru staveb (SO)				0,00
	Celkem SO + PS				18 723 291,55
	Celkem všeobecné položky				2 258 000,00
	Nabídková cena celkem				20 981 291,55

Stavba: Doplnění počítačů náprav pro zajištění volnosti v lokalitě Praha

VŠEOBECNÉ POLOŽKY PRO CELÝ SOUBOR STAVEB

Číslo položky.	Popis položky	Měrná jednotka	Množství	Sazba za jednotku	Celkem bez DPH
1.	Projekt stavby	■	■	■	■
2.	Autorský dozor	■	■	■	■
3.	Zajištění stavebního povolení	■	■	■	■
4.	Geometrické plány a věcná břemena	■	■		
5.	Geodetická dokumentace skutečného provedení	■	■	■	■
6.	Digitální dokumentace skutečného provedení stavby	■	■	■	■
7.	Dokumentace skutečného provedení stavby	■	■	■	■
8.	Zajištění osvědčení o bezpečnosti podle nařízení komise (ES) č 352/2009	■	■	■	■
	CELKOVÝ SOUČET Všeobecných položek				2 258 000,00

Uchazeč

Datum

Podpis

Příloha č. 5
Harmonogram postupu prací

viz příloha

Harmonogram časový a finančního plnění

Stavba: Doplnění počítačů náprav pro zajištění volnosti v lokalitě Praha

	12/2014	01/2015	02/2015	03/2015	04/2015	05/2015	06/2015	07/2015	08/2015	09/2015	10/2015	11/2015
Projekt stavby a zajištění stavebního povolení												
Správní řízení												
PS 2011 ŽST Choceň, doplnění PN z důvodu EZŠ												
PS 2021 ŽST Záběhovice nad Labem, doplnění PN z důvodu EZŠ												
PS 2031 ŽST Poděbrady, doplnění PN z důvodu EZŠ												
PS 2041 ŽST Bohušovice nad Ohří, doplnění PN z důvodu EZŠ												
PS 2051 ŽST Teplice v Čechách, doplnění PN z důvodu EZŠ												
PS 2061 ŽST Hoštejn, doplnění PN z důvodu EZŠ												
PS 2111 ŽST Krasíkov, doplnění PN z důvodu EZŠ												
PS 2121 ŽST Strančice, doplnění PN z důvodu EZŠ												
PS 2131 ŽST Hluboká nad Vltavou, doplnění PN z důvodu EZŠ												
Finanční plnění v mil. Kč			1,5							3,7		15,8

Příloha č. 6
Oprávněné osoby

Za Objednatele:

- ve věcech smluvních a obchodních:

Jméno a příjmení	██████████
E-mail	██████████
Telefon	██████████████████

- ve věcech technických:

Jméno a příjmení	██████████
E-mail	██████████
Telefon	██████████████████

- technický dozor stavebníka (TDS):

Jméno a příjmení	██████████
E-mail	██████████
Telefon	██████████

- ve věcech přípravy stavby – projekční činnost:
 - Náměstek ředitele příslušné stavební správy pro techniku a jím pověřený zástupce

Jméno a příjmení	██████████
E-mail	██████████
Telefon	██████████████████

- ve věcech realizace stavby:
 - Náměstek ředitele příslušné stavební správy pro investice a jím pověřený zástupce

Jméno a příjmení	██████████
E-mail	██████████
Telefon	██████████████████

- ve věcech geodetických:

Jméno a příjmení	██████████
E-mail	██████████
Telefon	██████████

Fax	
-----	--

▪ **Koordinátor BOZP na staveništi:**

Jméno a příjmení	
Adresa	-----
E-mail	
Telefon	
Fax	-----

Za Zhotovitele:

▪ **ve věcech smluvních a obchodních:**

Jméno a příjmení	Ing. Petr Faltus
Adresa	Žirovnická 2/3146, 106 17 Praha 10
E-mail	
Telefon	
Fax	

▪ **ve věcech smluvních (mimo podpisu této SOD a jejích případných dodatků):**

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

▪ **projekt manager:**

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

▪ odpovědný projektant:

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	████████████████████
E-mail	██████████
Telefon	██████████
Fax	██████████

▪ hlavní stavbyvedoucí:

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	████████████████████
E-mail	██████████
Telefon	██████████

▪ zástupce stavbyvedoucího:

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	████████████████████
E-mail	██████████
Telefon	██████████

▪ úředně oprávněný zeměměřičský inženýr:

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	██ ██████████
E-mail	██████████
Telefon	██████████
Fax	██████████

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních a obchodních jsou oprávněny v rámci této Smlouvy vést s druhou stranou jednání obchodního a smluvního charakteru.

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických a realizačních jsou oprávněny v rámci této Smlouvy vést s druhou stranou jednání technického charakteru. Dále jsou oprávněny provádět činnosti a úkony, o nichž to stanoví tato Smlouva.

Příloha č. 7

Seznam požadovaných pojištění

- Objednatel vyžaduje, aby Zhotovitel v souladu se Smlouvou prokázal následující pojištění:

DRUH POJIŠTĚNÍ	MINIMÁLNÍ VÝŠE POJISTNÉHO PLNĚNÍ
Pojištění Dila minimálně proti poškození nebo zničení požárem, výbuchem, úderem blesku a nárazem nebo zřícením letadla, povodní, záplavou, víchřicí, krupobitím, sesuvem půdy, zřícením skal či zemin, lavinami, pádem stromů, stožárů a jiných předmětů, zemětřesením, tíhou sněhu a námrazy, vodou vytékající z vodovodních zařízení a dále pro případ odcizení nebo úmyslného poškození stavebních součástí, a to včetně pojištění stavebních a montážních výkonů.	20 981 292.- Kč Pojistná smlouva č. 7720783000 u Kooperativa pojišťovna, a.s.
Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Zhotovitelem při výkonu podnikatelské činnosti třetím osobám	Česká pojišťovna a.s. - Certifikát pojištění (limit pojištění 101 000 000,- Kč)

Příloha č. 8

Seznam subdodavatelů

IDENTIFIKACE SUBDODAVATELE (obchodní firma, sídlo a IČO)	VĚCNÝ ROZSAH SUBDODÁVKY	HODNOTA SUBDODÁVKY V % Z CELKOVÉ CENY DÍLA
První SaZ Plzeň a.s., Wenzigova 79/8, 301 00 Plzeň – Východní Předměstí IČO 263 29 921	zhotovení projektové dokumentace pro stavební povolení včetně projednání s investorem, dokumentace pro provádění stavby, zpracování žádosti o stavební povolení, zajištění vydání stavebního povolení (nebo oznámení ve zkráceném řízení), zpracování dokumentace skutečného provedení a zajištění autorského dozoru zakázky	7,3
CELKEM %		7,3

Mgr. Michal Šedivý
Ivančík 2012, s.r.o.
Jiřího 202, Praha 10

AŽD Praha s.r.o., Žirovnická 2/3146, 106 17 Praha 10

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 14616
IČ 48029483

PLNÁ MOC

evidenční číslo
D-113/2014

AŽD Praha s.r.o.

zastoupená Ing. Zdeňkem Chrdlem, jednatelem společnosti

z m o c ň u j e

pana Ing. Petra Faltuse

obchodního ředitele

- ke schvalování, uzavírání a podpisu **smluv o budoucí smlouvě a smluv o dílo** dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, do výše hodnoty plnění 75 milionů Kč za AŽD Praha s.r.o.;
- ke schvalování, uzavírání a podpisu **smluv uzavíraných** dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, do výše hodnoty plnění 75 milionů Kč za AŽD Praha s.r.o.;
- k zastupování AŽD Praha s.r.o. v záležitostech souvisejících s elektronickými aukcemi a k účasti ve veškerých elektronických aukcích dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

Tato plná moc je platná do odvolání a nahrazuje plnou moc evidenční číslo D-031/2014 ze dne 17.7. 2014, která pozbývá platnosti.

Praha 29-09-2014

Ing. Zdeněk Chrdle
jedenatel společnosti

Zmocnění přijímám:

Ing. Petr Faltus
obchodní ředitel

PROHLÁŠENÍ O PRAVOSTI PODPISU NA LISTINĚ NESEPSANÉ ADVOKÁTEM

Běžné číslo knihy o prohlášeních o pravosti podpisu [REDACTED]

Já, níže podepsaná [REDACTED] advokátka se sídlem [REDACTED]
[REDACTED] zapsaná v seznamu advokátů, vedeném Českou advokátní
komorou pod ev. č. [REDACTED] prohlašuji, že tuto listinu přede mnou vlastnoručně ve
2 vyhotoveních podepsal:

Ing. Zdeněk Chrdle, [REDACTED]
[REDACTED]

Podepsaná advokátka tímto prohlášením o pravosti podpisu nepotvrzuje
správnost ani pravdivost údajů uvedených v této listině, ani její soulad
s právními předpisy.

V Praze dne 30.9.2014

[REDACTED]
vlastnoruční podpis advokátky
