

POŽADAVEK NA ČERPÁNÍ MD / ZMĚNOVÝ POŽADAVEK Č. 25-2020

Poskytovatel služby	AUTOCONT a.s.
Správce IS	Správa základních registrů
Objednatel	ČESKÁ REPUBLIKA - SPRÁVA ZÁKLADNÍCH REGISTRŮ
Smlouva	Č. SZR-374-74/Ř-2015
Číslo RFC SZR	RFC 801
Název RFC SZR	DČ – ISZR - změny na službách a v datech RÚIAN pro aplikaci zákona č. 51/2020 Sb.
Číslo tiketu (Service Desk)	56355 / 1-315804455
Katalogový list	ISZR12 objednávka
Typ odstavky	

1. Identifikace vzniku požadavku

Zadání požadavku prostřednictvím Service Desk.

2. Zadání požadované změny

Od 01.01.2021 musí být RÚIAN uzpůsoben požadavkům zákona č. 51/2020 Sb., o územně správním členění státu, týká se dat i služeb.

Žádáme o nacenění úprav dle přiložené tabulky se zadáním.




Služby_RUIAN_listo
pad.xlsx

3. Popis realizace

Realizace změny vychází z poskytnutých XSD od správce RUIAN a požadavků na workflow těchto služeb.

3.1 Vytvoření nových služeb

Na základě úprav XSD vnitřního rozhraní budou vytvořeny nové služby RUIAN/ISUI:



Tyto služby budou realizovat novou verzi pro odpovídající stávající služby:



3.2 Úprava existujících editačních služeb RUIAN


Rozšiřují se struktury zpráv pro editační služby RUIAN



3.3 Úprava existujících služeb s dereferencí do RUIAN

V existujících publikačních službách je v případě dereference do registru RUIAN (adresní místo nebo adresní lokality) možné v rámci volání služby volitelně čerpat i data vedená v RUIAN.


Například u služby *robCtiAifo* může být na výstupu služby informace z adresy pobytu z RUIAN:

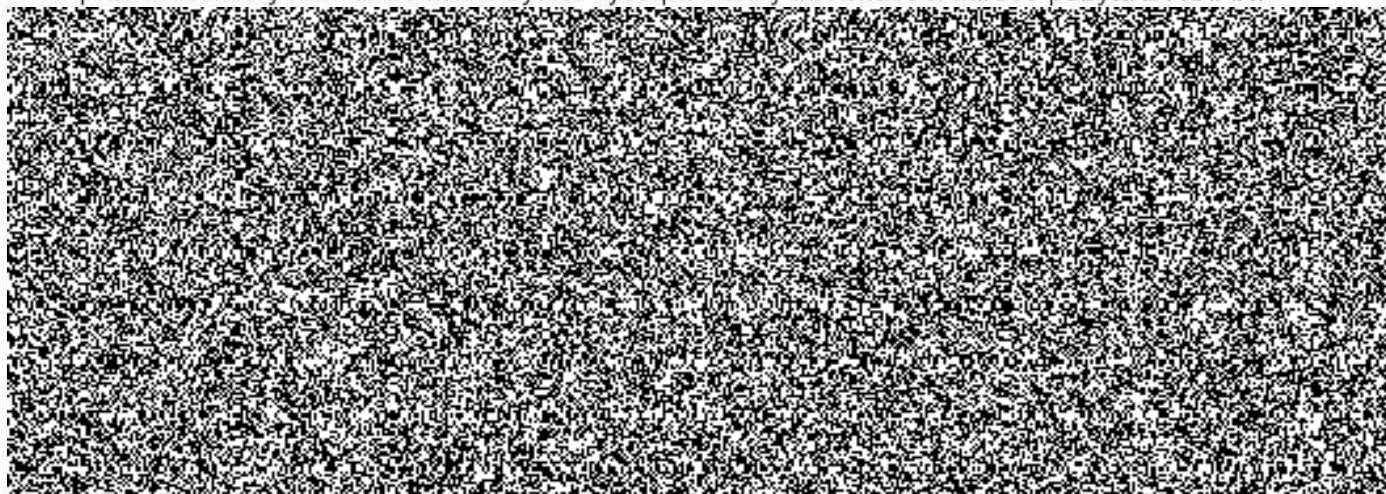

V nové verzi služeb RUIAN je nová definice služby pro čerpání této dereference z ROB.

V rámci implementace RFC bude tato definice implementována do stávajících služeb a to tak, aby neměla vliv na stávající konzumenty a současně umožnila čerpání v nové verzi RUIAN.

Výstup dotčených služeb bude upraven dle následujícího příkladu:

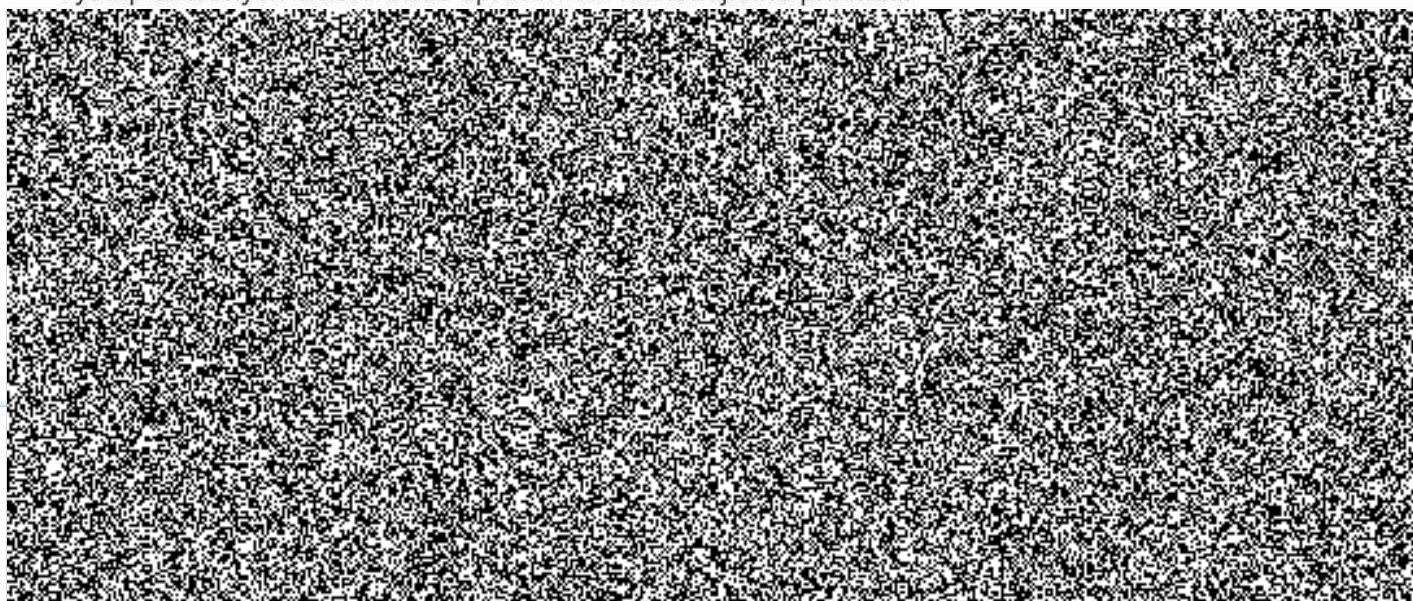

Na vstupu služeb bude v SeznamUdaju podporována nová hodnota *RUIANVerze2.0.0*.

Pokud bude při volání služby uveden parametr řídicí workflow *RUIANcti* (respektive *RUIANOver*), pak:

- Po přechodnou dobu bude rozlišován požadavek na čtení dereference RUIAN v nové verzi. Tj. pokud bude uvedena hodnota *RUIANVerze2.0.0*, bude interně ISZR volat novou verzi služby RUIAN a na výstupy bude uvádět výstup RUIAN z nové verze. Pokud požadavek na novou verzi uveden nebude, bude provedeno volání stávající interní služby RUIAN a výstup bude ze stávající verze.

- Po ukončení přechodného období bude vždy použito volání nové verze interní služby RUIAN a na výstupu bude vždy výstup RUIAN z nové verze bez ohledu na uvedení či neuvedení požadované verze na vstupu.

Poznámka k implementaci:

Výše uvedený postup navrhuje a důvodu jednoduchosti a konzistence chování vůči ostatním službám eGON rozhraní.

- Jednoduchost: i v tomto případě by existovala možnost pro všechny služby provádějící dereferenci z RUIAN vytvořit novou „dvojkovou“ verzi služeb, ale tato varianta by znamenala výrazný nárůst pracnosti a komplexnosti.
- Konzistence: tento přístup je již použit například v případě služeb ROB (ROBVerzeX.Y.Z)

4. Odhad pracnosti

Činnost	MD
Analýza a implementace XSD typů	
Příprava nových služeb (54 služeb)	
Příprava nových regresních testů	
Úprava existujících služeb (27 služeb)	
Úprava existujících regresních testů	
Testy funkcionality	
Vytvoření dokumentace pro nové služby	
Aktualizace dokumentace pro existující služby	
Projektové vedení a administrativa	
Celkem	

Celková cena: 1 976 000 Kč bez DPH, tj. 2 390 960 Kč s DPH.

Služby definované v rámci tohoto požadavku nejsou vývojem ani technickým zhodnocením již provozovaného systému.

Tento požadavek spadá do programu Digitální Česko 2018+ schváleného vládou ČR, plně podporuje rozvoj propojeného datového fondu a tím přispívá k rozvoji veřejné správy jako celku (projekt Základní registry 2.0).

5. Návrh harmonogramu změnového požadavku

Harmonogram realizace požadavku se bude řídit datem objednání a platným Release kalendářem. Nasazení aplikace ISZR do testovacího prostředí bude provedeno do 48 pracovních dnů od objednání změny a vystavení služeb RUIAN s uvedenými změnami na vývojové prostředí. Termín dodání může být prodloužen na základě zpoždění při poskytování potřebné součinnosti, případně počtu a priorit současně zpracovávaných změnových požadavků, nejpozději však do 31.12.2020.

6. Návrh testovacího scénáře

Testovací scénáře budou vytvořeny v průběhu realizace.

7. Výstupy změnového požadavku

- Nová verze ISZR
- Popisy služeb

8. Akceptační kritéria, způsob ověření na produkci

8.1 Akceptační kritéria

- Aktualizace popisů služeb
- WSDL a XSD balík
- Nová verze ISZR s upravenými službami

8.2 Způsob ověření na produkci

- Ověření nelze ze strany dodavatele provést. Zajistí objednatel.

9. Požadavky na součinnosti

9.1 RUIAN


- Vystavení služeb RUIAN na vnitřním rozhraní (vývojové, testovací, produkční prostředí)
- Součinnost RUIAN při testování
- Zajištění testovacích dat a scénářů ze strany RUIAN

9.2 SZR

- Koordinační práce ze strany SZR
- Součinnost při akceptaci

10. Dopady do provozu / dopady do provozní dokumentace

Nová verze ISZR s upravenými službami dle kapitoly 3. Budou vytvořeny nové služby E249<x>, E250<x>, E251, E252<x> a upravena služba E33. K těmto službám bude vytvořena/aktualizována dokumentace.

	Schválil (dodavatel)	Schválil (zákazník)
Jméno		
Datum		
Podpis		
