

**Návrh řešení požadavku na poskytnutí ad hoc služby v rámci Smlouvy o zajištění
správy, provozu a rozvoje komunikační infrastruktury, ve znění dodatku
č. 1 ze dne 19.12.2019**

číslo jednací Objednatele: MV-126064/SIK5-2018

číslo jednací Poskytovatele: 2018/321

(dále jen „Smlouva“)

Návrh řešení je předkládán:

Národní agentura pro komunikační a informační technologie, s. p.

se sídlem: Kodaňská 1441/46, 101 00 Praha 10

IČ, DIČ: 04767543, CZ04767543

bankovní spojení: ČSOB a. s., č. ú: 117404973/0300

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A,
vložka 77322

zastoupeno: Ing. Vladimír Dzurilla, ředitel Národní agentury pro komunikační a informační
technologie, s. p.

jako Poskytovatelem

pro

Česká republika – Ministerstvo vnitra

se sídlem: Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7

IČ, DIČ: 00007064, CZ00007064

zastoupeno: Mgr. Bohdan Urban, ředitel odboru provozu informačních technologií a
komunikací


kontaktní adresa: Olšanská 4, 130 27 Praha 3

jako Objednatelem na základě požadavku vedeného v CA SD pod ID_ 284873

Obsah

1. Úvod a shrnutí	3
1.1. Důvěrnost informací	3
2. Předmět Návrhu řešení	3
3. Obsah Návrhu řešení	3
3.1. Popis navrhovaného řešení	3
3.2. Požadavky na součinnost Objednatele	4
3.3. Harmonogram plnění	4
3.4. Způsob zajištění plnění	5
3.4.1 Aktivity NAKIT	5
3.4.2 Externí dodávka	6
3.5. Dopad na provozní činnost a provozní náklady Objednatele	6
3.6. Termíny a sankce	6
3.7. Prohlášení Poskytovatele o vztahu ke generálním a zákaznickým službám dle Smlouvy	6
3.8. Další podmínky a přechod vlastnického práva	7
4. Cena za realizaci plnění	8
4.1. Cena – Aktivity NAKIT	8
4.2. Cena – Externí dodávka	8
4.3. Způsob fakturace	8
5. Odpovědné osoby Poskytovatele	9
6. Kontaktní osoby Objednatele	9
7. Závěr	9
8. Předkládá za Poskytovatele	10
9. Akceptace Návrhu řešení ze strany Objednatele	10

1. Úvod a shrnutí





2. Předmět Návrhu řešení

Tento Návrh řešení je předkládán státním podnikem Národní agentura pro komunikační a informační technologie, s. p., (dále také jen „NAKIT“ nebo „Poskytovatel“) zapsaným v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, spisová značka A 77322 na základě Požadavku na poskytnutí ad hoc služeb dle čl. 5.2 Smlouvy s názvem „Žádost o realizaci AdHoc služby – Obnova hraničních směrovačů v internetovém bloku CMS“ vedeného v CA SD ID_284873 (dále jen „Požadavek“).

3. Obsah Návrhu řešení

Předmětem Návrhu řešení je obnova hraničních směrovačů v internetovém bloku CMS včetně implementačních prací. Cílem navrhované řešení je zajistit výměnu těchto zařízení, která jsou na konci životního cyklu a postupně bude ukončena podpora výrobce na instalované 1Gbit karty, 10 Gbit karty, řídicí karty a šasí.

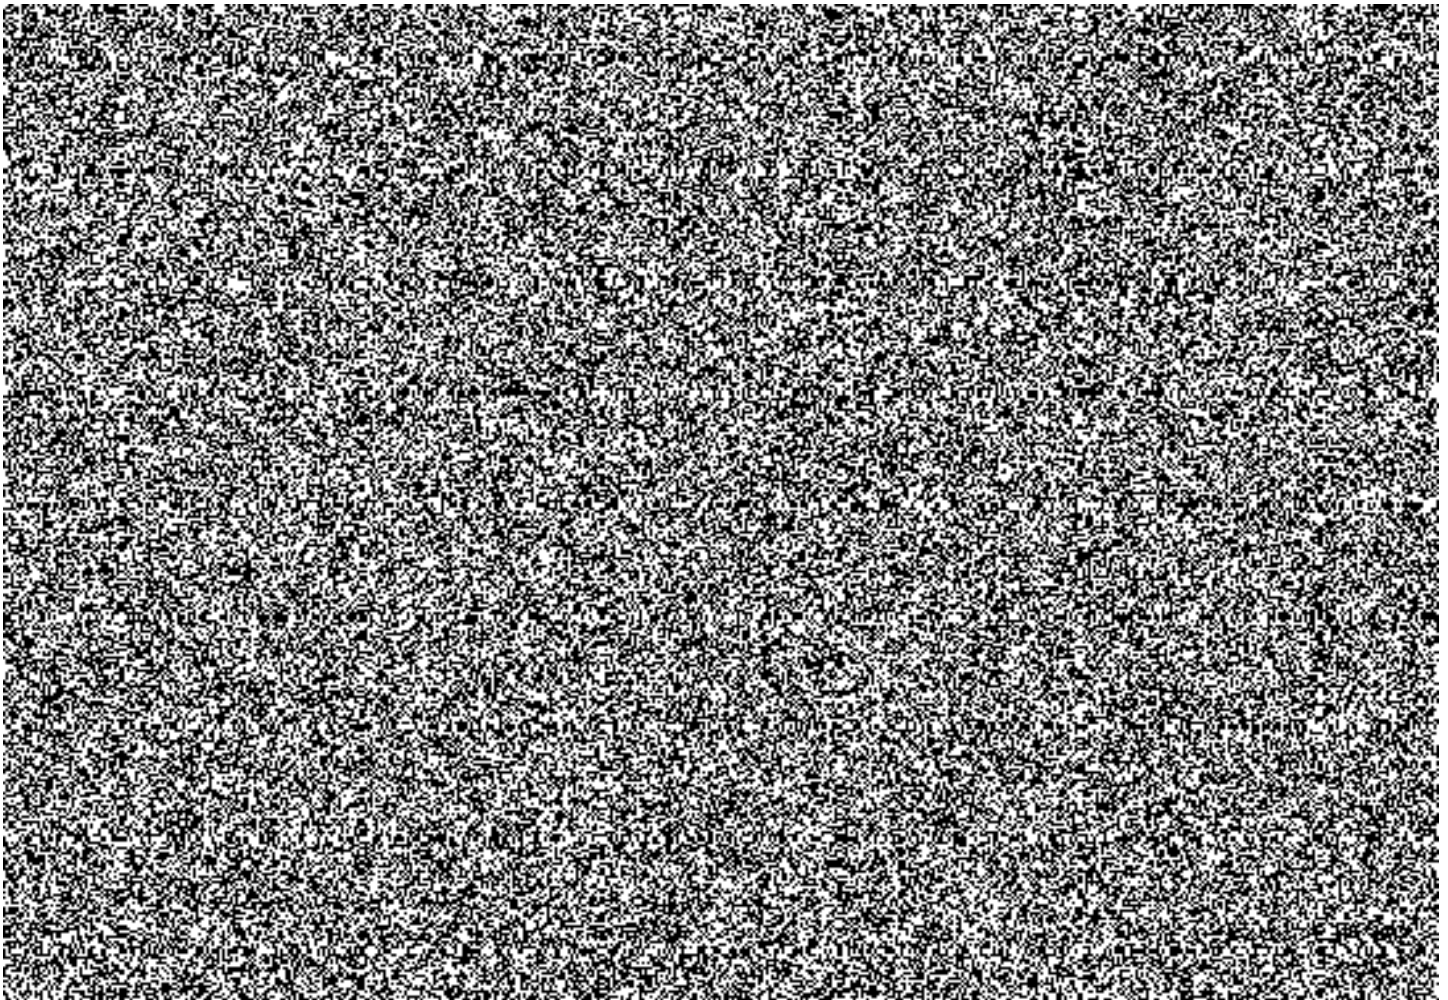

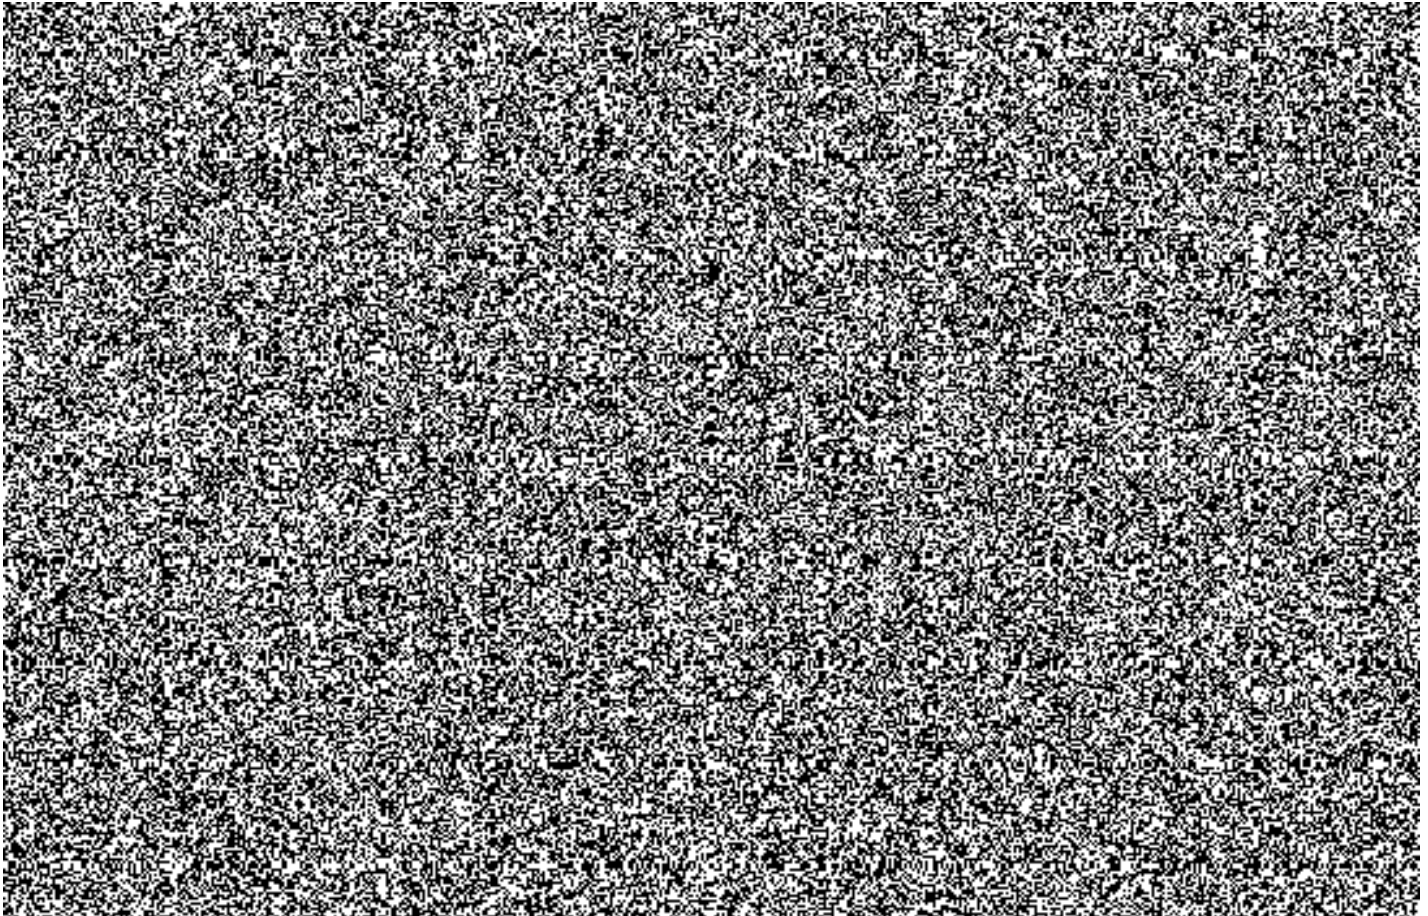

3.2. Požadavky na součinnost Objednatele

Ze strany Objednavatele je nezbytné zajistit tyto součinnosti:

- Součinnost při plánování odstávek při výměně hraničních směrovačů Cisco 7606-S.
- Převzít pořízenou infrastrukturu a začlenit ji do služby G5 NHS.

3.3. Harmonogram plnění

Harmonogram plnění představuje odhadovaný čas na uskutečnění celého procesu obnovy stávajících hraničních směrovačů Cisco 7606-S v internetovém bloku CMS. Realizace Návrhu řešení proběhne ve dvou fázích, ve Fázi I. bude dodán HW (2ks směrovačů).

Ve Fázi II. pak proběhne implementace dodaného HW (Fáze II předchází standardní kroky (předložení implementačního plánu, návrhy na servisní odstávky a schválení Change Managementu a MV, poté je možné zahájit Fázi II).

Předpokládaný harmonogram:

Fáze I.

Č.	Milník I.	Čas
1.	Schválení Návrhu řešení ze strany Objednatele.	T0
2.	Výběrové řízení a podpis smlouvy s dodavatelem HW	T1 = T0 + 4 týdnů
3.	Dodávka HW	T2 = T1 + 8 týdnů
4.	Akceptace a fakturace Fáze I.	T3 = T2 + 2 týdny

Fáze II.

Č.	Milník II.	Čas
1.	Dodávka HW	T0
2.	Implementace dodaného HW v DC1	T1 = T0 + 6 týdnů
3.	Zkušební provoz	T2 = T1 + 1 den
4.	Implementace dodaného HW v DC2	T3 = T2 + 6 týdnů
5.	Zkušební provoz	T4 = T3 + 1 den
6.	Akceptace a fakturace Fáze II.	T5 = T4 + 2 týdny

3.4. Způsob zajištění plnění

Plnění bude zajištěno jak interními aktivitami NAKIT, tak i externí dodávkou komponent a činnostmi spojenými s výměnou a konfigurací zařízení.

3.4.1 Aktivity NAKIT

Aktivity NAKIT spojené s realizační částí:

- Příprava a realizace VZ na dodávky komponent a služeb.
- Zhotovení realizačních podkladů pro provedení.
- Koordinace postupu prací jednotlivých subjektů.
- Provedení závěrečného testování.
- Převzetí díla od externího dodavatele (fyzické i dokladové).
- Materiálové předání technologií objednateli.
- Předání technologií do servisní péče provozních útvarů.
- Demontáž starého zařízení a uskladnění

Výše uvedené aktivity budou dodány v rámci tohoto maximálního rozsahu prací spojených s realizací navrhovaného řešení:

Role	Celkem hodin/role
Senior specialista provozu	37,5
Celkem	37,5

3.4.2 Externí dodávka

Součástí návrhu řešení je externí dodávka, náklady budou přefakturovány 1:1. Předmětem externí dodávky je dodání níže uvedeného HW, viz tabulka, a související instalační práce.

Infrastrukturní komponenty dle návrhu:

PČ	Zařízení	Počet	Detail
1.	Internetový hraniční směrovač	2 ks	Položkový rozpad dle výsledku výběrového řízení
2.	Podpora na 5 let	2 ks	Podpora na 5 let
3.	Implementační a konzultační práce	40 MD	Dle výsledku výběrového řízení

3.5. Dopad na provozní činnost a provozní náklady Objednatele

Navrhované řešení nemá dopad na provozní činnosti Objednatele ani na SLA u služby G5 dle NHS. Navrhované řešení má dopad na provozní náklady Objednatele u dotčené služby G5 ve smyslu navýšení plateb za servisní podporu pořízeného HW od pátého roku po akceptaci plnění. Cena podpory stávajících hraničních směrovačů je 577 935,84 Kč ročně bez DPH. Předpokládaná cena podpory pro nové směrovače je odhadnuta na 1,1mil Kč ročně bez DPH. Po odečtení ceny stávající podpory je předpokládané navýšení odhadnuto ve výši 522 tis. Kč ročně bez DPH pro 2 ks nových hraničních směrovačů v internetovém bloku CMS. Prvních 5 let servisní podpory je součástí plnění. Finální cena podpory bude upravena dle výsledku VZ.

3.6. Termíny a sankce

Dle čl. 17.11 Smlouvy

3.7. Prohlášení Poskytovatele o vztahu ke generálním a zákaznickým službám dle Smlouvy

Poskytovatel prohlašuje, že příslušné činnosti Poskytovatele (realizované prostřednictvím příslušných pracovních rolí) sloužící k realizaci tohoto Návrhu řešení nejsou součástí generálních ani zákaznických služeb dle čl. 3.2.1 a 3.2.2 Smlouvy, ani nejsou v jejich rámci hrazeny.

3.8. Další podmínky a přechod vlastnického práva

Další podmínky realizace Návrhu řešení a způsob přechodu vlastnického práva bude upraven dílčí smlouvou, která bude uzavřena mezi Poskytovatelem a Objednatelem.

4. Cena za realizaci plnění

Národní agentura pro komunikační a informační technologie, s. p. předkládá svoji cenovou nabídku v požadovaném rozsahu uvedenou v členění cena bez DPH, výše DPH včetně zákonné sazby 21 % a cena s DPH.

Položka	Cena Kč bez DPH	DPH 21 %	Cena Kč vč. DPH
Aktivity NAKIT	53 362,50 Kč	11 206,13 Kč	64 568,63 Kč
Externí dodávka	13 980 000,00 Kč	2 935 800,00 Kč	16 915 800,00 Kč
Celkem	14 033 362,50 Kč	2 947 006,13 Kč	16 980 368,63 Kč

4.1. Cena – Aktivity NAKIT

Výsledná cena za Aktivity NAKIT bude fakturována dle skutečně odpracované doby na základě odsouhlaseného Akceptačního protokolu.

Role	Cena za hodinu bez DPH	Počet hodin	Celkem bez DPH	DPH 21 %	Celkem vč. DPH
Senior specialista provozu	1 423,00 Kč	37,5	53 362,50 Kč	11 206,13 Kč	64 568,63 Kč
Celkem NAKIT			53 362,50 Kč	11 206,13 Kč	64 568,63 Kč

4.2. Cena – Externí dodávka

Odhadovaná cena za externí dodávku bude vyfakturována v poměru 1:1. Výsledná cena bude odpovídat aktuální ceně dle výsledku výběrového řízení.


Pol.	Název položky	Jednotková cena bez DPH	Počet	Celková cena bez DPH	DPH 21 %	Celková cena včetně DPH
1.	Internetový hraniční směrovač včetně licencí	4 000 000,00 Kč	2	8 000 000,00 Kč	1 680 000,00 Kč	9 680 000,00 Kč
2.	Podpora na 5 let	2 750 000,00 Kč	2	5 500 000,00 Kč	1 155 000,00 Kč	6 655 000,00 Kč
3.	Implementační a konzultační práce	12 000,00 Kč	40	480 000,00 Kč	100 800,00 Kč	580 800,00 Kč
Celkem Externí dodávka				13 980 000,00 Kč	2 935 800,00 Kč	16 915 800,00 Kč

4.3. Způsob fakturace


Fakturace proběhne po realizaci Návrhu řešení (dodávka HW 2ks směrovačů, Aktivity NAKIT, instalace a implementace HW na lokalitách) na základě podpisu Akceptačního protokolu a Dílčí smlouvy ze strany Objednatele. **Předpokládaný termín fakturace je 2Q 2021.**

5. Odpovědné osoby Poskytovatele

Osoba pověřená jednat ve věcech obchodních




Osoba pověřená jednat ve věcech technických



6. Kontaktní osoby Objednatele

Ve věcech smluvních



Ve věcech technických a akceptace plnění



7. Závěr

Tento Návrh řešení má platnost 30 dní. Poskytovatel si vyhrazuje právo aktualizovat termíny plnění po uplynutí této doby.

Národní agentura pro komunikační a informační technologie, s. p. je připravena o podrobnostech Nabízeného řešení dále jednat a následně samotné řešení dlouhodobě podporovat a rozšiřovat.

8. Předkládá za Poskytovatele

V Praze dne



Ing. Vladimír Dzurilla, ředitel

Národní agentura pro komunikační a informační technologie, s. p.

9. Akceptace Návrhu řešení ze strany Objednatele

V Praze dne

.....

Mgr. Bohdan Urban, ředitel

Odbor provozu informačních technologií a komunikací Ministerstva vnitra

