

SMLOUVA O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY

Název zakázky: „Oprava trati v úseku Kryry - Vroutek“

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dláždění 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Martinem Kašparem, ředitelem Oblastního ředitelství Ústí nad Labem,
na základě pověření č. 3014 ze dne 27. 10. 2020

Korespondenční adresa:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Oblastní ředitelství Ústí nad Labem

Železničářská 1386/31, 400 03 Ústí nad Labem

ePodatelnaORUNL@szdc.cz

Korespondenční adresa pro daňové doklady:

Správa železnic, státní organizace

Centrální finanční účtárna Čechy

Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice

ePodatelnaCFUCechy@spravazeleznic.cz

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: **E650-S-868/2021**

ISPROFOND: 500 312 0047

a

Chládek & Tintěra, a.s.

se sídlem: Nerudova 1022/16, Předměstí, 412 01 Litoměřice

IČO: 62743881 , DIČ: CZ62743881

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem,
spisová značka 706 B

bank. spojení: **XXXX**

zastoupena: Ing. Jan Kokeš, předseda představenstva, Vladimír Jehlička, DiS, člen představenstva, Miroslava Bosmanová, člen představenstva, Libuše Tintěrová, člen představenstva, Pavel Holzknacht, člen představenstva (společnost v celém rozsahu zastupují vůči třetím osobám vždy dva členové představenstva společně)

Korespondenční adresa:

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: 20248

uzavřely tuto smlouvu (dále jen „Smlouva“) v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“).

Objednatel si přeje, aby Dílo „**Oprava trati v úseku Kryry – Vroutek**“ bylo provedeno Zhotovitelem, přijal Zhotovitelovu Nabídku na provedení a dokončení tohoto Díla a odstranění všech jeho vad, a proto se

Objednatel a Zhotovitel dohodli takto:

1. Platí, že následující dokumenty tvoří součást této Smlouvy o dílo (ve znění případných dodatků) a jako její součást musí být čteny a vykládány:
 - 1.1 Dopis o přijetí nabídky datovaný 03. 02. 2021
 - 1.2 Dopis nabídky datovaný dne 07. 01. 2021
 - 1.3 Smluvní podmínky [Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelem (FIDIC 1999)-Obecné podmínky; Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelem – Zvláštní podmínky pro stavby Správy železnic, státní organizace schválené CK MD č. j.: 93/2019-520-DOP/1 ze dne 19. 3. 2019, s účinností od 12. 4. 2019
 - 1.4 Technická specifikace
 - 1.5 Výkresy a
 - 1.6 Formuláře:
 - 1.6.1 Soupis prací,
2. Specifikace související dokumentace je uvedena v Technické specifikaci, a to zejména ve Zvláštních technických podmínkách.
3. Za platby, které má Objednatel uhradit Zhotoviteli tak, jak je níže uvedeno, se Zhotovitel tímto zavazuje Objednateli, že provede a dokončí Dílo, včetně vypracování veškeré příslušné dokumentace související s Dílem a odstraní na něm všechny vady v souladu s ustanovením Smlouvy.
4. Objednatel se tímto zavazuje zaplatit Zhotoviteli za provedení a dokončení Díla a odstranění jeho vad Smluvní cenu v době a způsobem předepsaným ve Smlouvě.
5. Zhotovitel se zavazuje zaslat Objednateli do 14 dnů po nabytí účinnosti smlouvy oceněný Soupis prací dle své Nabídky v listinné podobě. Zhotovitel odpovídá za shodu obsahu listinné a elektronické podoby oceněného Soupisu prací.
 - 5.1 Zhotovitel se zavazuje, že bude Objednateli předávat následující sestavy v otevřeném datovém formátu xls/xlsx::
 - 5.1.1 Faktura,
 - 5.1.2 souhrn fakturace,
 - 5.1.3 soupis zjišťovacích protokolů,
 - 5.1.4 zjišťovací protokoly.
6. Rekapitulace ceny je uvedena v příloze č. 1 této Smlouvy o dílo.
7. NEOBSAZENO
8. V případě Potvrzení průběžné platby nebo Potvrzení závěrečné platby, které je posledním Potvrzením průběžné platby nebo Potvrzením závěrečné platby před převzetí Díla, Sekce nebo jiné části Díla Objednatelem ve smyslu Pod-článku 10.1 [*Převzetí díla a sekce*] a Pod-článku 10.2 [*Převzetí části díla*] Smluvních podmínek je Správce stavby povinen vydat Potvrzení průběžné platby nebo Potvrzení závěrečné platby nejpozději v den převzetí Díla, Sekce nebo části Díla Objednatelem.
9. Objednatel prohlašuje, že je ve vztahu k přijatým plněním v rozsahu předmětu Díla, týkajícího se výstavby, oprav a rekonstrukce železniční infrastruktury (zatříděných dle klasifikace produkce CZ-CPA pod kódy č. 41-43) na území České republiky, u nichž je mezi plátcí v tuzemsku uplatňován režim přenesení daňové povinnosti dle § 92a zákona č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“), osobou povinnou k dani dle § 5 odst. 1 zákona o DPH, neboť přijatá plnění použije pro svou ekonomickou činnost, a je tedy osobou povinnou přiznat a zaplatit DPH dle § 92 odst. 1 zákona o DPH.

10. Strany se dohodly, že stane-li se Zhotovitel nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a zákona o DPH, nebo daňový doklad Zhotovitele bude obsahovat číslo bankovního účtu, na který má být plněno, aniž by bylo uvedeno ve veřejném registru spolehlivých účtů vedeném správcem daně, je Objednatel oprávněn uhradit DPH z peněžního plnění přímo místně a věcně příslušnému správci daně Zhotovitele.
11. V případě jakékoliv nejistoty ohledně výkladu ustanovení Smlouvy budou její ustanovení vykládána tak, aby v co nejširší míře zohledňovala účel veřejné zakázky, vyjádřený Zadávací dokumentací.
12. Pro zhotovení Díla není dán požadavek na zajištění interoperability ve smyslu nařízení vlády č.133/2005 Sb.
13. Ukončením Smlouvy nejsou dotčena ustanovení Smlouvy ve znění dokumentů dle odst. 1 této Smlouvy o dílo a příloh dle odst. 21 této Smlouvy o dílo týkající se licencí, záruk, nároků z odpovědnosti za vady, nároky z odpovědnosti za škodu a nároky ze smluvních pokut, pokud vznikly před ukončením Smlouvy, ustanovení o ochraně informací, ani další ustanovení a nároky, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po ukončení účinnosti této Smlouvy.
14. Pokud by se kterékoliv ustanovení Smlouvy ukázalo být zdánlivým, neplatným nebo jinak nevymahatelným, nebo se jím stalo po uzavření této Smlouvy o dílo, pak tato skutečnost nepůsobí zdánlivostí, neplatností ani nevymahatelností ostatních ustanovení Smlouvy, nevyplyvá-li z donucujících ustanovení Právních předpisů jinak. Strany se zavazují bez zbytečného odkladu po výzvě kterékoliv Strany takové zdánlivé, neplatné či nevymahatelné ustanovení nahradit platným a vymahatelným ustanovením, které bude svým obsahem nejbližší účelu zdánlivého, neplatného či nevymahatelného ustanovení.
15. NEOBSAZENO.
16. Závazky ze Smlouvy je možné měnit pouze písemnou dohodou v listinné podobě Stran ve formě číslovaných dodatků této Smlouvy o dílo, podepsanou za každou Stranu osobou nebo osobami oprávněnými takový dodatek podepsat.
17. Nové vystrojené betonové pražce/kolejnice, které jsou součástí SO 05-10-01 železniční svršek dle technické specifikace v Soupisu prací jednotlivých položek, nejsou součástí dodávky na zhotovení Díla.

Nákup vystrojených betonových pražců/ kolejnic zajistí centrálně Objednatel, a to včetně dodávky na Místo předání uvedené v Technické specifikaci – ZTP.

Postup pro zajištění dodávky pražců/ kolejnic je uveden v Technické specifikaci – ZTP.

Zhotovitel se zavazuje sdělit Správci stavby před datem zahájení prací svého zástupce, který na základě plné moci vydané mu Správcem stavby bude přebírat od dodavatelů pražců a kolejnic za Objednatele jednotlivé dodávky pražců/kolejnic potřebné pro zhotovování Díla, a to včetně potvrzení dodacího listu, kterým přechází vlastnictví pražců/ kolejnic z dodavatelů pražců / kolejnic na Objednatele. Nebezpečí škody na věci přechází z Objednatele na Zhotovitele ihned po potvrzení dodacího listu.

18. Zhotovitel předložil před uzavřením Smlouvy o dílo Objednateli závazný, bezpodmínečný a neodvolatelný příslib banky, kterým prokázal, že má přístup k úvěrům a dalším finančním zdrojům ve výši 25 mil. Kč. Príslib banky musí být platný po celou dobu realizace stavebních prací až do vydání posledního Potvrzení o převzetí části Díla. V případě, že Zhotovitel neudrží v platnosti bankovní příslib v rozsahu uvedeném ve Smlouvě o dílo, je Objednatel oprávněn po Zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,02 % z nabídkové ceny uvedené v Dopisu nabídky za každý den neplnění této povinnosti. Ostatní nároky Objednatele tím nejsou dotčeny.
19. Podpisem této Smlouvy o dílo Zhotovitel současně jako zpracovatel uzavírá s Objednatel jako správcem smlouvu o zpracování osobních údajů ve znění uvedeném v Příloze č. 5 této Smlouvy o dílo.
20. Smlouva o dílo se vyhotovuje ve **třech** vyhotoveních, z nich **dvě** vyhotovení obdrží Objednatel a **jedno** vyhotovení Zhotovitel.
21. Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy o dílo:

Příloha č. 1	Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky
Příloha č. 2	Oprávněné osoby
Příloha č. 3	Seznam poddodavatelů
Příloha č. 4	Harmonogram postupu prací
Příloha č. 5	Smlouva o zpracování osobních údajů
Příloha č. 6	Zmocnění Vedoucího zhotovitele

Na důkaz toho strany uzavírají tuto Smlouvu o dílo, která vstupuje v platnost dnem podpisu této Smlouvy o dílo oběma Stranami a účinnou se stává dnem uveřejnění v registru smluv.

V Ústí nad Labem dne 10. 03. 2021

V Litoměřicích dne 23. 02. 2021

.....

Objednatel

Ing. Martin Kašpar

ředitel Oblastního ředitelství Ústí nad Labem

Správa železnic, státní organizace

.....

Zhotovitel

PŘÍLOHA Č. 1

Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky

Rekapitulace ceny díla

Stupeň:	Realizace
Název stavby:	"Oprava traťového úseku Kryry - Vroutek"

	SO/PS	Náklady Kč (bez DPH)
D. TECHNOLOGICKÁ ČÁST		
D.1 ŽELEZNIČNÍ ZABEZPEČOVACÍ ZAŘÍZENÍ		
D.1.1 Staniční a zabezpečovací zařízení (SZZ)		
	PS 04-01-11 ŽST Kryry, SZZ	4 510 007,43
D.1.2 Traťové zabezpečovací zařízení (TZZ)		
	PS 05-01-21 Kryry (včetně) - Vroutek (mimo), TZZ	5 170 430,30
D.2 ŽELEZNIČNÍ SDĚLOVACÍ ZAŘÍZENÍ		
D.2.5 Dálkový kabel (DK), dálkový optický kabel (DOK), závěsný optický kabel (ZOK)		
	PS 05-02-51 Kryry (včetně) - Vroutek (mimo), ochrana DKK	1 025 075,56
	PS 05-02-52 Kryry (včetně) - Vroutek (mimo), ochrany a přeložky DK	1 043 207,00
E. STAVEBNÍ ČÁST		
E.1 INŽENÝRSKÉ OBJEKTY		
E.1.1 Železniční svršek a spodek		
	SO 05-10-01 Kryry (včetně) - Vroutek (mimo), železniční svršek	48 561 473,00
	SO 05-11-01 Kryry (včetně) - Vroutek (mimo), železniční spodek	42 695 363,19
	SO 11-14-01 Blatno u Jesenice - Kaštice, výstroj trati	1 244 548,00
E.1.3 Železniční přejezdy		
	SO 05-13-01 Železniční přejezd P1703 v km 169,358	1 726 180,10
	SO 05-13-02 Železniční přejezd P1704 v km 171,652	1 862 956,34
	SO 05-13-03 Železniční přejezd P1705 v km 171,863	802 974,58
	SO 06-13-01 Železniční přejezd P1706 v km 172,166	2 415 871,17
E.1.4 Mosty, propustky a zdi		
	SO 05-20-01 Železniční most v km 168,060	3 041 563,96
	SO 05-20-02 Železniční most v km 168,418	4 906 936,51
	SO 05-20-03 Železniční most v km 168,565	9 325 732,76
	SO 05-20-04 Železniční most v km 172,016	4 795 908,27
	SO 05-20-05 Železniční most v km 172,055	2 906 952,76
	SO 05-21-01 Železniční propustek v km 167,836	1 010 041,10
	SO 05-21-02 Železniční propustek v km 167,961	610 724,72
	SO 05-21-03 Železniční propustek v km 168,817	111 748,15
	SO 05-21-04 Železniční propustek v km 169,366	912 916,55
	SO 05-21-05 Železniční propustek v km 169,783	872 799,53
	SO 05-21-06 Železniční propustek v km 169,905	1 015 756,31
	SO 05-21-07 Železniční propustek v km 170,785	1 595 547,67
	SO 05-21-08 Železniční propustek v km 171,326	592 483,84
	SO 05-21-09 Železniční propustek v km 171,966	1 414 706,77
E.1.5 Ostatní inženýrské objekty (inženýrské sítě a hydrotechnické objekty)		
	PS 05-53-01 Kryry (včetně) - Vroutek (mimo), ochrana telekomunikačních sítí jiných operátorů	107 140,00
	SO 05-54-01 Kryry - Vroutek, ochrana kabelu VN ČEZ Distribuce a.s. v žkm. 171,419	124 180,00
	SO 05-54-02 Kryry - Vroutek, ochrana kabelu NN ČEZ Distribuce a.s. v žkm. 171,636	173 640,00
	SO 05-54-03 Kryry - Vroutek, ochrana kabelu NN ČEZ Distribuce a.s. v žkm. 171,874	173 640,00
	SO 05-54-04 Kryry - Vroutek, ochrana kabelu NN ČEZ Distribuce a.s. v žkm. 172,055	81 420,00
	SO 05-54-05 Kryry - Vroutek, ochrana kabelu VO obec Vroutek v žkm. 172,055	77 310,00
	SO 06-54-01 ŽST Vroutek, ochrana kabelu NN ČEZ Distribuce a.s. v žkm. 172,378	206 040,00
E.1.6 Potrubní vedení (voda, plyn, kanalizace)		
	SO 05-50-01 Kryry (včetně) - Vroutek (mimo), ochrana vedení kanalizace	22 449,00
	SO 05-51-01 Kryry (včetně) - Vroutek (mimo), ochrana vedení vodovodu	22 450,00
	SO 05-52-01 Kryry (včetně) - Vroutek (mimo), ochrana vedení plynovodu	62 638,00
E.3 TRAKČNÍ A ENERGETICKÁ ZAŘÍZENÍ		
E.3.4 Ohřev výměn (elektrický EOv, plynový POv)		
	SO 04-74-01 Kryry, úprava EOv	313 295,00
E.3.6 Rozvody vn, nn, osvětlení a dálkové ovládání odpojovačů		
	SO 05-76-01 Kryry (včetně) - Vroutek (mimo), ochrany a přeložky NN	180 470,00
	SO 06-76-01 ŽST Vroutek, ochrana NN	222 920,00
Všeobecný objekt		
	SO 9898 Všeobecný objekt	1 160 427,00

147 099 924,57

V Litoměřicích, dne

Ing. Jan Kokeš
 Digitálně podepsal
 Ing. Jan Kokeš
 Datum: 2021.01.07
 11:20:19 +01'00'

Miroslava Bosmanová
 Digitálně podepsal
 Miroslava Bosmanová
 Datum: 2021.01.07
 11:20:36 +01'00'

Ing. Jan Kokeš
 Předseda představenstva,
 Chládek & Tintěra, a.s.

Miroslava Bosmanová
 Člen představenstva,
 Chládek & Tintěra, a.s.

PŘÍLOHA Č. 2

Oprávněné osoby

Oprávněné osoby Zhotovitele (Pod-článek 6.9 Smluvních podmínek, včetně ředitele stavby jako delegované osoby dle čl. 16 odst. 1 písm. g) směrnice SŽDC SM105 Změny během výstavby)

Ve věcech smluvních a obchodních

Jméno a příjmení	XXXX
Adresa	XXXX
E-mail	XXXX
Telefon	XXXX

Ve věcech technických

Jméno a příjmení	XXXX
Adresa	XXXX
E-mail	XXXX
Telefon	XXXX

Ředitel stavby dle směrnice SM SŽDC 105 Změny během výstavby

Jméno a příjmení	XXXX
Adresa	XXXX
E-mail	XXXX
Telefon	XXXX

Stavbyvedoucí

Jméno a příjmení	XXXX
Adresa	XXXX
E-mail	XXXX
Telefon	XXXX

Zástupce stavbyvedoucího

Jméno a příjmení	XXXX
Adresa	XXXX
E-mail	XXXX
Telefon	XXXX

Specialista (vedoucí prací) na železniční svršek a spodek

Jméno a příjmení	XXXX
Adresa	XXXX
E-mail	XXXX
Telefon	XXXX

Specialista (vedoucí prací na mosty a inženýrské konstrukce)

Jméno a příjmení	XXXX
Adresa	XXXX
E-mail	XXXX
Telefon	XXXX

Specialista (vedoucí prací) na sdělovací a zabezpečovací zařízení

Jméno a příjmení	XXXX
Adresa	XXXX
E-mail	XXXX
Telefon	XXXX

Specialista (vedoucí prací) na silnoproud

Jméno a příjmení	XXXX
Adresa	XXXX
E-mail	XXXX
Telefon	XXXX

Specialista (vedoucí prací) na geotechniku

Jméno a příjmení	XXXX
Adresa	XXXX
E-mail	XXXX
Telefon	XXXX

Osoba odpovědná za kontrolu kvality

Jméno a příjmení	XXXX
Adresa	XXXX
E-mail	XXXX
Telefon	XXXX

Osoba odpovědná za bezpečnost a ochranu zdraví při práci

Jméno a příjmení	XXXX
Adresa	XXXX
E-mail	XXXX
Telefon	XXXX

Úředně oprávněný zeměměřický inženýr

Jméno a příjmení	XXXX
Adresa	XXXX
E-mail	XXXX
Telefon	XXXX

Osoba odpovědná za projektovou dokumentaci zabezpečovacího zařízení

Jméno a příjmení	XXXX
Adresa	XXXX
E-mail	XXXX
Telefon	XXXX

Osoba odpovědná za kontrolu kvality

Jméno a příjmení	XXXX
Adresa	XXXX
E-mail	XXXX
Telefon	XXXX

PŘÍLOHA Č. 3


Seznam poddodavatelů

Identifikace poddodavatele (obchodní firma, sídlo a IČO)	Věcný rozsah poddodávky (označení dle čísel a názvů jednotlivých PS a SO)	Hodnota poddodávky v % ze Smluvní ceny díla
TOMWOOD s.r.o, Jankov 169, 257 03 Jankov, IČO: 457 88 898	Nakládání s nebezpečnými odpady	0,03%
GeoTec-GS, a.s., Chmelová 2920/6, 106 00 Praha 10, IČO: 251 03 431	Zkoušky kameniva, zátěžové zkoušky zemní pláně a pláně železničního svršku, posouzení a případný návrh změny pražcového podloží během realizace	0,6%
SCHLIKE-DOMI, spol. s r.o., Průjezdná 1958, 434 01 Most, IČO: 445 69 564	SO 05-53-01	0,07%
ČD - Telematika a.s., Bílinská 3449/30, 400 01 Ústí nad Labem, IČO: 614 59 445	PS 05-02-51 PS 05-02-52	1,4%
ATE, s.r.o., Wolkerova 14, 350 02 Cheb, IČO: 483 60 473	PS 04-01-11 PS 05-01-21 SO 05-76-01 SO 06-76-01	7,06%

PŘÍLOHA Č. 4

Harmonogram postupu prací

Oprava trati v úseku Kryry - Vroutek
HARMONOGRAM

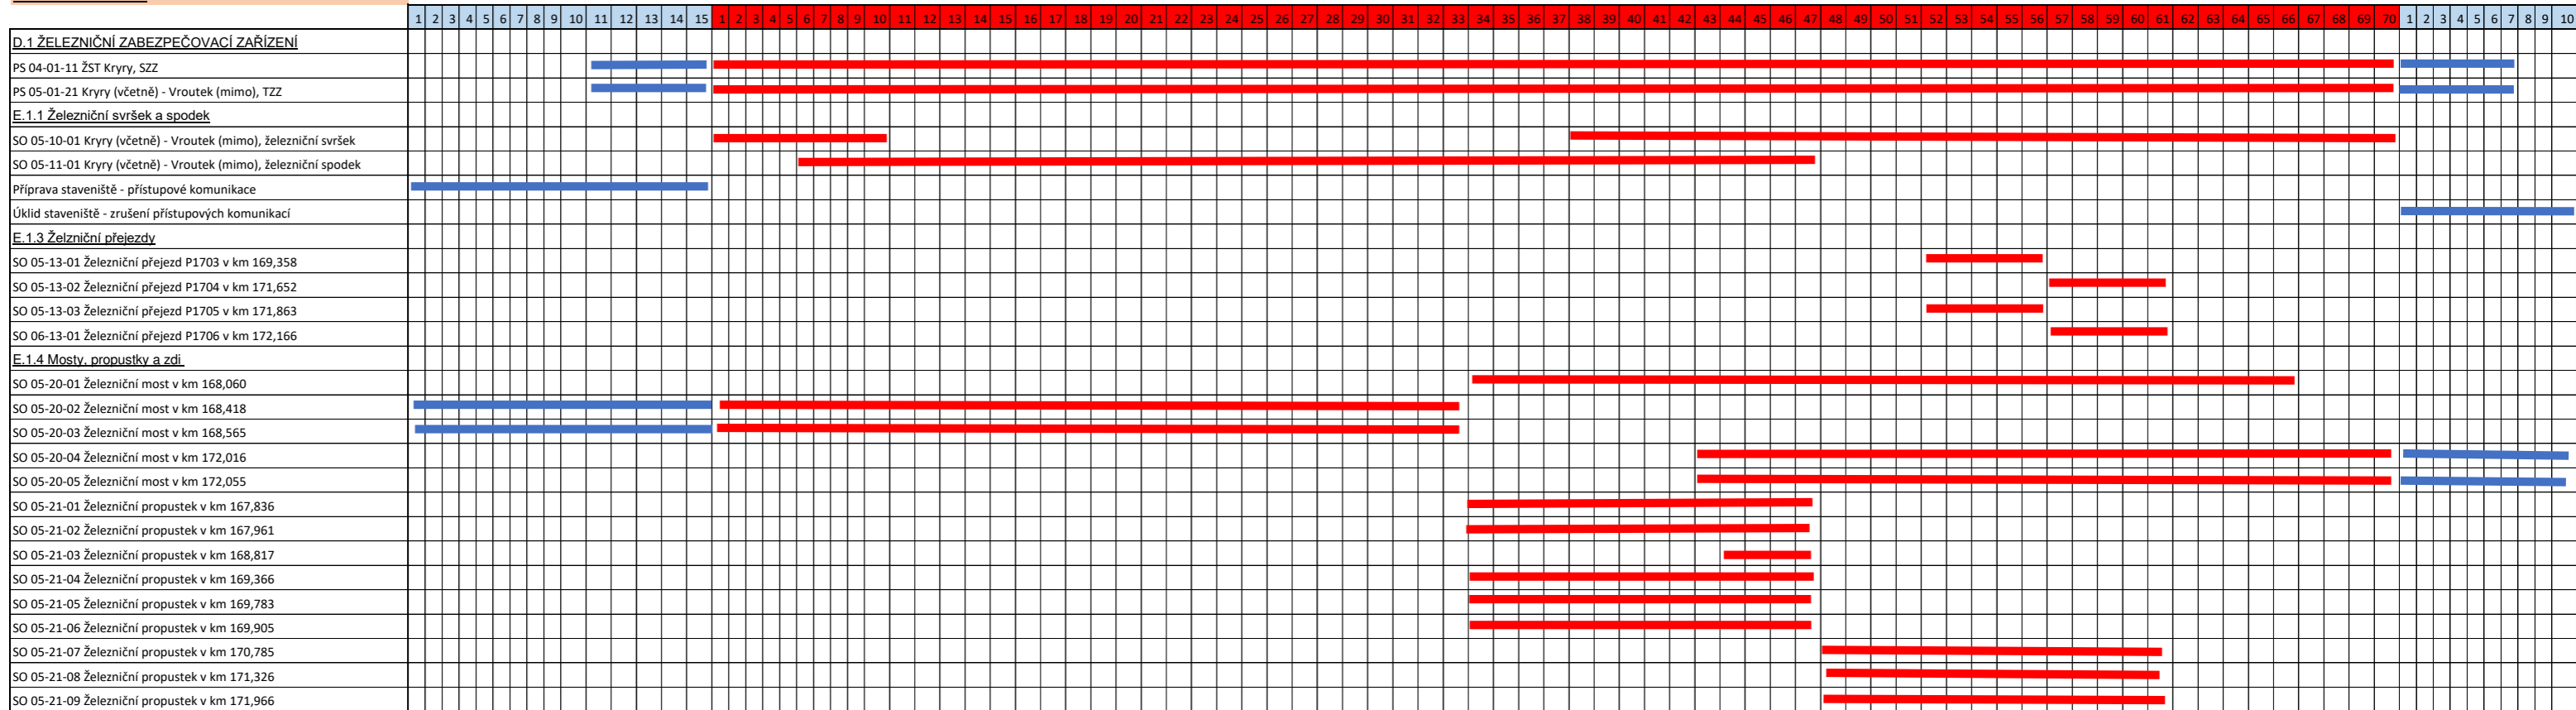

V Litoměřicích, dne

Ing. Jan Kokeš
 Digitálně podepsal Ing. Jan Kokeš
 Datum: 2021.01.07 11:19:28 +01'00'

Ing. Jan Kokeš
 Předseda představenstva,
 Chládek & Tintěra, a.s.

Miroslava Bosmanová
 Digitálně podepsal Miroslava Bosmanová
 Datum: 2021.01.07 11:19:45 +01'00'

Miroslava Bosmanová
 Člen představenstva,
 Chládek & Tintěra, a.s.

PŘÍLOHA Č. 5

Smlouva o zpracování osobních údajů

1. Předmět smlouvy o zpracování osobních údajů

- 1.1 Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel bude pro Objednatele zpracovávat osobní údaje třetích stran za účelem zajištění uzavření smluv uvedených ve Všeobecných technických podmínkách, a to za splnění podmínek dále uvedených.
- 1.2 Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel bude pro Objednatele zpracovávat předmětné osobní údaje výhradně za uvedeným účelem a na základě doložených pokynů a podmínek Objednatele a v souladu s nimi, jak vyplývají z této Smlouvy o zpracování osobních údajů a z této Smlouvy o dílo.

2. Rozsah zpracovávaných údajů

- 2.1 Zhotovitel bude pro Objednatele zpracovávat osobní údaje třetích stran, které jsou v souladu s platnou právní úpravou nezbytné pro uzavření smluv uvedených v odst. 2.3.25 přílohy č. 2 této Smlouvy o dílo.
- 2.2 Pokud Zhotovitel bude zpracovávat na základě výslovného pokynu Objednatele osobní údaje, které nejsou uvedeny ve výše uvedeném bodě 2.1, budou tyto nové osobní údaje zpracovávány za stejných podmínek.

3. Povinnosti Zhotovitele

- 3.1 Zhotovitel se zavazuje přijmout vhodná technická a organizační opatření podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46 ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“), které se na něj jako na zpracovatele vztahují a plnění těchto povinností na vyžádání doložit Správci.
- 3.2 Zhotovitel bude neprodleně informovat Objednatele, pokud jsou podle jeho názoru některé pokyny Objednatele v rozporu s platnou právní úpravou.
- 3.3 Zhotovitel je povinen zajistit, aby se osoby oprávněné zpracovávat osobní údaje zavázaly zachovávat mlčenlivost ve vztahu ke všem osobním údajům, které zpracovává v souladu se Smlouvou o zpracování osobních údajů, a rovněž tak o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů.
- 3.4 Zhotovitel je povinen přijmout všechna opatření dle čl. 32 GDPR tak, aby byla zajištěna odpovídající bezpečnost osobních údajů.
- 3.5 Zhotovitel může do zpracování zapojit poddodavatele pouze na základě předchozího písemného souhlasu Objednatele. V případě souhlasu se Zhotovitel zavazuje s těmito poddodavateli uzavřít smlouvu zajišťující dodržování práv a povinností stanovených touto Smlouvou, zvláště pak povinnosti mlčenlivosti a zajištění bezpečnosti osobních údajů a poskytnutí dostatečných záruk pro zavedení stejných technických a organizačních opatření poddodavatelem.
- 3.6 Zhotovitel je povinen zohlednit povahu zpracování, být Objednateli nápomocen prostřednictvím vhodných technických a organizačních opatření pro splnění Objednatelovy povinnosti reagovat na žádost o výkon práv subjektů dle GDPR.
- 3.7 Zhotovitel je povinen být Objednateli nápomocen při zajišťování souladu s povinnostmi podle článku 32 až 36 GDPR, a to při zohlednění povahy zpracovaných informací, jež má Zhotovitel k dispozici. V případech, kdy povaha věcí vyžaduje informování Objednatele ze strany Zhotovitele, informuje Zhotovitel Objednatele bez zbytečného odkladu.
- 3.8 Zhotovitel je povinen umožnit Objednateli a jím pověřené osobě během běžné pracovní doby Zhotovitele provést v sídle Zhotovitele kontrolu dodržování povinností týkajících se zpracování osobních údajů vyplývajících z této Smlouvy o zpracování osobních údajů, a to i po ukončení stanovené doby zpracování, tj. po ukončení této Smlouvy o dílo, a to do 3 měsíců od jejího ukončení.

- 3.9 Po ukončení zpracování osobních údajů podle této Smlouvy o zpracování osobních údajů je Zhotovitel povinen vymazat všechny zpracovávané osobní údaje ze všech svých systémů nebo databází, včetně vymazání všech záložních kopií, s výjimkou kdy uchovávání je v souladu s platnou právní úpravou nebo k tomu dal písemný souhlas Objednatel.

4. Odpovědnost Zhotovitele a smluvní pokuta

- 4.1 V případě, že Zhotovitel zpracuje osobní údaje nad rámec vymezený Smlouvou nebo doloženými pokyny Objednatele, považuje se ve vztahu k takovému zpracování Zhotovitel za „zpracovatele“ ve smyslu GDPR. Pokud tímto zpracováním nad rámec vymezený Smlouvou o zpracování osobních údajů nebo doloženými pokyny Objednatele vznikne Objednateli škoda, je Zhotovitel povinen škodu uhradit.
- 4.2 Pokud Zhotovitel poruší jakoukoliv povinnost vyplývající z ustanovení této Smlouvy o zpracování osobních údajů, je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% z Ceny Díla za každé jednotlivé porušení. Smluvní pokuta je splatná do 28 dnů ode dne doručení písemné výzvy k úhradě zaslané Objednatelem na základě tohoto ustanovení.
- 4.3 Zaplacením smluvní pokuty, jak je popsána v odstavci výše, není dotčeno právo Objednatele požadovat náhradu újmy způsobené porušením ustanovení této Smlouvy o zpracování osobních údajů.

PŘÍLOHA Č. 6

Zmocnění Vedoucího zhotovitele

- Netýká se

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1394516

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 9304d28b-469c-4da7-af87-12d3eee7dd3a

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Monika PETRÍKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 10.03.2021 12:54:02



7a406cde-5835-4940-8cb8-2eae171d87c7
