


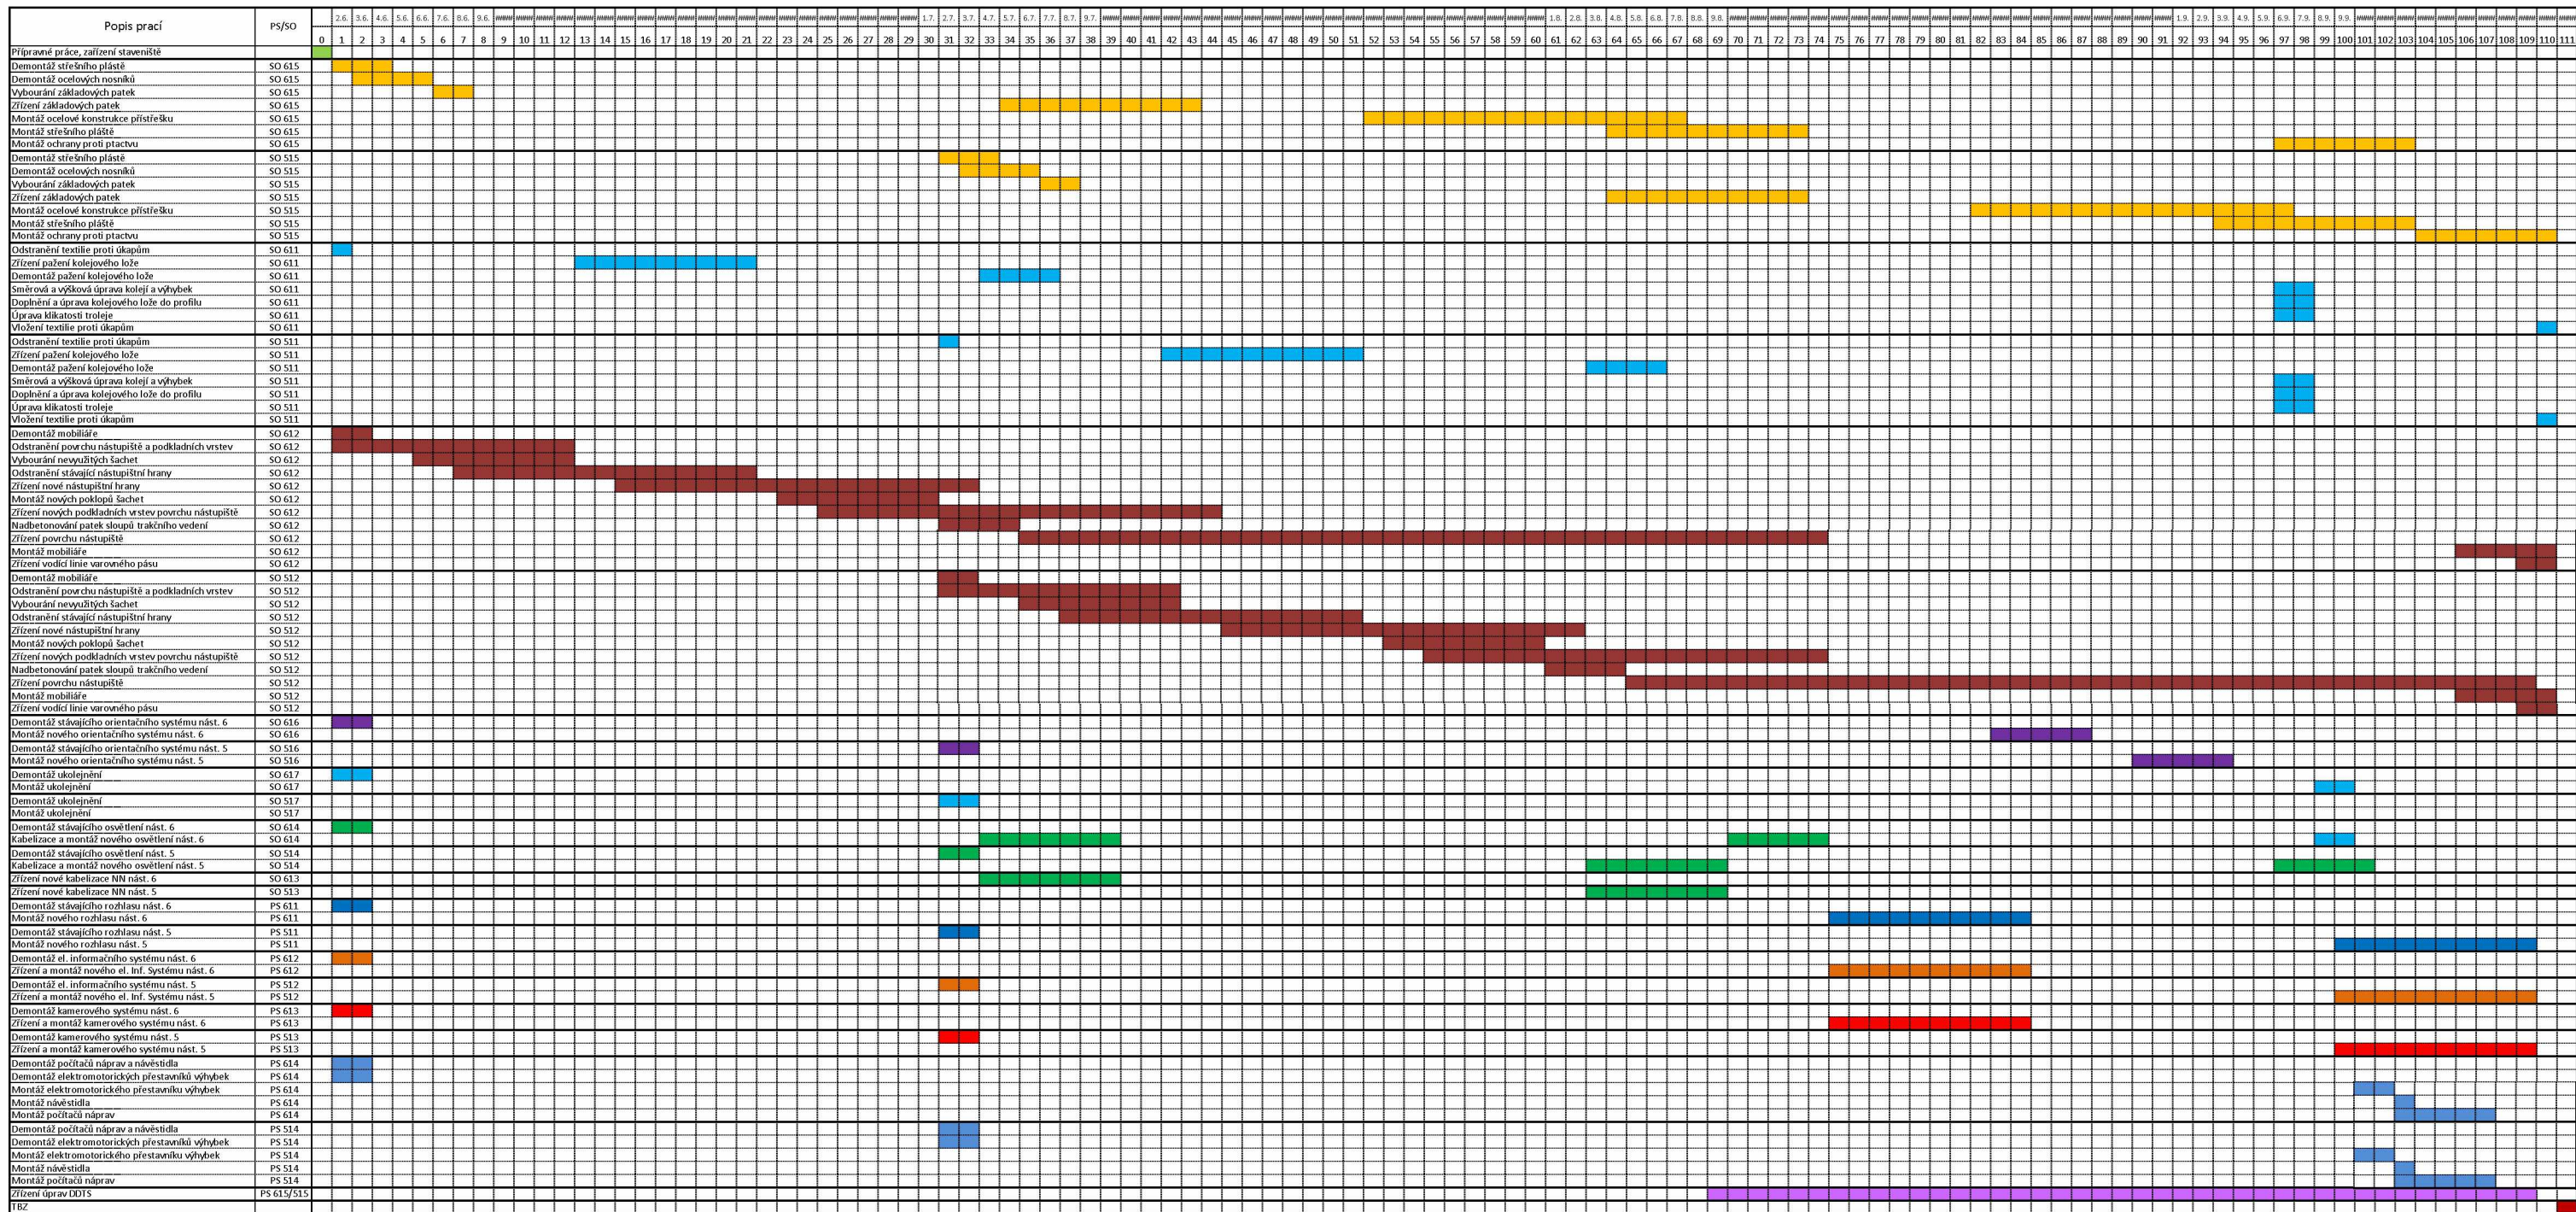

POSTUP PRÁCE: Oprava výhybek č. 2, 4, EU1, EU2 a zrušení výh. č. 1 v žst. Pardubice

Datum: 27.10.2016

Lokalita: Pardubice

TUDU: 1501

Předpokládaný začátek / konec v

Předpokládaná doba výluky:

Poř. č.	Popis práce	Objem prací	Začátek práce
	ZAČÁTEK VÝLUKY		7:00
1	Vypnutí trakčního vedení, ukolejnění		7:00
2	Snesení výhybky a přípojných polí s uložením na skládku	1 výhybka + 26m polí	7:30
3	Těžení štěrku, zeminy pláně, hloubení rýhy pro trativod	315 m ³	8:00
4	Úprava a zhutnění zemní pláně	297 m ²	11:00
5	Rozvinutí geotextilie	505 m ²	12:15
6	Zřízení trativodu	49 m + 2 šachty	9:30
7	Vysypání štěrkopísku z výklopných vozů	199 m ³	13:15
8	Rozprostření štěrkopísku	336 m ³	13:30
9	Zahrnutí trativodní rýhy	40 m ³	13:30
10	Zhutnění štěrkopískové vrstvy	336 m ²	13:45
11	Vysypání štěrku z výklopných vozů	60 m ³	14:45
12	Rozprostření spodní vrstvy kolejového lože	245 m ²	14:50
13	Zhutnění spodní vrstvy kolejového lože	245 m ²	15:05
14	Kladení výhybky a přípojných kolejových polí	1 výhybka + 26m polí	15:25
15	Zašterkování z výsypných Sa vozů	50 m ³	16:55
16	Směrová a výšková úprava koleje pro 30 km	1 výhybka + 26m polí	17:10
17	Práce SSZT, zapojení do RZZ	SSZT	16:15
18	Kontrola sjízdnosti trakčního vedení, zapnutí proudu	SEE	18:15
	KONEC VÝLUKY		18:30

	kolejový jeřáb EDK 300
	zemní stroj JCB 3CX
	zemní stroj JCB 3CX
	4 x nákladní automobil
	vibrační válec VVW 3402
	Lokomotiva + vozy na štěrk (sklopné UA Dumpcar/sypné Faccs 10)
	traťová strojní podbíječka ASP 07-275
	práce Správy sdělovací a zabezpečovací techniky a Správy elektrotechniky a energetiky

ýluky: 7.11.2016/16.11.2016
10 N nepře

Konec práce	Trvání práce	1. 7:00	2. 8:00	3. 9:00	4. ####	5. ####	6. ####	7. ####	8. ####	9. ####	10. ####	11. ####	12. ####	13. ####
7:30	0:30													
8:30	1:00		EDK											
13:15	5:15		JCB	4 nákl.	JCB	JCB	4 nákl.							
13:40	2:40					JCB	VWV							
14:15	2:00						ručně							
14:15	4:45				ručně									
13:45	0:30							Lok + 7 UA						
14:45	1:15							JCB						
14:45	1:15							JCB						
14:55	1:10							VWV						
15:15	0:30								Lok + 2 UA					
15:35	0:45													
15:50	0:45								VWV					
16:55	1:30									EDK				
17:25	0:30											Lok + 2 Faccs		
18:00	0:50											ASP		
18:15	2:00										SSZT			
18:30	0:15												SEE	

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1520750

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 6996b48c-e6e3-4915-a459-b4c75ea6ef33

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Jana SVOBODOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 25.05.2021 14:05:01



c978f494-5137-4c1b-a022-55b89bf09b08
