

1.12.21


Zobrazení hlavních vazeb

Index	Název činnosti	Pracovníků	Cena [TKč]	Množství [M. j.]	Doba Rez. [týd.]	Začátek možný	Konec možný	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
ZS Palachova																																					
1	PŘEVZETÍ STAVENIŠTĚ	0	0,00	0,0	1	0	1	1	Převzetí staveniště																												
MILNIK	1 ZS Palachova																																				
409	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ	5	220,25	126,4	6	0	1	6	Bourání konstrukcí																												
1	ZS Palachova			M3																																	
410	OSTATNÍ BOURACÍ PRÁCE	2	11,83	1,0	1	0	1	1	Ostatní bourací práce																												
1	ZS Palachova			M3																																	
459	VYBOURÁNÍ OTVOR VÝPLNÍ	2	2,75	2,0	1	0	1	1	Vybourání otvor výplní																												
1	ZS Palachova			M2																																	
460	DMTŽ TESAŘ KONSTRUKCÍ	2	1,61	28,0	2	0	1	2	Dmtž tesař konstrukcí																												
1	ZS Palachova			M3																																	
465	ODSTRANĚNÍ NÁTĚRŮ	2	1,69	7,7	1	0	1	1	Odstranění nátěrů																												
1	ZS Palachova			M2																																	
469	DOPRAVA A SKLÁD VYB HMOT	1	437,75	1528,9	6	0	1	6	Doprava a sklád vyb hmot																												
1	ZS Palachova			T																																	
859	PŘESUN HMOT TE 0	1	1,06	1060,0	1	5	1	1	Přesun hmot TE 0																												
1	ZS Palachova			KČ																																	
900	OSTATNÍ PRÁCE TE 0	2	14,25	14,3	1	5	1	1	Ostatní práce TE 0																												
1	ZS Palachova			TKČ																																	
3859	PŘESUN HMOT TE 3	2	9,92	9920,0	1	10	7	7	Přesun hmot TE 3																												
1	ZS Palachova			KČ																																	
4253	ZDI NADSTŘEŠNÍ	2	32,84	10,3	1	8	7	7	Zdi nadstřešní																												
1	ZS Palachova			M3																																	
4327	TEPELNÁ IZOLACE STŘECH	2	572,39	3760,6	11	8	8	18	Tepelná izolace střech																												
1	ZS Palachova			M2																																	
4827	NÁTĚRY STŘEŠNÍCH PRVKŮ	1	2,79	23,2	1	10	19	19	Nátěry střešních prvků																												
1	ZS Palachova			M2																																	
4859	PŘESUN HMOT STŘECHA	2	0,01	10,0	1	22	7	7	Přesun hmot střecha																												
1	ZS Palachova			KČ																																	
5103	ZDI VÝPLŇOVÉ A KOMÍNOVÉ	2	41,59	7,5	1	5	7	7	Zdi výplňové a komínové																												
1	ZS Palachova			M3																																	
5209	LEHKÉ PROSTOROVÉ LEŠENÍ	2	30,89	565,5	2	0	7	8	Lehké prostorové lešení																												
1	ZS Palachova			M3																																	
5327	TRUHLÁŘI OKNA	2	13637,73	503,8	7	4	7	13	Truhláři okna																												
1	ZS Palachova			M2																																	
5407	TESAŘI PODLAHY DŘEVĚNÉ	3	1145,52	47,8	11	0	7	17	Tesaři podlahy dřevěné																												
1	ZS Palachova			M3																																	
6207	TEPELNÁ IZOLACE KONSTR	2	433,49	566,7	2	7	9	10	Tepelná izolace konstr																												
1	ZS Palachova			M2																																	
6306	ÚPRAVA POVRCHŮ VNITŘNÍ	2	904,87	417,9	5	4	9	13	Úprava povrchů vnitřní																												
1	ZS Palachova			M2																																	
7407	OBKLADY VNITŘNÍ	2	11,47	61,5	2	10	14	15	Obklady vnitřní																												
1	ZS Palachova			M2																																	
7707	MALBY VNITŘNÍ	2	183,76	8658,5	8	0	18	25	Malby vnitřní																												
1	ZS Palachova			M2																																	
8257	TRUHLÁŘI DVEŘE,VYBAVENÍ	2	380,92	239,0	4	0	26	29	Truhláři dveře,vybavení																												
1	ZS Palachova			KS																																	
8607	MĚŘENÍ A REGULACE	2	184,41	110,6	2	14	14	15	Měření a regulace																												
1	ZS Palachova			KS																																	
8809	VYČISTĚNÍ OBJEKTU	3	209,47	3092,9	11	0	19	29	Vyčistění objektu																												
1	ZS Palachova			M2																																	
9687	KLEMPÍŘI FASÁDNÍ PRVKY	2	63,98	277,2	3	8	19	21	Klempíři fasádní prvky																												
1	ZS Palachova			M																																	
9950	OSTATNÍ NÁKLADY,REZERVA	1	166,00	166,0	29	0	1	29	Ostatní náklady,rezerva																												
1	ZS Palachova			TKČ																																	
9980	VÝSTUPNÍ KONTROLA	1	0,00	0,0	1	0	30	30	Výstupní kontrola																												
1	ZS Palachova																																				
9985	Předání díla max 7 měsíc	0	0,00	0,0	1	0	30	30	Předání díla max 7 měsíc																												
MILNIK	1 ZS Palachova																																				

Činnost: kritická - ■, zpožděná - ■, s rezervou - ■, rezerva - - + - +, milník - ⊕, vynucený termín - ▶, hlavní vazba - ↓
 Časová jednotka: 1 týden


1.12.21

Graf potřeby rozpočtové ceny celkem v týdnech [Tisíc Kč] - průběžně

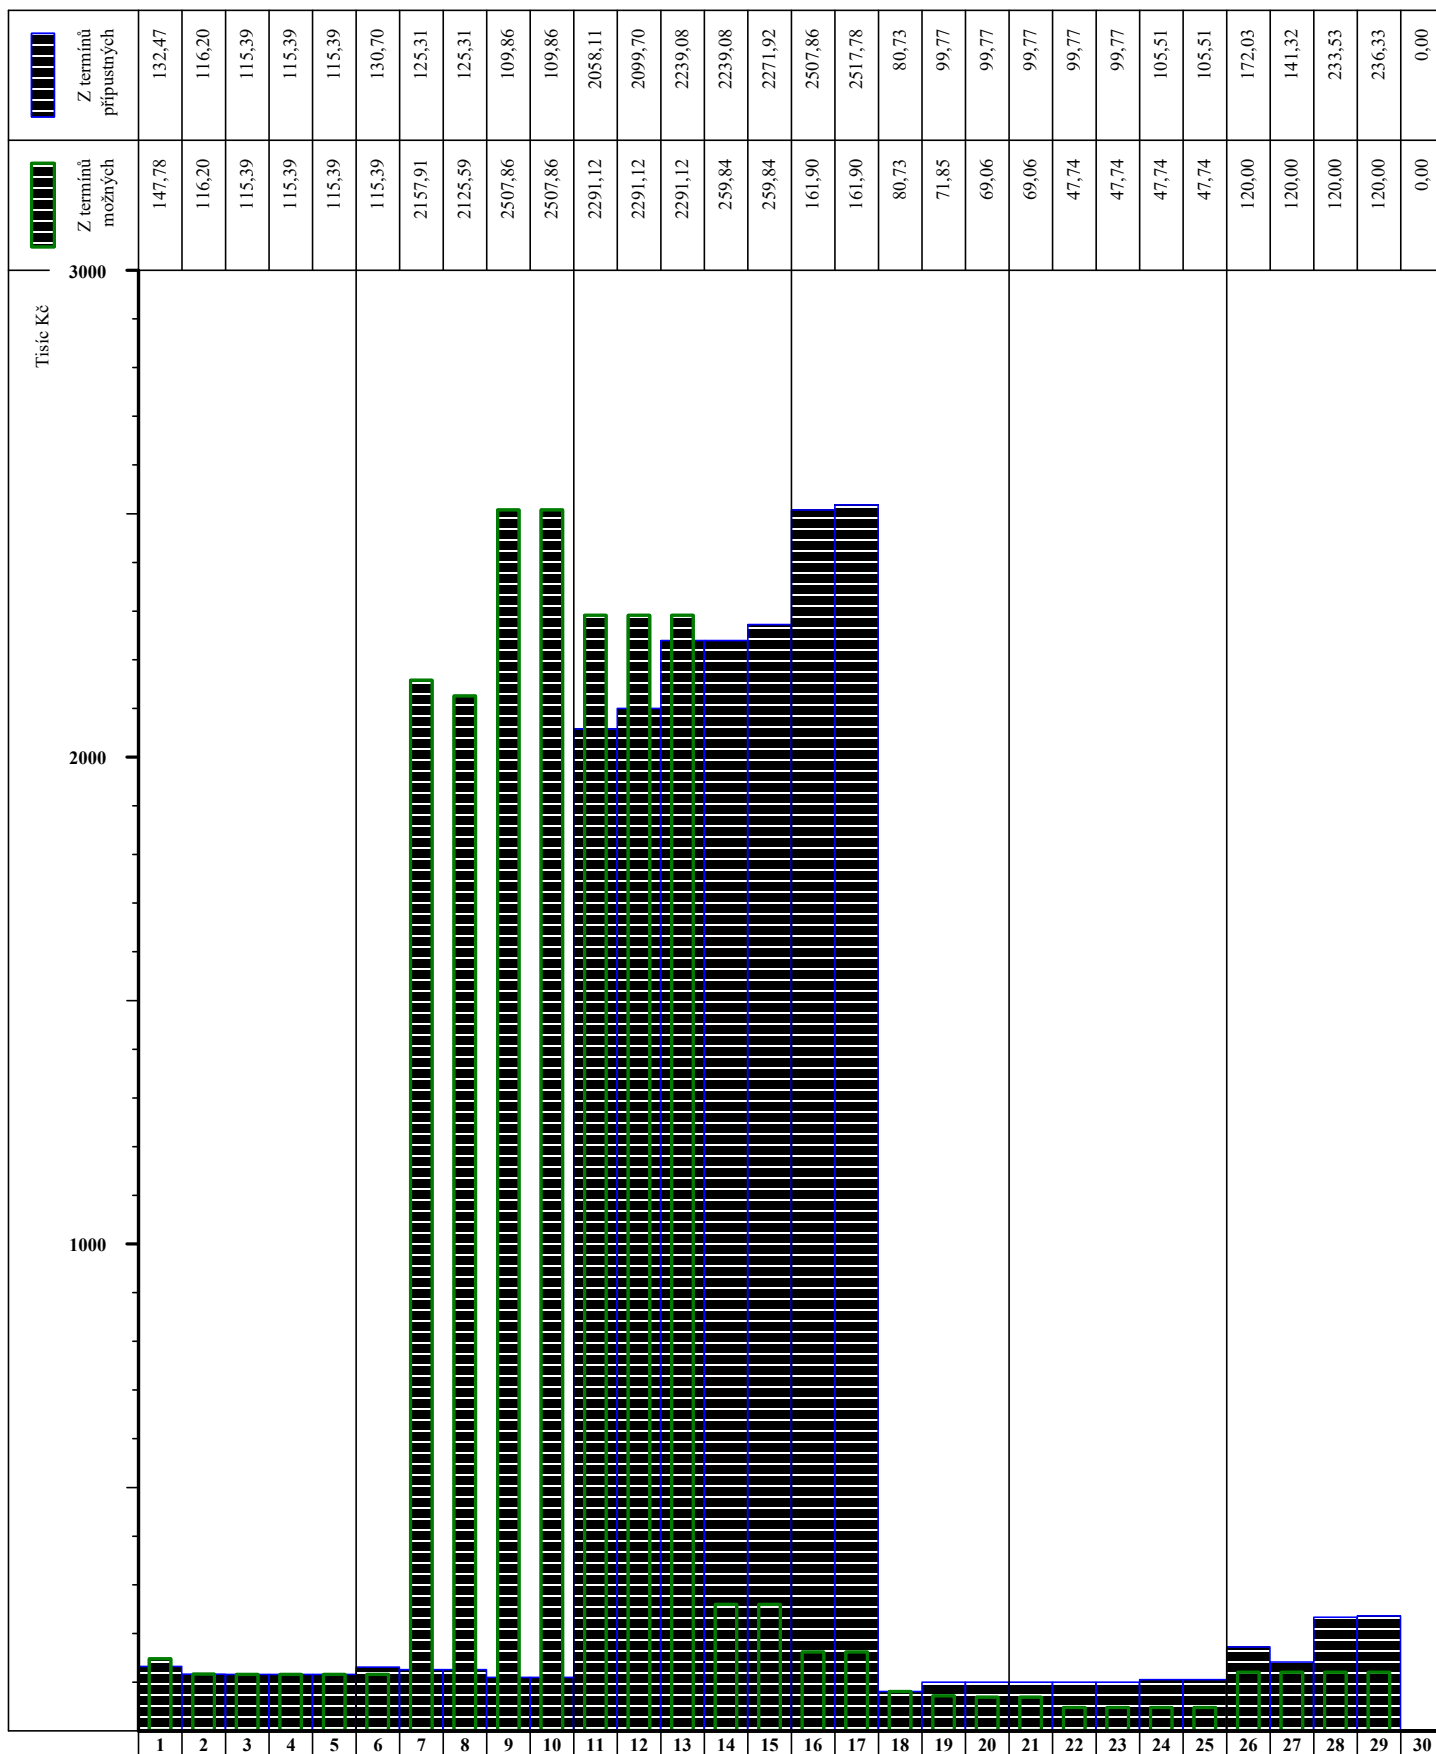


1.12.21

Graf potřeby rozpočtové ceny celkem v týdnech [Tisíc Kč] - nasčítaně

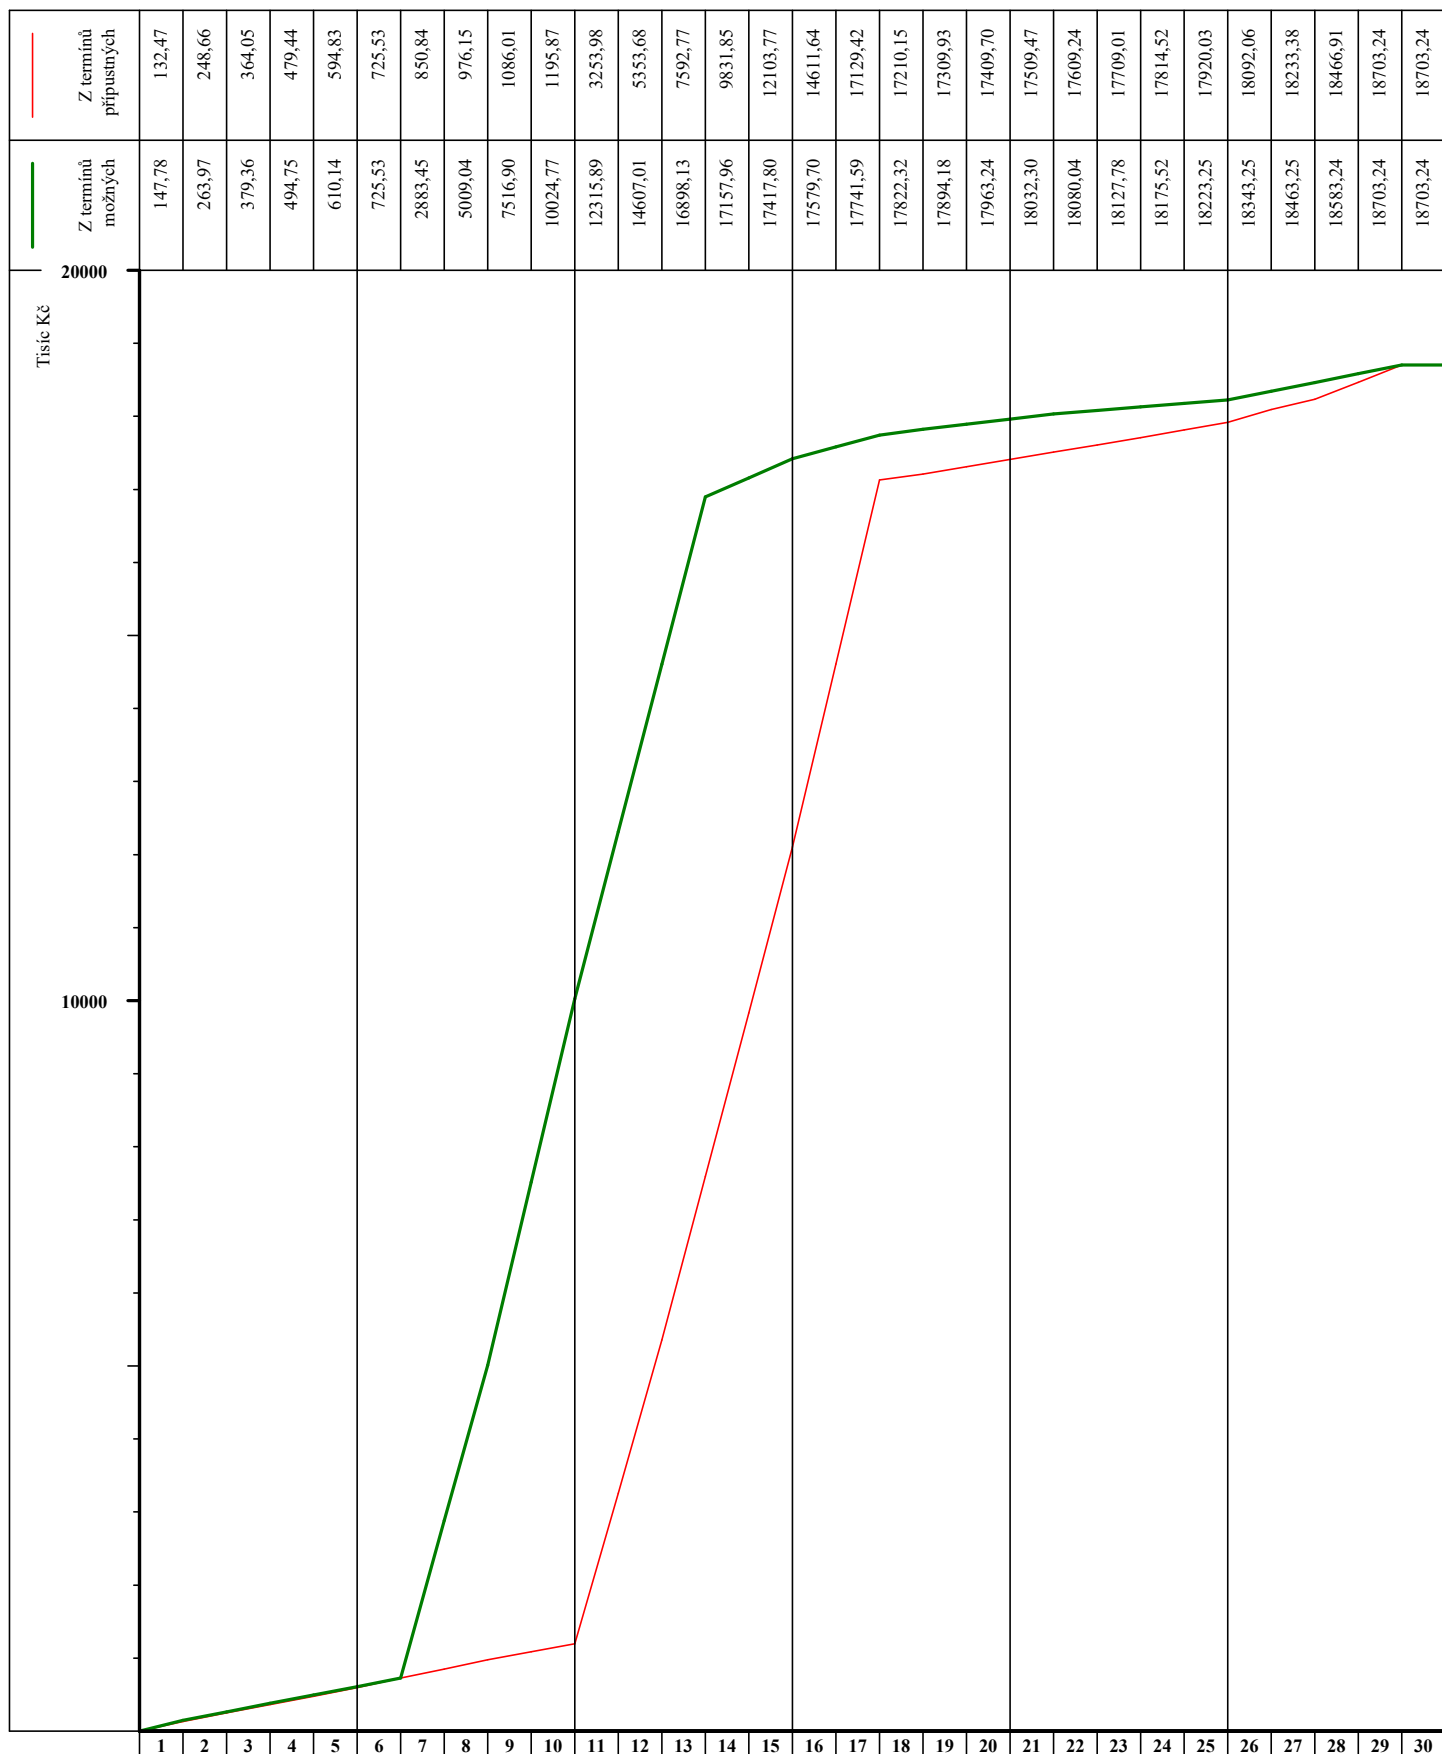


1.12.21

Graf potřeby rozpočtové ceny celkem v měsících [Tisíc Kč] - průběžně

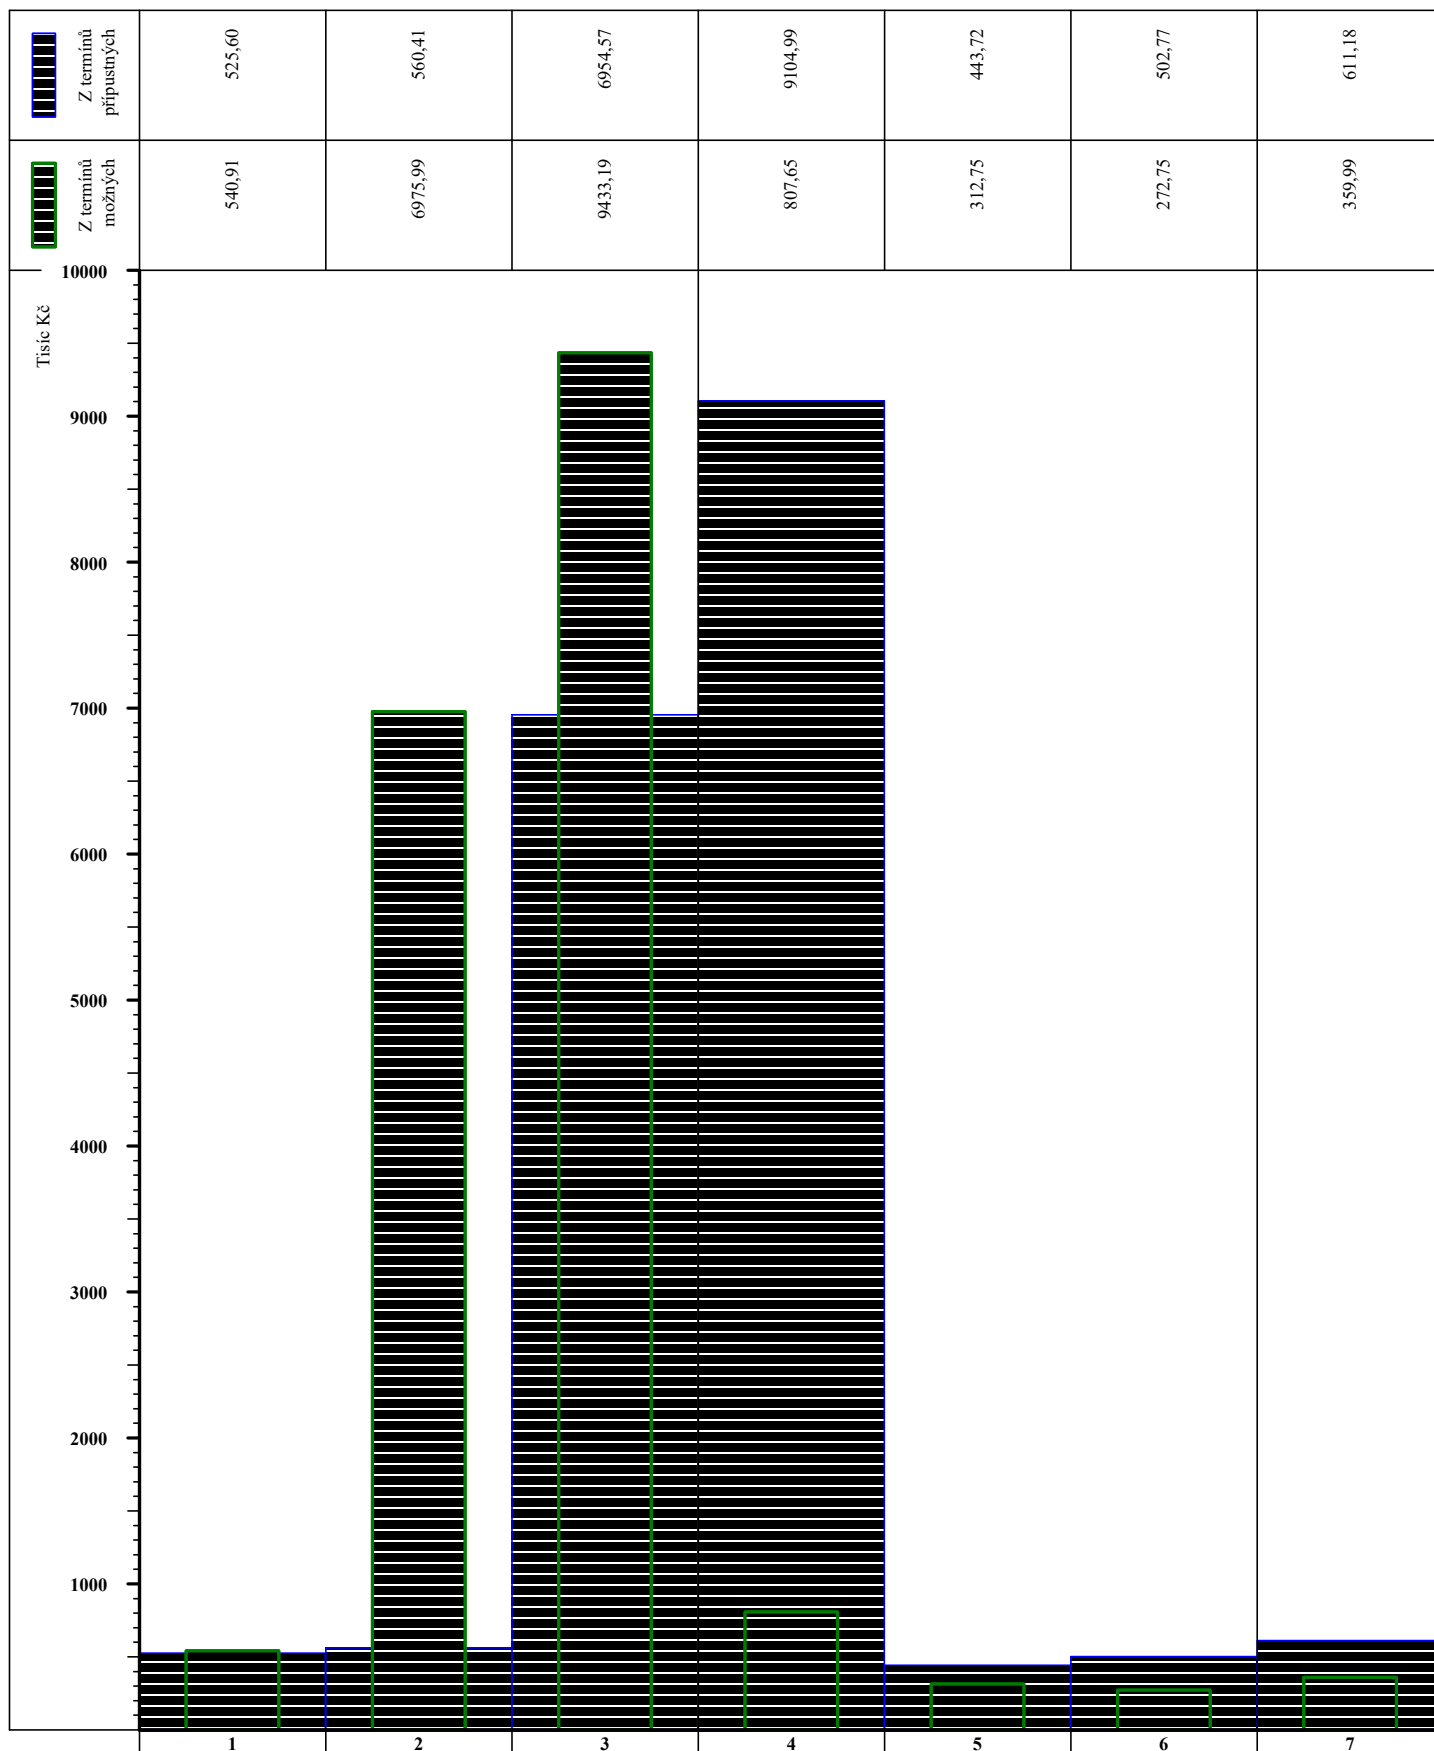

1.12.21

Graf potřeby rozpočtové ceny celkem v měsících [Tisíc Kč] - nasčítaně

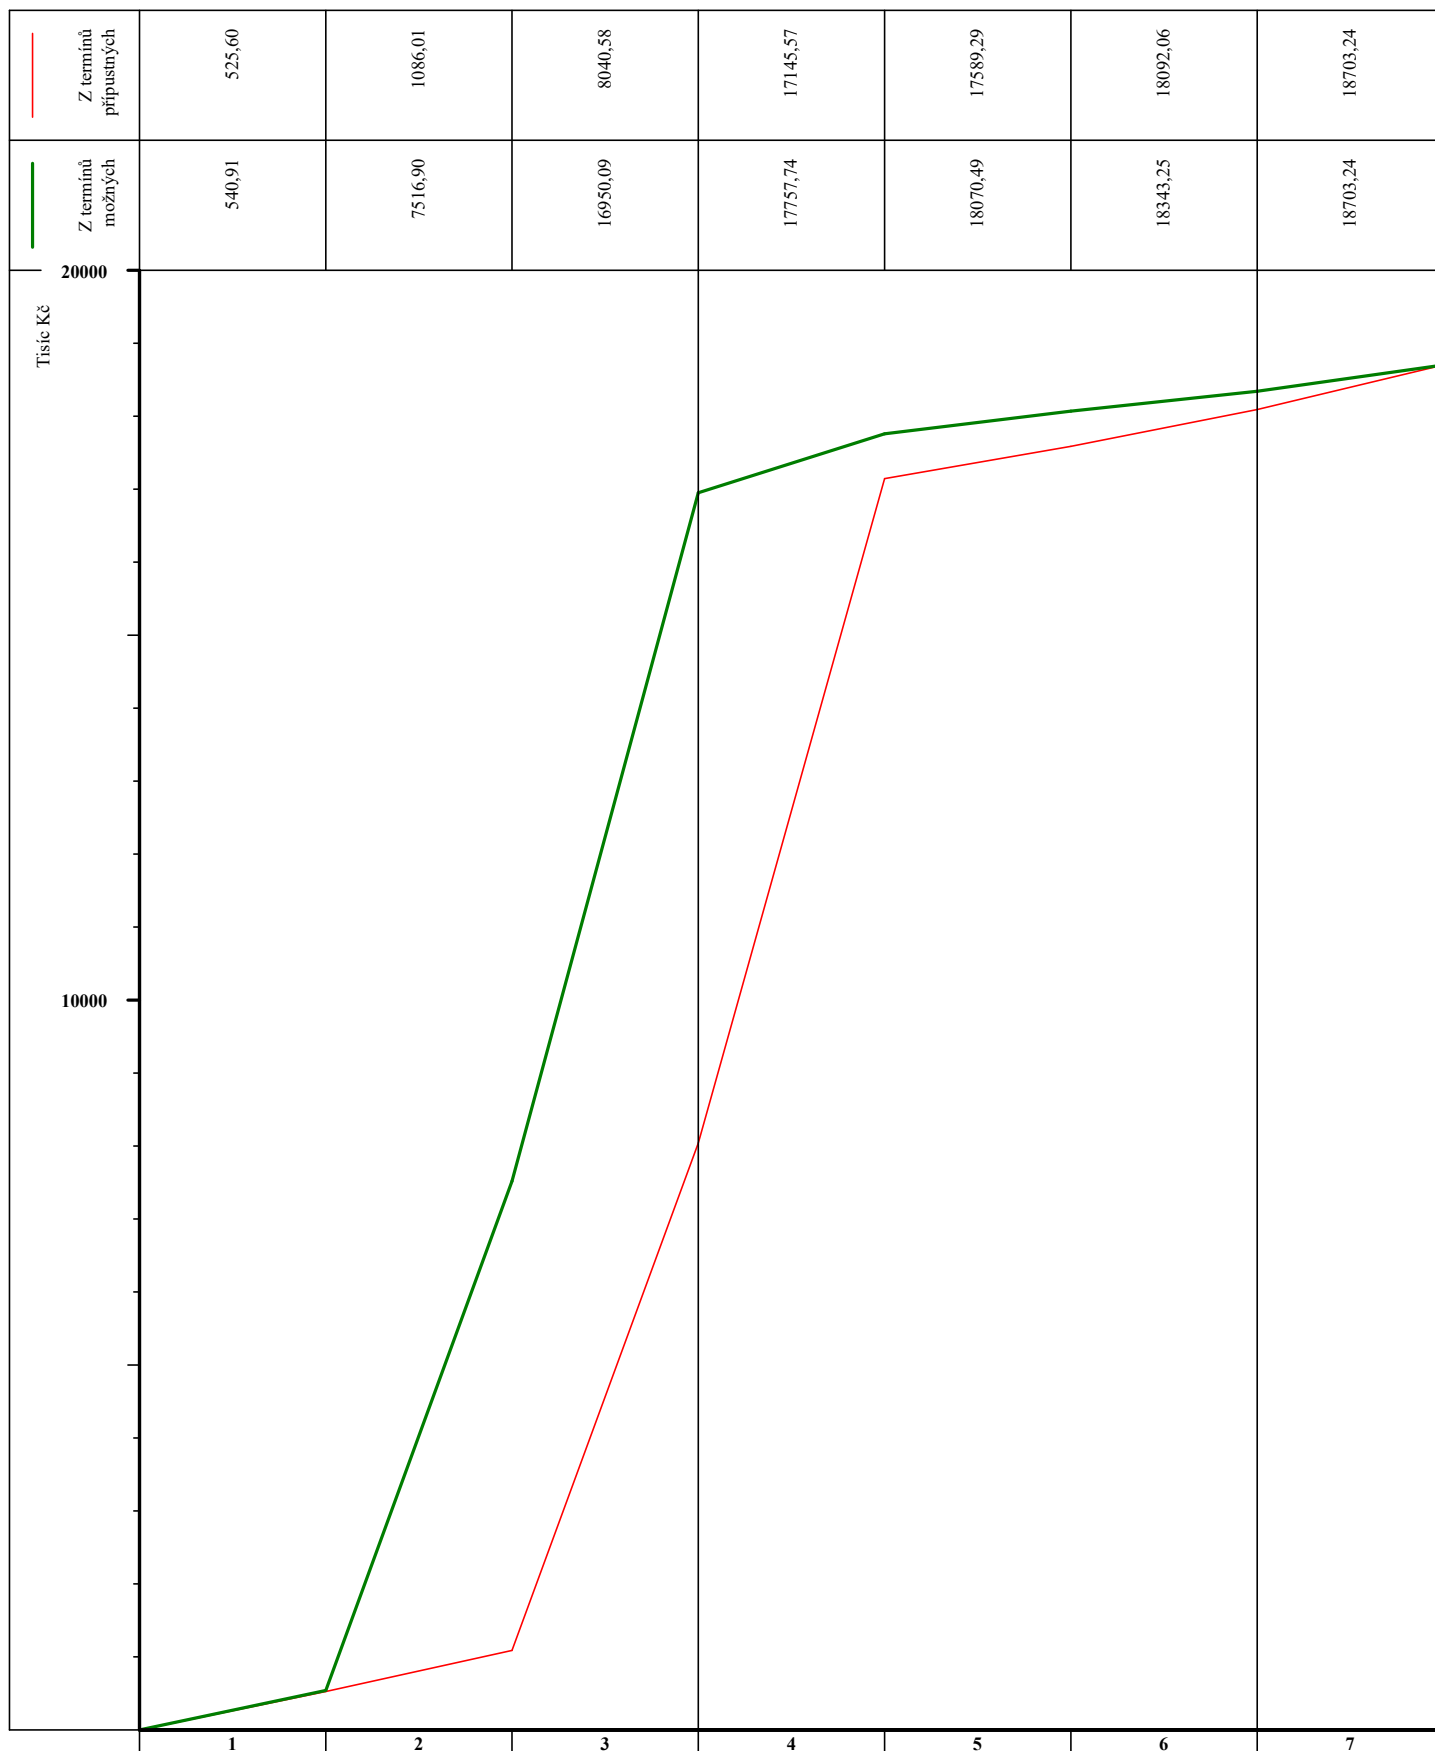



1.12.21

Přehled potřeby rozpočtové ceny celkem v týdnech [Tisíc Kč]

Termín	Průběžně z termínů		Nasčítaně z termínů		Nasčítaně v [%] z termínů	
	možných	přípustných	možných	přípustných	možných	přípustných
1	147,78	132,47	147,78	132,47	0,79	0,71
2	116,20	116,20	263,97	248,66	1,41	1,33
3	115,39	115,39	379,36	364,05	2,03	1,95
4	115,39	115,39	494,75	479,44	2,65	2,56
5	115,39	115,39	610,14	594,83	3,26	3,18
6	115,39	130,70	725,53	725,53	3,88	3,88
7	2157,91	125,31	2883,45	850,84	15,42	4,55
8	2125,59	125,31	5009,04	976,15	26,78	5,22
9	2507,86	109,86	7516,90	1086,01	40,19	5,81
10	2507,86	109,86	10024,77	1195,87	53,60	6,39
11	2291,12	2058,11	12315,89	3253,98	65,85	17,40
12	2291,12	2099,70	14607,01	5353,68	78,10	28,62
13	2291,12	2239,08	16898,13	7592,77	90,35	40,60
14	259,84	2239,08	17157,96	9831,85	91,74	52,57
15	259,84	2271,92	17417,80	12103,77	93,13	64,71
16	161,90	2507,86	17579,70	14611,64	93,99	78,12
17	161,90	2517,78	17741,59	17129,42	94,86	91,59
18	80,73	80,73	17822,32	17210,15	95,29	92,02
19	71,85	99,77	17894,18	17309,93	95,67	92,55
20	69,06	99,77	17963,24	17409,70	96,04	93,08
21	69,06	99,77	18032,30	17509,47	96,41	93,62
22	47,74	99,77	18080,04	17609,24	96,67	94,15
23	47,74	99,77	18127,78	17709,01	96,92	94,68
24	47,74	105,51	18175,52	17814,52	97,18	95,25
25	47,74	105,51	18223,25	17920,03	97,43	95,81
26	120,00	172,03	18343,25	18092,06	98,08	96,73
27	120,00	141,32	18463,25	18233,38	98,72	97,49
28	120,00	233,53	18583,24	18466,91	99,36	98,74
29	120,00	236,33	18703,24	18703,24	100,00	100,00
30	0,00	0,00	18703,24	18703,24	100,00	100,00



1.12.21

Přehled potřeby rozpočtové ceny celkem v měsících [Tisíc Kč]

Termín	Průběžně z termínů		Nasčítaně z termínů		Nasčítaně v [%] z termínů	
	možných	přípustných	možných	přípustných	možných	přípustných
1	540,91	525,60	540,91	525,60	2,89	2,81
2	6975,99	560,41	7516,90	1086,01	40,19	5,81
3	9433,19	6954,57	16950,09	8040,58	90,63	42,99
4	807,65	9104,99	17757,74	17145,57	94,94	91,67
5	312,75	443,72	18070,49	17589,29	96,62	94,04
6	272,75	502,77	18343,25	18092,06	98,08	96,73
7	359,99	611,18	18703,24	18703,24	100,00	100,00



1.12.21

ZS Palachova

Období od 1 do 30, plán vypočten z termínů možných

Index Etapa	Název činnosti	M. j. Dodavatel	Objem [M. j.]	Před obd.	V období.	Po období	Celkem	Trvání Rezerva	Začátek možný	Konec možný
				Cena	Náklady	[TKč]				
409	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ	M3	126	0,00	220,25	0,00	220,25	6	1	6
0	ZS Palachova			0	100	0	100	0		
410	OSTATNÍ BOURACÍ PRÁCE	M3	1	0,00	11,83	0,00	11,83	1	1	1
0	ZS Palachova			0	100	0	100	0		
459	VYBOURÁNÍ OTVOR VÝPLNÍ	M2	2	0,00	2,75	0,00	2,75	1	1	1
0	ZS Palachova			0	100	0	100	0		
460	DMTŽ TESAŘ KONSTRUKCÍ	M3	28	0,00	1,61	0,00	1,61	2	1	2
0	ZS Palachova			0	100	0	100	0		
465	ODSTRANĚNÍ NÁTĚRŮ	M2	8	0,00	1,69	0,00	1,69	1	1	1
0	ZS Palachova			0	100	0	100	0		
469	DOPRAVA A SKLÁD VYB HMOT	T	1529	0,00	437,75	0,00	437,75	6	1	6
0	ZS Palachova			0	100	0	100	0		
859	PŘESUN HMOT TE 0	KČ	1060	0,00	1,06	0,00	1,06	1	1	1
0	ZS Palachova			0	100	0	100	5		
900	OSTATNÍ PRÁCE TE 0	TKČ	14	0,00	14,25	0,00	14,25	1	1	1
0	ZS Palachova			0	100	0	100	5		
3859	PŘESUN HMOT TE 3	KČ	9920	0,00	9,92	0,00	9,92	1	7	7
3	ZS Palachova			0	100	0	100	10		
4253	ZDI NADSTŘEŠNÍ	M3	10	0,00	32,84	0,00	32,84	1	7	7
4	ZS Palachova			0	100	0	100	8		
4327	TEPELNÁ IZOLACE STŘECH	M2	3761	0,00	572,39	0,00	572,39	11	8	18
4	ZS Palachova			0	100	0	100	8		
4827	NÁTĚRY STŘEŠNÍCH PRVKŮ	M2	23	0,00	2,79	0,00	2,79	1	19	19
4	ZS Palachova			0	100	0	100	10		
4859	PŘESUN HMOT STŘECHA	KČ	10	0,00	0,01	0,00	0,01	1	7	7
4	ZS Palachova			0	100	0	100	22		
5103	ZDI VÝPLNOVÉ A KOMÍNOVÉ	M3	8	0,00	41,59	0,00	41,59	1	7	7
5	ZS Palachova			0	100	0	100	5		
5209	LEHKÉ PROSTOROVÉ LEŠENÍ	M3	566	0,00	30,89	0,00	30,89	2	7	8
5	ZS Palachova			0	100	0	100	0		
5327	TRUHLÁŘI OKNA	M2	504	0,00	13637,73	0,00	13637,73	7	7	13
5	ZS Palachova			0	100	0	100	4		
5407	TESAŘI PODLAHY DŘEVĚNÉ	M3	48	0,00	1145,52	0,00	1145,52	11	7	17
5	ZS Palachova			0	100	0	100	0		
6207	TEPELNÁ IZOLACE KONSTR	M2	567	0,00	433,49	0,00	433,49	2	9	10
6	ZS Palachova			0	100	0	100	7		
6306	ÚPRAVA POVRCHŮ VNITŘNÍ	M2	418	0,00	904,87	0,00	904,87	5	9	13
6	ZS Palachova			0	100	0	100	4		
7407	OBKLADY VNITŘNÍ	M2	61	0,00	11,47	0,00	11,47	2	14	15
7	ZS Palachova			0	100	0	100	10		
7707	MALBY VNITŘNÍ	M2	8659	0,00	183,76	0,00	183,76	8	18	25
7	ZS Palachova			0	100	0	100	0		
8257	TRUHLÁŘI DVEŘE,VYBAVENÍ	KS	239	0,00	380,92	0,00	380,92	4	26	29
8	ZS Palachova			0	100	0	100	0		
8607	MĚŘENÍ A REGULACE	KS	111	0,00	184,41	0,00	184,41	2	14	15
8	ZS Palachova			0	100	0	100	14		
8809	VYČISTĚNÍ OBJEKTU	M2	3093	0,00	209,47	0,00	209,47	11	19	29
8	ZS Palachova			0	100	0	100	0		
9687	KLEMPÍŘI FASÁDNÍ PRVKY	M	277	0,00	63,98	0,00	63,98	3	19	21
9	ZS Palachova			0	100	0	100	8		
9950	OSTATNÍ NÁKLADY,REZERVA	TKČ	166	0,00	166,00	0,00	166,00	29	1	29
10	ZS Palachova			0	100	0	100	0		

	Cena HSV	Cena PSV	Cena cizí	Cena	Nh HSV	Nh PSV	Nh cizí	Nh celkem	Ph HSV	Ph PSV	Ph cizí	Ph celkem
Plán oddíl:	1917	16620	166	18703	3592	3902	1056	8550	5132	4556	1509	11197
Plán celkem:	1917	16620	166	18703	3592	3902	1056	8550	5132	4556	1509	11197
