

SMLOUVA O DÍLO NA STAVBU

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanského zákoníku,
ve znění pozdějších předpisů, mezi

Objednatelem: Zoologická zahrada hl. m. Prahy, příspěvková
organizace

Se sídlem: U Trojského zámku 120/3, 171 00 Praha 7 - Troja
Zastoupeným: Mgr. Miroslavem Bobkem, ředitelem
IČO: 00064459
DIČ: CZ00064459
Bankovní spojení: PPF banka a. s.
Číslo účtu: 2000980001/6000

(dále jen „Objednatel“)

na straně jedné a

Zhotovitelem: STRABAG a. s.
Pozemní a inženýrské stavitelství

Se sídlem: Kačírková 982/4, 158 00 Praha 5 - Jinonice
Zastoupeným: Ing. Radimem Aulickým, prokuristou
Ing. Tomášem Rysem, prokuristou
Stavbyvedoucí: [REDACTED]
IČO: 60838744
DIČ: CZ60838744
Bankovní spojení: Raiffeisenbank a. s., Vodičkova 3, 111 00
Praha 1
Číslo účtu: 1100029040/5500

(dále jen „Zhotovitel“)

na straně druhé.

1. Úvodní ustanovení

1.1 Výše uvedené Smluvní strany uzavírají tuto Smlouvu o dílo na stavbu (dále jen „Smlouva“) v souladu s článkem 3.5, odst. 3.5.1. vnitřní směrnice Objednatele č. 8/2020 - Zadávání veřejných zakázek v Zoo Praha.

1.2 Smluvní strany deklarují, že uzavřením a nabytím účinnosti této Smlouvy nevznikají Objednateli žádné náklady. Objednateli vznikají náklady až okamžikem zahájení plnění dle této Smlouvy.

1.3 Smluvní strany se společně hlásí k principům odpovědného zadávání veřejných zakázek dle § 6 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů („ZZVZ“), kdy plněním předmětu této Smlouvy a jeho úhradou obě strany získávají maximální hodnotu a společně se podílejí na pozitivním rozvoji společnosti a ekonomiky a minimalizaci negativních dopadů na životní prostředí.

2. Předmět Smlouvy

2.1 Předmětem této Smlouvy je realizace stavebních prací při zhotovení a instalaci zvedání 7 světel nad zelenou stěnou v novém pavilonu goril (dále jen „**Dílo**“). Předmět této Smlouvy je podrobně specifikován v cenové nabídce, jejíž součástí je oceněný soupis prací s výkazem výměr a materiálu (dále jen „**Oceněný výkaz výměr**“), která tvoří přílohu č. 1 této Smlouvy.

Součástí dodávky Díla jsou i následující práce a činnosti:

2.1.1 zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení Díla;

2.1.2 veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí, majetku a životního prostředí;

2.1.3 průběžný úklid a čištění okolí staveniště;

2.1.4 zajištění všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání Díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů Díla;

2.1.5 odvoz a uložení stavební sutě na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů.

2.2 Zhotovitel se zavazuje, že provede Dílo vlastním jménem, na vlastní zodpovědnost a předá Dílo Objednateli v rozsahu, kvalitě, podmínkách a termínech dohodnutých v této Smlouvě a v souladu se všemi obecně závaznými předpisy, ČSN a dalšími závaznými či doporučenými technickými a bezpečnostními normami vztahujícími se k Dílu.

2.3 Zhotovitel se výslovně zavazuje při plnění Smlouvy provést všechny práce v nejvyšší odborné kvalitě. Jednotlivé komponenty Díla dodávané Zhotovitelem budou nové, nepoužité, neopravované, funkční a odpovídající požadavkům Objednatele. Zhotovitel provede Dílo osobně nebo subdodavatelsky.

2.4 Zhotovitel se zavazuje Dílo provést, tedy ve smyslu § 2604 Občanského zákoníku Dílo dokončit a předat Objednateli v souladu s touto Smlouvou řádně a včas. Objednatel je povinen za podmínek stanovených v této Smlouvě Dílo převzít a zaplatit Zhotoviteli cenu Díla dle této Smlouvy.

2.5 Součástí Díla jsou rovněž všechny předepsané doklady (záruční listy, protokoly o zkouškách a revizích, prohlášení o shodě, technické listy atd.) (dále jen „**Dokladová část Díla**“).

2.6 Zhotovitel neuskuteční žádnou změnu Díla, ceny, doby plnění ani žádných jiných podmínek této Smlouvy bez předchozího písemného souhlasu Objednatele.

- 2.7 Zhotovitel dodá i veškerý nutný pomocný materiál a zajistí potřebné činnosti v rozsahu předmětu Díla, které sice nejsou detailně specifikované v této Smlouvě, ale jsou nezbytné pro předání Díla v požadované kvalitě, nebo jsou předepsány příslušnými právními předpisy a technickými normami. Znění tohoto odstavce se nevztahuje na případné změny rozsahu Díla, které by představovaly změnu předmětu Díla nad rámec této Smlouvy.
- 2.8 Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s tím, že základní podmínkou Objednatele pro zadání realizace celého Díla je schválení a přidělení finančních prostředků k úhradě ceny Díla ze strany zřizovatele Objednatele, tj. hlavního města Prahy. V případě nedostatečného přidělení investičních prostředků si Objednatel vyhrazuje právo dát Zhotoviteli písemný pokyn buď nezačít plnění této Smlouvy, nebo dočasně pozastavit plnění této Smlouvy.
- 2.9 Zhotovitel se zavazuje, že zajistí, že po celou dobu provádění Díla bude na stavbě přítomen stavbyvedoucí uvedený ve Smlouvě k výkonu odborného vedení provádění stavby, a to v časovém rozsahu potřebném k plnění jeho povinností vyplývajících z obecně závazných právních předpisů, zejména ustanovení § 153 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a této Smlouvy. Stavbyvedoucím může být pouze osoba autorizovaná ČKAIT v oboru „Pozemní stavby“ podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. Zhotovitel se zavazuje, že stavbyvedoucí bude splňovat kvalifikační předpoklady pro výkon činnosti vyžadované touto Smlouvou. Zhotovitel je oprávněn změnit stavbyvedoucího uvedeného v označení smluvních stran pouze na základě předchozího písemného souhlasu Objednatele, přičemž nový stavbyvedoucí musí splňovat stejné kvalifikační předpoklady jako původní stavbyvedoucí.
- 2.10 Zhotovitel je při realizaci předmětu plnění veřejné zakázky povinen dodržet platné technické normy a ekologické požadavky.

3. Místo a doba plnění

- 3.1 Místem plnění je Zoologická zahrada hl. m. Prahy, příspěvková organizace, na adrese: U Trojského zámku 120/3, 171 00 Praha 7 - Troja.
- 3.2 Doba plnění je vymezena těmito termíny:
- 3.2.1 Objednatel předá Zhotoviteli staveniště k provedení Díla **do 2 (dvou) kalendářních dnů** ode dne nabytí účinnosti této Smlouvy. O předání staveniště bude mezi Objednatelem a Zhotovitelem podepsán předávací protokol.
- 3.2.2 Zhotovitel je povinen zahájit provádění Díla **do 2 (dvou) kalendářních dnů** ode dne předání staveniště.
- 3.2.3 Zhotovitel je povinen Dílo dokončit a protokolárně předat Objednateli způsobem popsaným v této Smlouvě v termínu **75 kalendářních dnů ode dne předání staveniště**.

3.2.4 Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště a vyklizené staveniště předat Objednateli **do 2 (dvou) kalendářních dnů** od dokončení Díla a jeho předání Objednateli.

- 3.3 Podmínky pro změnu sjednaných termínů jsou pouze tyto:
- (a) nedostatek finančních prostředků na straně Objednatele;
 - (b) z důvodů vyšší moci;
 - (c) prodlení způsobené nesoučinností ze strany Objednatele.

Vícepráce (dle definice v článku 4, odst. 4.8) nemají vliv na termín dokončení a Dílo bude dokončeno ve sjednaném termínu, pokud se Smluvní strany v písemném dodatku nedohodnou jinak.

4. Cena, platební podmínky, fakturační podmínky, vícepráce

- 4.1 Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na této celkové ceně Díla, která je sjednána jako jednotková s pevnými jednotkovými cenami specifikovanými u jednotlivých jednotek v Oceněném výkazu výměr. Souhrn jednotkových cen při počtu jednotek dle Oceněného výkazu výměr činí:

-	celkem částku bez DPH	630.740,79 Kč
-	výše DPH	132.455,57 Kč
-	celkem částku včetně DPH	763.196,36 Kč

- 4.2 Výše uvedená cena se sjednává jako nepřekročitelný cenový limit (dále jen „**Cenový limit**“) a je cenou nejvýše přípustnou za celkový předmět plnění a jsou v ní zahrnuty veškeré náklady Zhotovitele spojené s provedením Díla a s plněním všech dalších povinností Zhotovitele dle této Smlouvy. Cena Díla, tedy jednotkové ceny uvedené v Oceněném výkazu výměr, stejně jako Cenový limit, jsou platné až do úplného dokončení Díla. Do účtované ceny Díla může být promítnuta pouze zákonná změna sazby DPH.

- 4.3 Zhotovitel je oprávněn účtovat za provedení celého Díla cenu skutečně provedených jednotek a dodaného materiálu dle jednotkových cen uvedených v Oceněném výkazu výměr, jenž tvoří přílohu č. 1 této Smlouvy. Pokud by se počet skutečně provedených jednotek lišil od počtu jednotek uvedených v Oceněném výkazu výměr, je pro účtování ceny Díla určující skutečný počet provedených jednotek v rámci Díla; nicméně Zhotovitel není oprávněn za provedení Díla účtovat jakékoliv ceny za jeho provedení, které by v souhrnu překročily Cenový limit. Toto ujednání o Cenovém limitu bylo Smluvními stranami sjednáno s ohledem na skutečnost řádného seznámení Zhotovitele s veškerou dokumentací vymezující Dílo před uzavřením této Smlouvy.

- 4.4 Daňový doklad (dále jen „**Faktura**“) bude Zhotovitelem vystaven do 10 kalendářních dnů po dokončení a protokolárním předání Díla. Podkladem pro vystavení faktury bude Objednatelem odsouhlasený soupis provedených prací, který bude obsahovat specifikaci počtu jednotek skutečně provedených v rámci jednotlivých položek Díla a celkovou výši ceny za skutečně realizovaný počet jednotek v jednotkových cenách dle Oceněného výkazu výměr. Zhotovitel je

povinen předložit Objednateli Soupis provedených prací k jeho odsouhlasení před podpisem protokolu o předání a převzetí Díla.

- 4.5 Faktura Zhotovitele bude mít **30 denní lhůtu splatnosti** ode dne doručení faktury na adresu Objednatele uvedenou v záhlaví této Smlouvy. Faktura vystavená Zhotovitelem musí obsahovat náležitosti daňového dokladu v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a s § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Pokud faktura nebude obsahovat všechny náležitosti daňového dokladu stanovené výše uvedenými právními předpisy a Smlouvou, bude Objednatel oprávněn ji do data splatnosti vrátit zpět Zhotoviteli s tím, že ten je povinen poté vystavit novou fakturu s novým termínem splatnosti. V takovém případě se ruší běh lhůty splatnosti a nová lhůta počne běžet doručením opravené faktury.
- 4.6 Platba bude uskutečněna bezhotovostním převodem z účtu Objednatele na účet Zhotovitele.
- 4.7 Objednatel neposkytuje zálohové platby.
- 4.8 V případě, že se v průběhu provádění Díla vyskytne potřeba realizovat dodatečné práce či dodávky, které jsou z ekonomických nebo technických důvodů nezbytné, a není možné nebo ekonomické měnit Zhotovitele, nebo vznikly v důsledku objektivně nepředvídatelných okolností, překračující rozsah Díla vymezený v čl. 2 této Smlouvy, a které jsou současně nutné pro dokončení a předání Díla („**Vícepráce**“), je možné tyto Vícepráce realizovat pouze za předpokladu písemné dohody obou Smluvních stran a za předpokladu splnění požadavků vyplývajících z § 222 ZZVZ.
- 4.8.1 Zjistí-li Zhotovitel potřebu provedení Víceprací, je povinen na takovou skutečnost neprodleně upozornit Objednatele zápisem do stavebního deníku a následně předložit Objednateli změnový list (dále jen „**Změnový list**“), v němž bude uvedena specifikace předmětu Víceprací a jejich ocenění, pro které je Zhotovitel povinen použít jednotkové ceny příslušných nebo obdobných položek z Oceněného výkazu výměr.
- 4.8.2 Pokud není možné k ocenění víceprací použít jednotkové ceny příslušných nebo obdobných položek z Oceněného výkazu výměr, budou pro stanovení ocenění Víceprací využity ceny dle Cenové soustavy CS ÚRS (ÚRS Praha a.s.) platné ke dni ocenění Víceprací nebo podobné ceníky.
- 4.8.3 Pokud není možné Vícepráce ocenit výše uvedeným způsobem, musí Zhotovitel doložit prohlášení, že při stanovení ceny Víceprací byly dodrženy zásady stanovené zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů.
- 4.8.4 Změnový list předaný Zhotovitelem Objednateli bude podkladem k písemnému dodatku k této Smlouvě, jímž budou definovány důvody vzniku víceprací, sjednáno jejich provedení a jejich cena, případně prodloužení doby dokončení Díla. Ve Změnovém listě musí být také uvedeno, kdo za Objednatele změnu odsouhlasil.

- 4.8.5 Potřebu provedení Víceprací může požadovat také Objednatel, přičemž se postupuje shodně dle odstavců uvedených výše.
- 4.8.6 Zhotovitel je oprávněn vyúčtovat Objednateli cenu Víceprací pouze tehdy, pokud došlo k (i) uzavření písemného dodatku ke Smlouvě a (ii) provedení těchto Víceprací. V takovém případě Zhotovitel vyúčtuje cenu Víceprací postupem uvedeným výše v tomto čl. 4. Na účtování Víceprací nedopadá Cenový limit.
- 4.8.7 Pokud dojde k uzavření dodatku Smlouvy o provedení Víceprací, je Zhotovitel povinen do 3 (tří) pracovních dnů po provedení předmětných Víceprací předložit Objednateli soupis skutečně provedených Víceprací (dále jen „**Soupis provedených Víceprací**“). Soupis provedených Víceprací musí obsahovat ocenění Víceprací v souladu s příslušným dodatkem ke Smlouvě.
- 4.8.8 Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu za provedené Vícepráce po protokolárním převzetí Díla. Tato faktura má stejné formální náležitosti, jako řádná Faktura a hradí se stejným způsobem.
- 4.9 Vyskytnou-li se při provádění Díla méněpráce, je Zhotovitel povinen provést jejich přesný soupis, včetně jejich ocenění a tento soupis předložit Objednateli k odsouhlasení (dále jen „**Méněpráce**“). V případě Méněpráce se porovná skutečné množství provedených jednotek s počtem jednotek uvedených v Oceněném výkazu výměr. Výsledné snížení ceny Díla Smluvní strany upraví písemným dodatkem ke Smlouvě.
- 4.10 Stejný postup jako v případě Víceprací je uplatněn při aplikaci § 222, odst. 7 ZZVZ, kdy je předmětem záměna jedné nebo více položek Oceněného výkazu výměr, které nemají vliv na změnu ceny Díla. Taková změna se zaznamená do Změnového listu a staně se přílohou písemného dodatku Smlouvy.
- 4.11 V případě využití poddodavatelů je Zhotovitel povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků těmito poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení (vyjma případných sjednaných pozastávek) poddodavatelem vystavených a doručených faktur za plnění poskytnutá dle této Smlouvy, a to vždy do 30 (třiceti) pracovních dnů od obdržení platby ze strany Objednatele za konkrétní plnění.

5. Předání a převzetí Díla

- 5.1 Zhotovitel je povinen po ukončení stavby Dílo, v předepsané a dohodnuté kvalitě, množství a bez jakýchkoli faktických či právních vad, protokolárně předat Objednateli a Objednatel se zavazuje Dílo převzít.
- 5.2 Zhotovitel je povinen protokolárně předat Objednateli dokončené Dílo do termínu uvedeného v odst. 3.2.3 této Smlouvy. Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele k převzetí dokončeného Díla v rámci přejímacího řízení alespoň 2 (dva) pracovní dny před jeho zahájením. V rámci přejímacího řízení bude provedena kontrola Díla z hlediska úplnosti, jakosti a funkčnosti Díla. Na začátku

přejímacího řízení je Zhotovitel povinen předat Objednateli úplnou Dokladovou část Díla. Předání Díla bude osvědčeno předávacím protokolem podepsaným Zhotovitelem i Objednatel a tímto okamžikem předání přejde na Objednatele nebezpečí vzniku škody na Díle.

- 5.3 Předávací protokol bude obsahovat specifikaci Díla, místo a datum jejího předání, jakož i výslovné prohlášení Objednatele, zda Dílo přebírá bez výhrad či s výhradami a s uvedením takových výhrad. Dílo převezme v místě plnění kontaktní osoba Objednatele, která je uvedená v čl. 11 této Smlouvy nebo jím pověřená osoba. Předávací protokol může Objednatel doplnit o pro něj důležité skutečnosti.
- 5.4 Objednatel není povinen Dílo protokolárně převzít dle odst. 5.2 tohoto článku Smlouvy, budou-li na něm v rámci přejímacího řízení zjištěny vady. Objednatel je však povinen Dílo převzít ve smyslu § 2628 Občanského zákoníku v případě, kdy zjištěné vady budou pouze ojedinělými drobnými vadami, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání Díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují. Smluvními stranami však bylo výslovně sjednáno, že Objednatel není povinen Dílo protokolárně převzít, nedojde-li ze strany Zhotovitele k předání úplné Dokladové části Díla. Zhotovitel je povinen při předání Díla rovněž předat jedno vyhotovení stavebního deníku z průběhu celé stavby Díla.
- 5.5 V případě nepředvídatelných situací způsobených zásahy vyšší mocí, či v případě prodlení způsobeném neposkytnutím včasné součinnosti ze strany Objednatele, se Smluvní strany zavazují sjednat prodloužení termínu dokončení Díla o dobu trvání překážky v činnosti formou písemného dodatku ke Smlouvě.

6. Záruční podmínky

- 6.1 Zhotovitel poskytuje ve smyslu § 2113 a násl. Občanského zákoníku Objednateli záruku za jakost Díla spočívající v tom, že Dílo a jeho veškeré součásti bude po celou dobu záruční doby způsobilé ke smluvenému či obvyklému užívání, resp. si zachová smluvené či obvyklé vlastnosti.
- 6.2 Záruční doba Díla činí **60 (šedesát) měsíců** a počíná běžet ode dne následujícího po protokolárním předání Díla bez vad a nedodělků. Právo na záruky za jakost je platné za předpokladu dodržení všech stanovených pravidel pro údržbu a obsluhu Objednatel, avšak za podmínky, že Zhotovitel poskytnul Objednateli nejpozději při protokolárním předání Díla veškeré podklady a informace potřebné pro řádnou údržbu a obsluhu Díla, resp. všech jeho součástí. Každá prokázaná vada, která se projeví během záruční doby, bude odstraněna Zhotovitelem zcela na jeho náklady.
- 6.3 Jestliže se v záruční době vyskytnou vady Díla, je Objednatel povinen každé zjištění vady u Zhotovitele písemně reklamovat, a to bez zbytečného odkladu po jejím zjištění, nejpozději však do konce záruční doby Díla sjednané v odst. 6.2 výše.

- 6.4 Zhotovitel dále odpovídá za vady vyskytnuvší se po uplynutí záruční doby, pokud byly způsobeny porušením jeho povinností.
- 6.5 Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění každé reklamované vady Díla nejpozději do 3 (tří) kalendářních dnů od doručení písemné reklamace vady Díla Zhotoviteli. Má-li vada Díla charakter havárie, je Zhotovitel povinen nastoupit k odstranění takové vady do 24 hodin od doručení písemné reklamace vady Díla. V případě vad Díla zjištěných při předání Díla běží uvedené lhůty od okamžiku uzavření předávacího protokolu o předání Díla. Pokud se Zhotovitel ocitne v prodlení s nastoupením k odstranění vady Díla oproti termínům uvedeným v tomto odstavci, je Objednatel oprávněn si odstranění vady zajistit sám a náklady mu vzniklé na odstranění vady Díla je oprávněn přeučtovat Zhotoviteli, který je povinen mu tyto náklady v celém rozsahu zaplatit do 3 (tří) pracovních dnů od uplatnění jejich úhrady Objednatelem.
- 7. Práva a povinnosti Smluvních stran, včetně odpovědnosti za škodu a pojištění**
- 7.1 Objednatel je povinen Zhotoviteli zajistit a předat ke splnění závazku dle čl. 2 této Smlouvy bez zbytečného odkladu po jejím podpisu veškeré věci nezbytné k plnění Smlouvy (např. povolení k vjezdu do areálu, kontakty na třetí osoby apod.) a poskytnout Zhotoviteli veškerou potřebnou součinnost.
- 7.2 Objednatel je oprávněn provádět průběžnou kontrolu při realizaci Díla, a to dle svého uvážení; zpravidla po dohodě se Zhotovitelem. V případě potřeby může Objednatel zajistit nezávislý technický dozor za účelem zastupování Objednatele ve věci kontroly plnění závazků Zhotovitelem dle čl. 2 této Smlouvy.
- 7.3 Zhotovitel je povinen vedle dalších povinností vyplývajících z jiných ustanovení Smlouvy a obecně závazných právních předpisů, zejména:
- 7.3.1 umožnit oprávněným pracovníkům Objednatele, jakož i technickému doзору, provádět průběžnou kontrolu Díla, včetně provádění zápisů do stavebního deníku a předávat Objednateli kopie zápisů;
- 7.3.2 uhradit ze svých prostředků veškeré škody, které způsobí svojí činností v souvislosti se zhotovením Díla, a to jak na majetku Objednatele, tak i třetím osobám;
- 7.3.3 Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech svých zaměstnanců a dalších osob, které se s jeho vědomím zdržují na staveništi, a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami; Zhotovitel se zavazuje vůči Objednateli zajistit splnění veškerých povinností vyplývajících z předpisů a norem vztahujících se k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví v souvislosti s realizací Díla; Zhotovitel je povinen všechny své zaměstnance a další osoby pohybující se s jeho vědomím na staveništi proškolit dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, části páté, o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci; Zhotovitel se dále zavazuje splnit za Objednatele veškeré

povinnosti uložené mu zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, přičemž plnění těchto povinností je zahrnuto ve smluvní ceně;

7.3.4 Zhotovitel odpovídá za to, že při realizaci Díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý; pokud tak Zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání Objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel; stejně tak Zhotovitel odpovídá za to, že k realizaci Díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů;

7.3.5 Zhotovitel při provádění Díla provede všechna potřebná organizační, technická event. technologická a bezpečnostní opatření pro řádné zabezpečení prací a stavby včetně míst dotčených stavbou;

7.3.6 Zhotovitel zajistí a provede všechny nutné zkoušky dle ČSN, event. jiných norem vztahujících se k prováděnému Dílu, především revizi veškerých elektrických zařízení; všechny atesty, doklady a protokoly budou součástí Dokladové části Díla.

7.3.7 Zhotovitel povede o provádění Díla stavební deník, který bude v pracovní dobu k dispozici k nahlédnutí Objednateli.

7.4 Porušení všech povinností dle výše uvedeného bodu 7.3 této Smlouvy je považováno za podstatné porušení Smlouvy.

7.5 Zhotovitel je dále povinen v souvislosti se skutečností, že místem plnění je areál Zoo Praha, důsledně dodržovat následující:

7.5.1 v rámci plnění Smlouvy nesmí vstupovat mimo volné plochy areálu (do výběhů, bezprostředního okolí výběhů, provozních částí areálu aj.), vyjma po předchozí dohodě s odpovědnou osobou za daný zoologický úsek a po předchozím informování osoby Objednatelem pověřené přejímat předmět plnění stanovené v čl. 11 této Smlouvy;

7.5.2 Zhotovitel se zavazuje dodržet při plnění Smlouvy veškeré podmínky a připomínky vyplývající z provozu zoologické zahrady; zejména je povinen neomezovat nad nutnou míru provoz Objednatelem provozované zoologické zahrady; pokud nesplněním těchto podmínek vznikne Objednateli škoda, hradí ji Zhotovitel v plném rozsahu; tuto povinnost nemá, prokáže-li, že škodě nemohl zabránit ani v případě vynaložení veškeré možné péče, kterou na něm lze spravedlivě požadovat;

7.5.3 Všichni zaměstnanci Zhotovitele, kteří pracují v areálu Zoo Praha, jakož i třetí osoby podílející se na provedení plnění v areálu Zoo Praha, jsou povinni zachovávat ustanovení vnitřních norem Zoo Praha, týkající se oblasti bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, požární ochrany, ostrahy majetku a způsobu pohybu po areálu zoologické zahrady.

Vnitřní předpis Zoo Praha, podepsaný Zhotovitelem, je přílohou č. 2 této Smlouvy.

- 7.6 Zhotovitel prohlašuje, že má ke dni uzavření této Smlouvy uzavřené platné a účinné profesní pojištění odpovědnosti u Generali Česká pojišťovna a.s., pojistnou smlouvou č. 2947354953 za škodu způsobenou třetím osobám při výkonu povolání s pojistným limitem minimálně ve výši **1.000.000 Kč** (jeden milion korun českých). Toto pojištění se Zhotovitel zavazuje udržovat v účinnosti po celou dobu zhotovování Díla dle Smlouvy. Porušení této povinnosti je považováno za podstatné porušení Smlouvy.
- 7.7 Zhotovitel se zavazuje předložit Objednateli na jeho žádost originál pojistné smlouvy k nahlédnutí. Kopie této pojistné smlouvy je přílohou č. 3 této Smlouvy.
- 7.8 Zhotovitel je oprávněn zadat část plnění Díla poddodavateli. I v tomto případě je však jediným garantem plnění této Smlouvy Zhotovitel a na jeho vrub budou řešeny veškeré záruky a sankce. Zhotovitel zodpovídá i za škodu na Díle způsobenou činností těch, kteří pro něj Dílo a s tím související činnosti provádějí.
- 7.8.1 Zhotovitel se zavazuje oznámit Objednateli každou změnu poddodavatele oproti seznamu poddodavatelů; a to minimálně **3 pracovní dny** před nástupem takového poddodavatele na staveniště;
- 7.8.2 Pokud se na staveništi budou vyskytovat poddodavatelé, platí pro Zhotovitele stejné povinnosti, jaké jsou uvedeny v odst. 7.3.3;
- 7.9 Zhotovitel odpovídá za pořádek a čistotu na staveništi a je povinen na své náklady odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi. Totéž se týká zamezení znečišťování prostor mimo staveniště vlivem činností Zhotovitele. Zhotovitel je povinen s odpady vznikajícími při provádění Díla nakládat pouze způsobem stanoveným zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, a prováděcími předpisy, a zajistit likvidaci odpadů v souladu s nimi. Zhotovitel je povinen vést evidenci o všech druzích odpadů vzniklých z jeho činnosti a vést evidenci o způsobu jejich likvidace. Tato evidence bude součástí Dokladové části Díla.
- 7.10 Zhotovitel zajišťuje komplexní zabezpečení stavby a do doby jejího protokolárního předání Objednateli nese odpovědnost za škody na zhotovovaném Díle, na majetku Objednatele a za škody způsobené třetím osobám. Zhotovitel odpovídá i za škodu na Díle způsobenou činností těch, kteří pro něj Dílo, a s tím související činnosti, provádějí. Škody, které Zhotovitel způsobí svým opomenutím, nedbalostí nebo neplněním podmínek vyplývajících z obecně závazných právních předpisů, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této Smlouvy, je povinen bez zbytečného odkladu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit.

8. Mlčenlivost

- 8.1 Zhotovitel se zavazuje během plnění této Smlouvy, i po uplynutí doby, na kterou je tato Smlouva uzavřena, zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které se dozví od Objednatele v souvislosti s jejím plněním, nebo o skutečnostech, o nichž se dozví během svého působení v areálu Objednatele. Tato povinnost zavazuje zmocněnce, zaměstnance nebo jiné spolupracovníky Zhotovitele, kteří se podílejí na plnění této Smlouvy. Tím není dotčena možnost Zhotovitele uvádět činnost podle této Smlouvy jako svou referenci ve svých nabídkách v zákonem stanoveném rozsahu, popřípadě rozsahu stanoveném Objednatelem či organizátorem konkrétního výběrového nebo zadávacího řízení.
- 8.2 Zhotovitel se zavazuje uchovávat v přísné důvěrnosti veškeré informace, dokumentaci a materiály dodané nebo přijaté v jakékoli formě nebo poskytnuté a dané k dispozici Objednatelem.
- 8.3 Zhotovitel se zavazuje uhradit Objednateli či třetí straně, kterou porušením povinnosti mlčenlivosti nebo jiné své povinnosti v tomto článku uvedené poškodí, veškeré škody tímto porušením způsobené. Povinnosti Zhotovitel vyplývající z ustanovení příslušných právních předpisů o ochraně utajovaných informací nejsou ustanoveními tohoto článku dotčeny.

9. Smluvní pokuty a vyšší moc

- 9.1 V případě prodlení Zhotovitele se splněním povinnosti k dokončení a předání Díla oproti termínu uvedenému v čl. 3 odst. 3.2 bodě 3.2.3 této Smlouvy je Zhotovitel povinen hradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1,0 % z celkové ceny Díla bez DPH, a to za každý i započatý den prodlení.
- 9.2 Stejnou smluvní pokutu, jako dle odst. 9.1 výše, je Zhotovitele povinen hradit Objednateli při prodlení se splněním povinnosti k odstranění každé jednotlivé vady Díla oproti termínu uvedenému v čl. 6 této Smlouvy, případně při porušení jiné povinnosti dle této Smlouvy.
- 9.3 V případě prodlení Objednatele s úhradou ceny Díla nebo její části je Zhotovitel oprávněn požadovat zaplacení zákonného úroku z prodlení z dlužné částky za každý den prodlení.
- 9.4 Právo fakturovat a vymáhat smluvní pokutu a úrok z prodlení podle tohoto článku 9 Smlouvy vzniká oprávněné Smluvní straně prvním dnem následujícím po marném uplynutí doby stanovené k plnění nebo dnem následujícím po porušení povinnosti druhou Smluvní stranou.
- 9.5 Smluvní pokuty jsou splatné do 30 dnů po obdržení písemné výzvy oprávněné Smluvní strany k jejímu zaplacení na adresu sídla povinné Smluvní strany.
- 9.6 Sjednáním ani uhrazením smluvních pokut není dotčeno právo Objednatele na náhradu případně vzniklé škody v jejím plném rozsahu. Právo na úhradu smluvní pokuty vzniklé dle této Smlouvy není podmíněno vznikem škody.
- 9.7 Smluvní strany se zprošťují veškeré odpovědnosti za nesplnění svých povinností z této Smlouvy po dobu trvání prokazatelné vyšší

moci. Za vyšší moc je ve smyslu této Smlouvy považována každá událost nezávislá na vůli smluvních stran, která znemožňuje plnění smluvních závazků a kterou nebylo možno předvídat v době uzavření této Smlouvy, včetně případných opatření vlády ČR nebo ministerstev ČR. O vzniku a ukončení vyšší moci se budou Smluvní strany vzájemně písemně informovat nejpozději do 5 (pěti) kalendářních dnů od vzniku vyšší moci. Po dobu trvání prokazatelné vyšší moci se plnění závazků dle této Smlouvy pozastavuje do doby ukončení vyšší moci, popř. odstranění jejích následků, kdy se obě Smluvní strany dohodnou písemně na případné změně některých ustanovení této Smlouvy.

- 9.8 Za porušení mlčenlivosti specifikované v čl. 8 této Smlouvy je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení povinnosti.

10. Trvání a ukončení Smlouvy

- 10.1 Smlouva se uzavírá na dobu určitou a končí protokolárním předáním Díla dle odst. 3.2.3 čl. 3.2 a předáním vyklizeného staveniště dle odst. 3.2.4. čl. 3.2 této Smlouvy.
- 10.2 Smlouva může být ukončena dohodou smluvních stran. Každá smluvní strana je oprávněna od Smlouvy odstoupit při podstatném porušení Smlouvy druhou smluvní stranou. Odstoupení od Smlouvy musí být učiněno písemně a nabývá účinnosti dnem jeho doručení druhé smluvní straně.
- 10.3 Za podstatné porušení ze strany Zhotovitele je považováno zejména prodlení v dokončení a předání Díla Objednateli o dobu delší než 30 (třicet) dnů oproti termínu stanovenému v čl. 3 odst. 3.2 bodě 3.2.3 této Smlouvy. Za podstatné porušení Smlouvy ze strany Objednatele se považuje prodlení s úhradou Faktury oproti splatnosti sjednané v čl. 4 odst. 4.5 po dobu delší než 30 (třicet) dnů. Účinky odstoupení od Smlouvy nastávají dnem, kdy je písemné odstoupení doručeno druhé Smluvní straně.
- 10.4 Objednatel je dále oprávněn od Smlouvy odstoupit v případě, že Zhotovitel je v úpadku, probíhá vůči němu insolvenční řízení, na majetek Zhotovitele byl prohlášen konkurz anebo i v případě, že insolvenční návrh byl zamítnut proto, že majetek Zhotovitele nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení. Rovněž pak v případě, kdy Zhotovitel vstoupí do likvidace.
- 10.5 Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy v případě nepřidělení dostatečných finančních prostředků k úhradě ceny Díla ze strany zřizovatele Objednatele, tj. hlavního města Prahy.
- 10.6 Objednatel i Zhotovitel jsou oprávněni písemně vypovědět tuto Smlouvu i bez udání důvodu. V případě výpovědi smluvní strany dle tohoto odstavce Smlouvy činí výpovědní lhůta jeden měsíc a počítá se od prvního dne kalendářního měsíce následujícího po doručení písemné výpovědi druhé smluvní straně.
- 10.7 Odstoupením od Smlouvy není dotčena povinnost Zhotovitele na zaplacení sjednaných smluvních pokut a dobu do nabytí účinnosti odstoupení od Smlouvy, jakož i na povinnost Zhotovitele uhradit

Objednateli veškerou majetkovou újmu, jež Objednateli vznikla v důsledku neplnění jeho závazků ze Smlouvy či závazků vyplývajících ze zákona.

11. Kontaktní osoby

11.1 Za stranu Objednatele je osobou oprávněnou ustanoven [REDAKCE], vedoucí stavebního oddělení, nebo jím pověřená osoba. Kontaktní údaje oprávněné osoby Objednatele jsou:
Adresa pro doručování pošty: U Trojského zámku 120/3, 171 00 Praha 7 - Troja
Emailová adresa: [REDAKCE]
Mobilní telefon: [REDAKCE]

11.2 Za stranu Zhotovitele je osobou oprávněnou ustanoven **Ing. Radim Aulický, prokurista a Ing. Tomáš Rys, prokurista** nebo jím pověřená osoba. Kontaktní údaje oprávněné osoby Zhotovitele jsou:
Adresa pro doručování pošty: STRABAG a. s., Pozemní a inženýrské stavitelství, Ing. Tomáš Rys
Kačírkova 982/4
158 00 Praha 5
Emailová adresa: [REDAKCE]
Mobilní telefon: [REDAKCE]

11.3 O případných změnách kontaktních osob musí být vždy písemně informována druhá Smluvní strana.

12. Závěrečná ustanovení

12.1 Zhotovitel není oprávněn postoupit, převést ani zastavit jakákoli práva nebo pohledávky vyplývající z této Smlouvy na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu Objednatele. Tato Smlouva je závazná rovněž pro právní nástupce Smluvních stran.

12.2 Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel je vázán zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, a souhlasí s tím, že Objednatel zajistí zveřejnění celého textu Smlouvy, případně jejich dodatků, v registru smluv. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním této Smlouvy v plném rozsahu včetně osobních údajů ve Smlouvě obsažených či poskytnutím informace třetím osobám o této Smlouvě či podstatných částech této Smlouvy za podmínek definovaných zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění aktuálním ke dni požadavku na informace či zveřejnění, a rovněž prohlašují, že nic z obsahu této Smlouvy nepovažují za obchodní tajemství.

12.3 Zhotovitel si je vědom, že je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů. Zhotovitel se zavazuje k uchování účetních

záznamů a dalších relevantních podkladů souvisejících s dodávkou dle platných právních předpisů.

- 12.4 Právní vztahy Smlouvou neupravené či upravené jen částečně se řídí obecně platnými právními předpisy České republiky, přednostně příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.
- 12.5 Je-li některé ustanovení této Smlouvy neplatné, neúčinné, či nevymahatelné, bude tato Smlouva platit ve všech ostatních ustanoveních, nevyplývá-li z obsahu a povahy Smlouvy, že toto ustanovení nelze oddělit. Smluvní strany se zavazují nahradit toto neplatné, neúčinné či nevymahatelné ustanovení ustanovením bezvadným, které je svým obsahem tomuto neplatnému, neúčinnému či nevymahatelnému ustanovení nejbližší.
- 12.6 Veškeré změny této Smlouvy je možno činit jen v písemné formě, a to vzestupně číslovanými dodatky podepsanými oběma Smluvními stranami.
- 12.7 Smlouva je sepsána ve 2 originálních vyhotoveních, z nichž 1 vyhotovení obdrží Objednatel a 1 vyhotovení obdrží Zhotovitel.
- 12.9 **Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu** druhou ze smluvních stran. Tato Smlouva, **nabývá účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv**. Realizace plnění je tedy možná až od data účinnosti Smlouvy.
- 12.10 Každá ze Smluvních stran prohlašuje, že tuto Smlouvu přečetla, jejímu obsahu rozumí a souhlasí s ním, na důkaz čehož připojuje svůj podpis.
- 12.11 Nedílnou součástí této Smlouvy jsou následující přílohy:
- Příloha č. 1: Cenová nabídka se soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr
 - Příloha č. 2: Vnitřní předpis Zoo Praha (BOZP)
 - Příloha č. 3: Kopie pojistné smlouvy Zhotovitele

V Praze dne

V Praze dne 01-04-2022

Za Zhotovitele:

Za Objednatele:

.....
Ing. Radim Aulický
prokurista
Strabag a.s.

.....
Ing. Tomáš Rys
prokurista
Strabag a.s.

.....
Mgr. Miroslav Bobek
ředitel

Zoologická zahrada hl. m. Prahy



STRABAG a.s.
Pozemní a inženýrské stavitelství
direkce TQ
Kačírkova 982/4
CZ – 158 00 Praha 5 - Jinonice / Česká republika

Tel: +420 222 868 111
Fax: +420 222 868 100
pis@strabag.com

STRABAG

Zoologická zahrada hl. m. Prahy
U Trojského zámku 120/3, 171 00 Praha 7
Pyšelská 2327/2
14900; Praha 4

V Praze dne 1.3.2022

Zvedání 7 ks světel nad zelenou stěnou

Vážený obchodní partnere,

v příloze si Vám dovoluujeme předložit naši nabídku na dodávku a montáž zvedání 7ks světel nad zelenou stěnou k projektu Nový pavilon goril.

Námi předloženou kalkulaci jsme kdykoliv připraveni vysvětlit a upřesnit na základě Vašich požadavků.


Práce budou provedeny do 75 dní od potvrzení objednávky.

Platnost nabídky do 4.3.2022

Věříme, že naše společnost pro Vás představuje garanci otevřeného týmového a vstřícného jednání, spojení profesionality a finanční stability, která zaručuje včasné a odborné dokončení díla včetně všech potřebných záruk a garancí.

V případě jakýchkoliv dotazů jsme Vám rádi k dispozici na níže uvedeném kontaktu.

Za STRABAG a.s.



Pozemní a inženýrské stavitelství
Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5
GSM: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]

Příloha: č.1: Cenová nabídka zvedání 7ks světel nad zelenou stěnou
č.2: Popis navrhovaného řešení

Příloha č.1:

Zvedání 7 ks světel nad zelenou stěnou

	Množství	mj	Jednotková cena	Cena celkem
SILNOPROUD				
Demontáž osvětlovacího modulového systému zářivkového dl do 1100 mm se zachováním funkčnosti	7,00	ks	155,00	1 085,00
Montáž svítidlo výbojkové průmyslové stropní závěsné na oko s krabicí	7,00	ks	563,00	3 941,00
HZS elektrikář odborný	3,00	hod.	524,00	1 572,00
HZS revizní technik specialista	1,00	hod.	650,00	650,00
				7 248,00
ZVEDACÍ KLADKOSTROJ				
Elektromotorický kladkostroj s přímým řízením, bezpečnostní kategorie D8+, zatížitelnost 160+KG	4,00	ks	93 600,00	374 400,00
Nosná konstrukce - M290 Quattro, práškování barvou dle zadání, 3m, spojovací prvky	4,00	ks	19 500,00	78 000,00
Příprava přichycení, kotevní body, řešení kabeláže	1,00	ks	28 600,00	28 600,00
Doprava, instalace, zaškolení	1,00	ks	39 000,00	39 000,00
				520 000,00
SLABOPROUD				
Modul výstupů/vstupů modu670-IO, 8 DI/CI/DO(OC) + 8 DI/CI	1,00	ks	12 256,40	12 256,40
Doprava materiálu a služeb	1,00	kpl	2 034,50	2 034,50
Montážní práce - přečíslování modulů ASŘ v RS2	1,00	ks	2 275,00	2 275,00
Zapojení, zprovoznění a oživení (4x osvětlení, 2 motory)	1,00	kpl	6 864,00	6 864,00
Software podstanic řídicího systému AS7	1,00	kpl	4 524,00	4 524,00
Software vizualizace na SVC	1,00	kpl	5 070,00	5 070,00
Test 1:1	1,00	kpl	3 744,00	3 744,00
Zkušební provoz	1,00	kpl	1 716,00	1 716,00
Zaškolení obsluhy	1,00	kpl	1 404,00	1 404,00
Inženýrské práce na stavbě	1,00	kpl	3 276,00	3 276,00
Koordináční projekční práce	1,00	kpl	2 184,00	2 184,00
Úprava projektová dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS)	1,00	kpl	7 098,00	7 098,00
				52 445,90
STAVEBNÍ ČÁST				
Čištění budov vysátí prachu z ostatních ploch	32,40	m2	14,30	463,32
				463,32
VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
Zařízení staveniště, dočasné oplocení/ohrazení, označení	1,000	kpl	10 698,00	10 698,00
Připojení staveniště na inženýrské sítě, měření spotřeby,	1,000	kpl	8 859,00	8 859,00
Personální náklady	1,000	kpl	27 598,00	27 598,00
Pojistné (nad rámec běžného pojištění zhotovitele)	1,000	kpl	3 428,57	3 428,57
				50 583,57
CELKEM				630 740,79 Kč

Příloha č.2: Popis navrhovaného řešení:


- řešení pro zdvih světel v řadě by bylo použití truss konstrukce M290 quatro (viz příloha) v kombinaci s elektronickými řetězovými kladkostroji.
- Kladkostroj by byl umístěn uvnitř truss konstrukce, popř. pod ní.
- Kotevní hák by byl uchycen v kotevním bodě na stropě.
- Pro každý truss je kvůli stabilitě zapotřebí 2 takových zdvihacích zařízení, umístěných vždy na krajích konstrukce.
- Umístění zdvihu do nebo pod truss zajistí možnost zvednout konstrukci úplně ke stropu
- Pro použití zdvihacího zařízení v místě, kde pod břemenem procházejí lidé a břemeno není jinak staticky zajištěno je dle norem zapotřebí certifikace motoru "D8+".
- Jedná se motory s dvojitou bezpečnostní brzdou - nabízené motory tuto certifikaci mají.
- Řešení přívodní kabeláže je umístění speciálních ok na samotný řetěz. Při navíjení řetězu se kabeláž smotává podle rozsahu těchto ok. Při snížení výšky se natáhne na délku navíjecího řetězu
- Konstrukci lze nalakovat na zeleno a samotný motor případně také - variantou je textilní krytí v barvě stropu pro minimální znehodnocení jednotlivých prvků pro případný prodej nebo jiné využití.
- Konstrukce umožňuje připevnit světla s možností úpravy směrování.
- Řízení motorů bude řešeno přes stykače
 - Přes MaR se bude moci nastavovat výška světel pro postupnou optimalizaci.
 - V systému bude možné zkalibrování skutečné výšky konstrukce s časem zdvihu/snížení.
 - Ráno se konstrukce dle instrukce a požadavků systému automaticky vrátí ke stropu, večer na poslední zadanou hodnotu.
 - Hodnota by tak šla v systému nastavit dle požadované skutečné výšky s ohledem na růst rostlin
- Celý systém je po dosažení maximální výšky rostlin potenciálně odmontovatelný bez zásadních konstrukčních úprav a tedy použitelný pro jiné využití v rámci ZOO Praha, případně i prodejní, pokud pro něj nebude využití
- Konstrukce A (bližší k výběhu) by byla kratší - 5m (z jednoho 5m kusu truss)

STRABAG a.s.
Pozemní a inženýrské stavitelství
direkce TQ
Kačírkova 982/4
CZ – 158 00 Praha 5 - Jinonice / Česká republika

Tel: +420 222 868 111
Fax: +420 222 868 100
pis@strabag.com

STRABAG

- Konstrukce B (vzdálenější od výběhu) by byla delší - 6m (ze dvou kusů truss)
- Nosnost 1 motoru je 160kg, tedy 320kg na každou konstrukci.
- Váha motoru je do 20kg, váha konstrukce do 40kg
- Pokud odečteme toleranci dalších 20kg pro případné další montážní prvky, je využitelná nosnost jedné konstrukce 280kg
- Při váze 25kg/světlo je potenciál uchycení až 11 světel na jednu konstrukci, tedy více, než dostatečný
- Při použití pouze 5-6 světel je systém možné využít i pro uchycení čehokoliv jiného
- Rozměr konstrukce je 290x290mm x délka (5000mm, 6000mm)

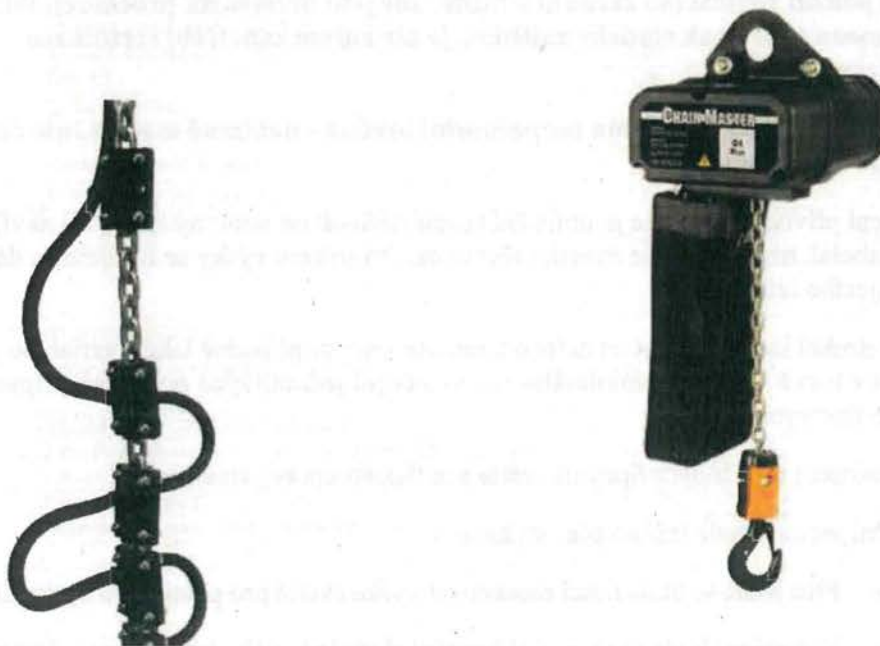



ZOOLOGICKÁ ZAHRADA HL. M. PRAHY
U TROJSKÉHO ZÁMKU 120/3 • 171 00 PRAHA 7
IČ: 00064459 • DIČ: CZ00064459

P O K Y N

PRO PRACOVNÍKY DODAVATELE PŮSOBÍCÍHO V ZOOLOGICKÉ ZAHRADĚ HL. M. PRAHY

Všichni pracovníci dodavatele (zaměstnanci i živnostníci), kteří pracují v areálu Zoologické zahrady hl. m. Prahy, jsou povinni zachovávat ustanovení vnitřních norem Zoologické zahrady hl. m. Prahy, týkající se oblasti bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, požární ochrany, ostrahy majetku a způsobu pohybu po areálu zoologické zahrady.

Zejména jsou všichni pracovníci dodavatele povinni:

1. Zdržovat se při plnění pracovních úkolů pouze na místech určených odpovědným zástupcem zoologické zahrady;
2. zdržovat se v areálu zoologické zahrady jen po dobu nezbytně nutnou k výkonu práce nebo k přípravě na práci či k cestě na pracoviště, respektive k jeho opuštění;
3. vstupovat do areálu zoologické zahrady a vycházet z něj zásadně hlavním vchodem (východem), pokud nebylo mezi odpovědnými zástupci obou stran dohodnuto jinak;
4. při přesunech v rámci areálu zoologické zahrady používat výhradně vymezené trasy a striktně přitom zachovávat návštěvní řád zoologické zahrady;
5. dodržovat zákaz vjezdu soukromých motorových vozidel do areálu zoologické zahrady. Dopravní prostředky nutné pro realizaci předmětu plnění dodavatele mohou vjíždět do areálu pouze s platným povolením vystaveným odpovědným pracovníkem zoologické zahrady, přičemž musí striktně dodržovat určené přepravní trasy a časy pohybu po areálu, tj. mimo návštěvní dobu. Pokud je nezbytně nutný pojezd dopravních prostředků či mechanizace po návštěvnických komunikacích v době, kdy je areál otevřen pro návštěvníky, musí k tomu dát souhlas ekonomicko-provozní náměstek nebo vedoucí provozního odboru, popř. je zastupující pracovník Zoo Praha, a současně musí být zaručena bezpečnost návštěvníků (například peším doprovodem vozidla poučenými osobami dodavatele ve výstražných vestách, a to před i za vozidlem).
6. při plnění pracovních úkolů používat pracovní oděv s viditelným označením zhotovitele (nápis či jednoznačné logo);
7. dodržovat zákaz používání veřejných WC pro návštěvníky;
8. dodržovat zákaz přibližovat se ke zvířatům, krmit je či dráždit;
9. dodržovat zákaz pití alkoholických nápojů, včetně piva, v areálu Zoo Praha;
10. dodržovat zákaz kouření v místech přístupných návštěvníkům či v místech návštěvníkům viditelných.

Mgr. Miroslav Bobek v. r.

ř e d i t e l

Potvrzují vlastnoručním podpisem, že jsem se s obsahem POKYNU seznámil, a že se jím budu důsledně řídit a beru na vědomí, že při porušení jeho ustanovení mohu být potrestán pokutou do výše 5.000,- Kč.

(Za podřízené může podepsat jejich nadřízený, který pak ručí za dodržování ustanovení POKYNU všemi podřízenými pracujícími v areálu Zoologické zahrady hl. m. Prahy).

V PRAZE dne: 23.3.2022 Jméno pracovníka: [REDAKCE] [REDAKCE] Podpis

Certifikát o pojištění

POJISTITEL

Generali Česká pojišťovna a.s.

Spálená 75/16, Nové Město, 110 00 Praha 1, Česká republika, IČO p 45272956
zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, spisová značka B
1464,
člen Skupiny Generali, zapsané v italském rejstříku pojišťovacích skupin, vedeném
IVASS,

POJIŠTĚNÝ

STRABAG a.s.

Kačírkova 982/4,
158 00 Praha 5
IČ 608 38 744

POJISTNÁ SMLOUVA Č. 2947354953

**DOBA TRVÁNÍ
POJIŠTĚNÍ**

1. 1. 2022 – 1. 1. 2023

ROZSAH KRYTÍ

Pojištění odpovědnosti za škodu z provozní činnosti dodavatele
Pojištění se vztahuje na odpovědnost pojištěného za škodu, pokud za ní odpovídá
v důsledku svého jednání nebo vztahu z doby trvání pojištění.

**LIMIT PLNĚNÍ
POJISTNÁ ČÁSTKA**

ekv. EUR 5.000.000,-
pro škodu vzniklou na životě, zdraví nebo věci třetí osoby (souhrnně)
for Bodily Injury and Property Damage (combined)

ÚZEMNÍ ROZSAH

celý svět mimo území USA/Kanada (kromě ekologické újmy a škod na životním
prostředí)

TENTO DOKUMENT JE POUZE INFORMATIVNÍ, VYDÁVÁ SE NA ŽÁDOST POJIŠTĚNÉHO A JEHO
PLATNOST JE VÁZÁNA NA ŘÁDNOU POJISTNOU SMLOUVU.

Generali Česká Pojišťovna a.s.

V Praze dne 16. 12. 2021



Digitálně
podepsal [redacted]
Datum: 2021.12.16
08:13:08 +01'00'

[redacted]
manažer
Mezinárodní obchod



Digitálně podepsal
[redacted]
Datum: 2021.12.16
11:08:13 +01'00'

[redacted]
upisovatel
Mezinárodní obchod
