



Smlouva o dílo

uzavřená dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „Občanský zákoník“)

SMLUVNÍ STRANY

1. Statutární město Ústí nad Labem

se sídlem: Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí nad Labem
Zastoupeno
na základě pověření: Ing. Daliborem Dařílkem, vedoucím odboru
dopravy a majetku Magistrátu města Ústí nad
Labem
IČ: 000 81 531
Osoba oprávněna jednat
ve věcech administrativních: [REDACTED]
bankovní spojení: Raiffeisenbank a. s.
číslo účtu: 5017001555/5500
(dále jen „objednatel“ nebo „smluvní strana“)

a

2. Credo Litoměřice VDZ spol. s r. o.

zastoupená/ý: Ing. Karolina Bobková, jednatel
se sídlem: Ústecká 53, 410 02 Malé Žernoseky
IČO: 254 93 043
DIČ: CZ254 93 043
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
číslo účtu: 100 692 73 89/0800
Pověřená osoba k jednání: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“ nebo „smluvní strana“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo na stavební práce v souladu s ustanovením § 2586 a násl. občanského zákoníku (dále jen „smlouva“)

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v této Smlouvě obsažených a s úmyslem být touto Smlouvou vázány, dohodly se na následujícím znění Smlouvy:

I. Preambule

Tato smlouva je uzavřena mezi objednatelem a zhotovitelem na základě výběrového řízení pro plnění veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Cyklostožany Ústí nad Labem.“.

II. Účel smlouvy

1. Účelem této Smlouvy je realizace Veřejné zakázky dle zadávací dokumentace Veřejné zakázky a nabídky zhotovitele, které tvoří přílohu této Smlouvy (dále jen „Zadávací dokumentace“) dostupná na: https://zakazky.usti-nad-labem.cz/profile_display_2.html.
2. Zhotovitel touto Smlouvou garantuje Objednateli splnění zadání Veřejné zakázky a všech z toho vyplývajících podmínek a povinností podle Zadávací dokumentace. Tato garance je nadřazena ostatním podmínkám a garancím uvedeným v této Smlouvě. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností to znamená, že:
 - a) v případě jakékoliv nejistoty ohledně výkladu ustanovení této Smlouvy budou tato ustanovení vykládána tak, aby v co nejširší míře zohledňovala účel Veřejné zakázky vyjádřený v Zadávací dokumentaci,
 - b) v případě chybějících ustanovení této Smlouvy budou použita dostatečně konkrétní ustanovení Zadávací dokumentace.
3. Zhotovitel je vázán svou nabídkou předloženou Objednateli v rámci zadávacího řízení na zadání Veřejné zakázky, která se pro úpravu vzájemných vztahů vyplývajících z této Smlouvy použije subsidiárně.

III. Předmět smlouvy

1. Předmětem této Smlouvy je úprava práv a povinností smluvních stran při poskytování a provádění díla spočívající v realizaci instalace cyklistických stojanů ve městě Ústí nad Labem. Součástí zakázky je i pořízení těchto stojanů (dále jen „Dílo“ nebo „Díla“).
2. Rozsah a specifikace Díla, zejména jeho věcné, místní a časové vymezení související s poskytováním konkrétních prací je vymezeno v této smlouvě, v zadávací dokumentaci, a ve výkazu výměr, který je nedílnou součástí této smlouvy.
3. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele dílo spočívající v instalaci celkem 30 cyklistických stojanů tvaru obrácené U, materiál nerez, délka 80 cm, z toho 26 s prodlouženou trubkou pro zabetonování, 4 s patkou pro uchycení pomocí vrutů. Podrobnější popis prací je uveden u jednotlivých stavebních objektů:
 - a. **SO 01 Mírové náměstí – infocentrum**
 - i. V rámci tohoto stavebního objektu budou instalovány celkem 4 cyklistické stojany. Stojany budou instalovány kolmo na rozhraní dvou typů dlažby v místě dle přiloženého zákresu. Vzdálenost mezi jednotlivými stojany bude 1 m.
 - ii. V místech instalace stojanů dojde k rozebrání dlažby a odstranění části spodní konstrukce pro vytvoření betonového základu 50x20x20 cm (2x pro každý stojan), do něhož bude stojan ukotven. Následně bude provedena kladecí vrstva ze šterkodrti, do níž bude zpětně osazena původní dlažba.
 - b. **SO 02 Bílinská – OC FORUM**
 - i. V rámci tohoto stavebního objektu budou instalovány celkem 3 cyklistické stojany v podchodu pod budovou OC FORUM k ul. Malá Hradební. Stojany budou instalovány vpravo ve směru od Kostelního náměstí mezi výlohy obchodu C&A kolmo na zeď objektu OC FORUM v místě dle přiloženého zákresu. Vzdálenost mezi jednotlivými stojany

bude 60 cm, vzdálenost přilehlé části stojanu od zdi objektu bude min. 60 cm, max. 80 cm.

- ii. V místech instalace stojanů dojde k rozebrání dlažby a odstranění části spodní konstrukce pro vytvoření betonového základu 50x20x20 cm (2x pro každý stojan), do něhož bude stojan ukotven. Následně bude provedena kladecí vrstva ze štěrkodrti, do níž bude zpětně osazena původní dlažba.
- c. **SO 03 U Nádraží – před budovou Hlavního nádraží**
 - i. V rámci tohoto stavebního objektu budou instalovány celkem 3 cyklistické stojany podél silniční obruby v chodníku proti výpravní budově. Stojany budou instalovány kolmo na silniční obrubu v místě dle přiloženého zákresu. Vzdálenost mezi jednotlivými stojany bude 60 cm, vzdálenost přilehlé části stojanu od obruby bude min. 60 cm, max. 80 cm.
 - ii. V místech instalace stojanů dojde k rozebrání dlažby a odstranění části spodní konstrukce pro vytvoření betonového základu 50x20x20 cm (2x pro každý stojan), do něhož bude stojan ukotven. Následně bude provedena kladecí vrstva ze štěrkodrti, do níž bude zpětně osazena původní dlažba.
- d. **SO 04 Varšavská – před budovou Městského obvodu Ústí nad Labem Střekov**
 - i. V rámci tohoto stavebního objektu budou instalovány celkem 2 cyklistické stojany podél silniční obruby v chodníku proti budově MO Ústí n.L. - Střekov. Stojany budou instalovány kolmo na silniční obrubu v místě dle přiloženého zákresu. Vzdálenost mezi jednotlivými stojany bude 60 cm, vzdálenost přilehlé části stojanu od obruby bude min. 60 cm, max. 80 cm.
 - ii. V místech instalace stojanů dojde k rozebrání dlažby a odstranění části spodní konstrukce pro vytvoření betonového základu 50x20x20 cm (2x pro každý stojan), do něhož bude stojan ukotven. Následně bude provedena kladecí vrstva ze štěrkodrti, do níž bude zpětně osazena původní dlažba.
- e. **SO 05 – U Radnice – před budovou Městského obvodu Ústí nad Labem – Neštětice**
 - i. V rámci tohoto stavebního objektu budou instalovány celkem 2 cyklistické stojany podél budovy MO Ústí n.L. - Neštětice v chodníku vedle vstupního schodiště do budovy, a to ve vzdálenosti 60 cm od tohoto schodiště. Stojany budou instalovány kolmo na stěnu objektu v místě dle přiloženého zákresu. Vzdálenost mezi jednotlivými stojany bude 60 cm, vzdálenost přilehlé části stojanu od stěny objektu bude min. 60 cm, max. 80 cm.
 - ii. V místech instalace stojanů dojde k rozebrání dlažby a odstranění části spodní konstrukce pro vytvoření betonového základu 50x20x20 cm (2x pro každý stojan), do něhož bude stojan ukotven. Následně bude provedena kladecí vrstva ze štěrkodrti, do níž bude zpětně osazena původní dlažba.
- f. **SO 06 – Stavbařů – před budovou Městského obvodu Ústí nad Labem – Severní Terasa**
 - i. V rámci tohoto stavebního objektu budou instalovány celkem 2 cyklistické stojany podél budovy MO Ústí n.L. – Severní Terasa v chodníku vedle vstupu do budovy v místě stávajících cyklistických stojanů. Stojany budou instalovány kolmo na stěnu objektu v místě dle přiloženého zákresu. Vzdálenost mezi jednotlivými stojany bude 60 cm, vzdálenost přilehlé části stojanu od zahradní obruby bude min. 60 cm, max. 80 cm.

- ii. V místech instalace stojanů dojde k rozebrání dlažby a odstranění části spodní konstrukce pro vytvoření betonového základu 50x20x20 cm (2x pro každý stojan), do něhož bude stojan ukotven. Následně bude provedena kladecí vrstva ze štěrkodrti, do níž bude zpětně osazena původní dlažba.
- g. **SO 07 – Masarykova – u vrátnice Zimního stadionu**
 - i. V rámci tohoto stavebního objektu budou instalovány celkem 2 cyklistické stojany podél obruby v chodníku u vrátnice Zimního stadionu. Stojany budou instalovány kolmo na obrubu oddělující chodník od zeleně v místě dle přiloženého zákresu. Vzdálenost mezi jednotlivými stojany bude 60 cm, vzdálenost přilehlé části stojanu od obruby bude min. 60 cm, max. 80 cm.
 - ii. V místech instalace stojanů dojde k odstranění povrchu z litého asfaltu a části spodní betonové konstrukce pro vytvoření betonového základu 50x20x20 cm (2x pro každý stojan), do něhož bude stojan ukotven. Následně bude proveden spojovací postřík a pokládka ACO 8CH v místě vytvořeného základu.
- h. **SO 08 – Masarykova – Městský stadion**
 - i. V rámci tohoto stavebního objektu budou instalovány celkem 2 cyklistické stojany podél oplocení Městského stadionu. Stojany budou instalovány kolmo na oplocení Městského stadionu v místě dle přiloženého zákresu. Vzdálenost mezi jednotlivými stojany bude 60 cm, vzdálenost přilehlé části stojanu od zahradní obruby bude min. 60 cm, max. 80 cm.
 - ii. V místech instalace stojanů dojde k rozebrání dlažby a odstranění části spodní konstrukce pro vytvoření betonového základu 50x20x20 cm (2x pro každý stojan), do něhož bude stojan ukotven. Následně bude provedena kladecí vrstva ze štěrkodrti, do níž bude zpětně osazena původní dlažba.
- i. **SO 09 – Městské sady**
 - i. V rámci tohoto stavebního objektu bude instalováno celkem 6 cyklistických stojanů, z toho 4 v okolí fontány u hudebního pavilonu a 2 u fontány pod ul. Palachova. Stojany budou instalovány vždy kolmo na obrubník oddělující dlážděné plochy a zeleň v místech dle přiloženého zákresu. Stojany budou rozmístěny mezi stávající mobiliář tak, aby na každé straně stojanu byl mezi stojanem a stávajícím mobiliářem prostor o šíři 60 cm, vzdálenost přilehlé části stojanu od obruby bude min. 60 cm, max. 80 cm.
 - ii. V místech instalace stojanů dojde k rozebrání dlažby a odstranění části spodní konstrukce pro vytvoření betonového základu 50x20x20 cm (2x pro každý stojan), do něhož bude stojan ukotven. Následně bude provedena kladecí vrstva ze štěrkodrti, do níž bude zpětně osazena původní dlažba.
- j. **SO 10 – Velká Hradební – podloubí pod budovou Magistrátu města Ústí nad Labem (průchod do Atria)**
 - i. V rámci tohoto stavebního objektu budou instalovány celkem 2 cyklistické stojany v průchodu z ul. Velká Hradební do Atria Magistrátu města Ústí n.L. Stojany budou instalovány kolmo na podélnou osu průchodu v místě původního stojanu mezi opěrami v místě dle přiloženého zákresu. Vzdálenost mezi jednotlivými stojany bude 60 cm.
 - ii. Stojany budou instalovány bez rozebrání dlažby pomocí vrutů na chemickou kotvu.
- k. **SO 11 – Atrium – před budovou Městského obvodu Ústí nad Labem – město**

- i. V rámci tohoto stavebního objektu budou instalovány celkem 2 cyklistické stojany mezi stromy naproti budově Městského obvodu Ústí nad Labem město. Stojany budou instalovány v ose stromů kolmo na osu jejich spojnice v místě dle přiloženého zákresu. Vzdálenost mezi jednotlivými stojany bude 60 cm.
 - ii. Stojany budou instalovány bez rozebrání dlažby pomocí vrutů na chemickou kotvu.
- Vybraný uchazeč je povinen si zajistit pro provádění staveb přípravu, projednání, povolení a realizaci nutných dopravně-inženýrských opatření včetně potřebných povolení. V rámci dopravně-inženýrských opatření musí být po dobu stavby zajištěn bezpečný pohyb chodců a přístup do jednotlivých objektů a provozoven.
4. Objednatel se za řádné provedení díla zavazuje zaplatit cenu dle čl. V. této Smlouvy.
5. Provedení díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné.
6. Zhotovitel splní svou povinnost provést Dílo jeho řádným ukončením a předáním Díla v místě plnění objednatele.
7. Pro případ nutné dodatečné práce (vícepráce) je třeba písemného odsouhlasení mezi objednatelem a zhotovitelem. Bez tohoto předchozího písemného souhlasu či jiné prokazatelné dohody o vykonání víceprací nesmí zhotovitel vícepráce provést. Pokud by neschválené vícepráce zhotovitel provedl, je oprávněn po objednateli požadovat pouze cenu použitých materiálů, pokud tyto materiály odpovídají běžným standardům takových materiálů. Objednatel není povinen hradit ty materiály, které nebyly z jakéhokoli hlediska pro provedení díla účelně a nezbytně nutné vynaloženy a dále není povinen hradit další náklady spojené s provedením neodsouhlasených víceprací (zejména práci a energie).
8. Změny, doplňky nebo rozšíření předmětu díla při jeho realizaci se řídí ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

IV. Místo a čas plnění díla

1. Místem plnění této Smlouvy je Ústí nad Labem, Mírové náměstí, ul. Bílinská, U Nádraží, Varšavská, U Radnice, Stavbařů, Masarykova, Městské sady, ul. Velká Hradební a Atrium budovy Magistrátu města Ústí nad Labem, dle přílohy této smlouvy – Zákresy umístění jednotlivých stavebních objektů do mapového podkladu.
2. Zhotovitel je povinen zahájit práce na provedení díla do 14 dnů od nabytí účinnosti smlouvy o dílo. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude dokončeno nejpozději **do dvou měsíců ode dne zahájení prací**.
3. Zhotovitel je povinen předat zhotovené dílo Objednateli v termínu stanoveném v odst. 2 tohoto článku této smlouvy. O předání a převzetí díla bude sepsán předávací protokol.
4. Při předání a převzetí díla je zhotovitel povinen předat objednateli veškeré dokumenty, plány a jiné listiny, které zhotovitel získal nebo měl získat v souvislosti s dílem či jeho provedením.
5. Řádné dokončení díla je závislé na řádném a včasném splnění součinnosti smluvních stran uvedené v čl. VII této smlouvy. Po dobu prodlení Objednatele s poskytnutím sjednaných součinností není Zhotovitel v prodlení s plněním předmětu této smlouvy. Nedojde-li mezi stranami k jiné dohodě a prokáže-li Zhotovitel, že ani při vynaložení veškerého úsilí nemohl dílo v důsledku prodlení Objednatele dokončit, je možné s výslovným souhlasem objednatele prodloužit stanovený termín dokončení díla o dobu shodnou s prodlením Objednatele v plnění jeho součinností.

6. Při předání a převzetí díla bude na základě kontroly provedené objednatelem protokolárně ověřeno, zda poskytnuté plnění dle této Smlouvy vedlo k výsledku, ke kterému se smluvní strany zavázaly touto Smlouvou, a to porovnáním skutečného rozsahu a kvality provedených prací na díle a jejich vlastností s jejich závaznou specifikací uvedenou v této Smlouvě.

V. Cena a platební podmínky

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za dílo provedené v souladu s touto smlouvou cenu v celkové výši:

Cena bez DPH (ZD pro 21 % DPH)	259 205 Kč
DPH 21 %	54 433 Kč

Cena celkem včetně DPH 313 638 Kč
(Slovy: „*Třístatřinácttisícšestsetřicetosmkorunčeských*“)

2. Cena za provedení díla je nejvýše přípustná a nepřekročitelná a obsahuje veškeré náklady spojené s provedením díla (zejména dopravné a skládkovné). Nad rámec této ceny nepřísluší zhotoviteli za provedení prací na díle žádná jiná odměna.
3. Cena za provedení díla je splatná na základě daňového dokladu (faktury) vystaveného zhotovitelem a doručeného na adresu Objednatele v listinné či elektronické formě. K ceně bude při fakturaci připočtena DPH v zákonné výši. Každá faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu v souladu s ustanovením § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“) a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOÚ“). Součástí vystavené faktury bude předání zápisů ze stavebního deníku a řádný soupis prací, kterými bylo dílo provedeno.
4. Objednatel je oprávněn pozastavit 10 % z celkové ceny díla, v případě, že v zápise o předání a převzetí díla budou uvedeny výhrady ohledně vad či nedodělků. Uvolnění této částky provede objednatel do 14 dnů ode dne, kdy oprávněný zástupce objednatele potvrdí protokol o odstranění vad a nedodělků.
5. Fakturace bude provedena za celé dílo po protokolárním převzetí dokončeného díla na základě faktury, která bude Objednatelem odsouhlasena.
6. V případě, že Zhotovitelem vystavená faktura nebude obsahovat všechny náležitosti dle odst. 3 této Smlouvy nebo nebude splňovat náležitosti daňového dokladu, je Objednatel oprávněn ve lhůtě do deseti pracovních dnů od jejího obdržení fakturu vrátit Zhotoviteli k opravě či doplnění. Lhůta splatnosti ceny za provedené dílo v takovémto případě počíná běžet ode dne doručení opravené nebo doplněné faktury Objednateli. Nevrátí-li Objednatel Zhotoviteli fakturu ve lhůtě specifikované v tomto odstavci, má se za to, že k faktuře Objednatel nemá výhrady.
7. Splatnost faktury činí 21 dnů ode dne jejího doručení objednateli.
8. Zhotovitel není oprávněn požadovat zálohové platby.
9. V případě, že některé ze stran této Smlouvy vznikne nárok na zaplacení smluvní pokuty, zašle tato smluvní strana společně s výzvou k uhrazení pokuty dle této Smlouvy fakturu na částku ve výši smluvní pokuty splňující náležitosti daňového dokladu podle ZDPH a účetního dokladu podle ZOÚ druhé smluvní straně. Smluvní pokuta je splatná do 30 dnů ode dne doručení faktury smluvní straně povinné k její úhradě.
10. V případě, že některé ze smluvních stran vznikne nárok na náhradu škody, zašle druhé smluvní straně písemné vyúčtování - fakturu s náležitostmi účetního dokladu podle ZDPH a ZOÚ s přesnou výší požadované náhrady, popisem vady popř. jiné události, jíž škoda vznikla a odkazem na konkrétní povinnost druhé smluvní strany, jejíž porušení způsobilo vznik škody. Náhrada škody je splatná do 30 dnů ode dne doručení řádného vyúčtování druhé smluvní straně.

11. Objednatel bude hradit přijatou fakturu pouze bankovním převodem na bankovní účet uvedený v záhlaví této smlouvy.
12. Stane-li se Zhotovitel nespolehlivým plátcem ve smyslu ZDPH, zaplatí Objednatel pouze základ daně. Příslušná výše DPH bude uhrazena až po písemném doložení Zhotovitele o jeho úhradě příslušnému správci daně.
13. Statutární město Ústí nad Labem (objednatel), jako příjemce plnění, které je předmětem této smlouvy a které odpovídá číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43 platnému od 1. ledna 2008, tímto prohlašuje, že ve vztahu k danému plnění nevystupuje jako osoba povinná k dani a že přijaté plnění použije výlučně pro účely, které nejsou předmětem daně z přidané hodnoty. V důsledku těchto skutečností se u předmětného plnění nepoužije režim přenesení daňové povinnosti dle § 92e ZDPH. Daň z přidané hodnoty je povinen přiznat a zaplatit poskytovatel plnění (zhotovitel).

VI. Práva a povinnosti smluvních stran při provádění díla

1. Zhotovitel je povinen provést dílo v rozsahu vyplývajícím z této smlouvy.
2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s obecně závaznými právními předpisy, normami a technickými podmínkami, platnými pro provádění díla v době uzavření smlouvy i v době provádění díla. Zhotovitel odpovídá za dodržení veškerých obecně závazných právních předpisů rovněž ze strany všech osob, které se budou fyzicky podílet na provedení díla, zejména pak za dodržení obecně závazných právních předpisů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany. O těchto předpisech v rozsahu relevantním pro provedení díla je Zhotovitel povinen výše uvedené osoby proškolit.
3. Zhotovitel bude při plnění předmětu této smlouvy postupovat s odbornou péčí. Zavazuje se dodržovat obecně závazné předpisy, technické normy a podmínky této smlouvy. Zhotovitel se bude řídit výchozími podklady objednatele, pokyny objednatele, zápisy a dohodami oprávněných pracovníků smluvních stran a rozhodnutími a vyjádřeními kompetentních orgánů státní správy.
4. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu s povinnostmi vyplývajících ze smlouvy nebo obecně závazných právních předpisů, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v dostatečné přiměřené lhůtě, jedná se o porušení smlouvy, která opravňuje objednatele k odstoupení od smlouvy.
5. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel kontrolní dny. Kontrolní dny se budou konat za účasti zástupců obou smluvních stran. Kontrolní dny na stavbě budou realizovány minimálně jednou za 14 dní. Zhotovitel je povinen se kontrolního dnu zúčastnit. Z kontrolního dne bude proveden zápis do stavebního deníku.
6. Osobou oprávněnou objednatelem k provádění kontrol je zástupce objednatele ve věcech technických: Kateřina Frišová, provozní technik oddělení údržby majetku odboru dopravy a majetku Magistrátu města Ústí nad Labem.
7. Zhotovitel je povinen vést a uchovávat o pracích provedených na díle dle této Smlouvy dokumentaci v rozsahu vyplývajícím z obecně závazných právních předpisů a z této smlouvy.
8. Nedostatky či vady oznámené dle odst. 4 tohoto článku budou zaznamenány do stavebního deníku s uvedením termínu jejich bezplatného odstranění.
9. Zhotovitel se zavazuje používat stroje, mechanismy a jiné prostředky vhodné pro provedení díla, tak aby dílo bylo provedeno v požadované kvalitě a nedocházelo k poškození zařízení a příslušenství ani jiného majetku.
10. Zhotovitel je povinen po dobu plnění této Smlouvy splňovat veškeré základní kvalifikační předpoklady či obdobné předpoklady nebo podmínky stanovené v zadávací dokumentaci. V případě, že Zhotovitel přestane splňovat jakýkoliv z těchto předpokladů, je povinen

nejpozději do 5 pracovních dnů tuto skutečnost Objednateli ohlásit s tím, že do 10ti pracovních dnů od oznámení této skutečnosti doloží veškeré potřebné doklady k opětovnému prokázání splnění těchto předpokladů.

11. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla řídit pokyny Objednatele. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele na nevhodnost pokynů či návrhů daných mu Objednatelem, na rizika vyplývající z Objednatelem požadovaných prací na díle, pokud neodpovídají obvyklým postupům předmětného plnění či podmínkám bezpečnosti práce, včetně důsledků pro kvalitu a termín poskytnutí příslušných prací na díle, jestliže Zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení své odborné péče.

VII. Součinnost a komunikace smluvních stran

1. Smluvní strany se zavazují vzájemně spolupracovat a poskytovat si veškeré informace nezbytné pro řádné a včasné plnění svých závazků.
2. Smluvní strany jsou povinny informovat druhou smluvní stranu o veškerých skutečnostech, které jsou nebo mohou být důležité pro řádné a včasné plnění jejich závazků, pokud takové skutečnosti již nebyly či neměly být známy druhé smluvní straně.
3. Zhotovitel je oprávněn požadovat součinnost Objednatele, pokud je tato součinnost nezbytná k odstranění překážek na straně Objednatele, které objektivně brání řádnému provedení díla. V takovém případě lze tuto součinnost požadovat kdykoliv v průběhu plnění této Smlouvy, přičemž však taková součinnost musí být specifikována dostatečně předem.
4. Objednatel bude Zhotoviteli zejména poskytovat potřebnou součinnost při plnění povinností dle čl. VI. této Smlouvy. Objednatel se zavazuje bezdůvodně neodmítnout poskytnutí součinnosti Zhotoviteli dle této Smlouvy.
5. Veškerá komunikace mezi smluvními stranami bude probíhat prostřednictvím oprávněných osob dle čl. XI této Smlouvy.
6. Pisemnost, která má být dle této Smlouvy doručena druhé smluvní straně, musí být doručena buď osobně, prostřednictvím držitele poštovní licence nebo elektronicky, a to vždy alespoň oprávněné osobě dle čl. XI této Smlouvy. V případě, že taková pisemnost může mít přímý vliv na účinnost této Smlouvy, musí být doručena buď osobně, nebo prostřednictvím držitele poštovní licence či datovou schránkou do sídla této smluvní strany zásilkou doručovanou do vlastních rukou, a to vždy osobě oprávněné k zastupování druhé smluvní strany dle zápisu v obchodním rejstříku, resp. na základě obecně závazných právních předpisů.

VIII. Náhrada škody a prodlení

1. Každá ze smluvních stran nese odpovědnost za způsobenou škodu v rámci platných právních předpisů a této Smlouvy. Za škodu se v tomto smyslu považuje i pokuta či jiná sankce uložená za správní delikt Objednateli v případě, že příčinou uložení takové sankce bylo porušení povinností Zhotovitele dle této Smlouvy. Obě smluvní strany se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí k předcházení škodám a k minimalizaci vzniklých škod. Smluvní strany jsou povinny nahradit způsobenou škodu za porušení povinností stanovených platnými právními předpisy, a dále stanovených v této Smlouvě.
2. Žádná ze smluvních stran nemá povinnost nahradit škodu způsobenou porušením svých povinností vyplývajících z této Smlouvy a není v prodlení, bránila-li jí v jejich splnění některá z překážek vylučujících povinnost k náhradě škody ve smyslu ustanovení § 2913 odst. 2 občanského zákoníku.
3. Každá ze smluvních stran se zavazuje upozornit druhou smluvní stranu bez zbytečného odkladu na vzniklé okolnosti vylučující povinnost k náhradě škody bránící řádnému plnění této Smlouvy. Smluvní strany se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí k odvrácení a překonání okolností vylučujících povinnost k náhradě škody.

4. Žádná ze smluvních stran není v prodlení, pokud toto prodlení mělo jednoznačnou a bezprostřední příčinu v prodlení druhé smluvní strany.
5. Zhotovitel není povinen nahradit škodu, která vznikla v důsledku věcně nesprávného nebo jinak chybného pokynu Objednatele v případě, že na nesprávnost takového pokynu Objednatele upozornil v souladu s čl. VI odst. 11 této Smlouvy.

IX. Jakost díla, záruka, odpovědnost za vady a za škodu, vlastnické právo

1. Zhotovitel především odpovídá za správnost a úplnost provedení předmětu díla, za správnost a úplnost provedení všech prací na díle uvedených ve smlouvě včetně veškerých příloh, technologických předpisů a postupů, veškerých platných norem a souvisejících platných předpisů.
2. Zhotovitel dále odpovídá za to, že celé dílo, i každá jeho jednotlivá část, bude bez jakýchkoliv vad, ať už věcných, právních nebo ostatních. Dílo nebo jeho část má vady, jestliže zejména neodpovídá výsledku určenému ve smlouvě, neodpovídá účelu jeho využití, případně nemá vlastnosti výslovně stanovené smlouvou, dokumentací, objednatel, platnými předpisy nebo nemá vlastnosti obvyklé.
3. **Záruční lhůta** na provedené dílo činí **24 měsíců** ode dne jeho protokolárního předání a převzetí.
4. Zhotovitel po uvedené záruční dobu také odpovídá za bezvadnost předmětu díla, tj. odpovídá za všechny vlastnosti, které má mít předmět díla zejména dle smlouvy, dle jednotlivých požadavků a pokynů objednatel, případně ostatních pověřených osob, dle dokumentace, norem a ostatních předpisů, pokud se na prováděný předmět díla, jeho části a příslušenství vztahují.
5. Jakákoliv vada na díle, která se vyskytne v průběhu záruční doby, bude objednatel oznámena bez zbytečného odkladu písemně zhotoviteli a tento odstraní závadu na své vlastní náklady, neprodleně, nejpozději však ve lhůtě 10 pracovních dnů, pokud se objednatel se zhotovitelem nedohodnou písemně jinak. Neodstraní-li zhotovitel vady díla ve lhůtě nebo oznámí-li před jejím uplynutím, že vady neodstraní, může objednatel požadovat přiměřenou slevu z ceny díla nebo po předchozím vyrozumění zhotovitele vadu odstranit sám nebo ji nechat odstranit, a to na náklady zhotovitele. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli výdaje a ušlý zisk, které souvisejí s odstraněním vad zajišťovaných objednatel. Zhotovitel je povinen nahradit tyto náklady do 30 dnů po obdržení příslušného platebního dokladu objednatel.
6. V případě opravy nebo výměny vadných částí díla se záruční doba díla nebo jeho části prodlouží o dobu, po kterou nemohlo být dílo nebo jeho část v důsledku zjištěné vady užíváno vůbec nebo mohlo být užíváno jen v omezeném rozsahu.
7. Reklamací lze uplatnit do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná objednatel v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.
8. Odstranění vady nemá vliv na nárok objednatel vůči zhotoviteli na zaplacení smluvních pokut a náhradu škod souvisejících s vadami díla.
9. Zhotovitel je rovněž odpovědný za jakékoliv ztráty nebo škody na díle či majetku objednatel jakož i třetích osob způsobené zhotovitelem nebo jeho subdodavateli v průběhu provádění jakýchkoliv prací a služeb při plnění nebo v souvislosti s plněním povinností podle této smlouvy.
10. Případné nároky z nedodržení povinností Zhotovitele dle odst. 1 tohoto článku této Smlouvy Objednatel uplatní zejména při předání a převzetí díla. Tím však není dotčeno právo Objednatel uplatnit tyto své nároky později, pokud Objednatel prokáže, že je objektivně nemohl uplatnit již v rámci předání a převzetí díla.
11. Vlastníkem díla po celou dobu trvání této smlouvy je objednatel. Nebezpečí škody při provádění díla nese zhotovitel a to doby řádného předání díla objednateli.

12. Zhotovitel je vlastníkem všech věcí nezbytných k realizaci trvalých, popř. dočasných konstrukcí, které vnesl na staveniště včetně strojů a jiných mechanismů a je nositelem nebezpečí škod na nich vzniklých nebo jimi vyvolaných.

X. Sankce

1. V případě, že Zhotovitel nedodrží závazný termín dokončení díla stanovený v této smlouvě, se Zhotovitel zavazuje zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2% z ceny díla včetně DPH za každý i započatý den prodlení, pokud prodloužení termínu dokončení nebylo v průběhu prací písemně odsouhlaseno Objednatelem.
2. V případě, že Objednatel neuhradí ve lhůtě splatnosti předloženou fakturu, se Objednatel zavazuje zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z fakturované částky včetně DPH za každý i započatý den prodlení.
3. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo druhé smluvní strany na náhradu škody zvlášť a v plné výši.
4. Výzva k uhrazení smluvní pokuty bude obsahovat určení události, která zakládá právo na smluvní pokutu. Oznámení musí dále obsahovat informaci o způsobu úhrady smluvní pokuty.
5. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn jednostranně započíst jakoukoliv svou pohledávku proti splatné či nesplatné pohledávce zhotovitele, a to i částečně, bez ohledu na to, zda pohledávky vznikly na základě této smlouvy.

XI. Oprávněné osoby

1. Každá smluvní strana jmenuje oprávněné osoby, které jsou uvedeny v záhlaví této smlouvy. Oprávněné osoby budou zastupovat smluvní stranu v záležitostech souvisejících s plněním dle této Smlouvy. Oprávněná osoba si může stanovit svého zástupce. Vystupuje-li zástupce za oprávněnou osobu, má stejné pravomoci jako oprávněná osoba.
2. Obě smluvní strany jsou oprávněny změnit jimi jmenované oprávněné osoby nebo jejich zástupce, jsou však povinny na takovou změnu druhou smluvní stranu písemně upozornit (doporučeným dopisem nebo elektronicky). Tato změna je účinná, až když se o ní druhá smluvní strana dozví.
3. Ustanovením tohoto článku Smlouvy není dotčeno postavení osob oprávněných zastupovat smluvní strany.
4. Oprávněné osoby jsou uvedeny v záhlaví této smlouvy a v čl. VI odst. 6 této smlouvy.

XII. Platnost a účinnost smlouvy, zánik smlouvy

1. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření, tj. dnem jejího podpisu osobami oprávněnými zastupovat smluvní strany a nabývá účinnosti zveřejněním v registru smluv.
2. Tato smlouva zaniká řádným splněním sjednaných závazků dle této smlouvy nebo za podmínek stanovených v následujících odstavcích tohoto článku.
3. Tuto Smlouvu lze zrušit:
 - a) dohodou smluvních stran, jejíž součástí je i vypořádání vzájemných závazků a pohledávek;
 - b) odstoupením od Smlouvy v případech uvedených v zákoně nebo v této Smlouvě.
4. Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy v případě, že:
 - a) Zhotovitel nezačne provádění díla v termínu, v němž mělo dojít k započetí provádění díla;
 - b) Zhotovitel je v prodlení s prováděním díla v úplném rozsahu dle Smlouvy po dobu delší než 5 dnů a nezjedná nápravu ani do 2 dnů od doručení písemného oznámení Objednatele o takovém prodlení;

- c) Zhotovitel plní závazek založený touto Smlouvou v rozporu se zadávacími podmínkami Veřejné zakázky nebo v přímém rozporu s pokyny Objednatele či platnými předpisy, normami a rozhodnutími příslušných orgánů, zejména orgánů státní správy, které je povinen při plnění závazku založeného touto Smlouvou dodržovat.
- 5. Objednatel je oprávněn okamžitě odstoupit od Smlouvy bez předchozího oznámení Zhotoviteli nebo výzvy k sjednání nápravy v přiměřené lhůtě:
 - a) bude-li soudem na majetek Zhotovitele prohlášen úpadek;
 - b) vstoupí-li Zhotovitel do likvidace;
 - c) pozbuje-li Zhotovitel jakékoliv oprávnění vyžadované právními předpisy pro provádění činnosti, k níž se zavazuje touto Smlouvou;
 - d) poruší-li Zhotovitel povinnosti stanovené v čl. VI odst. 10 této Smlouvy, přičemž toto porušení bude trvat déle, než 10 dnů.
- 6. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od Smlouvy v případě, že Objednatel je v prodlení s placením peněžitých částek Zhotoviteli dle této Smlouvy a toto prodlení trvá po dobu delší než 15 dnů a nezjedná nápravu ani do 15 dnů od doručení písemného oznámení Zhotovitele o takovém prodlení.
- 7. Veškerá porušení povinností Zhotovitele, která mohou mít za následek odstoupení od této Smlouvy ze strany Objednatele, se bez dalšího považují za závažné pochybení při plnění smluvního vztahu.
- 8. Předčasné ukončení Smlouvy nemá vliv na ta práva a povinnosti smluvních stran, u nichž z jejich povahy či kontextu této Smlouvy vyplývá, že mají zůstat v účinnosti i po dni ukončení účinnosti Smlouvy nebo mají vzniknout ke dni ukončení účinnosti Smlouvy.

XIII. Závěrečná ustanovení

- 1. Právní vztahy vzniklé z této Smlouvy a touto Smlouvou blíže neupravené se řídí platnými a účinnými právními předpisy České republiky, zejména občanským zákoníkem.
- 2. Výrazům, které nejsou v této Smlouvě výslovně definovány, je třeba připisovat stejný význam, jako je jim připisován jejími přílohami.
- 3. V případě rozporu mezi jednotlivými ustanoveními této Smlouvy se uplatní pro jejich výklad obecná interpretační pravidla.
- 4. Pokud tato Smlouva neupravuje příslušná práva a povinnosti smluvních stran, pak jsou smluvní strany povinny respektovat znění občanského zákoníku.
- 5. Dojde-li za dobu účinnosti této Smlouvy ke zrušení právního předpisu a jeho nahrazení novým právním předpisem věcně se dotýkajícím předmětu plnění dle této Smlouvy a bude-li mít tato změna podstatný dopad na podmínky plnění této Smlouvy, zavazují se smluvní strany zahájit jednání o uzavření dodatku, jehož předmětem bude úprava vzájemných smluvních vztahů tak, aby byl v maximální možné míře zachován předmět, účel a obsah této Smlouvy a aby bylo vyhověno podmínkám stanoveným navazující normou dle tohoto odstavce. V rámci tohoto jednání nebude Zhotovitel vznášet požadavky na navýšení Ceny za provedení díla s výjimkou případů, kdy takové navýšení bude objektivně a prokazatelně nezbytné k zachování předmětu, účelu a obsahu této Smlouvy. I v takovém případě však Zhotoviteli nevzniká bez dalšího nárok na sjednání navýšení jakékoli položky ceny za provedení díla.
- 6. Veškeré spory, které vzniknou ze Smlouvy nebo v souvislosti s ní, které se nepodaří vyřešit přednostně smírnou cestou, budou rozhodovány obecnými soudy. Smluvní strany jsou seznámeny se skutečností, že Objednatel, jako orgán územní samosprávy, je povinen poskytovat informace vztahující se k jeho působnosti dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že žádný údaj v této smlouvě, včetně jejích příloh, není označován za obchodní tajemství. Zhotovitel prohlašuje, že:


- a) Statutární město Ústí nad Labem je oprávněno, pokud postupuje dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, poskytovat veškeré informace o této smlouvě a o jiných údajích tohoto závazkového právního vztahu, pokud nejsou v této smlouvě uvedeny (např. o daňových dokladech, předávacích protokolech, nabídkách či jiných písemnostech),
- b) veškeré údaje uvedené v této smlouvě, popř. které jsou použity v rámci tohoto závazkového právního vztahu, a to i pokud jsou získány od třetích osob, nepodléhají povinnosti mlčenlivosti nebo jinému postupu směřujícímu k ochraně před zneužitím a zveřejněním.
7. Smluvní strany shodně prohlašují, že povinnost uveřejnění této smlouvy dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, bude splněna ze strany Objednatele.
8. Tuto Smlouvu lze měnit, doplňovat nebo rušit pouze formou písemných vzestupně číslovaných dodatků podepsaných smluvními stranami. Dodatky nabývají platnosti v den, kdy byly podepsány oběma smluvními stranami a účinnosti v den, kdy byly zveřejněny v registru smluv.
9. Tato Smlouva představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu této Smlouvy a je vyhotovena ve třech vyhotoveních s platností originálu, z nichž dvě obdrží objednatel a jedno zhotovitel.
10. Součástí Smlouvy tvoří tyto přílohy:
- Cenová nabídka zhotovitele (Krycí list nabídky)
 - Výkaz výměr
 - Zákres řešeného území

Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho k ní připojují svoje podpisy.

V Ústí nad Labem dne 06. 09. 2022

V Malých Žernosekách dne 23. 8. 2022

Objednatel:



Ing. Dalibor Dařílek
vedoucí odboru dopravy a majetku

Magistrátu města Ústí nad Labem

Zhotovitel:

CREDO LITOMĚŘICE VDZ spol. s r.o.
Ústecká 53, 410 02 Malé Žernoseky
IČO: 25493043 DIČ: CZ25493043



Ing. Karolina Bobková, jednatel
Credo Litoměřice VDZ spol. s r. o.





STATUTÁRNÍ MĚSTO ÚSTÍ NAD LABEM

Odbor dopravy a majetku

Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí nad Labem

Příloha č. 1 – Krycí list nabídky

KRYCÍ LIST NABÍDKY

1. Název veřejné zakázky:

„Cyklostojaňy Ústí nad Labem“

2. Základní identifikační údaje

2.1. Zadavatel

subjekt:

Statutární město Ústí nad Labem

sídlo:

Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí n/L

IČO:

00081531

DIČ:

CZ00081531

Zastoupeno:

Ing. Daliborem Dařílkem, vedoucím
odboru dopravy a majetku Magistrátu
města Ústí nad Labem

2.2. Uchazeč

název:

Credo Litoměřice VDZ spol. s r. o.

sídlo/místo podnikání:

Ústecká 53, 410 02 Malé Žernoseky

tel./fax:

[REDACTED]

e-mail:

[REDACTED]

bankovní spojení:

ČS, a. s., pobočka Litoměřice

č. účtu:

100 692 73 89/0800

IČ:

254 93 043

DIČ:

CZ254 93 043

osoba oprávněná jednat za uchazeče:

Ing. Karolina Bobková, jednatel

kontaktní osoba:

[REDACTED]

tel./fax:

[REDACTED]

e-mail:

[REDACTED]

3. Nabídková cena:

Cena v Kč celkem bez DPH: 259 205 Kč

Samostatně DPH 21%: 54 433 Kč

Cena v Kč celkem včetně DPH: 313 638 Kč

V Malých Žernosekách dne 9. 8. 2022

CREDO LITOMĚŘICE VDZ spol. s r.o.
Ústecká 53, 410 02 Malé Žernoseky
IČO: 25493043 ① DIČ: CZ25493043

[REDACTED]
Ing. Karolina Bobková, jednatel
podpis oprávněného
zástupce uchazeče

Popis	Cena	Hmotnost	DPH	Cena s DPH
SO 01: Mírové náměstí - infocentrum				
001: Zemní práce	37 390	2,0	7 852	45 242
005: Komunikace	4 970		1 044	6 014
009: Ostatní konstrukce a práce	5 620	1,9	1 180	6 800
SO 02: Bílinská - OC Forum				
001: Zemní práce	26 800	0,1	5 628	32 428
005: Komunikace	28 043	1,5	5 889	33 931
009: Ostatní konstrukce a práce	3 728		783	4 510
SO 03: U Nádraží - Hlavní nádraží				
001: Zemní práce	4 215	1,4	885	5 100
005: Komunikace	20 100	0,1	4 221	24 321
009: Ostatní konstrukce a práce	28 043	1,5	5 889	33 931
SO 04: Varšavská - MO Ústí n.L. - Sřekov				
001: Zemní práce	3 728		783	4 510
005: Komunikace	4 215	1,4	885	5 100
009: Ostatní konstrukce a práce	20 100	0,1	4 221	24 321
SO 05: U Radnice - MO Ústí n.L. - Neštěmice				
001: Zemní práce	18 405	0,6	3 865	22 270
005: Komunikace	2 485		522	3 007
009: Ostatní konstrukce a práce	2 520	0,5	529	3 049
SO 06: Stavbařů - MO Ústí n.L. - Severní Terasa				
001: Zemní práce	13 400	0,1	2 814	16 214
005: Komunikace	18 405	0,6	3 865	22 270
009: Ostatní konstrukce a práce	2 485		522	3 007
SO 07: Masarykova - zimní stadion				
001: Zemní práce	2 520	0,5	529	3 049
005: Komunikace	13 400	0,1	2 814	16 214
009: Ostatní konstrukce a práce	17 920	0,4	3 763	21 683
SO 08: Masarykova - Městský stadion				
001: Zemní práce	2 485		522	3 007
005: Komunikace	2 035	0,3	427	2 462
009: Ostatní konstrukce a práce	13 400	0,1	2 814	16 214
SO 09: Masarykova - Městský stadion				
001: Zemní práce	18 405	0,6	3 865	22 270
005: Komunikace	2 485		522	3 007
009: Ostatní konstrukce a práce	2 520	0,5	529	3 049
SO 10: Masarykova - Městský stadion				
001: Zemní práce	13 400	0,1	2 814	16 214
005: Komunikace	18 405	0,6	3 865	22 270
009: Ostatní konstrukce a práce	2 485		522	3 007

SO 09: Městské sady	37 390	2,0	7 852	45 242
001: Zemní práce	4 970		1 044	6 014
005: Komunikace	5 620	1,9	1 180	6 800
009: Ostatní konstrukce a práce	26 800	0,1	5 628	32 428
SO 10: Magistrát města Ústí n.L.	18 400	0,0	3 864	22 264
009: Ostatní konstrukce a práce	18 400	0,0	3 864	22 264
SO 11: MO Ústí n.L. - město	18 400	0,0	3 864	22 264
009: Ostatní konstrukce a práce	18 400	0,0	3 864	22 264

Celkem (bez DPH)

259 205

DPH

54 433

DPH 21 % ze základny: 259 205

54 433

Celkem (včetně DPH)

313 638

Poř. Typ	Kód	Alter. kód	MJ	Výměra bez ztr.	Ztrátové	Výměra	Jedn. cena	Cena	Jedn. hmotn.	Hmotnost	Jedn. súč	Sazba DPH	DPH	Cena s DPH
SO 01: Mírové náměstí - Infocentrum														
001: Zemní práce														
1.	SP	113106122				m2	2,0							
2.	SP	113107123				m2	2,0							
005: Komunikace														
3.	SP	275313811				m3	0,16							
4.	SP	564801111				m2	2,0							
5.	SP	594611111				m2	2,0							
6.	SP	599432111				m2	2,0							
009: Ostatní konstrukce a práce														
7.	SP	912111121				kus	4,0							
8.	H	74910152				kus	4,0							
SO 02: Bilinská - OC Forum														
001: Zemní práce														
1.	SP	113106122				m2	1,5							
2.	SP	113107123				m2	1,5							
005: Komunikace														
3.	SP	275313811				m3	0,12							
4.	SP	564801111				m2	1,5							
5.	SP	594611111				m2	1,5							
6.	SP	599432111				m2	1,5							
009: Ostatní konstrukce a práce														
7.	SP	912111121				kus	3,0							
8.	H	74910152				kus	3,0							
SO 03: U Nádraží - Hlavní nádraží														
001: Zemní práce														
1.	SP	113106122				m2	1,5							
2.	SP	113107123				m2	1,5							
005: Komunikace														
3.	SP	275313811				m3	0,12							
4.	SP	564801111				m2	1,5							
5.	SP	594611111				m2	1,5							
6.	SP	599432111				m2	1,5							
009: Ostatní konstrukce a práce														
7.	SP	912111121				kus	3,0							
8.	H	74910152				kus	3,0							
SO 04: Varsavská - MO Ústí n.L. - Střekov														
001: Zemní práce														
1.	SP	113106123				m2	1,0							
2.	SP	113107123				m2	1,0							
005: Komunikace														
3.	SP	275313811				m3	0,08							
4.	SP	564801111				m2	1,0							
5.	SP	594611111				m2	1,0							
6.	SP	599432111				m2	1,0							
009: Ostatní konstrukce a práce														
7.	SP	912111121				kus	2,0							
8.	H	74910152				kus	2,0							

Poř. Typ	Kód	Alter. kód	MJ	Výměra bez ztr.	Ztrátě	Výměra	Jedn. cena	Cena	Jedn. hmotn.	Hmotnost	Jedn. sur'	Sur'	Sazba DPH	DPH	Cena s DPH
8.	H	74910152				kus	2,0	-	2,0	0,03000	0,1	-	21	2 184	12 584
stojan na kola tvaru obrácené U, nerez, délka 80 cm															
SO 05: U Radnice - MO Ústí n.L. - Neštěmice															
001: Zemní práce															
1.	SP	113106123				m2	1,0	-	1,0	0,985	-	0,7	3 865	22 270	3 007
2.	SP	113107123				m2	1,0	-	1,0	1 500,00	-	0,4	21	1 192	1 815
Rozebírání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně															
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 230 mm ručně															
005: Komunikace															
3.	SP	275313811				m3	0,08	-	0,08	8 250,00	-	0,5	529	3 049	3 049
4.	SP	564801111				m2	1,0	-	1,0	720,00	-	0,1	21	139	799
5.	SP	598211110				m2	1,0	-	1,0	685,00	-	0,1	21	151	871
Kladecí vrstva ze štrkordité SD tl 30 mm															
Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2															
6.	SP	599632111				m2	1,0	-	1,0	455,00	-	0,2	21	144	829
Vyplnění spár zámkové dlažby křemílkovým pískem															
009: Ostatní konstrukce a práce															
7.	SP	912111121				kus	2,0	-	2,0	1 500,00	-	0,1	21	2 814	16 214
8.	H	74910152				kus	2,0	-	2,0	5 200,00	-	-	21	630	3 630
Montáž cyklostojanu tvaru obrácené U do betonové základové patky															
stojan na kola tvaru obrácené U, nerez, délka 80 cm															
SO 06: Stavbařů - MO Ústí n.L. - Severní Terasa															
001: Zemní práce															
1.	SP	113106123				m2	1,0	-	1,0	985,00	-	0,7	3 865	22 270	3 007
2.	SP	113107123				m2	1,0	-	1,0	1 500,00	-	0,4	21	1 192	1 815
Rozebírání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně															
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 230 mm ručně															
005: Komunikace															
3.	SP	275313811				m3	0,08	-	0,08	8 250,00	-	0,5	529	3 049	3 049
4.	SP	564801111				m2	1,0	-	1,0	720,00	-	0,1	21	139	799
5.	SP	598211110				m2	1,0	-	1,0	685,00	-	0,1	21	151	871
Kladecí vrstva ze štrkordité SD tl 30 mm															
Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2															
6.	SP	599632111				m2	1,0	-	1,0	455,00	-	0,2	21	144	829
Vyplnění spár zámkové dlažby křemílkovým pískem															
009: Ostatní konstrukce a práce															
7.	SP	912111121				kus	2,0	-	2,0	1 500,00	-	0,1	21	2 814	16 214
8.	H	74910152				kus	2,0	-	2,0	5 200,00	-	-	21	630	3 630
Montáž cyklostojanu tvaru obrácené U do betonové základové patky															
stojan na kola tvaru obrácené U, nerez, délka 80 cm															
SO 07: Masarykova - zimní stadion															
001: Zemní práce															
1.	SP	113107141				m2	1,0	-	1,0	985,00	-	0,7	3 763	21 683	3 007
2.	SP	113107132				m2	1,0	-	1,0	1 500,00	-	0,6	21	315	1 815
Odstranění povrchu z litého asfaltu tl do 40 mm ručně															
Odstranění podkladu z betonu prostého tl 200 mm ručně															
005: Komunikace															
3.	SP	275313811				m3	0,08	-	0,08	8 250,00	-	0,3	427	2 482	2 482
4.	SP	573231112				m2	1,0	-	1,0	450,00	-	0,0	21	139	799
5.	SP	577133111				m2	1,0	-	1,0	925,00	-	0,1	21	194	845
Postřik živitný spojovací ze směsi emulze v množství 0,80 kg/m2															
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 8 (ABJ) tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu															
009: Ostatní konstrukce a práce															
6.	SP	912111121				kus	2,0	-	2,0	1 500,00	-	0,1	21	2 814	16 214
7.	H	74910152				kus	2,0	-	2,0	5 200,00	-	-	21	630	3 630
Montáž cyklostojanu tvaru obrácené U do betonové základové patky															
stojan na kola tvaru obrácené U, nerez, délka 80 cm															
SO 08: Masarykova - Městský stadion															
001: Zemní práce															
1.	SP	113106123				m2	1,0	-	1,0	985,00	-	0,7	3 865	22 270	3 007
2.	SP	113107123				m2	1,0	-	1,0	1 500,00	-	0,4	21	1 192	1 815
Rozebírání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně															
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 230 mm ručně															
005: Komunikace															
3.	SP	275313811				m3	0,08	-	0,08	8 250,00	-	0,5	529	3 049	3 049
4.	SP	564801111				m2	1,0	-	1,0	720,00	-	0,2	21	139	799
5.	SP	598211110				m2	1,0	-	1,0	685,00	-	0,1	21	151	871
Kladecí vrstva ze štrkordité SO tl 30 mm															
Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2															
6.	SP	599632111				m2	1,0	-	1,0	455,00	-	0,2	21	144	829
Vyplnění spár zámkové dlažby křemílkovým pískem															

Pol. Typ	Kód	Alter. kód	Popis	M.J	Výměra bez ztr.	Zhrnulé	Výměra	Jedn. cena	Cena	Jedn. hmotn.	Hmotnost	Jedn. súč	Sazba DPH	DPH	Cena s DPH
009: Ostatní konstrukce a práce															
7.	SP	912111121	Montáž cyklostojanu tvaru obráceného U do betonové základové patky	kus	2,0	-	2,0	1 500,00	13 400	0,00090	0,1	-	-	2 814	16 214
8.	H	74910152	stojan na kola tvaru obrácené U, nerez, délka 80 cm	kus	2,0	-	2,0	5 200,00	10 400	0,03000	0,1	-	21	630	3 530
Cena 12 594															
SO 09: Městské sady															
001: Zemní práce															
1.	SP	113106122	Rozebírání dlažeb z kamenných dlaždic komunikací pro pášň ručně	m2	2,0	-	2,0	985,00	1 970	-	-	0,23500	21	414	2 384
2.	SP	113107123	Odsíranění podkladu z kamenná drceného tl 230 mm ručně	m2	2,0	-	2,0	1 500,00	3 000	-	-	0,44000	0,9	630	3 630
Cena 5 000															
005: Komunikace															
3.	SP	275313811	Základové patky z betonu tl. C 25/30 rozměrů 500x200x200 mm	m3	0,16	-	0,16	8 250,00	1 320	2,45329	1,9	-	-	1 180	6 800
4.	SP	054801111	Kladecí vrstva ze šleřkoduť SD tl 30 mm	m2	2,0	-	2,0	720,00	1 440	0,06900	0,1	-	21	277	1 592
5.	SP	059461111	Kladecí dlažby z lomového kamene s provedením lože ze šleřkoduť	m2	2,0	-	2,0	685,00	1 370	0,58020	1,2	-	21	302	1 742
6.	SP	059432111	Vypínění spár dlažby z lomového kamene drobným kamenivem	m2	2,0	-	2,0	745,00	1 490	0,10354	0,2	-	21	268	1 658
Cena 1 803															
009: Ostatní konstrukce a práce															
7.	SP	912111121	Montáž cyklostojanu tvaru obráceného U do betonové základové patky	kus	4,0	-	4,0	1 500,00	6 000	0,00090	0,1	-	-	5 628	32 428
8.	H	74910152	stojan na kola tvaru obrácené U, nerez, délka 80 cm	kus	4,0	-	4,0	5 200,00	20 800	0,03000	0,1	-	21	1 260	7 260
Cena 25 168															
SO 10: Magistrát města Ústí n.L.															
009: Ostatní konstrukce a práce															
1.	SP	912111113	Montáž cyklostojanu tvaru obráceného U přiléhavého vřuty na chemickou kotvu	kus	2,0	-	2,0	4 000,00	8 000	0,00120	0,0	-	21	1 680	9 680
2.	H	74910151	stojan na kola tvaru obrácené U, nerez, délka 80 cm s patkou pro uchycení vřuty	kus	2,0	-	2,0	5 200,00	10 400	0,02000	0,0	-	21	2 184	12 584
Cena 22 264															
SO 11: MO Ústí n.L. - město															
009: Ostatní konstrukce a práce															
1.	SP	912111113	Montáž cyklostojanu tvaru obráceného U přiléhavého vřuty na chemickou kotvu	kus	2,0	-	2,0	4 000,00	8 000	0,00120	0,0	-	21	1 680	9 680
2.	H	74910151	stojan na kola tvaru obrácené U, nerez, délka 80 cm s patkou pro uchycení vřuty	kus	2,0	-	2,0	5 200,00	10 400	0,02000	0,0	-	21	2 184	12 584
Cena 22 264															

1 - Mírové náměstí -
centrum

4x cyklostežan

MÍROVÉ NÁMĚSTÍ



02 - Bílinská
Forum

BÍLINSKÁ

KOSTELNÍ NÁMĚSTÍ

3201/4

3x cyklostojaň

BÍLINSKÁ

Malá Hradební



03 - Nádraží - Hlavní draží

60/6

91/22

965/6

3x cyklostojaň



50 04 - Varšavská - MO
Ústí n.L. - Střekov



2x cyklostojaň

VARŠAVSKÁ

NÁRODNÍHO O

NÁRODNÍHO ODBOJE

629/13

794/15

528

27984

286

PRÁVÝ CHODNÍK

OPLETALOVA

005 - U Radnice - MO
Ústí n.L. - Neštětice

292

230

229

U RADNICE

2x cyklostojaň

OPLETALOVA

0 1:27

006 - Stavbarů - MIO

stí n. l. - Severní Terasa

691/6

2823/2

43419/1807

2x cyklostojan

STAVBARŮ

STAVBARŮ

663/15

7 - Masarykova -
ní stadion

MASARYKOVA

2x cyklostojan

PARKOVIŠTĚ U ZIMNÍHO STADIONU

PARKOVIŠTĚ U ZIMNÍHO STADIONU

PARKOVIŠTĚ U ZIMNÍHO STADIONU

5

0

SO 08 - Masarykova -
Městský stadion

53/223

MASARYKOVA

104/221

90/219

107/213

107/213

454/211

94/209


2x cyklostejnán

0 1

09 - Městské sady

2x cyklostožan

4x cyklostožan

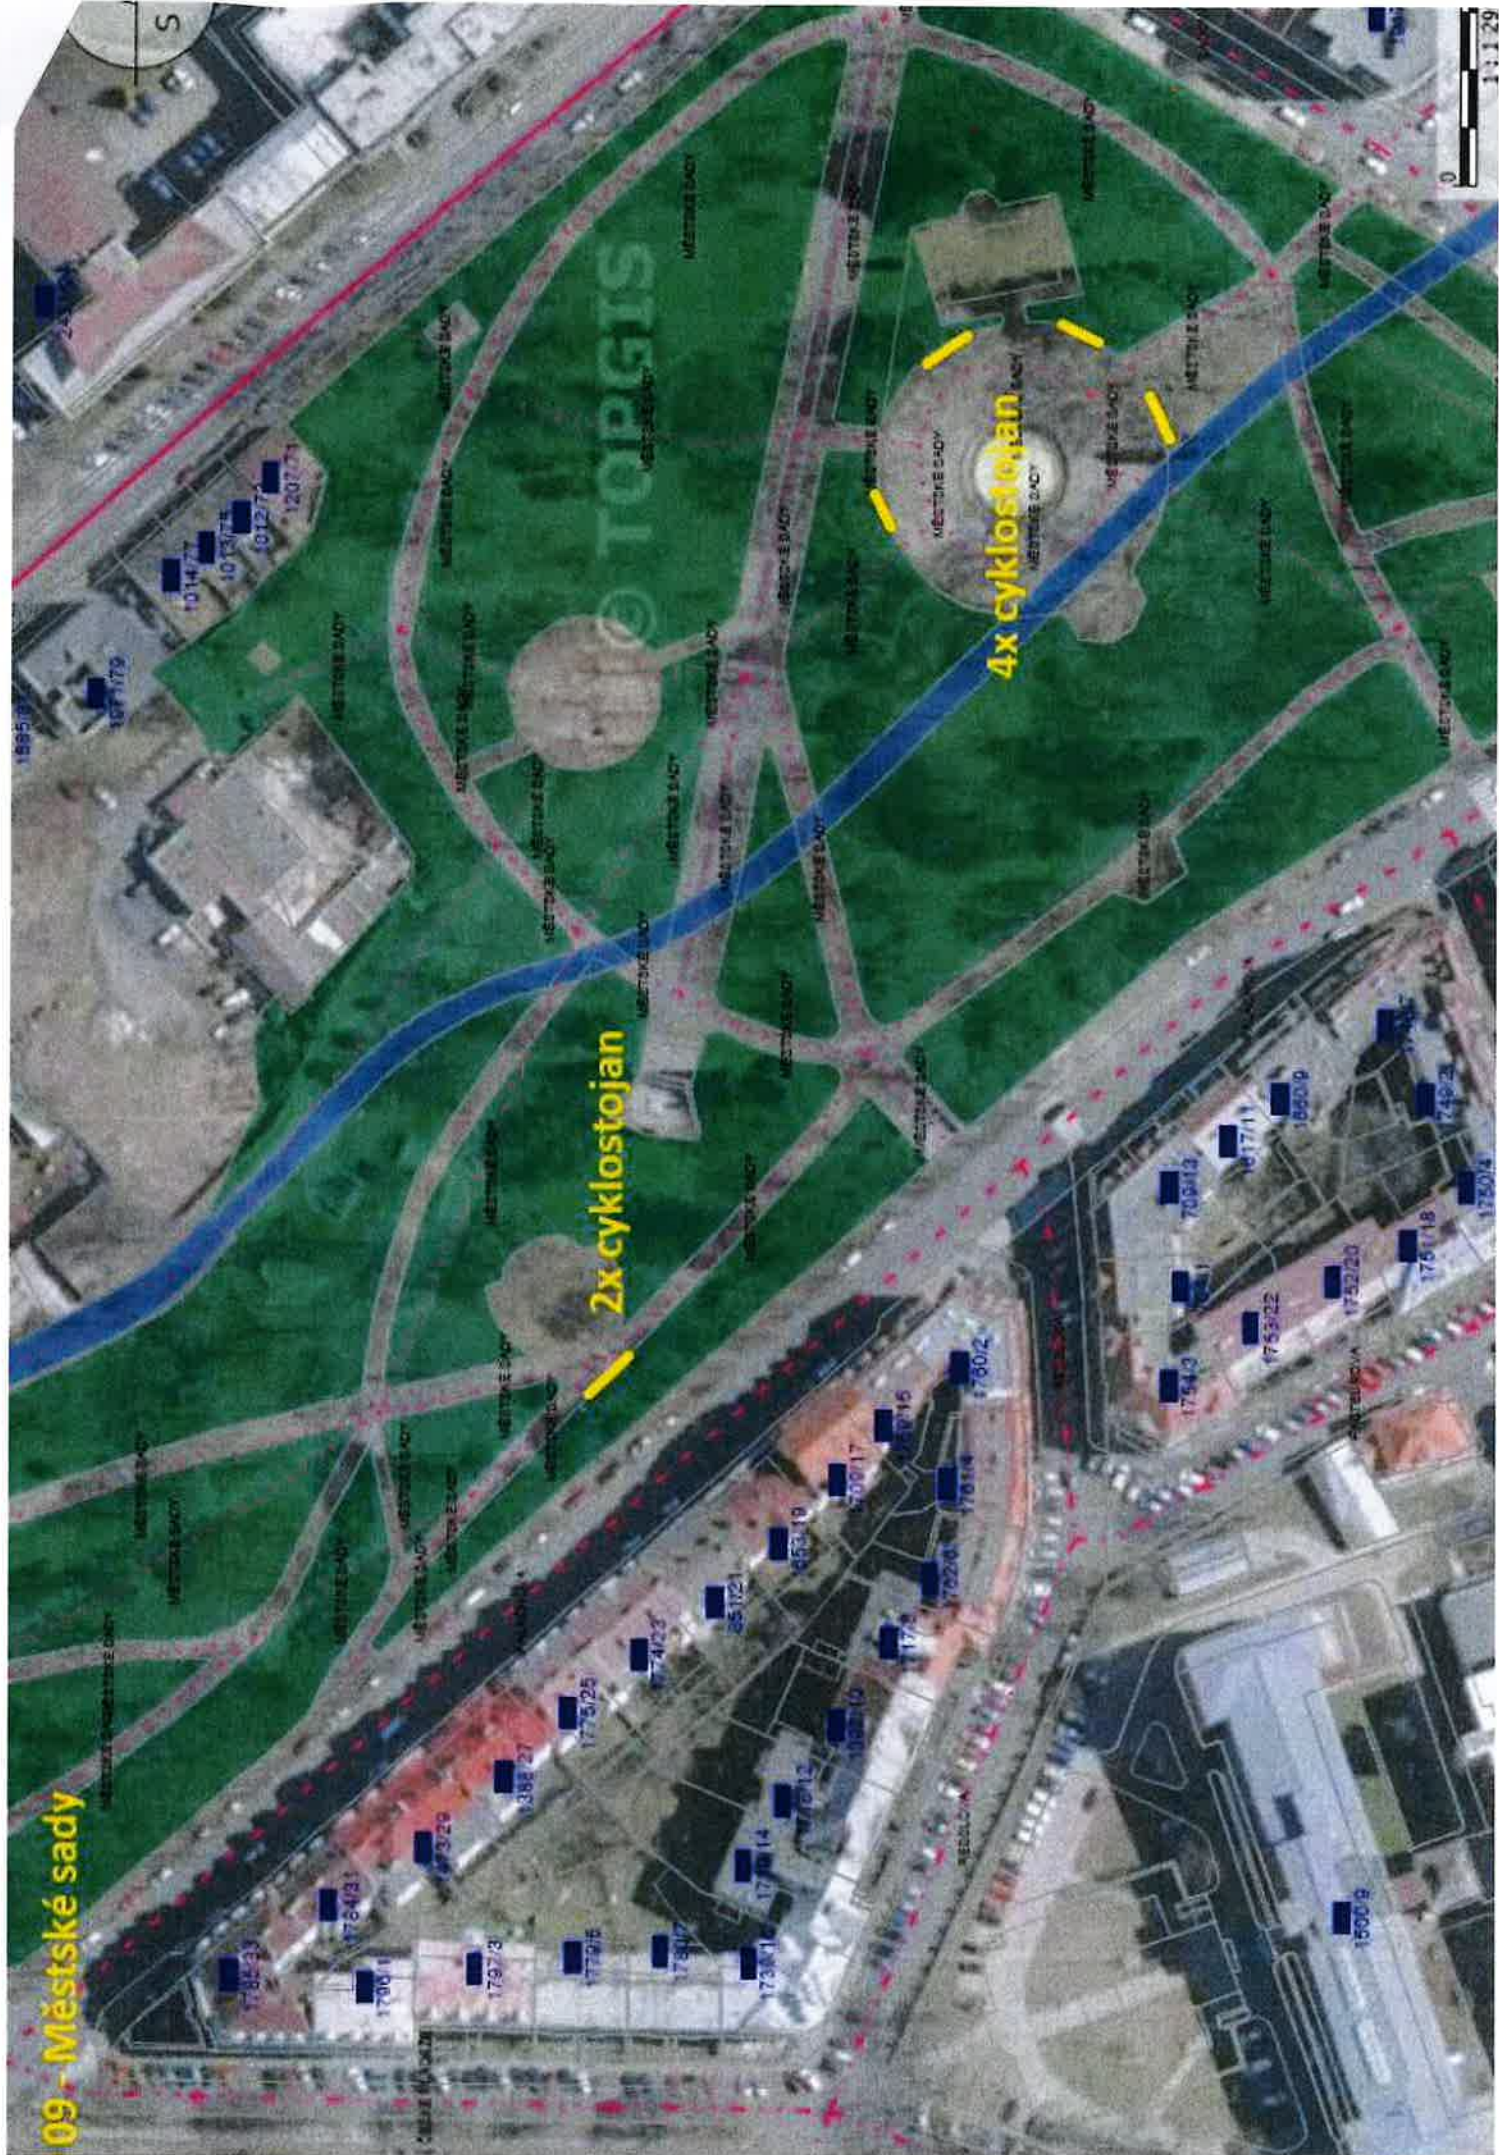

10 - Magistrát města
Lázně nad Labem

2221/5

2222/6

2223/7

1260/3

LIDICKÉ NÁMĚSTÍ

LIDICKÉ NÁMĚSTÍ

LIDICKÉ NÁMĚSTÍ

LIDICKÉ NÁMĚSTÍ

VELKÁ HRADEBNÍ

LIDICKÉ NÁMĚSTÍ

LIDICKÉ NÁMĚSTÍ

LIDICKÉ NÁMĚSTÍ

VELKÁ HRADEBNÍ

LIDICKÉ NÁMĚSTÍ

LIDICKÉ NÁMĚSTÍ

2x cyklostojan

2250/12A

11 - MO Ústí n.L. -
sto

254/26

254/26

+

254/26

25

2x cyklostoja

107

3129

0 1:27
