



S004P01LYK36

Číslo smlouvy objednatele: SD/2022/0424/150/1

Číslo smlouvy zhotovitele:



Město Hodonín

DODATEK Č. 1

KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřený podle ust. § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
na základě dohody obou stran

na dodávku stavby:

„Hodonín, Pánov – kabelizace veřejného osvětlení“

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:	Město HODONÍN
Sídlo:	Masarykovo náměstí 53/1, Hodonín, PSČ 695 35
IČO:	00284891
DIČ:	CZ 699001303
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s., pobočka Hodonín, č.ú. 424671/0100
Zastoupené:	ve smluvních záležitostech Liborem Střechou starostou města Hodonína, v technických záležitostech [REDACTED]

/dále jen objednatel/

Zhotovitel:	VEOS Pospíšil s.r.o.
Sídlo:	Dlouhá 226, 696 17 Dolní Bojanovice
IČO:	28328230
DIČ:	CZ28328230
Bankovní spojení:	Komerční banka a.s. – pobočka Hodonín, č.ú. 43-4196200247/0100
Zastoupen:	Marcelou Červenkovou – jednatelkou
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 61635	

/dále jen zhotovitel/

Objednatel a Zhotovitel společně dále také jako „Smluvní strany“ uzavřely v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „NOZ“) smlouvu o dílo č. SD/2022/0424/150 (dále jen „Smlouva“).

2. PŘEDMĚT DODATKU

- 2.1. Smluvní strany se tímto Dodatkem č. 1 v souladu s čl. 4. a čl. 15.4. Smlouvy dohodly na **úpravě termínu dokončení a protokolárního předání a převzetí díla, a na úpravě platebních podmínek.**

3. TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ

- 3.1. Smluvní strany tímto Dodatkem č. 1 mění čl. 5.3. Smlouvy v původním znění:

Termín dokončení a protokolárního předání a převzetí díla (ukončení doby plnění) do 15. 12. 2022.

na nové znění smlouvy:

1. část díla (viz příloha č. 2): Termín dokončení a protokolárního předání a převzetí díla (ukončení doby plnění) do **15. 12. 2022.**

2. část díla (viz příloha č. 2): Termín dokončení a protokolárního předání a převzetí díla (ukončení doby plnění) **do 20 kalendářních dnů od obdržení výzvy objednatele.** Objednatel vyzve Zhotovitele bezprostředně po zahájení výkopových prací, které zajistí společnost EG.D za účelem vytvoření společného rozšířeného výkopu určeného k uložení vedení distribuční sítě společnosti EG.D a veřejného osvětlení města Hodonína podél hlavní komunikace mezi silnicí I/55 a obcí Ratiškovice (u městské části Hodonín Pánov).

Bez zhotovení tohoto společného rozšířeného výkopu není možné zahájit práce na 2. části díla.

4. PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 4.1. Smluvní strany tímto Dodatkem č. 1 mění čl.7, který nově zní:

čl. 7.1:

1. část díla bude Zhotoviteli uhrazena Objednatelem na základě oceněného položkového rozpočtu, který bude překontrolován a odsouhlasen technickým dozorem stavby a zástupcem objednatele. Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu po protokolárním převzetí dokončené 1. části díla bez vad a nedodělků Objednatelem. Faktura bude prokazatelně předána zástupci Objednatele ke kontrole nejpozději **do 15. 12. 2022.**

2. část díla bude Zhotoviteli uhrazena Objednatelem na základě oceněného položkového rozpočtu, který bude překontrolován a odsouhlasen technickým dozorem stavby a zástupcem objednatele. Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu po protokolárním převzetí dokončené 2. části díla bez vad a nedodělků Objednatelem. Splatnost faktury bude 30 kalendářních dnů.

čl. 7.2: Cena za dílo nebo jeho dílčí část je **uhrazena dnem odepsání** příslušné částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.

čl. 7.3: Zhotovitel **prohlašuje a souhlasí, že:**

- mu nejsou známy skutečnosti, nasvědčující tomu, že se dostane do postavení, kdy nemůže daň zaplatit a ani se ke dni podpisu této smlouvy v takovém postavení nenachází,
- úplata za plnění dle smlouvy nebude poskytnuta zcela nebo zčásti bezhotovostním převodem na účet vedený poskytovatelem platebních služeb **mimo tuzemsko**,
- bude mít u správce daně registrován bankovní účet používaný pro **ekonomickou činnost**,
- bude-li faktura obsahovat číslo bankovního účtu určeného k úhradě ceny díla, které není správcem daně ve smyslu **Zákona o DPH zveřejněno jako číslo bankovního účtu, určeného pro ekonomickou činnost**, je objednatel oprávněn uhradit fakturu na bankovní účet, zveřejněný správcem daně ve smyslu zákona o DPH jako účet, který je používán pro ekonomickou činnost,
- pokud ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nebo k okamžiku poskytnutí úplaty na plnění, bude o zhotoviteli zveřejněna správcem daně skutečnost, že zhotovitel je **nespolehlivým plátcem**, uhradí objednatel daň z přidané hodnoty z přijatého zdanitelného plnění příslušnému správci daně,
- pokud ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nebo k okamžiku poskytnutí úplaty na plnění bude zjištěna nesrovnalost v registraci bankovního účtu zhotovitele určeného správcem daně pro **ekonomickou činnost**, uhradí objednatel daň z přidané hodnoty z přijatého zdanitelného plnění příslušnému správci daně.

5. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

5.1. Ostatní ujednání plynoucí z uzavřené Smlouvy ve znění dodatku č.1 zůstávají v platnosti.

5.2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Dodatku oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v informačním systému veřejné správy, registru smluv, v souladu se zákonem č. 340/2015 sb. o registru smluv.

5.3. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, přičemž Objednatel obdrží tři vyhotovení a Zhotovitel jedno vyhotovení po jejich podpisu.

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., O obcích, ve znění pozdějších předpisů

Rozhodnuto orgánem Města: Rada Města Hodonín

Datum a číslo usnesení: Mimořádná rada 13.12.2022, usnesení č. 243

Přílohy a nedílné součásti Dodatku:


Příloha č. 1 Změnový list č. 1

Příloha č. 2 Oceněný položkový rozpočet pro 1. část díla a 2. část díla


V Hodoníně, dne **14. 12. 2022**

V Hodoníně, dne **14. 12. 2022**


Obhizdnatel

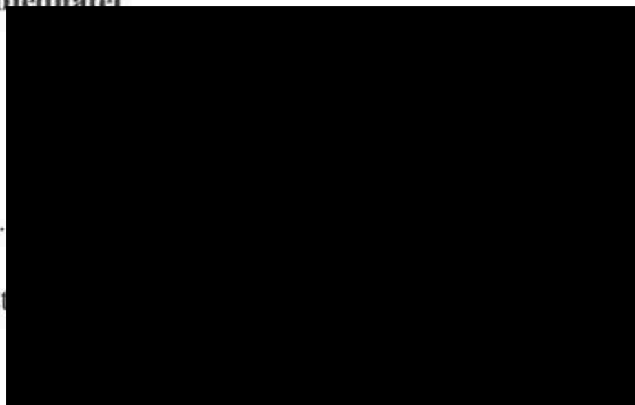

Zhotovitel



Marcela Červenková
jednatelka společnosti



Název akce:

„Hodonín, Pánov – kabelizace veřejného osvětlení“

Z M Ě N O V Ý L I S T

číslo: ZL č. 1

„Prodloužení termínu dokončení: Hodonín, Pánov – kabelizace veřejného osvětlení“

zpracovaný v souladu se Smlouvou o dílo č.: SD/2022/0438/150

1. **Oddíl stavby:** Hodonín, Pánov – kabelizace veřejného osvětlení
2. **Zpracovatel změnového listu** ██████████ - VEOS Pospišil s.r.o.
3. **Odkaz na dokumenty, v nichž je vznik a řešení změny popsáno**
Stavební deník (kontrolní den č. 3 ze dne 7.12.2022)

4. **Zdůvodnění a příčina změny:**

Na základě ústní dohody mezi zástupci města Hodonína a společností EG.D a. s. bylo ujednáno, že v rámci obnovy poškozené infrastruktury po tornádu umožní distribuční společnost EG.D městu Hodonín bezplatné přiložení uzemňovacího vedení FeZn a kabelové chráničky včetně kabelu pro veřejné osvětlení do společného rozšířeného výkopu, který rovněž zajistí EG.D v rámci realizace vlastní akce „Hodonín – Pánov, kabelizace DS“. Podmínkou bylo, že město Hodonín si samo zajistí veškerý potřebný materiál. Toto ujednání se týká výhradně společné trasy (cca 515 m) pro veřejné osvětlení a distribuční vedení, ostatní trasy si město bude realizovat samo.

V souladu s tímto ujednáním město Hodonín uskutečnilo výběrové řízení na zhotovitele akce „Hodonín, Pánov – kabelizace veřejného osvětlení“. Celá kabelizace veřejného osvětlení je tedy od počátku úzce závislá na pracích spol. EG.D.

Na 3. kontrolním dnu uskutečněném 7.12.2022 bylo zjištěno, že veřejné osvětlení podél hlavní komunikace mezi I/55 a Ratiškovcemi, nebude možné zrealizovat ve stanoveném termínu uvedeném ve smlouvě mezi městem Hodonínem a společností VEOS Pospišil (dodavatel stavby) z důvodu komplikací na straně EG.D na pracích souvisejících se společným výkopem, kde má být kabel pro veřejné osvětlení umístěn. V této návaznosti je zapotřebí upravit termín dokončení a protokolárního předání. Současně zhotovitel požaduje vyúčtování a úhradu již dokončené práce a dodaného materiálu. Za vzniklé okolnosti nenese odpovědnost zhotovitel, který je závislý na postupu prací spol. EG.D.

5. **Návrh technického řešení a rozsah změny**

Vzhledem k faktu, že dílo bylo z větší části již zrealizováno a kompletnímu dokončení díla brání vlivy, které nejsou na straně zhotovitele, navrhuje rozdělení díla na dvě části a to na **1. část díla**, která by zahrnovala veškeré části díla (veřejného osvětlení), které nejsou závislé na společnosti EG.D a budou dokončeny v ujednaném termínu ve smlouvě o dílo a na **2. část díla**, která by zahrnovala zbývající části díla, které nemohou být provedeny bez provedení společného rozšířeného výkopu společností EG.D.

Příčemž **1. část díla** bude předána objednateli na základě předávacího protokolu **do 15.12.2022**, a **2. část díla** bude předána objednateli **do 20 kalendářních dnů od obdržení výzvy objednatele**. Objednatel vyzve Zhotovitele bezprostředně po zahájení výkopových prací, které zajistí společnost EG.D za účelem vytvoření společného rozšířeného výkopu určeného k uložení vedení distribuční sítě společností EG.D a veřejného osvětlení města Hodonína podél hlavní komunikace mezi silnicí I/55 a obcí Ratiškovice (u městské části Hodonín Pánov).

Bez zhotovení tohoto společného rozšířeného výkopu není možné zahájit práce na 2. části díla.

Podrobná specifikace 1. části a 2. části díla bude řešena položkovým rozpočtem, který odsouhlasí technický dozor stavby a zástupce investora (objednatele).

6. **Změny platebních podmínek**

1. část díla bude zhotoviteli uhrazena objednatelem na základě oceněného položkového rozpočtu, jež bude nejdříve překontrolován a odsouhlasen technickým dozorem a zástupcem investora (objednatele).

2. část díla bude zhotoviteli uhrazena objednatelem na základě oceněného položkového rozpočtu, jež bude nejdříve překontrolován a odsouhlasen technickým dozorem a zástupcem investora (objednatele).

V Hodonině dne 8. 12. 2022

[redacted]
(jméno, podpis zhotovitele)

7. Stanovisko technického dozoru stavby (TDS)

Výše uvedený návrh změny je logickým vyústěním situace, na niž zhotovitel nenese žádný podíl viny.

Doporučení

TDS doporučuje ZL č. 1 schválit.

V Hodonině, dne 8. 12. 2022

8. Stanovisko zástupce investora

Zástupce investora **souhlasí s navrhovaným řešením** úpravy Smlouvy o dílo č. SD/2022/0424/150. Úpravou dojde k rozdělení díla na dvě části, úpravě termínu dokončení plnění bez navýšení celkové ceny díla a ke změně platebních podmínek.

Úpravou nedochází ke změně technických parametrů díla, ani k navýšení či snížení ceny za dílo.

Úprava smlouvy bude předložena ke schválení RMH formou dodatku č.1 k SOD, v souladu s vnitřními předpisy objednatele.

Návrh finančního krytí: 1. část díla: rozpočet ORJ 150 2022 – ORG: 14711 a 2. část díla: rozpočet ORJ 150 2023 – ORG: 14711 (převod části finančních prostředků)

ODPOVĚDNÝ REFERENT:

V Hodonině, dne 8. 12. 2022

[redacted]
.....
(jméno, podpis)

VEDOUcí ODBORU:

V Hodonině, dne 08. 12. 2022

[redacted]
.....
(jméno, podpis)

GARANT ODBORU:

V Hodonině, dne 12. 12. 2022

9. Přílohy ke změnóvému listu:

Příloha č. 1

Doklad o kontrole a zajištění finančního krytí při změně díla v průběhu realizace akce.

Příloha č. 2

Oceněný položkový rozpočet pro 1. část díla a 2. část díla.

Příloha č. 1 ZL - Doklad o kontrole a zajištění finančního krytí při změně díla v průběhu realizace akce

Druh veřejného výdaje: smlouva dodavatelská
Smlouva/objednávka: SD/2022/0424/150

Změnový list č.	Název Změnového listu	celková částka		
1	Prodloužení termínu dokončení Hodonín, Pánov – kabelizace veřejného osvětlení			
Rozpis částky na roky				
Finanční profil:				
ROK	ORJ	ORG	POLOŽKA	Částka v Kč

Potvrzují provedení kontroly a zajištění finančního krytí při změně díla v průběhu realizace akce, operaci schvalují:

příkazce operace:	datum:	08.12.2022	[redacted]	pod
správce rozpočtu:	datum:	9.12.22	[redacted]	pod

Změnový list je vyhotoven ve 4 originálních výtiscích. Dva výtisky obdrží zhotovitel, dva výtisky objednatel. Kopie založena u TDS a odboru investic a údržby MÚH.

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Objekt: Pákov - kabelizace veřejného osvětlení
 Objednatel: Město Pákov - kabelizace veřejného osvětlení, investice
 číslo: 00-2021-01 M - Hodonín, Pákov - kabelizace veřejného osvětlení, investice
 číslo: 0010

ROD: Hlavní
 Míst: Hodonín
 Zpracoval: CC-CZ Datum: 23. 2. 2022
 IC
 DČ
 Uchazeč: IC 2802250
 VEOS Prácheň s.r.o., Dlouhá 228, 006 17 Dolní Břežanovice DČ: CZ0202930
 Projednal: IC
 DČ
 Zpracoval: IC
 DČ
 Původník: IC
 DČ

Materiál	751 940,07
Montáž	328 942,80
Cena bez DPH	1 080 882,87
DPH základní sazba	21,00%
DPH snížená sazba	15,00%
Cena s DPH	1 242 039,48

Projednatel: Zpracoval:

Objednatel: Razítko: Datum a podpis: Razítko

Objednatel: Uchazeč:

Objednatel: Razítko: Datum a podpis: Razítko

KAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Město: Hodonín, Pákov - kabelizace veřejného osvětlení
 číslo: 30-2021-01 M - Hodonín, Pákov - kabelizace veřejného osvětlení, investice
 název: Hodonín
 Adresa: VEDOS Projekt s.r.o., Dlouhá 226, 695 17 Ústí nad Ohří
 Datum: 23. 2. 2022
 Projektant: VEDOS Projekt s.r.o.
 Zpracovatel:

	Město [CZK]	Město [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	731 040,37	326 543,80	1 057 584,17
HSV - Práce a dodávky HSV	7 840,00	18 586,98	26 426,98
1 - Změny práce	0,00	9 919,80	9 919,80
5 - Komunikace pozemní	7 840,00	8 240,00	16 080,00
907 - Tlumen světla	0,00	4 402,50	4 402,50
908 - Přesun hmot	0,00	957,68	957,68
PSV - Práce a dodávky PSV	126,00	85,40	191,40
741 - Elektrické vedení - silnoproud	126,00	85,40	191,40
M - Práce a dodávky M	723 073,37	226 891,42	949 964,79
21-M - Elektromotory	7 0 919,51	145 136,00	356 030,51
60-M - Změny práce při elektr. rozložení	12 154,86	81 725,42	93 880,28
H2S - Hodinové zúčtovací sazby	0,00	20 800,00	20 800,00
VRN - Vydání rozpočtové náklady	1,00	60 500,00	60 501,00
VRN1 - Příkupy, geodetické a projekční práce	0,00	24 500,00	24 500,00
VRN2 - Zřízení stavebních	1,00	27 000,00	27 001,00
VRN5 - Finanční náklady	0,00	9 000,00	9 000,00
VP - Větrání	0,00	0,00	0,00

Список ПРАВИ - это перечень прав, принадлежащих гражданам Российской Федерации, а также лицам, имеющим вид на жительство в Российской Федерации. Права граждан Российской Федерации устанавливаются Конституцией Российской Федерации и федеральными законами.

Table with 10 columns: No., Name, Date of Birth, Place of Birth, Citizenship, and other details. It lists various individuals and their corresponding rights.

2. ГАРАНТИИ (Гарантии)

Table with 10 columns: No., Name, Date of Birth, Place of Birth, Citizenship, and other details. This section lists individuals under the 'Guarantees' category.

3. ГАРАНТИИ (Гарантии)

Table with 10 columns: No., Name, Date of Birth, Place of Birth, Citizenship, and other details. This section lists individuals under the 'Guarantees' category, continuing from the previous table.

