

PROVÁDĚCÍ SMLOUVA

Číslo související Rámcové dohody: S-2095/0006601/2021

Číslo smlouvy objednatele: S-3565/00066001/2022

Číslo smlouvy zhotovitele: 22 075 05

Název související veřejné zakázky: „**Rámcová dohoda na projektové práce staveb pozemních komunikací, cyklostezek a parkovišť P+R ve vlastnictví Středočeského kraje realizovaných v prostředí BIM**“

1. Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

se sídlem: Zborovská 81/ 11, 150 21 Praha 5

zastoupená: Ing. Alešem Čermákem, Ph.D., MBA, ředitelem
nebo dále zastoupená Ing. Janem Fidlerem, DiS, statutárním zástupcem
ředitele, na základě plné moci ze dne 28. 06. 2022

IČO: 00066001

DIČ: CZ00066001

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

2. KSUS cyklo BIM 2021 – PXAFSASA4rSHB

se sídlem v Praze 4, Bezová 1658/1, 147 00

zastoupena společností **Pontex, spol. s r. o.** (Správce – vedoucí společník)

zastoupeným Ing. Václavem Hvízdalem, jednatelem, Ing. Petrem Součkem, jednatelem, Ing. Martinem Havlíkem, jednatelem (každý z jednatelů je oprávněn jednat za společnost samostatně)

bankovní spojení:

IČO: 407 63 439 DIČ: CZ40763439 (plátcí DPH)

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zápis v obchodním rejstříku vedeným Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 2994

Společníci sdružení:

AFRY CZ, spol. s r. o.

se sídlem v Praze 4, Magistrů 1275/13, 140 00

zastoupeným jednatelem Ing. Petrem Košanem,

bankovní spojení:

IČO: 453 06 605 DIČ: CZ45306605 (plátcí DPH)

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zápis v obchodním rejstříku vedeným Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 8073

SAGASTA, s. r.o.

se sídlem v Praze 4, Novodvorská 101014/, 142 00

zastoupeným jednatelem Ing. Jiřím Čurdou a Mgr. Ladislavem Beranem

bankovní spojení:

IČO: 045 98 555 DIČ: CZ04598555 (plátcí DPH)

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zápis v obchodním rejstříku vedeným Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 250116

SATRA, spol. s r. o.

se sídlem v Praze 9, Pod pekárnami 878/2, 190 00
zastoupeným jednatelem Ing. Ludvíkem Šajtarem,
bankovní spojení:

IČO: 185 84 209 DIČ: CZ18584209 (plátcí DPH)

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zápis v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 3014

4roads s.r.o.

se sídlem v Praze 6, Slunná 541/27, 162 00
zastoupeným jednatelem Ing. Janem Semerádem,
bankovní spojení:

IČO: 063 27 354 DIČ: CZ06327354 (plátcí DPH)

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zápis v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 280328

SHB, akciová společnost

se sídlem v Ostravě, Masná 1493/8, 702 00
zastoupeným členem představenstva Ing. Iljou Hustým,
bankovní spojení:

IČO: 253 24 365 DIČ: CZ25324365 (plátcí DPH)

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zápis v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 4477

(dále jen „**zhotovitel**“) na straně druhé

(společně také jako „**Smluvní strany**“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Prováděcí smlouvu s názvem veřejné zakázky: „**II/116 Beroun – Srbsko - PD**“ dále jen „smlouva“.

Článek I.**Předmět smlouvy**

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo, včetně poskytování souvisejících služeb (dále jen „**plnění**“), a to dle zadání objednatele v tomto rozsahu a členění:

Jedná se o zpracování PD pro společné povolení (DUSP) a zadání stavby (PDPS) a souvisejícího výkonu IČ (oznámení o provedení údržby dle §103 zákona č. 183/2006Sb., bude-li to stavebním úřadem akceptovatelné, jinak stavební řízení) při dodržení platných norem (např. 73 6101, 73 6102, 73 6110) TKP a TP. Součástí prací je výkon autorského dozoru (AD).

Jedná se o zpracování PD na opravu silnice ve špatném stavu:

Provést důslednou diagnostiku vozovky vč. PAU celého úseku silnice a na jejím základě navrhnout opravu silnice, odfrézování asfaltových vrstev vozovky, případné rozebrání stmelených/nestmelených podkladných vrstev, případná recyklace za studena.

Zajistit řádné odvodnění silnice (obnovení, pročištění příkopů, vyčištění – případně oprava a doplnění propustků).

V rámci PD bude zhodnocen silniční záchytný systém a bude navržena jeho případná obnova a doplnění. Dále bude v řešeném úseku silnice obnoveno vodící bezpečnostní zařízení v podobě

směrových sloupků a bude obnoveno vodorovné i svislé dopravní značení, vše v souladu s platnou legislativou.

Rovněž se předpokládá sanace stávajících a doplnění nových opěrných zdí.

Projektová dokumentace bude obsahovat platná vyjádření dotčených orgánů státní správy a správců inženýrských sítí.

Bude řádně dokončena majetkoprávní příprava této akce, tj. budou smluvně oboustranně upraveny vztahy k pozemkům zabraným dočasně či trvale stavbou – uzavření Smluv o Smlouvách budoucích kupních či darovacích, Smlouvy nájemní či o výpůjčce. Budou oboustranně podepsány smlouvy o smlouvách budoucích na provedení přeložek inženýrských sítí a Smlouvy o smlouvách budoucích na věcná břemena. Dále v případě nutnosti zajistit vyjmutí pozemků z plnění funkce lesa.

Majetkoprávní příprava bude probíhat v rozsahu stanoveném v Metodickém pokynu pro majetkoprávní přípravu dopravních staveb, v platném znění.

2. Objednatel se zavazuje řádně dokončené plnění převzít a zhotoviteli zaplatit dohodnutou cenu podle této smlouvy.
3. Právní vztahy mezi smluvními stranami touto smlouvou neupravené se řídí Rámcovou dohodou **na projektové práce staveb pozemních komunikací, cyklostezek a parkovišť P+R ve vlastnictví Středočeského kraje realizovaných v prostředí BIM**, uzavřenou dne 22. 10. 2021 (dále jen „**Rámcová dohoda**“).

Článek II.

Cena za dílo

1. Za řádnou realizaci této smlouvy náleží zhotoviteli cena ve výši stanovené jako součet cen za skutečně realizované plnění, které se vypočítají jako součin skutečně poskytnutého rozsahu plnění a jednotkových a dílčích cen příslušného plnění, tj. ve vztahu zadavatelem předpokládanému rozsahu plnění:

bez DPH:	6 579 500 Kč
DPH:	1 381 695 Kč
včetně DPH:	7 961 195 Kč

(dále jen „**cena plnění**“).

2. Podrobná specifikace ceny plnění tvoří přílohu b této smlouvy.
3. Cena byla zhotovitelem nabídnuta a stranami sjednána v souladu s podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě. Objednatel bude zhotoviteli hradit cenu pouze za skutečně poskytnuté a objednatelům odsouhlasené plnění.
4. Objednatel uhradí cenu v souladu s platebními podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě a dále dle čl. II odst. 5
5. Fakturace:
dle ujednání ve výše uvedené rámcové dohodě
6. Kontaktní osobou objednatele ve věci fakturace a ve věcech technických (osobou příslušnou k převzetí, schválení nebo připomínkám ve smyslu přílohy C Zvláštních obchodních podmínek Rámcové dohody) je:

Jméno: Ing. Milan Fiala

email:

tel:

Jméno: Ing. Martin Staněk
email:
tel:

Článek III.

Doba a místo plnění

- Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:
Podání žádosti o vydání SP (společné povolení):
nejpozději do 4 měsíců od předání čistopisu DUSP

DUSP koncept:
nejpozději do 6 měsíců od podpisu Smlouvy

DUSP čistopis:
nejpozději do 3 týdnů od obdržení písemných připomínek ke konceptu DUSP od Objednatele

PDPS:
nejpozději do 1 měsíc od vydání pravomocného SP nebo písemné výzvy Objednatele k zahájení plnění na této dílčí části služeb

Autorský dozor (včetně technické pomoci): na výzvu objednatel, do kolaudace stavby
- Smluvní strany sjednávají místo plnění takto - sídlo zhotovitele, výkon autorského dozoru

Článek IV.

Podmínky provádění díla

- Pro plnění této smlouvy a práva a povinnosti smluvních stran platí příslušná ustanovení Rámcové dohody, pakliže v této smlouvě není sjednáno jinak.
- Objednatel poskytne zhotoviteli bezplatně před zahájením jeho činnosti následující dokumentaci:
 - Technická specifikaceDokumentací nad rozsah dokumentace uvedené v tomto článku smlouvy, která je dostupná z veřejných zdrojů, a veškerá další nezbytná povolení, oznámení a souhlasy dotčených subjektů, které jsou dostupné z veřejných zdrojů a které jsou nezbytné pro řádnou realizaci plnění, si zhotovitel zajistí na vlastní náklady a riziko.
- Zhotovitel bere na vědomí, že plnění má být financováno ze SFDI. Zhotovitel se proto zavazuje poskytovat plnění rovněž v souladu s aktuálními požadavky poskytovatele dotace.
- Pro změnu podzhotovitele (poddodavatele), prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení na uzavření Rámcové dohody kvalifikaci nebo byl hodnocen v rámci stanoveného hodnotícího kritéria „Kvalifikace a zkušenosti osob zapojených do realizace veřejné zakázky“, platí obecné podmínky pro podzhotovitele, uvedené v Rámcové dohodě a Zvláštní příloze k nabídce zhotovitele.
- Ostatní podmínky, za kterých bude plněna smlouva, jsou následující:
 - Zákon č. 134/2016 Sb o zadávání veřejných zakázek

- Resortní metodiky uvedené na <https://www.sfdi.cz/pravidla-metodiky-a-ceniky/>

6. V souladu s čl. 13.1 Všeobecných obchodních podmínek pro zeměměřické a průzkumné práce a dokumentaci pozemních staveb, které jsou součástí Rámcové dohody na plnění Dílčí veřejné zakázky, ve znění Zvláštních obchodních podmínek, je rozsah osob podílejících se na plnění této smlouvy uveden v Příloze a. Rámcové dohody „Prohlášení o odborném personálu“.

7. Výsledky poskytnutých služeb:

- Průzkumy a zaměření 2x v listinné podobě
a 1x digitálně na flash disku

- Dokumentace pro společné povolení (DUSP) 4x v listinné podobě
a 1x digitálně na flash disku

- Dokumentace pro provedení stavby (PDPS) 4x v listinné podobě
a 1x digitálně na flash disku, 1 x oceněný a 1x
neoceněný výkaz výměr

- Dokladová část 1x v tištěné podobě
a 1x digitálně na flash disku

- Originál pravomocného územního rozhodnutí včetně dokladové části a stavebního povolení
(případně kladného stanoviska k ohlášení stavby) včetně dokladové části a ověřené projektové
dokumentace.
1x v tištěné podobě
a 1x kopie na flash disku

8. Pokud se na jakoukoliv část plnění poskytovanou zhotovitelem na základě této Smlouvy vztahuje GDPR (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)), je zhotovitel povinen zajistit plnění svých povinností v GDPR stanovených. V případě, kdy bude zhotovitel v kterémkoliv okamžiku plnění svých smluvních povinností zpracovatelem osobních údajů poskytnutých objednatelem nebo získaných pro objednatele, je povinen na tuto skutečnost objednatele upozornit a bezodkladně (vždy však před zahájením zpracování osobních údajů) s ním uzavřít Smlouvu o zpracování osobních údajů. Smlouvu dle předcházející věty je dále zhotovitel s objednatelem povinni uzavřít vždy, když jej k tomu objednatel vyzve.

Článek V.

Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti zveřejněním v registru smluv.
2. Tuto smlouvu je možno ukončit za podmínek stanovených v Rámcové dohodě.
3. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním uzavřené Smlouvy v registru smluv vedeném pro tyto účely Ministerstvem vnitra, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv),

ve znění pozdějších předpisů objednatel. Zhotovitel nepovažuje žádnou část této smlouvy za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

4. Přílohu této smlouvy tvoří:
 - a. Podrobná specifikace předmětu plnění,
 - b. Podrobná specifikace ceny.
5. Tato smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jejich elektronický originál.
6. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu uzavírají svobodně a vážně a že považují její obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY ZALOŽENÉ NA KVALIFIKOVANÉM CERTIFIKÁTU DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

V Říčanech

V Praze dne

**Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, p.o.**


KSUS cyklo BIM 2021 – PXAFSASA4rSHB
zastoupená společností **Pontex, spol. s r.o.**
(Správce – vedoucí společník)
Ing. Petr Souček, jednatel

Technická specifikace

Název akce: „II/116 Beroun – Srbsko“ - PD

Místo realizace akce:

Silnice II/116, staničení km 25,435 až 33,340 v délce 7,905 km, mezi uzlovými body 1241A077 – 1241A071, Středočeský kraj, okres Beroun, oblast Kladno

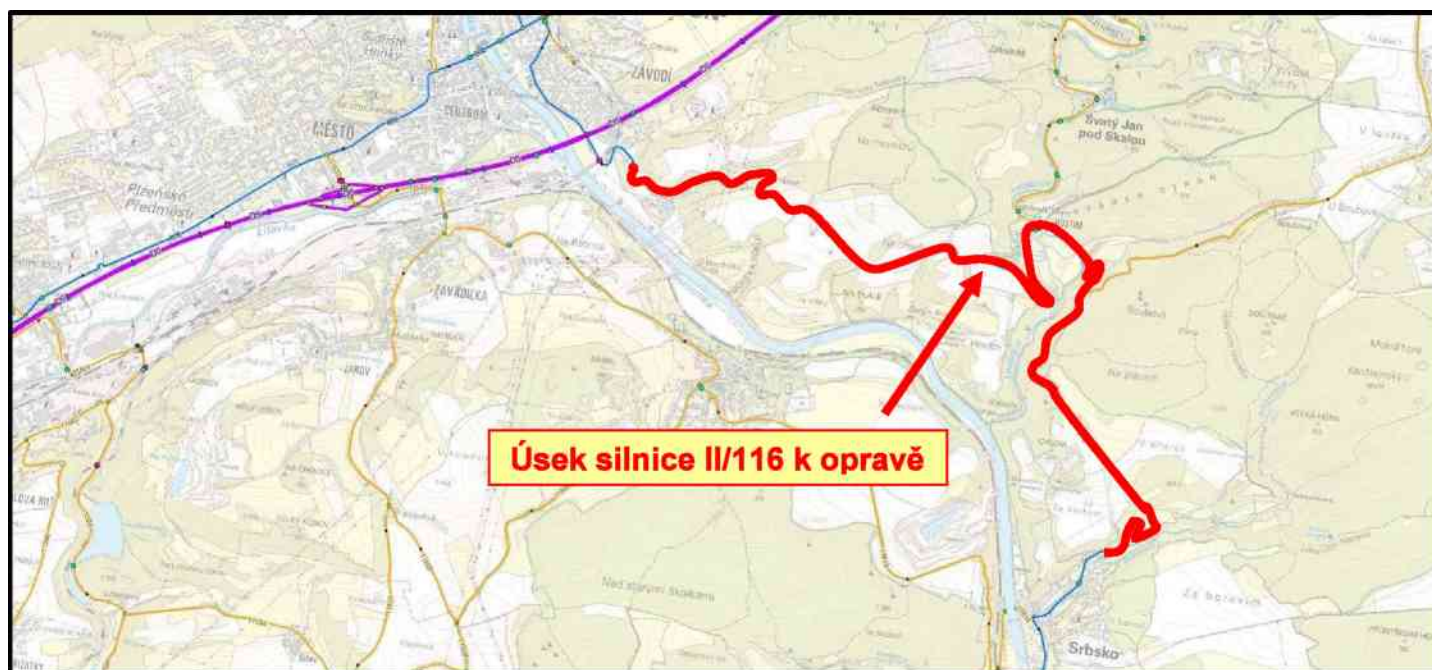

Základní popis akce:

Jedná se o zpracování PD pro společné povolení (DUSP) a zadání stavby (PDPS) a souvisejícího výkonu IČ (oznámení o provedení údržby dle §103 zákona č. 183/2006Sb., bude-li to stavebním úřadem akceptovatelné, jinak stavební řízení) při dodržení platných norem (např. 73 6101, 73 6102, 73 6110) TKP a TP. Součástí prací je výkon autorského dozoru (AD).

Technický popis stávajících objektů:

Silnice ve stanoveném úseku je v nevyhovujícím technickém stavu. Vykazuje četné poruchy – výtluky, vysprávký, podélné, příčné a mozaikové trhliny, místy deformace apod. Předpokládá se rekonstrukce vozovky, která bude mít dopady i do podkladních vrstev (např. recyklace za studena). V celém úseku bude muset být rekonstruován a doplněn záchytný systém včetně opěrných zdí.

V řešeném úseku silnice se nachází mostní objekt ev.č. 116-012 (stav objektu I – bezvadný).

Jedná se o zpracování PD na opravu silnice ve špatném stavu:

Provést důslednou diagnostiku vozovky vč. PAU celého úseku silnice a na jejím základě navrhnout opravu silnice, odfrézování asfaltových vrstev vozovky, případné rozebrání stmelených/nestmelených podkladních vrstev, případná recyklace za studena.

Zajistit řádné odvodnění silnice (obnovení, pročištění příkopů, vyčištění – případně oprava a doplnění propustků).

V rámci PD bude zhodnocen silniční záchytný systém a bude navržena jeho případná obnova a doplnění. Dále bude v řešeném úseku silnice obnoveno vodící bezpečnostní zařízení v podobě směrových sloupků a bude obnoveno vodorovné i svislé dopravní značení, vše v souladu s platnou legislativou.

Rovněž se předpokládá sanace stávajících a doplnění nových opěrných zdí.

Projektová dokumentace bude obsahovat platná vyjádření dotčených orgánů státní správy a správců inženýrských sítí.

Bude řádně dokončena majetkoprávní příprava této akce, tj. budou smluvně oboustranně upraveny vztahy k pozemkům zabraným dočasně či trvale stavbou – uzavření Smluv o Smlouvách budoucích kupních či darovacích, Smlouvy nájemní či o výpůjčce. Budou oboustranně podepsány smlouvy o smlouvách budoucích na provedení přeložek inženýrských sítí a Smlouvy o smlouvách budoucích na věcná břemena. Dále v případě nutnosti zajistit vyjmutí pozemků z plnění funkce lesa.

Majetkoprávní příprava bude probíhat v rozsahu stanoveném v Metodickém pokynu pro majetkoprávní přípravu dopravních staveb, v platném znění.

Je požadována případná koordinace postupu prací s projektovou přípravou Správy železnic (SŽ).

Dále je předmětem projekčních prací prověření návaznosti na cyklistickou infrastrukturu.

Návrh řešení:

- provést diagnostiku vozovky, inženýrskogeologický průzkum, průzkum stávajících opěrných zdí
- provést geodetické zaměření
- rekonstrukce silnice jejich součástí a vybavení podle výsledků diagnostického průzkumu
- výměna a doplnění svodidel, obnova směrových sloupků, obnova VDZ i SDZ
- zajištění řádného odvodnění silnice

Oprava bude realizována po etapách.

V předpokládané ceně na zpracování PD je zahrnuta činnost na etapizaci akce, včetně jejího projednání s dotčenými DOSS. Zhotoviteli tak nevzniká nárok na navýšení ceny z důvodu etapizace a jejího delšího projednání (získání příslušných rozhodnutí o společném povolení). V ceně díla je rovněž zahrnut i POV na jednotlivé etapy.

Specifikace rozhodujících stavebních objektů:

- oprava silnice
- sanace a doplnění opěrných zdí
- oprava a doplnění záchytných systémů
- oprava či doplnění propustků
- sanace silničního tělesa, případně svahu
- pročištění příkopů
- návrh DIO

Předpokládané stavební náklady rekonstrukce:

- 250 mil Kč bez DPH

Termín realizace

Dokumentace pro společné povolení DUSP – koncept

- **Nejpozději do 6 měsíců od podpisu Smlouvy**

Dokumentace pro společné povolení – DUSP – čistopis

- **Nejpozději do 3 týdnů od obdržení písemných připomínek ke konceptu dokumentace DUSP od Objednatele**

Prověření možnosti využití oznámení o provedení souvislé údržby, jinak podání žádosti o vydání společného povolení

- **Nejpozději do 4 měsíců od předání čistopisu DUSP**

Dokumentace PDPS

- **Do 1 měsíce od vydání pravomocného SP nebo na výzvu objednatel.**

Výkon autorského dozoru

- **Na výzvu Objednatele, v průběhu realizace stavby**

Kontakty:

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 11, 150 21 Praha 5, IČ 00066001

Oblast Kladno

Kontaktní osoba:

Ing. Marek Hanuš, vedoucí investic, mobil:

e-mail:

Ing. Martin Staněk, projektový manažer, mobil:

e-mail:

Fotodokumentace:







Podrobná specifikace ceny

AKCE

Příloha č. 2

II/116 Beroun - Srbsko - PD

žlutě - vyplní uchazeč

Tabulka č. 1

Předpokládaná hodnota stavebních nákladů v Kč bez DPH	Procentní poměr ze stavebních nákladů nabídnutý uchazečem v Rámcové smlouvě - část DUSP*)	Procentní poměr ze stavebních nákladů nabídnutý uchazečem v Rámcové smlouvě - část Výkon IČ ke společnému povolení včetně majetkoprávního projednání*)	Procentní poměr ze stavebních nákladů nabídnutý uchazečem v Rámcové smlouvě - část VD-ZDS*)	Technická pomoc objednateli (v Kč bez DPH/hod)**)	Cena celkem v Kč bez DPH****)
250 000 000	1,750%	0,325%	0,400%	800,000	
Předpokládaný celkový počet hod technické pomoci	x	x	x	490	
Předpokládaná hodnota dílčí části Veřejné zakázky ***)	4 700 000	1 075 000	1 200 000	392 000	7 367 000
Nabídka uchazeč v Kč bez DPH	4 375 000	812 500	1 000 000	392 000	6 579 500
% změna ceny Nabídka/Předpoklad	93,09%	75,58%	83,33%	100,00%	89,31%

*) Uchazeč použije při ocenění % poměr ze stavebních nákladů uvedený v Rámcové smlouvě. Tento % poměr může být buď shodný nebo nižší než je % poměr uvedený v Rámcové smlouvě. Podrobnější popis viz čl. 6 "Cena" v Rámcové smlouvě

***) Uchazeč použije při ocenění hodinovou sazbu (bez DPH) ve stejné výši nebo nižší než, je příslušná hodinová sazba bez DPH uvedená v příslušném rozmezí předpokládaných stavebních nákladů uvedených v Soupisu prací v tabulce "IV.C) Položkový rozpočet - technická pomoc objednateli" příslušného typového příkladu, který je součástí Rámcové smlouvy. Bližší popis viz čl. 6 "Cena" v Rámcové smlouvě. Hodinovou sazbu doplní do příslušné tabulky technické pomoci

****) Předpokládanou hodnotu dílčí části Veřejné zakázky považuje Zadavatel jako maximální a nepřekročitelnou. V případě jejího překročení si zadavatel vyhrazuje právo zadávací řízení zrušit

*****) Celková cena bez DPH uvedená v Tabulce soupisu prací musí být shodná s Celkovou cenou v Kč bez DPH uvedenou v Nabídkové tabulce uchazeče.

Kontrola rovnosti dílčích cen v tabulce č. 1 a rozepsaných cen v tabulce č. 2 - 6

Kontrolní propoččet Tab. č. 1 a 2 část DUSP Rozdíl:	Ok
Kontrolní propoččet Tab. č. 1 a 2. část IČ ke společnému povolení Rozdíl:	Ok
Kontrolní propoččet Tab. č. 1 a 2. část VD-ZDS Rozdíl:	Ok

V Praze dne 25.11.2022

Ing. Václav Hvizdal, Jednatel společnosti Pontex, spol. s r.o. -
Vedoucí společník za KSUS cyklo BIM 2021 –
PXAFSASA4fSHB

II/116 Beroun - Srbsko - PD

žlutě ocení uchazeč	
0 popis položky	Nabídková cena uchazeče v Kč
Průzkumy a podklady - DUSP	
Zjištění průběhu a zakres IS, zaměření, záborový elaborát, digitální katastrální mapa	250 000,00
Geotechnický průzkum dle TP 76, průzkum stávajících opěrných zdí	500 000,00
Průzkumy pro DUSP (Hluková, Exhalační studie, Bilance zemin a ornice, Dendrologický průzkum, diagnostika vozovky, apod)	1 000 000,00
Průzkumy DUSP celkem	1 750 000,00
DUSP	
Průvodní zpráva	25 000,00
Souhrnné technické řešení	100 000,00
Stavební část	2 250 000,00
DIO	125 000,00
ZOV, havarijní a povod. plán a nakládání s odpady	100 000,00
BOZP	25 000,00
DUSP celkem	2 625 000,00
DUSP celkem včetně průzkumů	4 375 000,00
IČ-zajištění vydání společného povolení	
projednání dokumentace	450 000,00
majetkoprávní podklady	300 000,00
podání žádosti bez poplatků	62 500,00
IČ celkem	812 500,00
PDPS	
Technická zpráva	25 000,00
Výkresová část	850 000,00
ZTKP	50 000,00
Soupis prací a rozpočet	75 000,00
PDPS celkem	1 000 000,00
celkem bez DPH	6 187 500,00

V Praze dne 25.11.2022

Ing. Václav Hvízdal, jednatel společnosti Pontex, spol. s r.o. - Vedoucí společník za KSUS cyklo BIM 2021 – PXAFSASA4fSHB

Technická pomoc objednateli - Autorský dozor

II/116 Beroun - Srbsko - PD

	Počet hod.	Kč/hod *)	Cena celkem
Cena Technická pomoc v rámci majetkoprávního projednání - vedení aplikace MPP	50	800	40 000
Cena Technická pomoc v rámci výběrového řízení na zhotovitele stavby	50		40 000
Cena AD celkem bez DPH	390		312 000
Celkem	490		392 000

*) Sazba zahrnuje veškeré související náklady s AD, tj. cestovné, náklady na PHM, stravné apod.

Díleč činnosti při výkonu AD	AD hodin
Činnost	
Posuzování postupu výstavby z technického hlediska, sledování a kontrola technických a kvalitativních parametrů stavby.	50
Vyřádění k požadavkům na zvětšený rozsah stavebních prací, popř. změn v průběhu výstavby oproti projektové dokumentaci, změn vycházejících z podmínek smlouvy se zhotovitelem stavby, posuzování jejich oprávněnosti, řešení množství a kvality, změny plnění z pohledu dodržení standardů, parametrů, kvality, množství, přiměřenosti ceny a prodloužení lhůt výstavby.	80
Odsouhlasení dílenské a provozní dokumentace zhotovitele stavby z hlediska souladu s dokumentací ověřenou stavebním úřadem a zadávací dokumentací pro výběr zhotovitele stavby.	30
Účast na jakémkoliv jednání, které svolává objednatel a vyzývá AD k účasti.	80
Vyjadřování se zástupci objednatele k plnění díla z hlediska pochybností k provedení množství. Vyjadřovat se zástupci objednatele k požadavkům zhotovitele stavby a případně i budoucího provozovatele na změny plnění z pohledu dodržení standardů, parametrů, kvality, množství, přiměřenosti ceny a na prodloužení lhůt výstavby, případně dalších údajů a ukazatelů stanovených zadávací dokumentací	50
Pouze na výzvu zadavatele dle aktuální potřeby se bude podílet na: <ul style="list-style-type: none"> • účasti kontrolních dnech stavby • účasti přejímacích řízeních dílčích částí stavby a celé stavby • účasti při zásadních zkouškách a měřeních včetně vydání případných stanovisek k jejich výsledkům • odsouhlasování geodetické měření pohybů nosné konstrukce v určených bodech • spolupráci se zástupcem objednatele při výběru a schvalování vzorků materiálů, zařízení a vybavení předkládaných zhotovitelem stavby, zejména z hlediska jejich jakosti, druhu provedení a vhodnosti použití a to z pohledu souladu s dokumentací ověřenou stavebním úřadem a zadávací dokumentací pro výběr zhotovitele stavby 	100
celkem hodin	390
Kč/hod	800
Celkem Kč bez DPH	312 000

*) Pozn.: Hodinová sazba musí být u všech položek ve stejné výši

Poznámky:

- Základním účelem výkonu AD je sledování, zda postup stavebních prací odpovídá schválené zadávací dokumentaci stavby a spolupráce při řešení nepředvídaných problémů. Zástupce zhotovitele zadávací dokumentace stavby se bude zúčastňovat kontrolních dnů na stavbě a dalších jednání svolaných investorem stavby na základě jeho výzev. V případě pochybností zhotovitele dokumentace o kvalitě prováděných prací na stavbě může zástupce zhotovitele dokumentace provést kontrolu stavby dle vlastního uvážení s tím, že předem na tuto skutečnost upozorní investora stavby.
- Výkon autorského dozoru bude realizován průběžně dle aktuálních potřeb, na základě výzvy objednatele. Výzva musí být zhotoviteli oznámena nejpozději dva pracovní dny před datem výkonu autorského dozoru. Za AD však nejsou považovány nesrovnalosti v původním projektu a jejich následné vysvětlování.
- Osoba pověřená výkonem autorského dozoru provádí zápisy do stavebního deníku o své účasti na stavbě, o zjištěných skutečnostech při kontrole a ověřování a jejich vyhodnocení, o návrzích na opatření a o svých doporučeních. Stanoviska k návrhům ostatních účastníků provádění stavby zapisuje do stavebního deníku nejpozději do tří (3) pracovních dnů od doručení výzvy zástupce objednatele.
- Veškerá činnost bude zajišťována bez zbytečného odkladu tak, aby nebyl ohrožen postup stavby.
