

SMLOUVA O DÍLO

Číslo smlouvy objednatele 2023/0098

„Zhotovení umělého travního povrchu – víceúčelové sportoviště Bazovského, Praha 6 - Řepy“

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku v platném znění

1. Smluvní strany

Městská část Praha 17

se sídlem: Žalanského 291/12b, 163 02 Praha 6

zástupce oprávněný jednat ve věcech smluvních: Mgr. Alena Kopejtková, starostka

tel.: +420 234 683 111

IČO: 00231223

DIČ: CZ00231223

ID datové schránky: 4mnbvza

bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s.

číslo účtu: 27-2000700399/0800

osoby určené ke kontaktu se dodavatelem jsou:

Mgr. David Zlatý, vedoucí odboru životního prostředí a dopravy ÚMČ Praha 17

Tel: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

[REDACTED], referentka odboru životního prostředí ÚMČ Praha 17

Tel: [REDACTED] e-mail: [REDACTED]

TDS: [REDACTED], e-mail: [REDACTED], Tel: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

a

UTsport s.r.o.

se sídlem: Nad lávkou 672/5, 160 00 Praha 6 - Vokovice

zastoupená: p. Dalibor Večerka, jednatel společnosti

IČO: 03760359

DIČ: CZ03760359

bankovní spojení: [REDACTED]

číslo účtu: [REDACTED]

zapsána v OR MS v Praze oddíl C, vložka 237361

tel./fax: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

zástupce ve věcech technických: p. Dalibor Večerka

tel./e-mail: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

Oprávnění zástupci obou smluvních stran prohlašují, že jsou způsobilí k právním úkonům a po vzájemném projednání a shodě uzavírají smlouvu o dílo v tomto znění:

2. Předmět plnění

2.1. Předmětem veřejné zakázky je realizace díla spočívajícího ve zhotovení umělého travního povrchu, provedení zásypu vrstvy jemného písku, provedení výřezu a položení nového lajnování na víceúčelovém sportovišti v rozsahu 264 m² a další práce s tím spojené. Předmět veřejné zakázky je blíže specifikován ve výkazu výměr (příloha č. 1) a v zadávací dokumentaci, která je nedílnou součástí této smlouvy (příloha č. 2).

2.2. Zhotovitel se zavazuje za podmínek sjednaných v této smlouvě k provedení díla:

„Zhotovení umělého travního povrchu – víceúčelové sportoviště Bazovského, Praha 6 - Řepy“

v rozsahu dle zadávací dokumentace a výkazu výměr.

2.3. Součástí plnění díla je:

- zajištění provedení prací dle zadávacích podmínek zadavatele
- zařízení staveniště, zajištění potřebných mechanismů pro provedení díla a zajištění stavby z hlediska BOZP, PO
- předání atestů použitých materiálů v českém jazyce
- zabezpečení koordinace a řízení stavby
- účast pracovníků zhotovitele při předání díla
- předání dokladu o likvidaci odpadů ze stavby

2.4. Součástí díla jsou všechny práce, které jsou k řádnému provedení díla nezbytné, a o kterých zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem měl nebo mohl vědět. Zhotovitel současně prohlašuje, že se dostatečně seznámil se zadávací dokumentací zadavatele, a že mu nejsou známy žádné skutečnosti, pro které by nemohl dílo realizovat.

2.5. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje, že na svůj náklad a na své nebezpečí a podle platebních podmínek ujednaných touto smlouvou, provede dodávku stavebních prací dle předmětu smlouvy.

2.6. Splněním předmětu plnění se rozumí úplné dokončení díla v rozsahu sjednaném v rámci této smlouvy jako celku, ve sjednaném termínu, bez vad a nedodělků. O předání a převzetí díla a předání podkladů bude podepsán zápis oběma stranami.

2.7. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v bezvadné jakosti, z nových materiálů podle technologických a pracovních postupů vyplývajících ze zadávací dokumentace. Zhotovitel je povinen dodržovat ustanovení příslušných předpisů týkajících se předmětu díla, včetně požadavků na zajištění bezpečnosti práce dle zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) a Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Zhotovitel do stavby nezabuduje žádný výrobek, který nebyl certifikován.

3. Doba plnění

3.1. Čas plnění byl stanoven v souladu se soutěžní nabídkou v termínech:

Předání/převzetí staveniště: do 5 pracovních dnů ode dne podpisu smlouvy oběma smluvními stranami.

Zahájení stavebních prací: do 10 pracovních dnů ode dne podpisu smlouvy oběma smluvními stranami.

Dokončení stavebních prací a předání/převzetí díla: do 10 kalendářních dnů ode dne zahájení stavebních prací

- 3.2. Doba plnění ujednaná touto smlouvou se prodlužuje v těchto případech:
- a) pokud povětrnostní podmínky znemožní pokračovat v provádění díla, např. pro trvalý déšť, zejména pak pro tzv. mokré procesy, mráz pod minus 5 stupňů Celsia, a to jen v tom případě, že by nebylo možno dodržet technologické postupy prací, jak je v příslušných právních normách uvedeno
 - b) objednatel včas nepředá staveniště zhotoviteli, popř. mu nepředá včas rozhodnutí orgánu státní správy, pokud je ho k provedení díla potřeba
 - c) z důvodu vyšší moci (např. živelná událost apod.)
 - d) dojde-li během provádění stavebních prací k výraznému zvýšení stavebních nebo jiných prací oproti pracím uvedeným v předmětu této smlouvy nebo proti nabídkovému výkazu výměr
 - e) pro nedostatek finančních prostředků na straně objednatele
 - f) nebude-li zhotovitel schopen pokračovat v plnění díla pro překážky ležící na straně objednatele
- 3.3. Údaje o skutečnostech, jak je v předchozím odstavci této smlouvy uvedeno, budou zhotovitelem zapsány ve stavebním deníku a jejich věrohodnost bude potvrzena objednatelem.
- 3.4. Pro výklad této smlouvy se za vyšší moc považují okolnosti, které vznikly po uzavření smlouvy, a které nemohly být smluvními stranami předpokládány, přičemž se jedná o neodvratitelné události mimořádné povahy mající bezprostřední vliv na plnění díla ujednaného podle této smlouvy.
- 3.5. V případě, že důvody vyšší moci pominou, je dotčená smluvní strana povinna neprodleně o takové skutečnosti písemně informovat druhou smluvní stranu.

4. Cena díla

- 4.1. Cena díla je sjednána jako pevná a neměnná ve výši:

celková nabídková cena bez DPH		178 148,00 Kč
výše DPH	21 %	37 411,08 Kč
celková nabídková cena včetně DPH		215 559,08 Kč

Tato cena je shodná s nabídkovou cenou. Uvedená cena je nejvýše přípustná. Tuto cenu je možné překročit pouze za podmínek stanovených v této smlouvě.

- 4.2. Cena je podrobně specifikována ve výkazu výměr, který tvoří nedílnou součást této smlouvy jako její příloha č. 1.
- 4.3. Úprava smluvních cen v průběhu realizace stavby je možná:
- v případě objednatelem odsouhlaseného provedení prací, které nejsou obsaženy ve výkazu výměr a jsou nezbytné ke zhotovení díla (vícepráce)
 - dojde-li ke změně standardů či rozsahu prací vymezených zadávacími podmínkami veřejné zakázky vyvolaných objednatelem, nebo průběhem realizace díla. Cena těchto víceprací/méně prací, pokud ji nebude možno určit z jednotkových cen obsažených ve výkazu výměr, bude stanovena podle cen URS platných v době provádění díla
 - úprava sjednané ceny díla a jeho částí v průběhu realizace stavby včetně stanovení konečné ceny musí být stanovena dohodou smluvních stran, a to formou písemného dodatku k této smlouvě

- 4.4. Jakékoliv použití náhradních materiálů, jiných technologií a případné nutné práce nad rámec smlouvy je zhotovitel povinen předem projednat a odsouhlasit s objednatelem. Pokud práce nad rámec smlouvy provede zhotovitel bez předchozího písemného souhlasu objednatele, není tento povinen provedené vícepráce zaplatit. Použitím dražších materiálů a výrobků nevzniká zhotoviteli právo uplatňovat změnu dohodnuté ceny, pokud není použití takových materiálů důsledkem požadavků objednatele.

5. Místo plnění

- 5.1. Místem plnění je víceúčelové sportoviště Bazovského, parc. č. 1293/18, k. ú. Řepy.

6. Povinnosti objednatele

- 6.1. Objednatel se zavazuje za provedení díla podle čl. 2 zaplatit zhotoviteli cenu dle čl. 4 této smlouvy za podmínek v této smlouvě stanovených.
- 6.2. Objednatel předá staveniště zhotoviteli obvyklým způsobem prosto práv třetí osoby, a to nejpozději do dne zahájení stavebních prací dle této smlouvy. Staveniště bude předáno zhotoviteli k bezplatnému použití po dobu výstavby. O převzetí staveniště bude sepsán zápis podepsaný oběma stranami.
- 6.3. Staveništěm se rozumí prostor určený objednatelem pro stavbu a zařízení staveniště. Objednatel odevzdá zhotoviteli celé staveniště najednou tak, aby zhotovitel na něm mohl začít práce podle zadávací dokumentace.
- 6.4. Objednatel má vyhrazeno právo kontrolovat dílo v průběhu výstavby.

7. Povinnosti zhotovitele

- 7.1. Zhotovitel se zavazuje za podmínek této smlouvy provést dílo v rozsahu dle čl. 2 této smlouvy, a to na svůj náklad a nebezpečí.
- 7.2. Zhotovitel ponese na svůj náklad případné poškození nepředaného a nepřevzatého díla.
- 7.3. Náklady spojené s vytýčením stavby, skládkováním sutě a vybouraných hmot vč. náležitostí s těmito činnostmi spojenými zajišťuje zhotovitel ve vlastní režii.
- 7.4. Zhotovitel se zavazuje akceptovat případné požadavky objednatele na provedení prací nad rámec sjednaného předmětu plnění.
- 7.5. Zařízení staveniště, sanitární zařízení, zdroje vody a el. energie atd. zabezpečuje zhotovitel, jeho cena je součástí ceny díla. Zhotovitel zabezpečí na své náklady veškerou dopravu a skladování všech materiálů, stavebních hmot a dílců, výrobků, strojů a zařízení.
- 7.6. Zhotovitel zabezpečí na své náklady odstranění odpadů a nečistot, které jsou výsledkem jeho činnosti. Zhotovitel se zavazuje udržovat pořádek a čistotu na staveništi a odpovídá za škodu způsobenou neplněním této povinnosti.
- 7.7. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 dnů po podpisu zápisu o předání a převzetí díla vyklidit staveniště. Pro případ prodloužení je zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý započatý den prodloužení.

- 7.8. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví vlastních pracovníků včetně zaškolení a dodržování protipožárních předpisů.
- 7.9. Zhotovitel je povinen (v rámci dohodnuté ceny) zajistit vyložení, správné skladování a uložení všech materiálů (stavebních hmot a výrobků), použitých při realizaci díla této smlouvy, vč. vertikální dopravy.
- 7.10. Zhotovitel odpovídá za pořádek a čistotu na staveništi, zařízení staveniště a stavbou dotčených místech.
- 7.11. Zhotovitel v plném rozsahu zodpovídá za způsobené škody objednateli a třetím osobám. Zhotovitel je povinen být po celou dobu stavby řádně pojištěn (pojištění odpovědnosti za škodu) a na požádání objednatele předložit doklady prokazující řádné pojištění.
- 7.12. Seznam subdodavatelů (název, právní forma, sídlo, statutární orgán, IČO, DIČ) s uvedením předmětu subdodávek a výši finančního objemu tvoří nedílnou součást této smlouvy, jako její příloha č. 3. Subdodavatelem se rozumí jakákoli právnická nebo podnikající fyzická osoba, který se vědomě podílí na realizaci veřejné zakázky.
- 7.13. Zhotovitel je v rámci provádění stavebních prací povinen na vlastní náklady zajistit příslušná dopravně-inženýrská opatření, zejména přechodnou úpravu provozu podle zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, na všech pozemních komunikacích dotčených stavebními pracemi vč. povolení těchto opatření.

8. Dodací podmínky

- 8.1. Požadovaná kvalita a způsob její kontroly se řídí obecně závaznými předpisy. Na stavbu budou použity materiály I. jakostní třídy s parametry odpovídajícími zadávací dokumentací. Na vyžádání objednatele předloží zhotovitel vzorky a normou nebo předepsané atesty materiálů, které hodlá použít do stavby.
- 8.2. Stavební deník:
- Zhotovitel vede ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník (dále jen „SD“). Do SD se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, jako jsou údaje o časovém postupu prací, zdůvodnění odchylek od zadávací dokumentace apod. Objednatel je povinen sledovat obsah SD a k zápisům zhotovitele vyjadřovat své stanovisko. SD je zhotovitel povinen uložit tak, aby k němu měl přístup zástupce objednatele vykonávající technický dozor.
 - Je zakázáno zápisy ve SD přepisovat, škrtnat a dále nelze z deníku vytrhávat jednotlivé listy.
 - SD se skládá z úvodního listu, denních záznamů a příloh. Úvodní list obsahuje: název a sídlo objednatele a subdodavatelů (a změny těchto údajů), identifikační údaje stavby podle zadávací dokumentace, přehled uzavřených smluv, seznam dokladů a úředních opatření týkajících se díla.
 - Denní záznamy se píšou do knihy s očíslovanými listy se dvěma oddělitelnými průpisy.
 - Ve SD se průběžně vyznačují doklady, které se v jednom vyhotovení ukládají přímo na stavbě, jako jsou smlouvy, výkresy dokumentující odchylky apod.
 - Denní záznamy čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí případně jeho zástupci dle smlouvy v den, kdy byly práce prováděny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Při denních zápisech se nesmí vynechávat volná místa. Mimo stavbyvedoucího může provádět potřebné záznamy pracovníci uvedení v této smlouvě, zástupce přímého investora a orgány státního stavebního dozoru, popřípadě jiné pověřené orgány.
 - Jestliže stavbyvedoucí nesouhlasí s provedeným zápisem objednatele, je povinen připojit k záznamu do 3 prac. dnů svoje stanovisko, jinak se má za to, že s obsahem souhlasí.
 - Stavbyvedoucí je povinen předložit denní záznamy zástupcům objednatele nejpozději následující pracovní den a odevzdat mu první průpis. Technický dozor příjem potvrdí. Jestliže technický dozor investora nesouhlasí s obsahem zápisu, poznamená tuto skutečnost do 3 pracovních dnů do SD s uvedením důvodů, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí.

- i) Zhotovitel je povinen uložit druhý průpis denních záznamů odděleně od originálů tak, aby byl k dispozici v případě ztráty originálu.
 - j) Povinnost zhotovitele vést SD končí dnem podpisu protokolu o převzetí díla, resp. odstraněním vad v něm uvedených.
 - k) Zhotovitel bude na stavbě průběžně doplňovat dokumentaci skutečného provedení stavby, zejména těch dodávek, které budou v průběhu dalších prací zakryty.
- 8.3. Případný zápis ve SD, jež by zavazoval některou ze stran přímo k dohodě o změně cen sjednaného díla, víceprací, změně termínu dokončení a úprav záruční doby, bude považován za bezpředmětný s výjimkou ustanovení čl. 10. Jakékoliv úpravy nebo změny těchto skutečností lze řešit pouze na podkladě vzájemné dohody statutárních zástupců, a to výhradně formou písemného dodatku ke smlouvě nebo uzavřením smlouvy nové. Lhůty pro vyjádření námitek ve stavebním deníku pozbývají platnosti, pokud zhotovitel jakýmkoliv způsobem ztíží nebo znemožní oprávněnému zástupci objednatele přístup ke SD.
- 8.4. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole prací, které budou zakryty, písemně ve SD min. 3 dny před zakrytím. V případě nepřítomnosti technického dozoru na stavbě jej zhotovitel vyrozumí telefonicky nebo e-mailem. V případě, že se zástupce objednatele, ač řádně vyzván, ke kontrole nedostaví, může zhotovitel předmětné práce zakrýt, nezakryje-li zhotovitel práce s ohledem na vážnost takovýchto prací a vyčká déle než dohodnuté 3 dny. Zástupce objednatele je oprávněn uplatňovat změny dohodnutého času plnění.
- 8.5. Neúčast zástupce objednatele na kontrole zakrývaných prací ani zakrytí prací zhotovitelem nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za řádné provedení díla, ani odpovědnosti vyplývající ze záruky a vadného plnění stanovených touto smlouvou.
- 8.6. Dozor objednatele má právo nařídít zmocněnci zhotovitele přerušeni, zastavení nebo pokračování prací, a to i v případě, jestliže zmocněnec zhotovitele s takovým rozhodnutím nesouhlasí. Příkaz musí být vykonán bezodkladně, přičemž vzniklé rozpory a jejich následky budou předmětem dodatečných jednání mezi zhotovitelem a objednatelem vyvolaných do 3 pracovních dnů. Zejména je dozor oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práce, je-li ohrožena bezpečnost provádění díla, život nebo zdraví pracujících na stavbě.

9. Financování

- 9.1. Financování díla bude probíhat na základě dohody smluvních stran takto:
- objednatel neposkytuje zálohové platby
 - platba za plnění předmětu této smlouvy bude realizována bezhotovostním převodem na účet zhotovitele na základě faktury s náležitostmi dle této smlouvy vystavené nejpozději do 15 dnů od vzniku práva fakturace
 - zjišťovací protokol skutečně provedených prací potvrzený objednatelem bude vždy přílohou faktury se zdanitelným plněním
 - faktury objednatel uhradí do 21 dnů od prokazatelně doručené a schválené faktury do sídla zadavatele.
 - pro případ, že by zhotovitel nedodržel dohodnutý termín dokončení díla nebo jiným způsobem porušil jednotlivá ustanovení této smlouvy, je objednatel oprávněn po řádném předání díla oprávněn požadovat uhrazení smluvních pokut dle této smlouvy
 - vzájemné pohledávky mohou být řešeny zápočtem mezi oběma smluvními stranami
 - fakturovaná částka se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání této částky z účtu objednatele
- 9.2. Faktura zhotovitele bude obsahovat náležitosti daňového dokladu podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a náležitosti níže uvedené:
- název a sídlo a registrační čísla (IČO, DIČ) smluvních stran

- údaj o zápisu firmy v OR
- bankovní spojení – číslo účtu
- evidenční číslo daňového dokladu
- číslo smlouvy objednatele
- předmět díla a rozsah provedených prací
- cenu bez daně
- sazbu daně
- výši daně
- celkovou částku k úhradě
- datum vystavení daňového dokladu, doba splatnosti, datum zdanitelného plnění
- razítko a podpis
- přílohou bude zjišťovací protokol skutečně provedených prací

9.3. Dle § 92e zákona č. 235/2004 Sb. zákon o DPH, nebude u veřejné zakázky uplatněno přenesení daňové povinnosti.

9.4. Objednatel je oprávněn do lhůty splatnosti vrátit bez zaplacení zhotoviteli fakturu, která neobsahuje náležitosti stanovené smlouvou nebo fakturu, která obsahuje nesprávné cenové údaje nebo není doručena v požadovaném množství výtisků, a to s uvedením důvodu vrácení. Zhotovitel je v případě vrácení faktury povinen tuto opravit nebo vyhotovit fakturu novou. Oprávněným vrácením faktury se ukončuje lhůta její splatnosti. Nová lhůta splatnosti počíná běžet dnem prokazatelného doručení opravené nebo nově vystavené faktury do sídla objednatele. Faktura se považuje za vrácenou ve lhůtě splatnosti, je-li v této lhůtě odeslána.

10. Přerušení prací

10.1. Pokud dojde k přerušení prací z důvodů výskytem skrytých překážek bránících výstavbě, odsouhlasených objednatelem, bude přerušení zapsáno ve stavebním deníku a zhotovitel má právo sjednat dodatkem ke smlouvě přiměřené prodloužení lhůty výstavby o dobu přerušení nebo nezbytně nutnou dobu související s přerušením prací.

10.2. Pokud objednatel zjistí závažné nedostatky v realizaci díla na straně zhotovitele, může práce zastavit nebo přerušit do doby provedení nápravy. Doba přerušení jde na vrub zhotovitele.

11. Garance

11.1. Zhotovitel přebírá záruku na dílo jako celek po dobu 60 měsíců. Záruční lhůty počínají běžet dnem podpisu zápisu o předání/převzetí stavby oběma smluvními stranami bez vad a nedodělků.

11.2. Objednatel je povinen reklamovat vady písemně, bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a stanovena lhůta k jejich odstranění.

11.3. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 dnů po obdržení písemné reklamace zahájit reklamační řízení na místě v součinnosti s objednatelem. Pokud objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii je zhotovitel povinen nastoupit na odstranění vady do 24 hodin od nahlášení závady. V případě havárie uplatňuje objednatel reklamaci mailem, telefonicky nebo jinou rychlou formou. Zhotovitel odstraní veškeré uznané vady díla v záruční době ve lhůtě do 15 dnů od uznání reklamace nebo ve lhůtě písemně dohodnuté, a to bezplatně. Pokud v uvedených lhůtách zhotovitel nezahájí reklamační řízení na místě v součinnosti s objednatelem, má se za to, že zhotovitel reklamaci objednatele uznává jako oprávněnou. Neuznaná reklamace nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za reklamovanou vadu.

- 11.4. V případě, že zhotovitel ne zahájí odstraňování záručních vad ani do 10 dnů ode dne stanoveného ve lhůtě uvedené v čl. 11 odst. 3 nebo pokud neodstraní záruční vady do dne stanoveného ve lhůtě uvedené v čl. 11 odst. 3 je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za každý případ a den prodlení, a to až do dne, v němž dojde k odstranění reklamačních závad.
- 11.5. Reklamací lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamáce odeslaná objednatelem poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.
- 11.6. Jestliže zhotovitel neodstraní uznanou reklamovanou vadu ani do deseti dnů po uplynutí lhůty dle článku 11 odst. 3, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vad jinou odbornou osobu (dále jen „pověřená osoba“). Pověření je objednatel povinen zhotoviteli písemně oznámit. Objednatel je oprávněn požadovat po zhotoviteli úhradu veškerých nákladů spojených s odstraněním vad pověřenou osobou.
- 11.7. V případech hodných zvláštního zřetele mohou zhotovitel i objednatel účtovat sankce nižší, než je v této smlouvě uvedeno.

12. Předání díla

- 12.1. Zhotovitel je povinen zápisem do stavebního deníku oznámit objednateli, nejpozději 3 dny před termínem dokončení díla, kdy bude dílo připraveno k předání. Objednatel je pak povinen do 5 kalendářních dnů od této výzvy přejímací řízení svolat a řádně v něm pokračovat. Zhotovitel je povinen zápisem do stavebního deníku oznámit objednateli ukončení dílčí části prováděného díla a objednatel je povinen zahájit přebírání této části díla.
- 12.2. Zhotovitel je povinen připravit a u přejímacího řízení předložit:
- zápisy a osvědčení použitých materiálů
 - zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací
 - zápisy o vyzkoušení smontovaného zařízení, o provedených revizích, protokoly o provedených provozních zkouškách apod. v rozsahu dle příslušných předpisů
 - stavební deník
 - vyhodnocení komplexního vyzkoušení, pokud je zadávací dokumentací určeno
 - doklady o likvidaci odpadu ze stavby
 - seznam subdodavatelů (název, právní forma, sídlo, statutární orgán, IČO, DIČ) s uvedením předmětu subdodávek a výší finančního objemu (tento seznam předloží zhotovitel pouze v případě, došlo-li ke změně subdodavatelů)
- 12.3. O průběhu přejímacího řízení pořídí objednatel zápis. Jestliže objednatel odmítá dílo převzít, je povinen do zápisu uvést své důvody.
- 12.4. Dílo je řádně dokončeno, jestliže nevykazuje žádné vady a nedodělky a je předáno objednateli na základě zápisu o předání a převzetí díla, podepsaného odpovědnými zástupci smluvních stran. Dokladem o předání a převzetí díla je zápis podepsaný zástupci obou smluvních stran. Specifikace vad a nedodělků, případně způsobu jejich odstranění bude tvořit přílohu zápisu o předání a převzetí díla.
- 12.5. Vadou se rozumí podstatná odchylka v kvalitě, rozsahu a parametrech díla stanovených zadávací dokumentací, touto smlouvou či obecně závazným předpisem. Nedodělkem se rozumí nedokončená část díla oproti zadávací dokumentaci a smlouvě.
- 12.6. Zhotovitel odpovídá za vady dle příslušných ustanovení občanského zákoníku. Zhotovitel rovněž odpovídá za skryté vady, které jsou důsledkem porušení povinností zhotovitele nebo porušení pracovních a technologických postupů.

- 12.7. Zhotovitel nese odpovědnost za řádné provedení díla z hlediska stavebního, bezpečnosti práce, ochrany zdraví a požární ochrany.
- 12.8. Zhotovitel odpovídá za veškeré škody způsobené objednavateli či třetím osobám, které vzniknou těmto subjektům v příčinné souvislosti s činností zhotovitele, jeho zaměstnanců, případně subdodavatelů, spojenou s plněním předmětu díla.

13. Smluvní pokuty

- 13.1. Pokud zhotovitel nedokončí celé dílo ve sjednaném termínu dle článku 3, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny díla za každý započatý den prodlení.
- 13.2. V případě, že objednatel neuhradí fakturu v termínu sjednaném dle této smlouvy, je zhotovitel oprávněn požadovat po objednateli uhrazení smluvní pokuty ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý započatý den prodlení.
- 13.3. Pokud dojde ze strany objednatele k prodlení s úhradou dohodnutých plateb dle této smlouvy o více než 30 kalendářních dnů, je zhotovitel oprávněn pozastavit práce a o tuto dobu prodlení prodloužit termín dokončení stavebních prací.
- 13.4. V případě, že zhotovitel nedodrží lhůtu pro odstranění vad a nedodělků zjištěných při převzetí stavby je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč za každý zjištěný případ a započatý den prodlení.
- 13.5. V případě, že zhotovitel nedodrží povinnost provádění průběžného denního úklidu stavby, zařízení staveniště a dotčených prostor je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč za každý zjištěný případ.
- 13.6. V případě, že zhotovitel ukládá stavební materiál nebo stavební suť mimo určené prostory, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý zjištěný případ.
- 13.7. V případě, že zhotovitel poruší předpisy BOZP a PO je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč za každý zjištěný případ.
- 13.8. Smluvní pokuta je splatná do 14 dnů ode dne doručení písemné výzvy k jejímu zaplacení druhé smluvní straně.

14. Odstoupení od smlouvy

- 14.1. Objednatel může odstoupit od smlouvy:
- jestliže je zhotovitel v prodlení s termínem dokončení díla z důvodů na jeho straně a z jeho chování je zřejmé, že termín dokončení díla (i jeho částí) nebude dodržen a zhotovitel neposkytne objednateli po jeho výzvě dostatečnou jistotu v této záležitosti. Za podstatné porušení smlouvy bude považováno opoždění stavebních prací o více jak 14 dnů proti termínům schválených v této smlouvě
 - zhotovitel opakovaně nerespektuje nařízení zástupců objednatele
 - zhotovitel provádí dílo v rozporu s projektem / zadávací dokumentací, nebo provádí dílo takovým způsobem, který nevykazuje výslednou kvalitu díla

- 14.2. Odstoupení od smlouvy musí být oznámeno písemně. V tomto případě má odstupující strana právo žádat odpovídající náhrady a vyrovnání ve smyslu občanského zákoníku pro důvody zaviněné druhou stranou.

15. Ostatní ujednání


- 15.1. Kontrolní den se bude konat pravidelně jednou týdně, pokud nebude dohodnuto jinak. Termíny budou dohodnuty při předání staveniště.
- 15.2. Obě smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou stranou nezpřístupní třetím osobám a že tyto informace nevyužijí jinak nežli k plnění účelu této smlouvy.
- 15.3. Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva bude včetně příloh publikována na internetových stránkách městské části Praha 17, na profilu zadavatele a dále v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registraci smluv (zákon o registru smluv), s výjimkou přílohy č. 1 z důvodu ochrany obchodního tajemství podle § 504 občanského zákoníku. Uveřejnění smlouvy v registru smluv v souladu se zákonem o registru smluv zajistí objednatel.
- 15.4. Tato smlouva může být měněna jen písemnou formou dodatky podepsanými statutárními orgány obou smluvních stran. Pro platnost dodatku se vyžaduje dohoda o celém textu. Smluvní strany výslovně prohlašují, že jsou si vědomy toho, že jejich závazkový vztah zakládáný touto smlouvou se řídí občanským zákoníkem. Dále strany sjednávají, že pokud nebylo v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se právní poměry z ní vyplývající a vznikající (včetně práv a povinností stran) občanským zákoníkem.
- 15.5. Tato smlouva obsahuje úplnou dohodu stran ve věcech obsažených v této smlouvě. Žádná jiná dohoda, prohlášení či příslib učiněný kteroukoliv ze smluvních stran, které nebudou zakotveny v této smlouvě, nebudou právně závazné, pokud tak tato smlouva výslovně nestanoví.
- 15.6. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
- 15.7. Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy:
1) výkaz výměr
2) zadávací dokumentace
- 15.8. Podle ustanovení § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb. o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, se konstatuje, že uzavření této smlouvy schválila Rada městské části Praha 17 na svém 12. zasedání dne 29.03.2023, usnesením č. Us RMČ 000110/2023.
- 15.9. Tato smlouva je vyhotovena ve 3 stejnopisech, z nichž jeden 1 výtisk obdrží zhotovitel a 2 výtisky objednatel.

16. Podpisy smlouvy


Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek. Smluvní strany se dohodly na celém obsahu smlouvy a její autentičnost potvrzují svým podpisem.

V Praze dne: 16.5. 23

V Praze dne: 20. 04. 2023



Dalibor Večerka, jednatel




Mgr. Aleňka Kopejtková, starostka

DOLOŽKA

Na základě díkce § 43 zákona č. 131/2000 Sb., o hl. městě Praze v platném znění a v souladu s usnesením RMČ č. Us RMČ 000110/2023 ze dne 29.03.2023 se osvědčuje právní úkon spočívající v uzavření smlouvy o dílo mezi MČ Praha 17 a společností UTsport s.r.o., Nad lávkou 672/5, 160 00 Praha 6 – Vokovice, IČO: 03760359 a potvrzuje se splnění podmínek daných výše uvedeným ustanovením.

V Praze dne: 19. 04. 2023



**Veřejná zakázka malého rozsahu: Zhotovení umělého travního povrchu - víceúčelové sportoviště
Bazovského, Praha 6 - Řepy**

Položka	MJ	Množství	Jednotková cena bez DPH (Kč)	Cena za pol.bez DPH (Kč)
Úprava pokladní vrstvy - kontrola a očištění podkladu, doplnění, zhutnění	m2	264		
Dodávka umělého travního koberce	m2	264		
Pokládka umělého travního koberce a lepení vč. dodávky pásek a lepidla a vč. lajnování	m2	264		
Zásyp křemičitým pískem vč. jeho dodávky dle technických listů výrobce	m2	264		
Doprava	kpl	1		
Likvidace odpadu	kpl	1		
VRN - zařízení stanoviště, režie, kompletační činnost	kpl	1		
Celková cena bez DPH (Kč)				178148,00
DPH % (doplní uchazeč)			21%	37411,08
Celková cena vč. DPH (Kč)				215559,08




Příloha č. 2 - Zadávací dokumentace

„Zhotovení umělého travního povrchu – víceúčelové sportoviště Bazovského, Praha 6 - Řepy“

Místo plnění veřejné zakázky: víceúčelové sportoviště Bazovského, Praha 6 – Řepy
(DH č. 12, umístění u ulice Šimonova 1106 – 1110)
parc. č. 1293/18, k. ú. Řepy

Plocha povrchu hřiště: 264 m²
(čistá plocha povrchu nezahrnuje případný prořez)

Ortofotomapa:

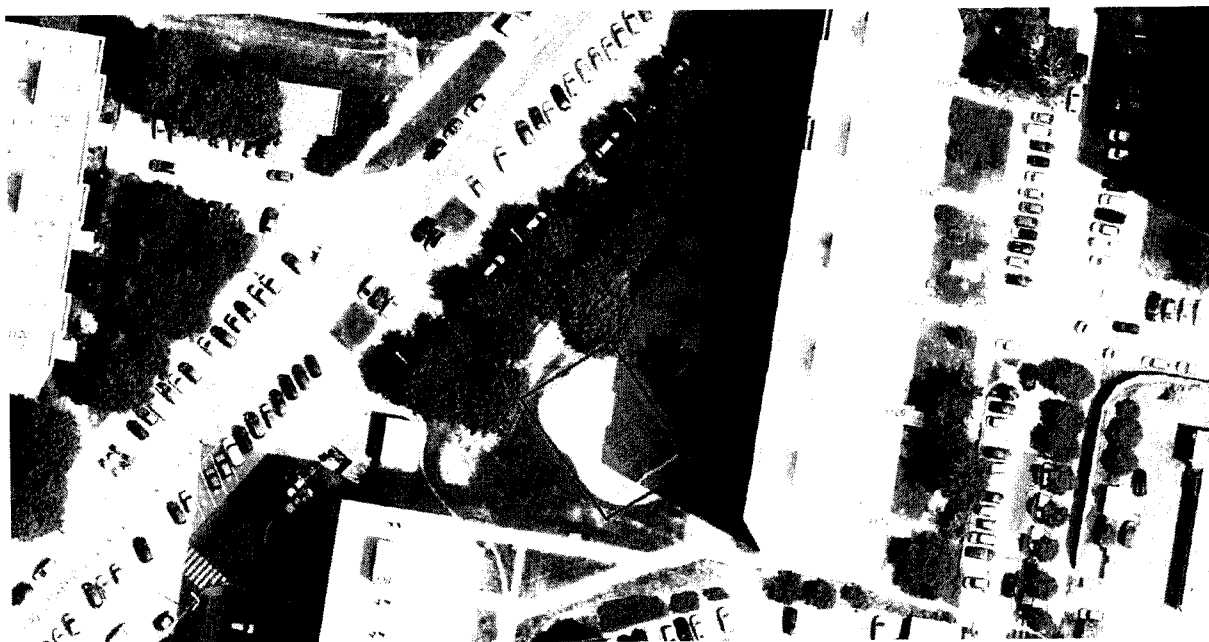


Umělý travní povrch:

- vyroben z tvarovaného PE monofilního vlákna, vhodného pro víceúčelové sportovní aktivity a dětská hřiště
- barva: zelená
- materiál: 100 % PE
- tloušťka vlákna: 180 µm
- zásyp: křemičitým pískem viz požadavky výrobce povrchu
- výška vlasu: 18 mm

Předmět veřejné zakázky zahrnuje:

- Příprava podkladu – kontrola a očištění podkladu, jeho doplnění a zhutnění na požadovanou úroveň
- Dodávka a montáž (lepení vč. dodávky pásek a lepidla a vč. lajnování) umělého travního povrchu určeného pro víceúčelové sportoviště
- Lajnování bude určeno pro různé druhy sportů – fotbal, basketbal, házená, badminton apod.

- 
- Likvidace odpadu, doprava
 - Zařízení staveniště, režie, kompletační činnost
 - Povrch musí splňovat požadavky příslušných technických norem, zejména ČSN EN 1176 (2018) a ČSN EN 1177 (2018).
 - Zadavatel požaduje, aby provádění díla bylo mimo jiné v souladu s právními předpisy vztahujícími se k předmětu veřejné zakázky.
 - Zadavatel nepřipouští použití jakýchkoliv repasovaných nebo dříve použitých zařízení, dílů či materiálů. Všechna dodaná zařízení, díly a materiály musí být nové a první jakosti.
 - Dodavatel výše uvedenou skutečnost prokáže předložením příslušných osvědčení.
