



ÚVN


ÚSTŘEDNÍ VOJENSKÁ NEMOCNICE
Vojenská fakultní nemocnice Praha

účastnit kontrolních dnů a koordinovat veškeré stavební práce a úpravy, které jsou na základě konzultací s projektantem zpracovány již v projektové dokumentaci.

Dodavatel bere na vědomí, že při zahájení realizaci částí stavby, která slouží pro umístění zařízení vyžadující stavební prvky radiační ochrany, bude s dostatečným předstihem informovat zástupce zadavatele a technického dozoru a bez jejich přítomnosti nesmí být realizace této části stavby realizována.



Časový harmonogram

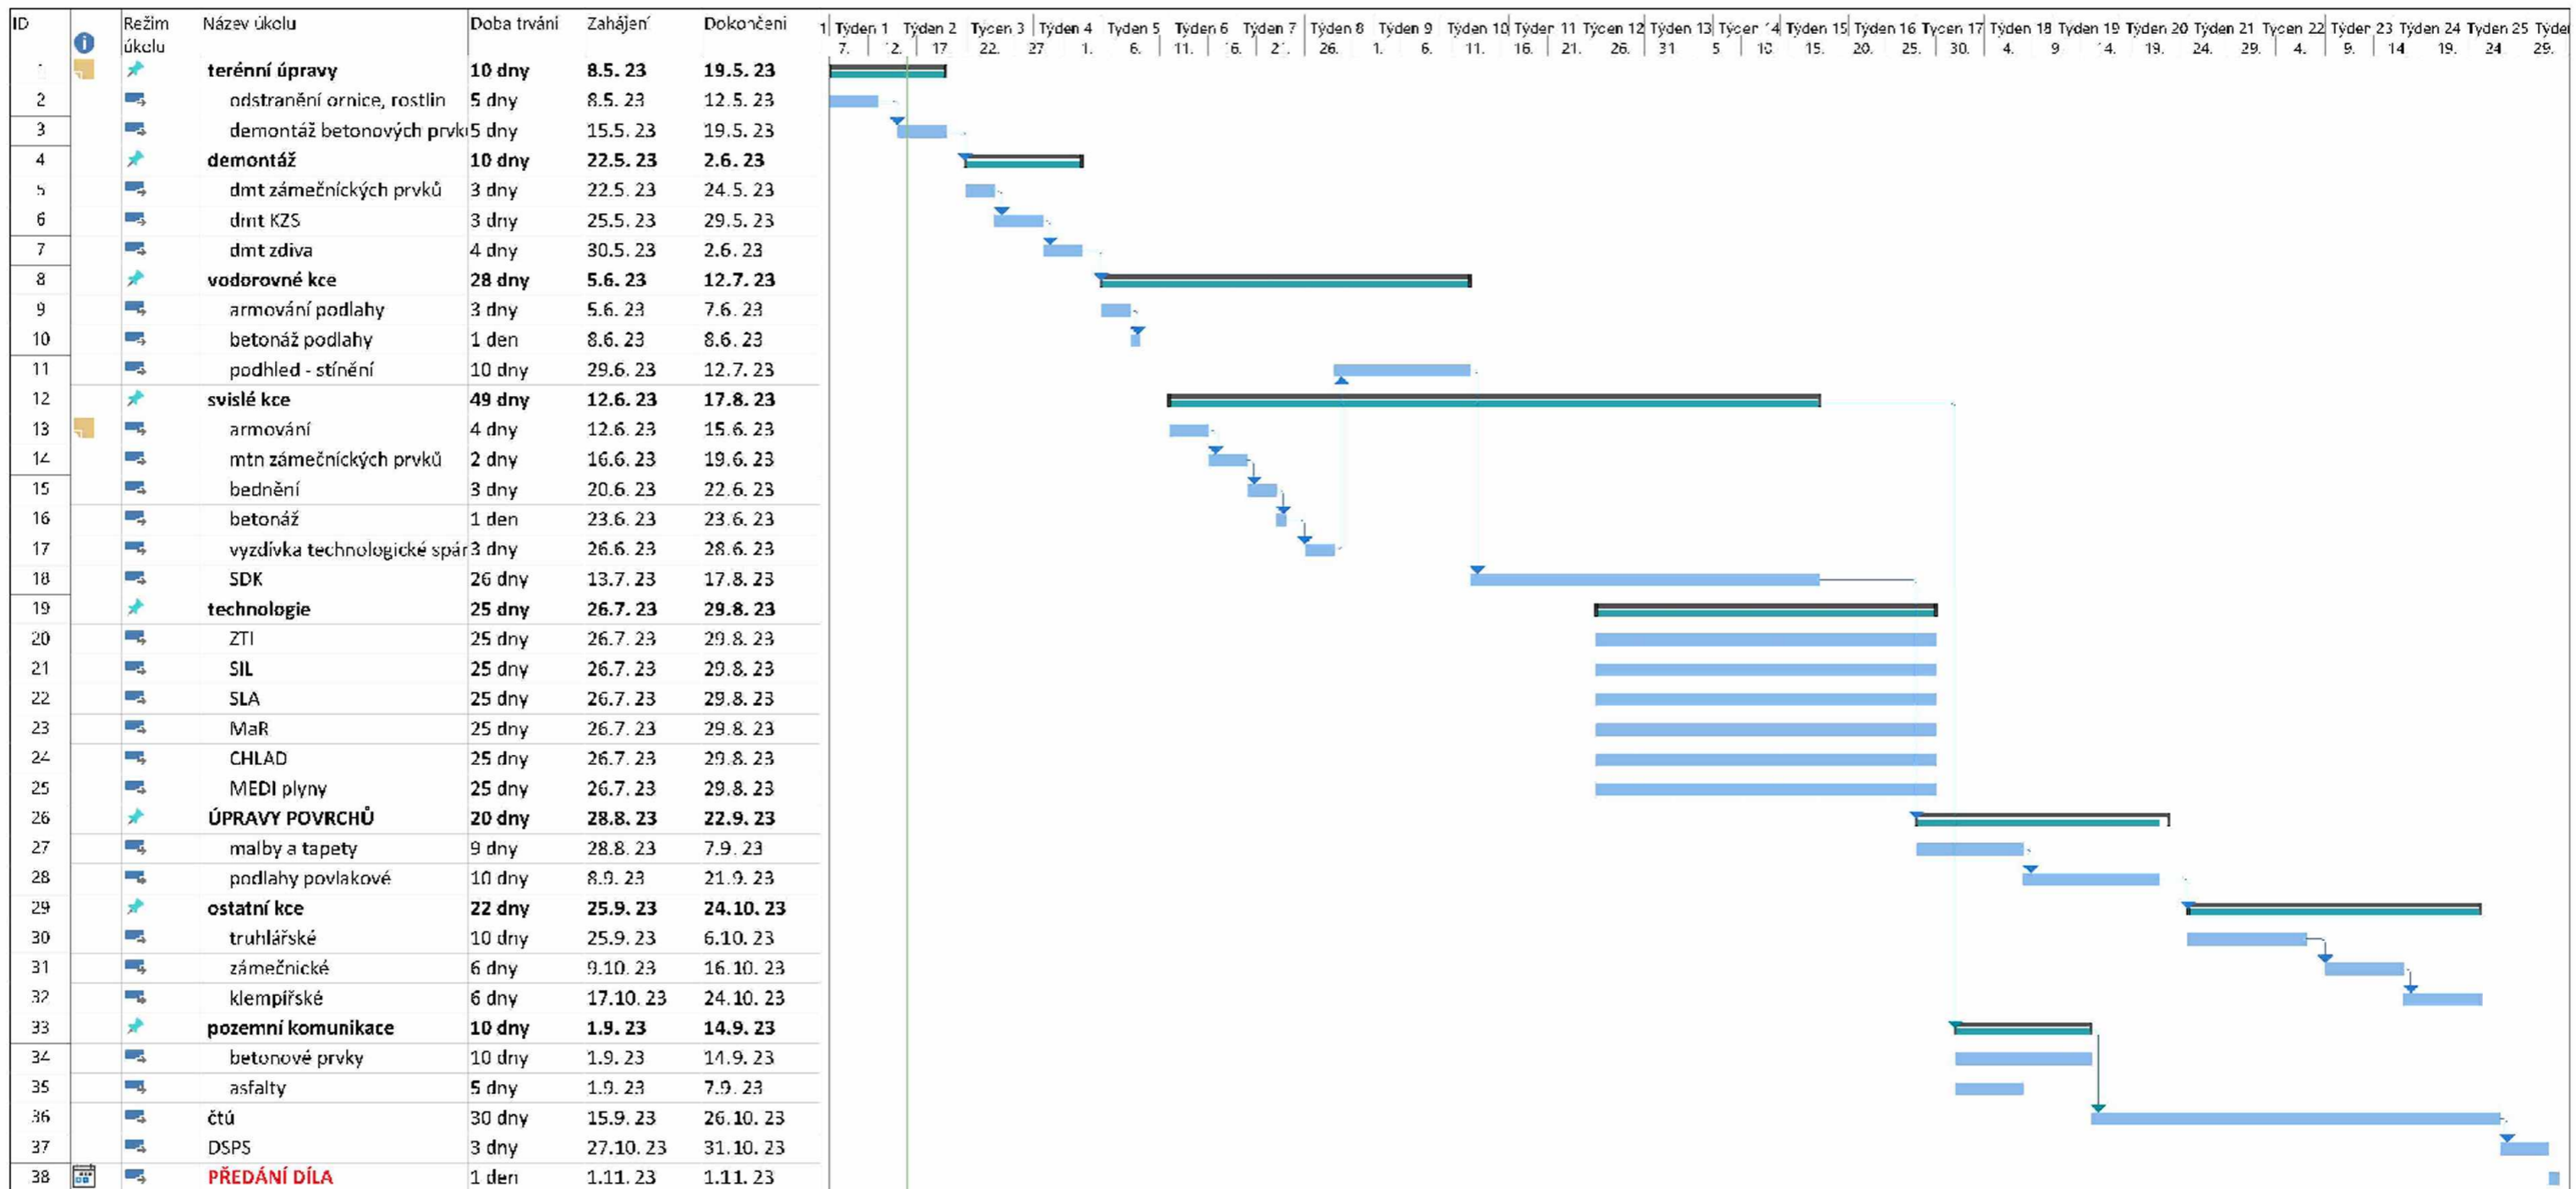

Projekt: Simple Project Plan
Datum: 16.5.23

Úkol
Rozdělení
Mílník
Souhrnný

Souhrn projektu
 Neaktivní úkol
 Neaktivní mílník
 Neaktivní souhrn

Ruční úkol
 Ruční úkoly zahnuté v souhrnném úkolu
 Ruční souhrn

Pouze zahájení
 Pouze s datem dokončení
 Vnější úkoly
 Vnější mílník

Konečný termín
 Průběh
 Průběh ručně zadaného úkolu

Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	cena	5	6	7	8	9	10
terénní úpravy	10 dny	8.5.2023	19.5.2023	651 053 Kč	651 053 Kč					
odstranění ornice, rostlin	5 dny	8.5.2023	12.5.2023							
demontáž betonových prvků	5 dny	15.5.2023	19.5.2023							
demontáž	10 dny	22.5.2023	2.6.2023	398 076 Kč	398 076 Kč					
dmt zámečnických prvků	3 dny	22.5.2023	24.5.2023							
dmt KZS	3 dny	25.5.2023	29.5.2023							
dmt zdiva	4 dny	30.5.2023	2.6.2023							
vodorovné kce	28 dny	5.6.2023	12.7.2023	6 986 453 Kč		4 191 872 Kč	2 794 581 Kč			
armování podlahy	3 dny	5.6.2023	7.6.2023							
betonáž podlahy	1 den	8.6.2023	8.6.2023							
podhled - stínění	10 dny	29.6.2023	12.7.2023							
svislé kce	49 dny	12.6.2023	17.8.2023	8 912 350 Kč		2 228 088 Kč	4 456 175 Kč	2 228 088 Kč		
armování	4 dny	12.6.2023	15.6.2023							
mtn zámečnických prvků	2 dny	16.6.2023	19.6.2023							
bednění	3 dny	20.6.2023	22.6.2023							
betonáž	1 den	23.6.2023	23.6.2023							
vyzdívka technologické spáry	3 dny	26.6.2023	28.6.2023							
SDK	26 dny	13.7.2023	17.8.2023							
technologie	25 dny	26.7.2023	29.8.2023							
ZTI	25 dny	26.7.2023	29.8.2023	95 351 Kč				95 351 Kč		
SIL	25 dny	26.7.2023	29.8.2023	2 021 072 Kč				2 021 072 Kč		
SLA	25 dny	26.7.2023	29.8.2023	1 732 504 Kč				1 732 504 Kč		
MaR	25 dny	26.7.2023	29.8.2023	592 381 Kč				592 381 Kč		
CHLAD	25 dny	26.7.2023	29.8.2023	3 421 200 Kč				3 421 200 Kč		
MEDI plyny	25 dny	26.7.2023	29.8.2023	392 803 Kč				392 803 Kč		
ÚPRAVY POVRCHŮ	20 dny	28.8.2023	22.9.2023							
malby a tapety	9 dny	28.8.2023	7.9.2023	189 257 Kč				189 257 Kč		
podlahy povlakové	10 dny	8.9.2023	21.9.2023	574 820 Kč				574 820 Kč		
ostatní kce	22 dny	25.9.2023	24.10.2023							
truhlářské	10 dny	25.9.2023	6.10.2023	99 563 Kč						99 563 Kč
zámečnické	6 dny	9.10.2023	16.10.2023	480 275 Kč						480 275 Kč
klempířské	6 dny	17.10.2023	24.10.2023	198 572 Kč						198 572 Kč
pozemní komunikace	10 dny	1.9.2023	14.9.2023	97 506 Kč					97 506 Kč	
betonové prvky	10 dny	1.9.2023	14.9.2023							
asfalty	5 dny	1.9.2023	7.9.2023							
čtů	30 dny	15.9.2023	26.10.2023	101 840 Kč					101 840 Kč	
DSPS	3 dny	27.10.2023	31.10.2023							
PŘEDÁNÍ DÍLA	1 den	1.11.2023	1.11.2023							
VRN	120 dny	8.5.2023	1.11.2023	1 365 341 Kč	227 557 Kč	227 557 Kč	227 557 Kč	227 557 Kč	227 557 Kč	227 557 Kč
ostatní náklady				604 231 Kč	100 705 Kč	100 705 Kč	100 705 Kč	100 705 Kč	100 705 Kč	100 705 Kč
				28 914 648 Kč	1 377 391 Kč	6 748 221 Kč	7 579 018 Kč	11 575 738 Kč	527 608 Kč	1 106 672 Kč



Složení realizačního týmu



SEZNAM ČLENŮ REALIZAČNÍHO TÝMU – SLOŽENÍ REALIZAČNÍHO TÝMU

Dodavatel:	OHLA ŽS, a.s.
Sídlo:	Tuřanka 1554/115b, 627 00 Brno
IČ:	46342796
Název veřejné zakázky:	„ÚVN – VoFN Praha – Vybudování vyšetřovny pro ozařovač – realizace“

Výše uvedený účastník zadávacího řízení tímto čestně prohlašuje, že se na plnění veřejné zakázky budou podílet:

HLAVNÍ STAVBYVEDOUČÍ	
Titul, jméno a příjmení	
Délka praxe (počet roků odborné praxe <u>v pozici hlavní stavbyvedoucí</u>)	8 let
Poměr k účastníkovi	zaměstnanec

a) Informace k prokázání technické kvalifikace dle § 79 odst. 2 písm. c) a d) zákona

ÚDAJE K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ TECHNICKÉ KVALIFIKACE	
účast na min 1 referenci dokončené stavby, tj. výstavba nebo rekonstrukce zdravotnického, výzkumného či obdobného zařízení, jehož součástí byla nová výstavba prostor pro umístění zdravotnické či obdobné technologie jejíž zdroj ionizujícího záření dosahuje hodnot min. 7 MeV (např. lineární urychlovač, gama nůž, či jiný obdobný přístroj se speciálními nároky na zajištění radiační ochrany). na pozici hlavní stavbyvedoucí.	
Název referenční zakázky	SÚ onkologické kliniky
Objednatel/Investor	Fakultní nemocnice Olomouc IČ: 00098892
Investiční náklady v Kč bez DPH	56,34 mil. Kč
Doba a místo realizace zakázky	03/2021 – 12/2021
Stručný popis zakázky	Rekonstrukce oddělení radiační onkologie v souvislosti s obměnou lineárních urychlovačů
Kontaktní osoby objednatele/investora, u kterých zadavatel může uvedené informace ověřit	

*Pozn.: tabulku příp. použije účastník tolikrát, kolikrát je třeba (podle počtu uvedených referenčních zakázek k prokázání kvalifikace)



Pojistná smlouva/ pojistný certifikát

MAPFRE ESPAÑA COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A.

CERTIFICA

Que **OBRASCON HUARTE LAIN, S.A.**, tiene contratada con esta Sociedad póliza de Responsabilidad Civil nº **0962299700674**, con fecha de efecto 01 de julio de 2022 y fecha de vencimiento 01 de julio de 2023, actualmente en vigor.

En dicha cobertura, en sus términos, alcance y condiciones, se cubren las responsabilidades civiles que puedan surgir con ocasión de la realización de su actividad "**CONSTRUCCIÓN, PROMOCIÓN, CONCESIONES Y SERVICIOS Y OTROS NEGOCIOS EN GENERAL, SEGÚN SE INDIQUE EN EL OBJETO SOCIAL, REALIZADAS POR LAS SOCIEDADES ASEGURADAS**".

El seguro se rige por lo dispuesto en las condiciones generales, especiales y particulares de la póliza, en las que figuran, entre otras, las siguientes coberturas y límites:

- RESPONSABILIDAD CIVIL EXPLOTACIÓN.
- RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL.
- RESPONSABILIDAD CIVIL PRODUCTOS.
- RESPONSABILIDAD CIVIL POST-TRABAJOS.
- RESPONSABILIDAD CIVIL CRUZADA.
- DEFENSA Y FIANZAS

Límite de Indemnización por siniestro de 6.000.000 EUR.

En los términos, límites y condiciones de la póliza, tienen condición de ASEGURADOS:

OHLA ŽS, a.s. (NIF No. CZ46342796)
Tuřanka 1554/115b, 627 00 Brno, República Checa

OHL ŽS Slovakia, a.s. (NIF No. SK2020292109)
Tuhovská 10722/29, 831 06 Bratislava, Eslovaquia

TOMI – REMONT a.s. (NIF No. CZ25508571)
Přemyslovka 2514/4, 796 01 Prostějov 1, República Checa

El Tomador se encuentra al corriente de sus obligaciones de pago.

La presente póliza sustituye y es continuación, sin disminución alguna en límites y coberturas de la póliza nº **0962199700701**.

Madrid, a 1 de julio de 2022.



MAPFRE ESPAÑA COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A.

(MAPFRE, ŠPANĚLSKO, POJIŠŤOVACÍ A ZAJIŠŤOVACÍ SPOLEČNOST, a.s.)

POTVRZUJE:

že **OBRASCON HUARTE LAIN, S.A.** má uzavřenou platnou pojistnou smlouvu o pojištění odpovědnosti číslo **0962299700674** s účinností od 1. července 2022 do 1. července 2023.

Tato pojistka kryje v termínech, v rozsahu a za stanovených podmínek odpovědnost pojištěného za škody způsobené při činnostech spojených s „**VÝSTAVBOU, PODPOROU, KONCESEMI A POSKYTOVÁNÍM SLUŽEB, JAKOŽ I S DALŠÍMI OBCHODNÍMI AKTIVITAMI, KTERÉ JSOU UVEDENY V PŘEDMĚTU ČINNOSTI A KTERÉ JSOU REALIZOVÁNY POJIŠTĚNÝMI SPOLEČNOSTMI**“.

Pojištění se řídí všeobecnými, zvláštními a speciálními pojistnými podmínkami vztahujícími se k dané pojistné smlouvě, v kterých jsou kromě jiného uvedena následující pojistná krytí a limity.

- ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU Z PROVOZNÍ ČINNOSTI
- ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU ZPŮSOBENOU ZAMĚSTNAVATELEM
- ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU ZPŮSOBENOU VADNÝM VÝROBKEM
- ODPOVĚDNOST ZA ŠKODY PO PŘEDÁNÍ DÍLA
- KŘÍŽOVÁ ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU
- NÁKLADY NA OBHAJOBU A ZÁKONNÉ ZÁRUKY

Maximum pojistného krytí na pojistnou událost je 6.000.000 EUR.

V rámci stanoveného rozsahu, limitů a podmínek pojistné smlouvy jsou v postavení **POJIŠTĚNÝCH**:

OHLA ŽS, a.s. (DIČ CZ46342796)

Tuřanka 1554/115b, 627 00 Brno, Česká republika

OHL ŽS Slovakia, a.s. (DIČ SK2020292109)

Tuhovská 10722/29, 831 06 Bratislava, Slovensko

TOMI - REMONT a.s. (DIČ CZ25508571)

Přemyslovka 2514/4, 796 01 Prostějov 1, Česká republika

Pojistník splnil v termínu svoji platební povinnost.

Tato pojistná smlouva nahrazuje a je pokračováním pojistné smlouvy číslo **0962199700701**, a to bez jakéhokoli snížení limitů a pojistného krytí vyplývajícího z předchozí pojistné smlouvy

Madrid, dne 1. července 2022

MAPFRE ESPAÑA COMPAÑÍA DE SEGUROS Y
REASEGUROS

Razítko pojišťovny Mapfre

Podpis: nečitelný

Toto osvědčení o existenci pojištění má informativní charakter a nijak nemění, nerozšiřuje ani neomezuje obsah všeobecných, zvláštních a speciálních podmínek, které byly přijaty pojištěncem a kterými se řídí pojistné krytí ze smluv v něm uvedených.

PŘEKLADATELSKÁ DOLOŽKA

Já, [REDACTED] soudní překladatelka jazyka českého a španělského zapsaná v seznamu tlumočnicků a překladatelů vedeném Ministerstvem spravedlnosti České republiky, tímto stvrzuji, že jsem osobně provedla překlad připojené listiny, a že tento překlad souhlasí s textem předmětné listiny. Při provádění překladu nebyl přibrán konzultant.

Tento úkon je zapsán v evidenci úkonů pod číslem položky: [REDACTED]

V Praze, dne 28.08.2022



