

Smlouva o dílo (SOD)
uzavřená na základě Občanského zákoníku

zhotovitel č.
objednatel č. **145 IVŠ/2023**

I. Smluvní strany:

Objednatel:

Vysoká škola ekonomická v Praze
se sídlem: Nám. W. Churchilla 1938/4, 130 67 Praha 3
Zastoupená: Ing. Tomášem Zouharem, kvestorem

Bankovní spojení: [REDAKCE]

IČ: 61384399

DIČ: CZ61384399

Číslo datové schránky: canj9d5

Pracoviště pověřené plněním z této smlouvy: Správa účelových zařízení VŠE,
řízená: Ing. Otou Zimou CSc., MBA
Jeseniova 2769/208 13000 Praha 3

Zhotovitel:

FAST střechy s.r.o.

Se sídlem: Smetanova 2065, 547 01 Náchod

Zastoupená: Milošem Štantejským, jednatelem společnosti

Bankovní spojení: [REDAKCE]

IČ: 27537676

DIČ: CZ27537676

Číslo datové schránky: ti55w3g

Osoba pověřená jednáním ve věcech smluvních: Miloš Štantejský, jednatel společnosti

Osoba pověřená jednáním ve věcech technických: [REDAKCE]

II. Předmět smlouvy:

1. Zhotovitel se zavazuje pro objednatele realizovat bez vad a nedodělků, ve smluveném termínu, na své náklady stavební práce a dodávky materiálu v rozsahu veřejné zakázky pod názvem: „**Rekonstrukce střechy Thalerova kolej**“, na adrese Jeseniova 1954/210, 130 00 Praha 3, spočívající v rekonstrukci střešního pláště, (dále jen „**dílo**“), když rozsah díla je dán výkazem výměr v položkovém rozpočtu (příloha č. 1) a projektovou

dokumentací (příloha č. 2). Veškeré práce jsou zapracovány do cenové nabídky, která je nedílnou součástí smlouvy a je vedena jako příloha č. 1 této smlouvy.

2. Zhotovitel byl objednatelem vybrán ke zhotovení díla v rámci zadávacího řízení o veřejné zakázce malého rozsahu týkající se díla (dále jen „**zadávací řízení**“), která se neřídí zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek; práva, povinnosti a podmínky v tomto zadávacím řízení se řídí zákonem a vyhláškami č. 170/2016 Sb., č. 168/2016 Sb. a č. 169/2016 Sb. a nařízením vlády ČR č. 172/2016 Sb., a to na základě nabídky podané zhotovitelem v zadávacím řízení s tím, že zhotovitel je povinen v rámci plnění předmětu této smlouvy dodržet všechny podmínky zadávací dokumentace zadávacího řízení a dodržet veškeré své závazky vyplývající z nabídky podané zhotovitelem v zadávacím řízení.

3. Objednatel je jako veřejný zadavatel povinen postupovat v souladu s ustanoven § 219 zákona o zadávání veřejných zakázek, a tudíž uveřejnit na svém profilu tuto smlouvu včetně jejich příloh a případných dodatků, výši skutečně uhrazené ceny za plnění veřejné zakázky.

4. Objednatel se zavazuje řádně (v souladu s touto smlouvou) a včas provedené dílo od zhotovitele převzít a zaplatit za ně zhotoviteli sjednanou cenu podle níže uvedených podmínek.

5. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s právními, technickými a dalšími obecně závaznými předpisy platnými na území České republiky v době provedení díla.

III. Předmět plnění:

1. Předmětem díla je „**Rekonstrukce střechy Thalerova kolej**“. Součástí díla, kromě montážních a stavebních prací, jsou i dodávky všech materiálů, z nichž je dílo provedeno a též doprava na staveniště, skladování, správa, zabudování a montáž všech dílů a materiálů, odvoz a likvidace odpadů obalových materiálů.

2. Za účelem řádného provedení díla je zhotovitel dále povinen zajistit:

- a) zřízení a provozování staveniště
- b) vybavení staveniště podle požární ochrany
- c) povinné zkoušky materiálů, vzorků a prací ve smyslu platných norem a předpisů
- d) likvidaci zařízení staveniště a vyklizení staveniště včetně uvedení všech skladových prostor do původního stavu.

3. Zhotovitel se zavazuje provést rovněž případná jednání a činnosti spojené s výkonem inženýrské činnosti, zejména vyřizování veškerých povolení, souhlasů a oznámení souvisejících s provedením díla.

IV. Doba plnění:

Termín zahájení prací: 1. 7. 2023

Termín dokončení díla: 31. 8. 2023

1. Zhotovitel se zavazuje zahájit zhotovení díla do 3 pracovních dnů ode dne 1. 7. 2023 a provést dílo, tj. zcela jej dokončit do dne 31. 8. 2023, a to podle orientačního harmonogramu postupu prací při realizaci díla, který tvoří přílohu č. 3 této smlouvy. Harmonogram bude průběžně aktualizován dle postupu ostatních prací celkové rekonstrukce.

2. V den zahájení zhotovování díla podle této smlouvy bude mezi objednatelem a zhotovitelem sepsán písemný protokol, dokládající předání staveniště ke zhotovování díla podle této smlouvy ze strany objednatele zhotoviteli s tím, že zhotovitel v tomto protokolu jako stavbyvedoucího při zhotovování díla uvede jmenovitě pověřenou osobu.

3. Po úplném dokončení díla podle této smlouvy bude mezi objednatelem a zhotovitelem sepsán písemný protokol o předání a převzetí díla.

4. Prodlení zhotovitele se zhotovením díla a jeho protokolárním předáním objednateli ve sjednaném termínu nebo nepřevzetí staveniště ke zhotovení díla ze strany zhotovitele na základě písemného protokolu ve sjednaném termínu je považováno za podstatné porušení této smlouvy, které zakládá objednateli právo odstoupit od této smlouvy.

5. Zhotovitel se zavazuje bezodkladně informovat objednatele o veškerých okolnostech, které mohou mít vliv na termín provedení díla.

6. Zhotovitel se je povinen při zhotovení díla a při plnění veškerých jeho dalších povinností vyplývajících z této smlouvy v plném rozsahu uvádět název „**Rekonstrukce střechy Thalerova kolej**“, také při všech úředních jednáních a na veškerých dokumentech týkajících se zhotovení díla a při plnění povinností zhotovitele podle této smlouvy.

V. Cena:

1. Cena díla je stanovena jako maximální smluvní cena podle objednatelem přijaté cenové nabídky uvedené v cenové nabídce zhotovitele a která tvoří přílohu č. 1 této smlouvy zpracované na základě výkaz výměr pro předmět díla v cenové úrovni ke dni předání dokončeného předmětu díla podle této smlouvy.

- **Celková cena díla činí:2 245 743,30,- Kč**

(slovy: dvamilionadvěstěčtyřicetpěttisícasedmsetčtyřicettři korun českých) bez daně z přidané hodnoty (DPH) podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů

- daň z přidané hodnoty z této ceny činí:471 606,09,- Kč

(slovy: čtyřistasedmdesátjedentisicašestsetšest korun českých)

- **celková cena díla včetně DPH činí:2 717 349,39,- Kč**

(slovy: dvamilionysedmsetsedmnácttisicatřistačtyřicetdevět korun českých)

2. Zhotovitel prohlašuje, že předem zjistil množství a objemy potřebných materiálů a prací pro úplné a bezvadné zhotovení díla a jejich případné zvýšení nebude mít vliv na výši ceny díla.

3. Cena díla je stanovena na základě pečlivé a odborné kalkulace zhotovitele, učiněné po předchozím pečlivém a podrobném prohlédnutí místa zhotovení díla.

4. Celková smluvní cena za dílo zahrnuje veškeré náklady vynaložené zhotovitelem při zhotovení díla a plnění veškerých jeho závazků podle této smlouvy, a to zejména:

- a) veškeré náklady na úplné, kvalitní a provozuschopné provedení díla,
- b) veškeré náklady na dodávku, uskladnění, správu, zabudování, montáž a zprovoznění veškerých dílů, součástí, celků a materiálů nezbytných k provedení díla,

- c) veškeré náklady na dopravu, stavbu, skladování, montáž a správu veškerých technických zařízení a mechanismů nezbytných k provedení díla,
- d) veškeré běžné i mimořádné provozní náklady zhotovitele nezbytné k provedení díla,
- e) veškeré náklady na dopravu a ubytování pracovníků zhotovitele,
- f) veškeré náklady na záborny veřejného prostranství mimo vlastní pozemek stavby pro účely zřízení zařízení staveniště nezbytného k provedení díla,
- g) veškeré náklady na provedení veškerých příslušných a normami či vyhláškami stanovených zkoušek materiálů a dílů včetně předávacích zkoušek,
- h) veškeré náklady na běžné i mimořádné pojištění odpovědnosti zhotovitele a pojištění díla,
- i) veškeré daně a poplatky spojené s provedením díla,
- j) veškeré náklady na provedení nutných, potřebných či úřady stanovených opatření nezbytných k provedení díla,
- k) náklady na odvoz a likvidaci veškerého stavebního a montážního odpadu (suti, zbytků stavebních hmot apod.) včetně veškerých nákladů spojených s jejich uložením podle právních předpisů a nákladů a poplatků za skládkovné a recyklaci,
- l) veškeré náklady spojené s vyklizením staveniště a celkovým úklidem prostor dotčených výstavbou nebo zhotovením díla podle této smlouvy a jejich protokolárním předáním zpět objednateli.

5. Cena díla je konečná a zhotovitel není oprávněn na objednateli požadovat úhradu jakýchkoli víceprací a vícenákladů. V případě, že:

- a) nebudou některé práce při zhotovení díla ve sjednaném rozsahu provedeny nebo
- b) nebudou při zhotovení díla použity ve sjednaném rozsahu některé materiály nebo
- c) nebudou zhotovitelem ve sjednaném rozsahu plněny některé jeho povinnosti podle této smlouvy či vynaloženy některé náklady uvedené v této smlouvě

bude celková cena díla snížena o cenu těchto nevykonaných prací, neposkytnutých materiálů, neposkytnutých plnění a nevynaložených nákladů stanovenou podle této smlouvy a výkazu výměr, které budou předem písemně odsouhlaseny objednatelem.

6. Objednatel je oprávněn oproti pohledávce zhotovitele na zaplacení ceny díla, kterou je povinen uhradit zhotoviteli na základě této smlouvy, nebo jakékoli její části, jednostranně započítat v souladu s ustanovením § 1982 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, veškeré své pohledávky vůči zhotoviteli, zejména pohledávky z titulu smluvních pokut, které bude zhotovitel povinen objednateli podle této smlouvy uhradit.

7. Vyvstanou-li při realizaci díla nové požadavky nezbytné pro řádné provádění díla, objednatel a zhotovitel uzavřou písemný dodatek k této smlouvě, v němž bude cena díla změněna v závislosti na změně těchto požadavků, a to při jednotkových cenách odpovídajících cenám uvedeným ve výkazu výměr, které budou písemně odsouhlaseny objednatelem, s tím, že zároveň nesmí být stanovena jiná doba, během níž má být dílo zhotoveno. V případě, že nebude možné cenu příslušných prací a dalších plnění, které bude povinen poskytnout zhotovitel na základě požadavku objednatele nad rámec této smlouvy určit podle jednotkových cen uvedených v položkovém rozpočtu a výkazu výměr, který je součástí nabídky zhotovitele, budou příslušné ceny určeny podle Cenové soustavy ÚRS, zveřejňované společností ÚRS PRAHA, a.s., se sídlem Praha 10, Pražská 18, PSČ 102 00, IČ: 471 15 645, zapsanou v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1776, platné v kalendářním roce, ve kterém budou příslušné práce a plnění zhotovitelem poskytnuty, se snížením o 10 % (slovy: deset procent).

8. Dojde-li v průběhu realizace díla k změnám položek v rámci výkazu výměr, které musí být předloženy na změnových listech, před uzavřením dodatku musí být návrhy změnových listů odsouhlaseny investorem, TDS a AD.

VI. Platební a fakturační podmínky:

1. Smluvní strany se dohodly, že objednatel uhradí zhotoviteli cenu díla podle této smlouvy bez jakýchkoli záloh, které nejsou povoleny, a to na základě faktur – daňových dokladů vystavených zhotovitelem v souladu se skutečným stavem realizace díla, a to následujícím způsobem:

- a) Zhotovitel má nárok na úhradu části ceny díla do výše 90% celkové ceny díla na základě měsíčních dílčích faktur vystavených zhotovitelem vždy na základě předložení zjišťovacího protokolu, tj. soupisu provedených prací odsouhlaseného objednatelem, dle předávacího protokolu a v cenách dle cenové nabídky zhotovitele vždy se splatností 30 kalendářních dnů od doručení faktury objednateli.
- b) Po řádném celém dokončení celého díla, jeho předáním a převzetím bez vad a nedodělků na základě předávacího protokolu, uhradí objednatel zhotoviteli 10 % ceny díla na základě faktury vystavené zhotovitelem s termínem splatnosti 30 kalendářních dnů. V závěrečném daňovém dokladu budou vyúčtovány veškeré objednatel zaplacené dílčí faktury.
- c) Soupis provedených prací a dodávek bude vypracován jako zjišťovací protokol, ze kterého bude patrná celková cena a množství vč. jednotkových cen, množství a cena materiálu a prací provedených od počátku stavby včetně vyjádření v procentech a množství a cena materiálu a prací zbývajících do konce díla vč. vyjádření v procentech.

2. Faktury – daňové doklady budou zhotovitelem předány objednateli ve 2 (slovy: dvou) vyhotoveních a budou obsahovat zejména tyto údaje:

- název a sídlo oprávněné a povinné osoby, tj. zhotovitele a objednatele
- IČ a DIČ zhotovitele a objednatele
- číslo smlouvy
- číslo faktury
- název akce včetně čísla registrace akce
- den vystavení faktury – daňového dokladu, den splatnosti a datum zdanitelného plnění
- označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který má objednatel platit
- fakturovanou částku bez daně z přidané hodnoty, sazbu daně z přidané hodnoty, daň z přidané hodnoty, celkovou částku včetně daně z přidané hodnoty
- razítko a podpis oprávněné osoby zhotovitele
- konstantní a variabilní symbol pro platbu a veškeré další údaje vyžadované právními a účetními předpisy, a to zejména zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.

3. Závěrečná faktura bude zhotovitelem vystavena po dokončení díla, tj. podepsání protokolu o předání a převzetí díla podepsaný protokol o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků je nezbytnou součástí závěrečné faktury.

4. Faktury bude zhotovitel zasílat objednateli elektronicky na e-mail: [REDAKCE], doporučenou poštou nebo je osobně předávat do sekretariátu Správy účelových zařízení Vysoké školy ekonomické v Praze, a to vždy ve 2 (slovy: dvou) vyhotoveních na adrese SÚZ VŠE Jeseniova 208, 130 00 Praha 3.

5. Finanční prostředky uhrazené ze strany objednatele ve prospěch zhotovitele na úhradu celkové ceny díla podle této smlouvy budou zhotovitelem výhradně použity na uhrazení závazků spojených s předmětem plnění díla podle této smlouvy.

6. V případě, že příslušná faktura – daňový doklad bude obsahovat nesprávné anebo neúplné

údaje či náležitosti nebo nebudou splněny podmínky pro její vystavení, je objednatel oprávněn fakturu – daňový doklad vrátit zhotoviteli do dne její smluvní splatnosti. Zhotovitel podle charakteru nedostatků fakturu – daňový doklad opraví nebo vystaví novou fakturu – daňový doklad. Vrácením faktury – daňového dokladu přestává běžet původní lhůta splatnosti a s tím, že začíná běžet znovu ode dne doručení opravené nebo nové faktury – daňového dokladu.

7. Objednatel se zavazuje zaplatit platby dle řádně vystavených faktur do data splatnosti těchto faktur dle odst. 1. Za termín úhrady se rozumí den odepsání platby z účtu objednatele.

VII. Vícepráce – méněpráce :

1. Požadavek objednatele na vícepráce nebo méněpráce bude vždy řešen zapsáním do stavebního deníku. Zhotovitel do 5 pracovních dní předá objednavateli jejich ocenění, které bude po odsouhlasení objednatelem, přílohou dodatku ke smlouvě.

2. Cena víceprací a méněprací bude stanovena vždy dle jednotkových cen uvedených v cenové nabídce zhotovitele dle přílohy č. 1 této smlouvy. V případě víceprací, které nejsou v položkovém rozpočtu cenové nabídky zhotovitele, bude cena stanovena dle čl. V. odst. 7 této smlouvy.

3. Vícepráce budou zaplacený po řádném předání celého díla samostatně na základě zvláštního vyúčtování (daňových dokladů) zhotovitele, mimo sjednanou cenu díla a na základě objednatelem odsouhlaseného soupisu těchto prací.

VIII. Podmínky zhotovování díla:

1. Zhotovitel je povinen při provádění díla postupovat podle platných právních předpisů a technických norem, technologických předpisů výrobců použitých materiálů a výrobků, a v souladu s touto smlouvou a jejími přílohami. V případě porušení těchto svých povinností, odpovídá zhotovitel objednateli v plném rozsahu za způsobenou škodu s tím, že je povinen uvést dílo na své vlastní náklady zcela do souladu s obsahem této smlouvy.

2. Při provádění díla je zhotovitel povinen dodržovat právní a další obecně závazné předpisy a normy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Zhotovitel je povinen na staveništi a v dalších prostorách, v nichž se bude pohybovat, udržovat pořádek a čistotu, odstranit na vlastní náklady odpady vzniklé při provádění díla.

3. Zhotovitel je povinen dodržet kvalitu, technický a funkční standard všech stavebních a technologických dodávek, včetně přístrojů a zařízení zahrnutých do díla. Případně uvažované odchylky dodávek je zhotovitel povinen předem a včas s objednatelem projednat jako návrh, který objednatel nemusí přijmout.

4. Zhotovitel je povinen činit taková opatření, aby jeho činností nedošlo ke škodám na majetku objednatele, nebo třetích osob, a nebo k poškození zdraví objednatele nebo třetích osob, jimž by objednatel za takto způsobenou škodu odpovídal. V případě způsobení takovéto škody, zhotovitel způsobenou škodu v plné výši nahradí.

5. Zhotovitel vyzve objednatele k prověření prací, jejichž výsledek bude v dalším průběhu prací zakryt nejméně 3 (slovy: tři) pracovní dny před zakrytím výsledku těchto prací, a to:

a) písemně doporučeným dopisem nebo

b) datovou schránkou nebo

c) faxem nebo e-mailovou zprávou s tím, že nejpozději následující pracovní den bude výzva odeslána písemně doporučeným dopisem.

6. Zhotovitel se zavazuje ke zhotovení díla používat výhradně materiály a výrobky vybavené atestem nebo jiným potvrzením o plnění požadavků veškerých předpisů a norem. Objednatel si vyhrazuje právo požadovat doložení těchto atestů od zhotovitele před použitím příslušných materiálů a výrobků při zhotovování díla, pokud si to objednatel nevyžádá v jiném termínu. Nejpozději je však zhotovitel povinen předložit tyto atesty ke dni ukončení přejímacího řízení.

7. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s tím, že objednatel je oprávněn dát zhotoviteli příkaz k přerušení prací při zhotovování díla, je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví osob pracujících na ní, nebo hrozí-li vznik škody. Hrozí-li vznik škody a k přerušení při zhotovování díla dojde v takovém případě z důvodů na straně zhotovitele, nemá přerušení prací vliv na závazek zhotovitele zhotovit dílo ve sjednaném termínu.

8. Pokud objednatel při průběžné kontrole provádění díla zjistí, že dílo vykazuje vady, nebo že zhotovitel porušuje jiné své povinnosti stanovené touto smlouvou, je oprávněn vyzvat zhotovitele, aby odstranil vady vzniklé vadným prováděním díla, případně aby splnil své jiné smluvní povinnosti a dílo prováděl řádně.

9. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že dílo a jeho součásti opatří veškerými, zejména bezpečnostními a výstražnými označeními, vyžadovanými právními a dalšími obecně závaznými předpisy a normami.

10. Obstarání nutných záborů prostranství mimo pozemek určený k výstavbě, dočasných omezení dopravních značení a dalších skutečností nutných k provádění prací při střetu s provozem na veřejných komunikacích je povinností zhotovitele. Zhotovitel hradí rovněž všechny správní poplatky a jiné platby spojené s používáním veřejných ploch, ploch ve vlastnictví třetích osob a komunikací.

11. Zhotovitel zajistí v případě potřeby ochranu nedokončených prací a výkonů před veškerými vnějšími vlivy, tj. i klimatickými vlivy (např. před pronikáním vlhkosti, před účinky vichřice atd.). Náklady spojené s touto činností nebudou objednatelem zvlášť hrazeny a nese je v plném rozsahu zhotovitel.

12. Zhotovitel zajistí, aby jeho pracovníci prováděli veškeré stavební a montážní práce podle hygienických a bezpečnostních předpisů s tím, že je povinen uhradit veškeré eventuální újmny na zdraví a majetku vzniklé porušením těchto předpisů.

13. Zhotovitel se zavazuje, že ke skladování materiálu potřebného k provedení díla a provádění přípravných stavebních montážních prací bude využívat pouze prostory předem dohodnuté s objednatelem.

14. Zhotovitel je povinen starat se na vlastní náklady o nepřetržité odstraňování nečistot způsobených jeho činností, likvidaci obalových materiálů a zbytků materiálů obecně. V případě nečinnosti zhotovitele, i po písemné výzvě objednatele, je objednatel oprávněn toto odstranění v případě potřeby nechat provést třetí osobou, přičemž veškeré náklady na tuto odklízovací činnost nese zhotovitel.

15. Zhotovitel odpovídá za eventuální škody, které způsobil činností svojí nebo svých poddodavatelů po celou dobu realizace díla a též nese v plném rozsahu nebezpečí jakýchkoli dalších škod na díle, až do doby protokolárního předání díla nebo jeho části (podlaží) a jeho převzetí bez vad a nedodělků objednatelem.

16. Zhotovitel je povinen vést jednoduchý záznam o stavbě (vyhl. 499/2006) a to ve stavebním deníku na stavbě ve 3 (slovy: třech) kopiích zápisu. Stavební deník musí být na stavbě trvale přístupný a bude kdykoliv k dispozici objednateli, který je oprávněn činit do stavebního deníku zápisy, v mimopracovní době bude uložen na recepci koleje. Zhotovitel do stavebního deníku zapisuje skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy a skutečnosti, které mají význam pro průběh provádění díla, zejména postup prací, údaje nutné pro posouzení prací orgány státní správy, údaje o časovém postupu prací, přerušování provádění prací, s udáním důvodů, nehod, překážek a jiných událostí a všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy o dílo. Pro sdělení urgentních skutečností jedné smluvní strany druhé smluvní straně bude používán telefonický styk, potvrzený e-mailem. Objednatel je povinen sledovat obsah stavebního deníku a k zápisům zhotovitele připojovat své stanovisko, souhlas, námitky apod., a to nejdéle do tří pracovních dnů od provedení zápisu zhotovitelem. V případě, kdy zhotovitel provede do stavebního deníku zápis, ke kterému je objednatel povinen zaujmout stanovisko, je povinen objednatele ihned po provedení zápisu prokazatelně informovat.

Do stavebního deníku jsou oprávněni zapisovat:
za objednatele:

[REDACTED]

za zhotovitele:

[REDACTED]

17. Zhotovitel určí na základě předchozího projednání s objednatel a v souladu se zadávací dokumentací osobu stavbyvedoucího s tím, že jméno stavbyvedoucího bude zapsáno do zápisu o předání a převzetí staveniště. Případná změna stavbyvedoucího bude objednateli oznámena písemně předem.

18. Objednatel bude provádět na stavbě technický dozor stavebníka (TDS) prostřednictvím osoby k tomu pověřené objednatelem a osobně, resp. osobami oprávněnými objednatelem zastupovat v rámci kontrolních dnů. Zhotovitelem bude z kontrolních dnů na místě pořizován zápis, který bude všemi přítomnými na místě podepsán a následně všem zaslán e-mailem, zejména objednavateli.

19. Pokud zhotovitel použije ke splnění části díla třetí osoby, je povinen předem písemně oznámit objednateli jejich základní identifikační údaje a předat objednateli kopii platného oprávnění příslušné osoby k zajištění požadovaného výkonu nebo služby (dále jen „**poddodavatel**“). Zhotovitel se zavazuje k tomu, že třetí osoby, které by jako poddodavatelé zhotovovaly příslušnou část díla, budou plně kvalifikované a budou seznámeny zhotovitelem s podmínkami zhotovení díla podle této smlouvy. Zhotovitel v plném rozsahu odpovídá za plnění veškerých povinností a řádné zhotovení příslušné části díla těmito třetími osobami.

Zhotovitel:

- a) není oprávněn v rámci smluvních vztahů s poddodavatelem sjednat jakékoli výhrady vlastnického práva poddodavatele k dílu nebo jakékoli jeho části ve smyslu ustanovení § 2132 a násl. obč. zák., tj. je povinen zajistit, aby objednatel nabyl vlastnické právo dílu a jeho jednotlivým částem vždy za podmínek uvedených výhradně v této smlouvě, a to řádně a včas, a je povinen zajistit, aby vlastnické právo objednatele k dílu a jeho jednotlivým částem nebylo jakkoli rušeno, a

- b) je povinen v rámci smluvních vztahů s poddodavatelem chránit zájmy objednatele a předcházet vzniku případných škod na straně objednatele, přičemž zhotovitel v plném rozsahu odpovídá za činnost a jednání příslušného poddodavatele, jako by příslušnou část díla prováděl, příslušnou činnost vyvíjel a jednal sám,

20. Zhotovitel se zavazuje, že splní při zhotovení díla veškeré podmínky uvedené v zadávací dokumentaci a dodrží obecně platné normy a vyhlášky platné na území České republiky pro realizaci staveb.

21. Zhotovitel se zavazuje při provádění prací podle této smlouvy co nejméně narušovat provoz v areálu Thalerovy koleje.

22. Zhotovitel odpovídá v plné výši za újmu, kterou způsobí při provádění díla nebo v souvislosti s prováděním díla objednateli nebo třetím osobám. Zhotovitel odpovídá objednateli za újmu způsobenou pracovníky zhotovitele a jinými pracovníky pověřenými zhotovitelem a poddodavatelem, vykonávajícími činnosti při zhotovení díla na základě této smlouvy.

23. Zhotovitel je povinen při provádění díla postupovat v souladu s touto smlouvou a jejími přílohami a též podle platných právních předpisů a dalších obecně závazných norem, zejména na základě zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 262/2002 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zabezpečení bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády České republiky č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády České republiky č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zaslání záznamu o úrazu, ve znění pozdějších předpisů, a prováděcích předpisů, a rovněž technických norem včetně norem doporučujících. V případě porušení těchto svých povinností, odpovídá zhotovitel objednateli v plném rozsahu za způsobenou škodu s tím, že je povinen uvést dílo na své vlastní náklady zcela do souladu s obsahem této smlouvy.

24. Zhotovitel je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly, ve smyslu § 2 písm. e) a § 13 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, tj. poskytovat kontrolnímu orgánu doklady o dodávkách stavebních prací, zboží a služeb hrazených z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory v rozsahu nezbytném pro ověření příslušné operace. Splnění této povinnosti je zhotovitel povinen zajistit i u osob, které se budou případně jako poddodavatelé podílet se souhlasem objednatele na zhotovení díla podle této smlouvy.

25. Zhotovitel je povinen učinit veškerá právní jednání a úkony k tomu, aby měl objednatel možnost splnit své povinnosti týkající se archivace dokumentace vztahující se k dílu a čerpání finančních prostředků na úhradu ceny díla, a to podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky Ministerstva vnitra České republiky č. 645/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o archivnictví a spisové službě a o změně některých

zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky Ministerstva vnitra České republiky č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby, ve znění pozdějších předpisů, s tím, že je zhotovitel povinen umožnit přístup k veškeré dokumentaci, týkající se realizace díla, a to, mimo jiné, za účelem provádění kontrol vztahujících se k čerpání prostředků na úhradu celkové ceny díla a při provádění jakýchkoli dalších kontrol podle zákona č. 252/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů, a též za účelem provádění kontroly podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, za podmínek uvedených v těchto zákonech, a to zejména za účelem provádění kontrol prováděných ze strany příslušných orgánů a institucí podle právních předpisů České republiky. Zhotovitel je povinen nejméně po dobu 10 (slovy: deseti) let ode dne dokončení díla, nejméně však do roku 2033, uchovávat veškeré doklady a písemnosti potřebné k řádnému provedení kontroly užití finančních prostředků na zaplacení celkové ceny díla a bezodkladně poté, co k tomu obdrží písemnou výzvu objednatele, poskytnout tyto doklady a písemnosti objednateli.

26. Povinnosti ujednané v odstavci 24. a odstavci 25. je zhotovitel, za předpokladu, že k tomu budou splněny požadavky kladené právními předpisy, povinen splnit a příslušné listiny, dokumenty a údaje poskytnout i v případě, že jejich obsah podléhá ochraně podle zvláštních právních předpisů (např. jako obchodní tajemství či utajované skutečnosti).

27. Zhotovitel prohlašuje, že u něj není a nebude vykonávána nelegální práce ve smyslu ustanovení § 5 písm. e) zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zejména, že veškerá závislá práce vykonávaná fyzickými osobami u něj je a bude konána v základním pracovněprávním vztahu. Zhotovitel též prohlašuje, že pokud příslušnou práci na základě vztahu se zhotovitelem vykonávají nebo budou vykonávat fyzické osoby – cizinci, tak ji vykonávají nebo ji budou vykonávat v souladu s vydaným povolením k zaměstnání a v souladu s vydaným povolením k dlouhodobému pobytu za účelem zaměstnání ve zvláštních případech (tzv. zelená karta) vydaným podle zvláštního právního předpisu nebo v souladu s modrou kartou, a též že, pokud je to podle zvláštního předpisu vyžadováno, tak fyzické osoby – cizinci nevykonávají a nebudou vykonávat na základě vztahu se zhotovitelem jakoukoli práci bez platného povolení k pobytu na území České republiky. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že jeho prohlášení uvedená v ustanovení tohoto odstavce smlouvy budou odpovídat skutečnosti po celou dobu trvání této smlouvy.

28. Zhotovitel je povinen umožnit objednateli pravidelné kontrolní prohlídky provádění díla 1x týdně za přítomnosti objednatele, zhotovitele, technického dozoru, autorského dozoru a koordinátora BOZP. Termíny kontrolních dní budou dohodnuty mezi objednatelem a zhotovitelem při předání staveniště.

IX. Staveniště:

1. Objednatel předá zhotoviteli protokolárně část pozemku k zahájení prací dle harmonogramu a o předání staveniště bude zhotovitelem vyhotoven zápis, ve kterém bude zhotovitelem potvrzeno převzetí staveniště. Objednatel určí zhotoviteli přístupové cesty a poskytne zdarma připojovací místa energií a medií nezbytná k provádění díla.

2. Zhotovitel se zavazuje řádně označit staveniště veškerými, zejména bezpečnostními a výstražnými označeními, vyžadovanými právními a dalšími obecně závaznými předpisy a normami.

3. Zhotovitel odpovídá v průběhu provedení díla za pořádek a čistotu na staveništi. Je povinen na své náklady odstranit odpady a nečistoty vzniklé provedením díla a průběžně odstraňovat veškerá znečištění a poškození komunikací, ke kterým dojde provozem zhotovitele.

4. Zhotovitel se zavazuje na své náklady staveniště vyklidit a uvést do náležitého stavu

a předat je zpět objednateli v termínu uvedeném v této smlouvě.

5. Okolí budovy, stání pro kontejnery, jakož i vyhrazený prostor pro krátkodobé ukládání materiálu bude protokolárně předáno do 15 dní od ukončeného a řádně předaného díla objednateli ve stavu prostém jakýchkoli zařízení, odpadů, materiálu nebo jiných věcí, umístěných na tato místa zhotovitelem v průběhu provádění díla. V opačném případě je objednatel oprávněn vyklidit tyto prostory na náklady zhotovitele, popřípadě nevyklizený majetek a odpady sešrotovat, zničit apod. na náklady zhotovitele; zhotovitel je povinen uhradit tyto náklady objednateli do 15 dnů od obdržení výzvy k jejich úhradě.

X. Přechod vlastnického práva a nebezpečí škody na díle:

1. Vlastnické právo k dílu resp. jeho částem přechází na objednatele okamžikem předání každého podlaží zvlášť, a to na základě předávacího protokolu podepsaného objednatelem.

2. Zhotovitel nese nebezpečí škod na prováděném díle až do okamžiku předání jednotlivého podlaží bez vad a nedodělků a jeho převzetí objednatelem, s výjimkou materiálů a zařízení zajišťovaných objednatelem, které jsou majetkem objednatele od počátku; zhotovitel však nese nebezpečí škod i na těchto materiálech a zařízeních, pokud je převezme k provádění díla nebo tyto užívá na základě písemného zmocnění objednatele. Nebezpečí škody na díle přechází ze zhotovitele na objednatele okamžikem předání a převzetí díla, tj. podepsáním protokolu o předání a převzetí díla.

3. Nebezpečí škody na zhotovovaném díle přechází na objednatele okamžikem podpisu protokolu o předání a převzetí celého díla bez vad a nedodělků bránících plnohodnotnému užívání díla podle ustanovení tohoto článku smlouvy oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Do té doby nese veškeré nebezpečí škody na díle v plném rozsahu zhotovitel. Zhotovitel však bude i nadále v plném rozsahu odpovědný za veškeré škody nebo poškození způsobené jakýmkoliv jednáním nebo opomenutím zhotovitele po předání a převzetí díla. Zhotovitel bude též odpovídat za veškeré škody nebo poškození, které se objeví po předání a převzetí díla, které vzniknou v důsledku předchozích činností, za něž byl zhotovitel odpovědný, a za případné škody vzniklé při odstraňování drobných vad a nedodělků díla.

XI. Předání a převzetí díla:

1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním díla bez vad a nedodělků bránících plnohodnotnému užívání díla objednateli v místě provedení díla a převzetím díla bez vad a nedodělků bránících plnohodnotnému užívání díla ze strany objednatele. Po dokončení díla se zhotovitel zavazuje objednatele písemně vyzvat k převzetí díla.

2. Objednatel je povinen na výzvu zhotovitele řádně dokončené dílo převzít. Řádným dokončením díla se rozumí:

- a) provedení kompletního díla bez vad a nedodělků – ověřuje se za účasti zástupce objednatele prohlídkou na místě provedení díla včetně prověření funkčnosti díla,
- a
- b) předání kompletní požadované dokumentace – ověřuje se kontrolou rozsahu a obsahu předávané dokumentace;
- c) předání výchozí revize na celé dílo, a
- d) předání protokolů o měření

2. Objednatel je povinen na výzvu zhotovitele řádně dokončené dílo převzít. Řádným dokončením díla se rozumí, provedení kompletního díla bez vad a nedodělků – ověřuje se za účasti zástupce objednatele a TDS prohlídkou na místě provedení díla včetně prověření

funkčnosti díla.

3. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo splněním všech následujících podmínek:

- a) zhotovením všech položek výkazu výměr předmětu díla,
- b) provedením všech dodávek materiálů a prací, které tvoří předmět díla dle této smlouvy, ve sjednané kvalitě, včetně odstranění vad případně uvedených v předávacím protokolu
- c) podpisem protokolu o předání a převzetí díla objednatelem.

4. K předání a převzetí dokončeného díla vyzve písemně zhotovitel objednatel 3 pracovní dny před termínem předpokládaného předání díla. Předání díla bude probíhat na místě realizace předmětu zakázky.

5. Zhotovitel a objednatel se zavazují sepsat o předání a převzetí předmětu díla protokol.

6. Protokol o předání a převzetí díla bude vyhotoven ve dvou vyhotoveních a bude zejména obsahovat:

- a) název objednatele a zhotovitele včetně pověřených zástupců;
- b) název a rozsah předávaného díla;
- c) datum předání a převzetí díla;
- d) prohlášení o úplnosti a kompletnosti díla;
- e) soupis případných vad a nedodělků, pokud se objednatel rozhodne dílo převzít i s vadami a nedodělků s uvedením termínů pro jejich odstranění.

7. Při přejímacím řízení předá zhotovitel objednateli tyto doklady:

- a) doklady o úspěšném provedení všech revizí a zkoušek;
- b) kopii stavebního deníku;
- c) atesty, prohlášení o shodě a doklady jakosti na materiály používané v průběhu realizace díla;
- d) záruční listy na všechny dodané zařizovací předměty a jejich komponenty.

8. K předání a převzetí dokončeného díla před plánovaným termínem zhotovitel vyzve písemně objednatel nejméně 5 (slovy: pět) pracovních dnů předem. K výzvě zhotovitele k předání a převzetí díla přiloží zhotovitel:

- a) písemné potvrzení od TDS, že tento převzal zápisy o zaškolení obsluhy díla s podpisy zaškolených osob a veškeré doklady stanovené normami, platnými zákony a vyhláškami či výrobcí jednotlivých zařízení (např. prohlášení o shodě, zkušební protokoly a certifikáty, protokoly o provedených měřeních atd.), dále stanovené ve vyjádřeních všech dotčených orgánů a organizací (pokud toto není povinností objednatele), které jsou součástí zadávací dokumentace, včetně zaměření, s tím, že všechny tyto doklady budou při protokolárním předání a převzetí díla předány zhotovitelem objednateli v originále a 1 (slovy: jedné) kopii s jejich číslovaným seznamem,
- b) dokumentaci skutečného provedení díla, a to ve sjednaném počtu vyhotovení,
- c) originál jednoduchého záznamu o stavbě ve stavebním deníku, vedeného podle ustanovení článku VIII. odst. 16 této smlouvy,
- d) veškeré doklady, týkající se zhotoveného díla, vyžadované právními nebo jinými obecně závaznými normami či výrobcí jednotlivých materiálů nebo zařízení, které jsou součástí díla, a to zejména výchozí revize všech elektroinstalací, prohlášení o shodě, zkušební protokoly a certifikáty, záruční listy, návody a manuály, atesty, protokoly o provedených měřeních a příslušná povolení a příslušné souhlasy, nezbytné k provádění díla, a též doklady uvedené ve vyjádřeních všech dotčených orgánů a organizací (pokud toto není povinností objednatele), které jsou součástí zadávací dokumentace, včetně zaměření, to vše v originále a v 1 (slovy: jedné) kopii s potvrzením zhotovitele o autenticitě kopií s originálem dokumentu, s tím, že k těmto dokladům bude přiložen seznam, obsahující jejich výčet, opatřený potvrzením

zhotovitele o jeho úplnosti, anebo písemné potvrzení od TDS, že tento převzal ke kontrole shora uvedené doklady, přičemž všechny tyto doklady budou v takovém případě předány objednateli nejpozději při protokolárním předání a převzetí díla v originále a v 1 (slovy: jedné) kopii s potvrzením zhotovitele o autenticitě kopií s originálem dokumentu, s tím, že k těmto dokladům bude přiložen seznam, obsahující jejich výčet, opatřený potvrzením zhotovitele o jeho úplnosti.

9. Objednatel není povinen dílo převzít s drobnými vadami a nedodělky nebránícími běžnému užívání.

10. Po dokončení díla zhotovitel zcela vyklidí a uvede do řádného stavu staveniště (včetně odstranění zařízení staveniště), všechny prostory, které užíval při provádění díla, a všechny okolní prostory, a to nejpozději do 10 (slovy: deseti) dnů po převzetí díla objednatelům a vyklizené staveniště a příslušné prostory protokolárně předá objednateli.

11. Objednatel se zavazuje umožnit zhotoviteli předání díla do 10 (slovy: deseti) pracovních dnů ode dne, ve kterém mu bude doručeno písemné oznámení zhotovitele, že dílo bylo zcela zhotoveno a že je připraveno k předání.

12. Objednatel je oprávněn odmítnout výzvu zhotovitele k zahájení řízení o předání a převzetí díla v případě, že zjistí skutečnosti, které zahájení předání a převzetí díla brání. Objednatel je povinen tyto skutečnosti písemně sdělit zhotoviteli nejpozději do dne, který bezprostředně předchází nejzazšímu termínu pro předání a převzetí díla podle ustanovení odstavce 8. tohoto článku smlouvy.

13. Předání díla se uskuteční na základě předávacího protokolu podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran. V protokolu bude v kladném případě stvrzeno, že zhotovitel předává výsledek díla v řádném stavu, bez vad bránících uvedení výsledku díla do provozu.

XII. Práva z odpovědnosti za vady, záruka, odpovědnost za škodu:

1. Zhotovitel odpovídá za řádné, kvalitní, bezvadné a včasné provedení díla a za to, že dílo bude provedeno v souladu s platnými právními předpisy a technickými normami, touto smlouvou a jejími přílohami a individuálními pokyny objednatele. Zhotovitel poskytuje objednateli podle ustanovení § 2619 ve spojení s ustanovením § 2113 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů ode dne podpisu předávacího protokolu o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků podle ustanovení článku IX. této smlouvy oprávněnými zástupci objednatele a zhotovitele záruku za bezvadnost a jakost provedeného díla v rozsahu 60 (slovy: šedesát) měsíců ode dne podpisu předávacího protokolu o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.

2. Záruka se nevztahuje na vady, u nichž zhotovitel prokáže, že byly způsobeny výlučně z těchto důvodů:

- a) zásahem třetí osoby,
- b) neodborným provozováním díla,
- c) živelnou pohromou,
- d) nevhodnými pokyny objednatele v průběhu stavby, na kterých objednatel trval i přes písemné upozornění zhotovitele.

3. Volba práva způsobu řešení odpovědnosti za vady náleží objednateli a zhotovitel je povinen jí vyhovět. Nebude-li objednatel požadován jiný způsob odstranění vady, odstraní zhotovitel na své náklady a nebezpečí všechny vady díla, které budou objednatelům zjištěny během záruční doby, bez ohledu na to, zda půjde o vady způsobené vadami materiálu anebo o vady vzniklé v důsledku nekvalitního provedení prací.

4. Reklamacie musí být podána písemně do konce záruční doby. Za řádně uplatněnou se pokládá i reklamacie uplatněná e-mailem. Zhotovitel je povinen přijetí e-mailu potvrdit. Objednatel je povinen reklamovanou vadu řádným způsobem označit a uvést, jak se projevuje a případně též jakým způsobem ji požaduje odstranit. Na základě požadavku zhotovitele je objednatel povinen umožnit mu v dohodnutém termínu prohlídku reklamované vady. Zhotovitel provede odbornou prohlídku nejpozději do 48 (slovy: čtyřicet osm) hodin od odeslání e-mailové reklamacie objednatelem a v témže termínu je povinen zahájit práce na odstranění vady. Konečný termín odstranění vad reklamovaných objednatelem bude stanoven po vzájemné dohodě s objednatelem v zápisu o projednání reklamacie s tím, že pokud nebude mezi objednatelem a zhotovitelem sjednáno jinak, je zhotovitel povinen odstranit příslušnou vadu nejpozději do 7 (sedmi) dnů ode dne jejího uplatnění objednatelem. U částí díla, jejichž porucha znamená znemožnění řádného užívání díla či riziko vzniku následné škody, je zhotovitel povinen řešit reklamaci neodkladně tak, aby dílo mohlo být plnohodnotně a bezpečně užíváno nejpozději do 3 (slovy: tři) pracovních dnů ode dne uplatnění vady.

5. O dobu vyřízení oprávněného nároku z reklamacie, což je doba od doručení reklamacie zhotoviteli do ukončení opravy a převzetí jejího výsledku objednatelem, se prodlužuje záruční doba uvedená v ustanovení odstavce 1. tohoto článku smlouvy. Při výměně reklamované části díla za novou část díla, počíná běžet okamžikem protokolárního předání vyměněné části díla ve vztahu k vyměněné části díla nová záruční doba.

6. V případě, že zhotovitel neodstraní vadu díla ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn požádat o odstranění této vady díla bez předchozího upozornění zhotovitele na tuto skutečnost třetí osobu s tím, že tato třetí osoba odstraní vadu díla na náklady zhotovitele. Tím nebude dotčena záruka na dílo podle ustanovení odstavce 1. tohoto článku smlouvy.

7. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele alespoň 48 (slovy: čtyřicet osm) hodin předem ke kontrole provedení odstranění každé reklamované vady. Dokladem o odstranění vady a termínu jejího odstranění je zápis podepsaný oběma smluvními stranami.

8. Pokud zhotovitel neprokáže jinak, má se za to, že za vadu v době záruční doby odpovídá.

XIII. Pojištění odpovědnosti za škodu:

1. Zhotovitel je povinen mít sjednané pojištění odpovědnosti za veškeré škody vzniklé v souvislosti s jeho činností dle této smlouvy o dílo, včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele a to na pojistné plnění pro každou jednotlivou pojistnou událost ve výši nejméně v takové částce, aby výše pojistného plnění v plném rozsahu kryla veškeré potenciální škody, které mohou v souvislosti s činností Zhotovitele dle této smlouvy o dílo vzniknout, minimálně ve výši 1.000.000 mil. Kč. Zhotovitel se zavazuje udržovat pojištění platné v jeho nesnížené výši po dobu výkonu veškeré činnosti dle této smlouvy. Kopii pojistné smlouvy předloží Zhotovitel Objednateli nejpozději v den podpisu smlouvy o dílo. Pojistná smlouva tvoří nedílnou součást této smlouvy, aniž by k ní musela být přiložena.

XIV. Sankce:

1. V případě prodloužení zhotovitele se zahájením zhotovení díla, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč (slovy: dvacet tisíc korun českých) za každý započatý den prodloužení zhotovitele se splněním jeho povinností.

2. V případě prodloužení zhotovitele s nedodržením termínu dle harmonogramu prací, který je přílohou č. 3 této smlouvy, nebo prodloužení se splněním termínu pro dokončení a předání díla, nebo jednotlivých etap a/nebo při prodloužení zhotovitele s předáním vyklizeného a do řádného stavu uvedeného staveniště (včetně odstranění zařízení staveniště) objednateli z důvodů na

straně zhotovitele uhradí zhotovitel zvlášť za každé jednotlivé porušení povinnosti smluvní pokutu ve výši 20.000,-Kč (slovy: padesát tisíc korun českých) za každý započatý den prodlení do data předání díla nebo jednotlivých etap dle harmonogramu.

3. V případě, že zhotovitel poruší jakýkoli svůj závazek uvedený v ustanovení článku VIII., odst. 1. této smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit objednateli za každé jednotlivé porušení svého závazku smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč (slovy: dvacet tisíc korun českých).

4. V případě, že se ukáže, že jakékoli prohlášení zhotovitele uvedené v ustanovení článku VIII., odst. 27. této smlouvy neodpovídá skutečnosti, nebo zhotovitel poruší svoji povinnost uvedenou v ustanovení článku VIII., odst. 27. této smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit objednateli za každý jednotlivý případ porušení své povinnosti smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč (slovy: dvacet tisíc korun českých). Pokud vznikne objednateli v důsledku umožnění nelegální práce ze strany zhotovitele újma, je zhotovitel povinen tuto újmu objednateli v plném rozsahu nahradit nejpozději do 1 (slovy: jednoho) týdne ode dne, ve kterém mu bude doručena písemná výzva objednatele k náhradě škody.

5. Nedostaví-li se zhotovitel k posouzení reklamace nebo nevyjádří-li se k reklamované vadě nebo nenastoupí-li k provedení záruční opravy anebo neodstraní-li vadu v termínech uvedených a ujednaných v článku XI. a XII. této smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit objednateli u vad, z jejichž důvodu může vzniknout škoda, a/nebo u vad bránících, a to i částečně, užívání díla, smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč (slovy: pět tisíc korun českých) a u ostatních vad smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč (slovy: jedentisíc korun českých), a to vždy za každou jednotlivou vadu a za každý započatý den prodlení se splněním jeho povinnosti.

6. Poruší-li zhotovitel povinnost předložit pojistnou smlouvu nebo udržovat platné pojištění po dobu výkonu veškeré činnosti, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za každý den prodlení se splněním jeho povinnosti.

7. Za prodlení objednatele se zaplacením dohodnutých plateb ve lhůtě splatnosti smluvní úrok z prodlení ve výši 0,01% z dlužné částky za každý započatý kalendářní den prodlení.

8. Smluvní pokuty dle této smlouvy jsou splatné do 30 dnů ode dne, kdy byla doručena výzva k jejich zaplacení.

9. Překážka v provádění prací způsobená objednatelem opravňuje zhotovitele k uplatnění práva na náhradu škody pouze v případě, že tato překážka je způsobena porušením povinností objednatele a trvá nepřetržitě déle než 20 (slovy: dvacet) pracovních dnů ode dne, ve kterém bude objednateli doručena písemná výzva zhotovitele k umožnění pokračování ve zhotovování díla. V případě překročení této lhůty je zhotovitel oprávněn na objednateli požadovat náhradu skutečně vzniklé a prokázané škody, nikoliv však náhradu ušlého zisku, to vše s tím, že maximální výše náhrady škody činí 50.000,- Kč (slovy: padesát tisíc korun českých) a zhotovitel se nároku na náhradu škody tuto částku přesahující v plném rozsahu výslovně vzdává. Sankce sjednané touto smlouvou hradí strana povinná straně oprávněné nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé smluvní straně v této souvislosti škoda, kterou lze vymáhat samostatně, to vše s tím, že pohledávka na úhradu sankcí je splatná dnem porušení příslušné povinnosti, na jehož základě nárok na příslušnou sankci vznikl. Při prodlení s placením sankcí může strana oprávněná účtovat straně povinné úrok z prodlení ve výši 10% (slovy: deset procent) z nezaplacené částky příslušné sankce ročně. Sankce i náhradu způsobené škody uhradí strana povinná ve prospěch strany oprávněné na základě písemné výzvy k jejich zaplacení.

10. Jednotlivé sankce v této smlouvě uváděné se navzájem neruší a mohou být uplatněny souběžně i samostatně.

11. Sjednáním smluvních pokut podle ustanovení tohoto článku smlouvy není dotčeno právo objednatele na náhradu škody s tím, že se výše náhrady škody o výši sjednané smluvní pokuty ani z části nesnižuje.

XVI. Odstoupení od smlouvy:

1. Každá ze smluvních stran je oprávněna od této smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení smlouvy druhou smluvní stranou.

2. Objednatel je oprávněn písemně odstoupit od této smlouvy zejména v těchto jednotlivých případech:

- a) zhotovitel se ocitne v prodlení delším než 20 dní s dokončením jednotlivých etap dle časového harmonogramu prací, nebude-li mezi stranami dohodnuto jinak
- b) zhotovitel se ocitne v prodlení delším než 20 dní s dokončením díla a jeho předáním objednateli, nebude-li mezi stranami dohodnuto jinak,
- c) ukáže se, jakékoliv prohlášení zhotovitele uvedené v ustanovení článku VIII., odst. 27 této smlouvy neodpovídá skutečnosti,
- d) bude rozhodnuto o zrušení zhotovitele s likvidací podle ustanovení § 187 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,
- e) zhotovitel se ocitne v úpadku ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů,
- f) z důvodů, které nebudou na straně objednatele, nebude možné řádné a včas splnit předmět této smlouvy,
- g) zhotovitel při zhotovování díla opakovaně poruší právní a další obecně závazné předpisy a normy,
- h) zhotovitel při zhotovování díla opakovaně nedodržuje technologické postupy, porušuje kvalitu a jakost prováděného díla vyplývající z platných norem, této smlouvy, jejích příloh nebo z obecně závazných předpisů,
- i) použije ke splnění části díla třetí osoby (poddodavatele) v rozsahu více než 20% ceny díla.

3. Zhotovitel má právo odstoupit od smlouvy při prodlení objednatele s úhradou splatných faktur o více než 30 dnů ode dne splatnosti pod podmínkou doručení předchozího písemného upozornění zhotovitele objednateli o nezaplacení faktury.

4. Zhotovitel v případě odstoupení od smlouvy k datu, ke kterému nastaly účinky odstoupení
- a) předá objednateli všechny výkresy, specifikace a ostatní doklady a dokumentaci vyhotovenou nebo připravenou zhotovitelem ve stavu k datu, ke kterému nastaly účinky odstoupení od smlouvy
 - b) předá zhotoviteli vyklizené staveniště do 14 dní od odstoupení od smlouvy.

5. Objednatel je v případě odstoupení od smlouvy oprávněn převzít staveniště a dokončit dílo buď sám, nebo zadat jeho dokončení třetí osobě.

6. Smluvní strany jsou oprávněny od této smlouvy odstoupit z důvodů uvedených v této smlouvě nebo v zákoně, písemným oznámením zaslaným doporučeným dopisem druhé smluvní straně. Odstoupením od smlouvy tato smlouva zaniká. Účinky odstoupení nastávají doručením oznámení druhé smluvní straně.

7. Oprávněná strana nemůže odstoupit od smlouvy poté, kdy jí byla doručena zpráva, že již byla řádně splněna povinnost, jejíž porušení bylo důvodem odstoupení od smlouvy.

8. Smluvní strany se výslovně dohodly, pokud není v této smlouvě výslovně ujednáno jinak, na vyloučení aplikace ustanovení § 1978 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tj. na tom, že marné uplynutí dodatečné lhůty k plnění, poskytnuté

s tím, že tato lhůta již nebude prodloužena, nemá za následek automatické odstoupení od této smlouvy.

9. V případě odstoupení objednatele od této smlouvy podle ustanovení odstavce 2. tohoto článku smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit objednateli finanční vypořádání ve výši 300.000,- Kč (slovy: třístatisíc korun českých).

10. Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze smlouvy. Odstoupení od smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody vzniklého porušením smlouvy, ani smluvních ustanovení týkajících se smluvních pokut, volby práva, řešení sporů.

XVII. Stanovení osob oprávněných zastupovat smluvní strany:

1. Objednatele je v rámci výkonu práv a povinností podle této smlouvy oprávněn zastupovat:

Jméno, příjmení: Ing. Tomáš Zouhar, kvestor VŠE, tel.: [REDAKCE] [REDAKCE] [REDAKCE]

[REDAKCE] který je též kontaktní osobou objednatele při jednání objednatele a zhotovitele podle této smlouvy.

2. Zhotovitele je v rámci výkonu práv a povinností podle této smlouvy oprávněn zastupovat: jméno příjmení Michal Štantejský, jednatel společnosti, tel. [REDAKCE]

[REDAKCE] který je též kontaktní osobou zhotovitele při jednání objednatele a zhotovitele podle této smlouvy.

XVIII. Doručování

1. Veškerá oznámení vyplývající z této smlouvy a listiny doručované mezi smluvními stranami budou, pokud není v této smlouvě výslovně uvedeno jinak, předány osobně oproti podpisu, potvrzujícím jejich předání nebo zaslány prostřednictvím datové schránky nebo doporučeně poštou na adresu sídla adresáta. Písemnost se považuje za doručenu, i když se adresát o uložení nedozvěděl, a to 5. (slovy: pátým) dnem ode dne, kdy byla uložena na poště. To platí i v případě, že nebyla doručena na změněnou adresu sídla, pokud příslušná smluvní strana změnu adresy druhé smluvní straně neoznámí. Písemnost se považuje za doručenu i v případě, že adresát odepře písemnost přijmout, a to dnem odmítnutí převzetí písemnosti.

XIX. Závěrečná ujednání:

1. Smlouva může být doplňována nebo měněna pouze na základě písemných číslovaných, oběma stranami odsouhlasených dodatků.

2. Pokud se jakékoliv ustanovení této smlouvy stane nebo bude určeno jako neplatné nebo nevynutitelné, pak taková neplatnost nebo nevynutitelnost neovlivní platnost nebo vynutitelnost zbylých ustanovení této smlouvy. V takovém případě se smluvní strany dohodly, že bez zbytečného odkladu nahradí neplatné nebo nevynutitelné ustanovení ustanovením platným a vynutitelným, aby se dosáhlo v maximální možné míře dovolené právními předpisy stejného účinku a výsledku, jaký byl sledován nahrazovaným ustanovením.

3. Smlouva vstupuje v platnost a nabývá účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv Ministerstva vnitra ČR.

4. Smlouva byla vyhotovena ve 2 (slovy: dvou) stejnopisech. Každá ze smluvních stran obdrží po 1 (slovy: jednom) stejnopisu smlouvy.

5. Obě smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem řádně a pečlivě přečetly, že byla uzavřena podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně,

nikoli v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují oprávnění zástupci smluvních stran pod text smlouvy své vlastnoruční podpisy.

Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy:

Příloha č. 1 – Cenová nabídka zhotovitele – výkaz výměr


Příloha č. 2 – Projektová dokumentace

Příloha č. 3 – Harmonogram prováděných prací

V Praze dne: 21-06-2023

Obíednatel:

Zhotovitel:

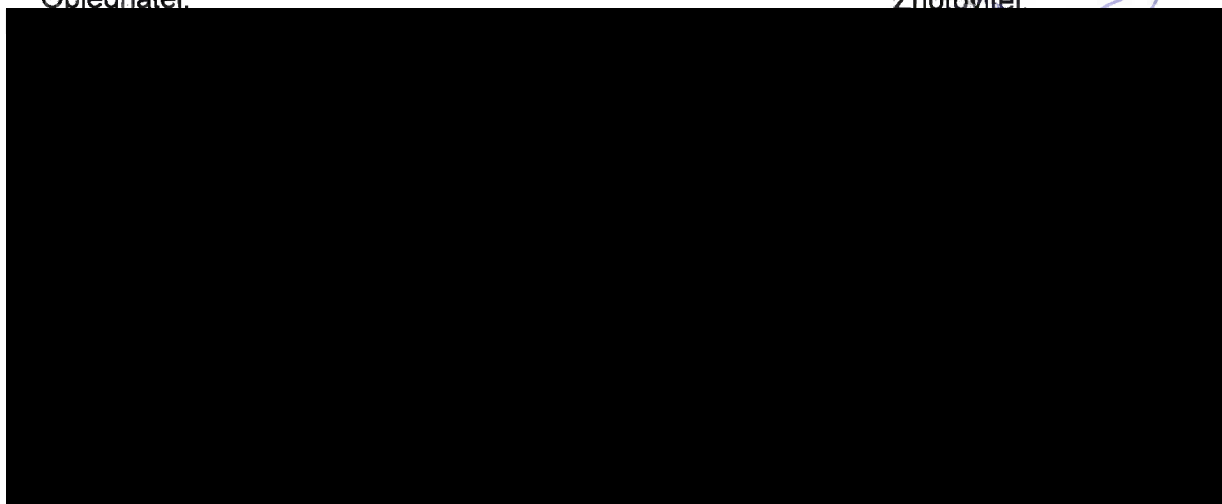

PITULACE STAVBY

30-2023

na: VŠE Praha - Rekonstrukce střechy Thalerovy koleje

Adresa: Jeseniova 1954/210, 13000 Praha 3 - Žižkov

CC-CZ:
Datum: 30. 5. 2023

Zadavatel:
Správa účelových zařízení VŠE v Praze

IČ: 61384399
DIČ: CZ61384399

Zhotovitel:
FAST střechy, s.r.o.

IČ: 27537676
DIČ:

Projektant:
Drobný Architects, s.r.o.

IČ: 26499924
DIČ: CZ26499924

Zpracovatel:
[Redacted]

IČ: 08660361
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Nabídková cena obsahuje veškeré práce a dodávky obsažené v projektové dokumentaci, výkazu výměr, technické zprávě a ve výkresové

Cena bez DPH			2 245 743,30
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	2 245 743,30	471 606,09
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			2 717 349,39

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 30-2023

Stavba: VŠE Praha - Rekonstrukce střechy Thalerovy koleje

Místo: Jeseniova 1954/210, 13000 Praha 3 - Žižkov

Datum: 30. 5. 2023

Zadavatel: Správa účelových zařízení VŠE v Praze

Projektant: Drobný Architects, s.r.o.

Zhotovitel: FAST střechy, s.r.o.

Zpracovatel: [REDACTED]

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		2 245 743,30	2 717 349,39	
01	Rekonstrukce střechy	2 185 243,30	2 644 144,39	STA
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	60 500,00	73 205,00	STA

PRŮJEDNÁVACÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

stavba:

VŠE Praha - Rekonstrukce střechy Thalerovy koleje

Objekt:

01 - Rekonstrukce střechy

KSO:

Místo: Jeseniova 1954/210, 13000 Praha 3 - Žižkov

Zadavatel:

Správa účelových zařízení VŠE v Praze

Zhotovitel:

FAST střechy, s.r.o.

Projektant:

Drobný Architects, s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 30. 5. 2023

IČ:

61384399

DIČ:

CZ61384399

IČ:

27537676

DIČ:

IČ:

26499924

DIČ:

CZ26499924

IČ:

08660361

DIČ:

Cena bez DPH

2 185 243,30

DPH základní
snížená

Základ daně
2 185 243,30
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
458 901,09
0,00

Cena s DPH

v CZK

2 644 144,39

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VŠE Praha - Rekonstrukce střechy Thalerovy koleje

Objekt:

01 - Rekonstrukce střechy

Místo:

Jeseniova 1954/210, 13000 Praha 3 - Žižkov

Datum:

30. 5. 2023

Zadavatel:

Správa účelových zařízení VŠE v Praze

Projektant:

Drobný Architects,
s.r.o.

Zhotovitel:

FAST střechy, s.r.o.

Zpracovatel:

██████████

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

2 185 243,30

HSV - Práce a dodávky HSV

480 066,04

997 - Přesun sutě

480 066,04

PSV - Práce a dodávky PSV

1 705 177,26

712 - Povlakové krytiny

976 343,60

713 - Izolace tepelné

493 493,45

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

10 634,28

741 - Elektroinstalace

25 696,80

762 - Konstrukce tesařské

55 618,67

764 - Konstrukce klempířské

143 390,46

IS PRACÍ

Objekt: VŠE Praha - Rekonstrukce střechy Thalerovy koleje

01 - Rekonstrukce střechy

Místo: Jeseniova 1954/210, 13000 Praha 3 - Žižkov

Datum: 30. 5. 2023

Zadavatel: Správa účelových zařízení VŠE v Praze

Projektant: Drobný Architects,
s.r.o.

Zhotovitel: FAST střechy, s.r.o.

Zpracovatel: Ing. Jaroslav Střížka


PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

2 185 243,30

PC Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová sou
--------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	------------

W 117 1170



Kód

Popis

MJ

Množství


J.cena [CZK]

Cena celkem [CZK]

Cenová soustava

Součet

2,000



PČ Typ

Kód

Popis


MJ

Množství

J.cena [CZK]

Cena celkem [CZK]

Cenová sou



Kód

Popis


MJ

Množství

J.cena [CZK]

Cena celkem [CZK]

Genová soustava



PČ Typ

Kód

Popis

MJ

Množství

J.cena [CZK]

Cena celkem [CZK]

Cenová sou

Kód

Popis


MJ


Množství

J.cena [CZK]

Cena celkem [CZK]

Genová soustava





RYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Závba:

VŠE Praha - Rekonstrukce střechy Thalerovy koleje

Objekt:

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

KSO:

Místo: Jeseniova 1954/210, 13000 Praha 3 - Žižkov

Zadavatel:

Správa účelových zařízení VŠE v Praze

Zhotovitel:

FAST střechy, s.r.o.

Projektant:

Drobný Architects, s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 30. 5. 2023

IC:

61384399

DIČ:

CZ61384399

IC:

27537676

DIČ:

IC:

26499924

DIČ:

CZ26499924

IC:

08660361

DIČ:

Cena bez DPH

60 500,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	60 500,00	21,00%	12 705,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

73 205,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VŠE Praha - Rekonstrukce střechy Thalerovy koleje

Objekt:

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo:

Jeseniova 1954/210, 13000 Praha 3 - Žižkov

Datum:

30. 5. 2023

Zadavatel:

Správa účelových zařízení VŠE v Praze

Projektant:

Drobný Architects,
s.r.o.

Zhotovitel:

FAST střechy, s.r.o.

Zpracovatel:

Ing. Jaroslav Stolička

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

60 500,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	60 500,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	5 000,00
VRN2 - Příprava staveniště	5 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	7 500,00
VRN4 - Inženýrská činnost	19 500,00
VRN6 - Územní vlivy	10 000,00
VRN7 - Provozní vlivy	6 000,00
VRN9 - Ostatní náklady	7 500,00

IS PRACÍ

Objekt: VŠE Praha - Rekonstrukce střechy Thalerovy koleje

Projekt: VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo: Jeseniova 1954/210, 13000 Praha 3 - Žižkov

Datum: 30. 5. 2023

Zadavatel: Správa účelových zařízení VŠE v Praze

Projektant: Drobný Architects, s.r.o.

Zhotovitel: FAST střechy, s.r.o.

Zpracovatel: Ing. Jaroslav Stolička

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							60 500,00	
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				60 500,00	
D	VRN1		Průzkumné, geodetické a projektové práce				5 000,00	
1	K	011002000	Průzkumné práce	...	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC					
			WV		1,000			
			WV		1,000			
			Součet					
D	VRN2		Příprava stavenišť				5 000,00	
2	K	022002000	Přeložení konstrukcí	...	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC					
			WV		1,000			
			WV		1,000			
			Součet					
D	VRN3		Zařízení stavenišť				7 500,00	
3	K	030001000	Zařízení stavenišť	...	1,000	7 500,00	7 500,00	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC					
			WV		1,000			
			WV		1,000			
			Součet					
D	VRN4		Inženýrská činnost				19 500,00	
4	K	041002000	Dozory	...	1,000	2 000,00	2 000,00	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC					
			WV		1,000			
			WV		1,000			
			Součet					
5	K	043002000	Zkoušky a ostatní měření	...	1,000	2 500,00	2 500,00	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC					
			WV		1,000			
			WV		1,000			
			Součet					
6	K	044002000	Revize	...	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC					
			WV		1,000			
			WV		1,000			
			Součet					
7	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	...	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC					
			WV		1,000			
			WV		1,000			
			Součet					
D	VRN6		Územní vlivy				10 000,00	
8	K	062002000	Ztížené dopravní podmínky	...	1,000	7 500,00	7 500,00	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC					
			WV		1,000			
			WV		1,000			
			Součet					
9	K	063002000	Práce na těžce přístupných místech	...	1,000	2 500,00	2 500,00	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC					
			WV		1,000			
			WV		1,000			
			Součet					
D	VRN7		Provozní vlivy				6 000,00	
10	K	071002000	Provoz investora, třetích osob	...	1,000	1 000,00	1 000,00	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC					
			WV		1,000			
			WV		1,000			
			Součet					
11	K	079002000	Ostatní provozní vlivy	...	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC					
			WV		1,000			
			WV		1,000			
			Součet					
D	VRN9		Ostatní náklady				7 500,00	
12	K	094104000	Náklady na opatření BOZP	...	1,000	7 500,00	7 500,00	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC					
			WV		1,000			
			WV		1,000			
			Součet					

Příloha č. 2

Kompletní projektová dokumentace v tištěné podobě

PŘEDÁNO 1x PARE'

